

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	04.07.2024	
Předmět změny:	Výměna parapetního zdiva v objektu SO 01	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala se zachováním parapetního zdiva v objektu SO 01. Popis a zdůvodnění změny: Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že stávající parapetní zdivo je vyžděné mezi ocelové profily, které jsou v dožilém stavu, bez hydroizolace, silně zkorodované a neplní svou statickou funkci. Na základě tohoto zjištění došlo k vybourání tohoto zdiva, které bude nahrazeno zdivem novým včetně hydroizolace. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. - fotodokumentace Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 91.133,83 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
91.133,83 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 13.9.2024	Datum: 12.9.2024	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 12.9.2024	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZUŠ Střezina - II. etapa - fázování

Objekt: Změnové listy

Část: Bourání příčky

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: S T A K O společnost s ručením omezeným

Místo: Hradec Králové Luční 838 k.ú. Slezské předměstí

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 14. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 91 133,83

3 Svislé a kompletní konstrukce 57 031,50

1	011	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	50,000	1 140,63	57 031,50
---	-----	-----------	--	----	--------	----------	-----------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 935,00

2	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	15,000	529,00	7 935,00
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

100*0,15 15,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 460,50

3	013	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	50,000	169,21	8 460,50
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

997 Přesun sutě 17 706,83

4	R	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	13,050	266,56	3 478,61
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

5	013	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	13,050	424,00	5 533,20
---	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------


6	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	117,450	14,47	1 699,50
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

13,05*9 117,450

7	R	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	5,460	336,00	1 834,56
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------


998 Přesun hmot 5 160,96

8	R	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	4,906	1 051,97	5 160,96
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 01
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	04.07.2024	
Předmět změny:	Výměna parapetního zdiva v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
AD souhlasí se změnou řešení. Jedná se o stav zjištěný při výstavbě, u parapetního zdiva po odkrytí konstrukcí zjištěn nevyhovující stav.		
		

Příloha ZL.č.01 - fotodokumentace



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	04.07.2024	
Předmět změny:	Změna sádrokartonových příček v objektu SO 01	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s využitím některých místností (např. skladů) bez nároku na akustická opatření. Popis a zdůvodnění změny: Na základě dodatečného požadavku provozovatele, prostřednictvím investora, dojde ke změně ve způsobu užívání těchto místností (např. skladů) na kabinety. Z výše uvedených důvodů musí dojít ke změně typu sádrokartonových příček nově za příčky akustické. Současně je nutné splnit hygienickou normu a požadavek Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje na akustický útlum. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 67.713,03 Kč	(+) 105.631,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 37.918,47 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 13.9.2024	12.9.2024	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 12.9.2024	

ZL.č.2 - úprava SDK příček

Stavba:

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 918,47

D	763	Konstrukce suché výstavby	37 918,47
---	-----	---------------------------	-----------

308	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	-52,390	1 292,48	-67 713,03
-----	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB

VV

m.č. 1.20 a 1.21 (6,75*2,6)

17,550

m.č. 1.19 a 1.20 (6,75*2,6)

17,550

m.č. 1.07 a 1.06 (6,65*2,6)

17,290

VV

Součet

52,390

308b	K	763111462	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB	m2	17,550	1 850,00	32 467,50
------	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB

VV

m.č. 1.20 a 1.21 (6,75*2,6)

17,550

VV

Součet

17,550

308c	K	763111527	SDK příčka tl 225 mm profil CW+UW 150 desky 3xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 64 dB	m2	34,840	2 100,00	73 164,00
------	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB

VV

m.č. 1.19 a 1.20 (6,75*2,6)

17,550

VV

m.č. 1.07 a 1.06 (6,65*2,6)

17,290


VV

Součet

34,840

Celkem bez DPH

37 918,47 Kč

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 02
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	04.07.2024	
Předmět změny:	Změna sádrokartonových příček v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
AD souhlasí se změnou řešení. Jedná se o dodatečný požadavek investora, kdy část místností chce využívat i pro občasnou výuku hudební výchovy, proto bylo nutné upravit i požadavky na akustiku obálky místnosti.		
		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	14.07.2024		
Předmět změny:	Změna izolace střechy v objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s využitím plošné izolace střechy s izolantem o únosnosti EPS 100. Popis a zdůvodnění změny: Na základě odsouhlasené výrobní dokumentace, kterou předložil v rámci provádění stavby zhotovitel, bylo rozhodnuto o změně plošného izolantu nově o únosnosti EPS 70. Spádové klíny umístěné na této plošné izolaci zůstanou dle projektové dokumentace (EPS 150). Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. - výrobní dokumentace Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 196.691,38 Kč		(+) 156.433,31 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(-) 40.258,07 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
			
Datum: 13.9.2024		Datum: 12.9.2024	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
			
Datum:		Datum: 12.9.2024	

ZL.č.03 - záměna polystyrenu střecha SO01

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-40 258,07

D PSV

Práce a dodávky PSV

-40 258,07

D 713

Izolace tepelné

266	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	-77,622	153,44	-11 910,32
-----	---	----------	---	----	---------	--------	------------

PP

deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm

267	M	28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 140mm	m2	-857,055	215,60	-184 781,06
-----	---	----------	---	----	----------	--------	-------------

PP

deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 140mm

266a	M	28372309	deska EPS 70 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	77,622	123,60	9 594,08
------	---	----------	--	----	--------	--------	----------


PP

deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm

267a	M	28372316	deska EPS 70 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 140mm	m2	857,055	171,33	146 839,23
------	---	----------	--	----	---------	--------	------------

PP

deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 140mm

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 03
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	14.07.2024	
Předmět změny:	Změna izolace střechy v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
AD souhlasí se změnou řešení. Záměnou izolantu nedojde ke zhoršení tepelně technických parametrů díla.		
		

střecha 2

střecha 1

střecha 4

střecha 5

střecha 3

střecha 6

střecha 1-6


doporučená skladba (směrem od podkladu)

1. vrstva EPS70 základní izolace 16cm
2. vrstva EPS100 spádové klíny + EPS70 podložné desky

Prosím, před objednáním závazně zkontrolovat!

úžlabí ———
rozvodí - - - - -
podložná deska 12cm
podložná deska 2x12cm

POZICE	ROZSAH SPÁDU / DRUH		SPÁD	ŠÍŘKA	DÉLKA
	v plánu	od-do (mm)	%	mm	mm
klíny styro EPS 100	1	20-50	3,00	1 000	1 000
	2	50-80	3,00	1 000	1 000
	3	80-110	3,00	1 000	1 000
	4	110-140	3,00	1 000	1 000
	11	20-40	2,00	1 000	1 000
	12	40-60	2,00	1 000	1 000
Zakázka	Dodavatel:		Odběratel:		
	Styrotrade		Coleman S.I.,a.s.		
	Akce:		Místo:		
	ZUŠ Střezina		Hradec Králové		
	Datum:		Číslo zakázky:		
	3.7.2024		53891 neu		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	12.08.2024	
Předmět změny:	Příčky v místnostech WC dívky (č.1.30) a WC chlapci (č. 1.32) v objektu SO 01	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s využitím stávajících příček v místnostech WC dívky a WC chlapci v objektu SO 01. Popis a zdůvodnění změny: Po zahájení stavebních prací a odstranění omítek byly zjištěny vážné statické vady (trhliny) a technologické chyby při původní výstavbě příček v místnostech WC dívky a WC chlapci. Na základě tohoto zjištění dojde k vybourání těchto příček a k jejich novému vyzdění. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. - fotodokumentace Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 101.682,24 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 101.682,24 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 13.9.2024	Datum: 12.9.2024	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 12.9.2024	

ZL.č.04 - příčky WC 1.32 a 1.30 - Varianta pórobeton

Stavba: 656823 - ZUŠ Střezina - II. etapa - fázování (zadáni)
Objekt: Architek...

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:
Zpracoval:
Datum: 22. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 101 682,24

3 Svislé a kompletní konstrukce 36 334,69

50	R	342272205	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm	m2	22,975	605,68	13 915,50
			"50mm"				
			(1,35*2,2)*5		14,850		
			(3,25*2,5)		8,125		
			Součet		22,975		
51	R	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	13,098	1 018,54	13 340,84
			"100mm"(3,25*2,5)*2		16,250		
			(-0,8*1,97)*2		-3,152		
			Součet		13,098		
53	R	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	26,000	149,48	3 886,48
			2,5*6		15,000		
			2,2*5		11,000		
			Součet		26,000		
341	011	346272216	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	m2	8,125	639,00	5 191,88
			3,25*2,5		8,125		
			Součet		8,125		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 267,00

104	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačeníem do tmelu stěn	m2	72,146	280,00	20 200,88
			"100mm"(3,25*2,5)*2		16,250		
			(-0,8*1,97)*2		-3,152		
			"50mm"				
			(1,35*2,2)*5		14,850		
			(3,25*2,5)		8,125		
			Mezisoučet		36,073		
			36,073*2		72,146		
			Mezisoučet		72,146		
156	R	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	8,000	1 232,00	9 856,00
			"800" 2		2,000		
			"700" 6		6,000		
			Součet		8,000		
157	553	55331487X01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm, s polodázkou s těsněním TPE	kus	2,000	1 952,16	3 904,32

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
158	553	55331461X01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 50mm rozměru 700/1970, 2100mm, polodrážka s TPE těsněním	kus	6,000	1 884,30	11 305,80

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 702,64

170	R	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	36,073	72,61	2 619,26
			36,073		36,073		
			Součet		36,073		

339	013	962086110	Bourání pórobetonových příček nebo přizdivek tl do 100 mm	m2	36,073	126,00	4 545,20
			"100mm"(3,25*2,5)*2		16,250		
			(-0,8*1,97)*2		-3,152		

			"50mm"				
			(1,35*2,2)*5		14,850		
			(3,25*2,5)		8,125		
			Součet		36,073		

340	R	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	10,200	444,92	4 538,18
			(0,8*2)*2		3,200		
			(0,7*2)*5		7,000		
			Součet		10,200		

997 Přesun sutě 4 726,52


226	R	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,164	266,56	576,84
227	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,164	331,37	717,08
228	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	19,476	14,47	281,82
			2,164*9		19,476		
			Součet		19,476		

231	R	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,164	1 456,00	3 150,78
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

998 Přesun hmot 3 651,39


234	R	998012101	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,471	1 051,97	3 651,39
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

Celkem 101 682,24

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 04
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	12.08.2024	
Předmět změny:	Příčky v místnostech WC dívky (č. 1.30) a WC chlapci (č. 1.32) v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
AD souhlasí se změnou řešení. Jedná se o stav zjištěný při výstavbě, původní příčky byly po odkrytí potvrzeny jako nevyhovující.		
		





ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	12.08.2024	
Předmět změny:	Energokanal v objektu SO 01 (ubourání)	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace vedení energokanalů převzala z dochovaných podkladů.		
Popis a zdůvodnění změny: Po zahájení stavebních prací a po odkrytí podlah bylo zjištěno, že skutečné vedení a rozsah energokanalů je naprosto odlišný od projektového řešení a současně v kolizi s nově navrženou ležatou kanalizací. Na základě tohoto zjištění došlo ke kompletnímu vybourání stávajících betonových konstrukcí energokanalů, které byly v kolizi s navrženou kanalizací a nahrazeny zásepovým materiálem.		
Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. - fotodokumentace		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 177.391,20 Kč	(+) 1.009.662,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 832.271,68 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 13.9.2024	Datum: 12.9.2024	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 12.1.2024	

ZL.č.05 - bourání a překrytí energokanálu

P.č.	Název	Cena bez DPH
1	Bourání energokanálu	236 470,05 Kč
2	Překrytí energokanálu	125 808,63 Kč
3	Ubourání a překrytí energokanálu - středová část	647 384,20 Kč
4	Odpočet nových PZD desek	- 177 391,20 Kč
Celkem bez DPH		832 271,68 Kč

ZL.č.05 - Bourání a překrytí energokanálu

Stavba: ZUŠ Střezina - II. etapa - fázování

Objekt: Změnové listy

Část: Ubourání energokanálu

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: S T A K O společnost s ručením omezeným

Místo: Hradec Králové Luční 838 k.ú. Slezské předměstí

Zpracoval:

Datum: 24. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

236 470,05

1 Zemní práce

56 010,10

1	R	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,200	336,00	1 411,20
"opšt výkop kanalizace"4,2					4,200		
2	001	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	84,600	139,00	11 759,40
"zemina na skládku"4,2*3					12,600		
"recyklát na zásyp"24,0*3					72,000		
Součet					84,600		
3	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,200	340,31	1 429,30
4,2					4,200		
Součet					4,200		
4	R	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4,200	60,73	255,07
4,2					4,200		
Součet					4,200		
5	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,560	268,80	2 032,13
4,2*1,8					7,560		
6	001	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	27,000	651,00	17 577,00
7	589	58981124	recyklát betonový frakce 16/32	t	54,000	399,00	21 546,00
27*2,0					54,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

87 461,21

8	013	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	6,400	7 691,33	49 224,51
6,4					6,400		
9	013	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	5,400	5 290,00	28 566,00
(12*0,8+8*0,8+5*0,4)*0,30					5,400		
10	013	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	1,900	5 089,84	9 670,70
38*1,0*0,50*0,10					1,900		

997 Přesun sutě

36 192,36

11	R	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	32,310	266,56	8 612,55
12	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,310	331,37	10 706,56
13	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	290,790	14,47	4 207,73
32,31*9 "Přepočtené koeficientem množství					290,790		
14	R	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	32,310	392,00	12 665,52

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

998

Přesun hmot

56 806,38

15	R	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	54,000	1 051,97	56 806,38
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

Celkem

236 470,05

ZL.č.05 - Bourání a překrytí energokanálu

Stavba: ZUŠ Střezlna - II. etapa - fázování

Objekt: Změnové llisty

Část: Překrytí energokanálu

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: S T A K O společnost s ručením omezeným

Místo: Hradec Králové Luční 838 k.ú. Slezské předměstí

Zpracoval: [redacted]

Datum: 14. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3 Svislé a kompletní konstrukce 125 808,63

hsv Práce a dodávky HSV 1 713,20

1	014	310237241	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	613,00	1 226,00
"podezdívka"2,0					2,000		
2	014	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,060	8 120,00	487,20
"podezdívka"1,5*0,20*0,20					0,060		

4 Vodorovné konstrukce 91 968,34

3	011	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	5,256	5 130,00	26 963,28
7,75*3,4*0,180					4,743		
1,9*1,5*0,180					0,513		
Součet					5,256		
4	011	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	33,754	560,00	18 902,24
7,75*3,4					26,350		
1,9*1,5					2,850		
(7,75+3,4)*2*0,18					4,014		
1,5*0,180*2					0,540		
Součet					33,754		
5	011	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	33,754	56,00	1 890,22
6	011	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	29,200	112,00	3 270,40
7,75*3,4					26,350		
1,9*1,5					2,850		
Součet					29,200		
7	011	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	29,200	56,00	1 635,20
8	R	411354601a		m2	29,200	500,00	14 600,00
9	011	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,698	31 000,00	21 638,00
634,7*1,1*0,001					0,698		
10	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,099	31 000,00	3 069,00
90,30*1,1*0,001					0,099		
Součet					0,099		

8 Trubní vedení 16 620,00

11	271	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	3 620,00	3 620,00
12	552	55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání	kus	1,000	13 000,00	13 000,00

99 Přesun hmot a manipulace se suť 15 507,09

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	R	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdíváním obvodovým pláštěm v do 6 m	t	14,741	1 051,97	15 507,09

Celkem

125 808,63

ZL.Č.5 - ubourání a překrytí energokanálu - středová část

Stavba: ZUŠ Střezina - II. etapa - fázování

Objekt: Změnové listy

Část: Ubourání a překrytí energokanálu 3.část

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: S T A K O společnost s ručením omezeným

Místo: Hradec Králové Luční 838 k.ú. Slezské předměstí

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

647 384,20

1 Zemní práce

148 972,50

1	001	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	135,000	139,00	18 765,00
*zásyp dovoz a odvoz 75*2,0*0,45*2					135,000		
Součet					135,000		
2	001	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	270,000	128,00	34 560,00
135,0*2					270,000		
3	001	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	135,000	383,00	51 705,00
67,5*2					135,000		
4	001	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	67,500	651,00	43 942,50
75*2,0*0,45					67,500		
5	583	58344120	štěrkodrt' frakce 0/8	t			

4 Vodorovné konstrukce

102 510,00

6	011	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	18,000	4 750,00	85 500,00
75,0*2*0,12					18,000		
Součet					18,000		
7	011	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	10,000	560,00	5 600,00
10,0					10,000		
Součet					10,000		
8	011	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	10,000	56,00	560,00
9	011	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,350	31 000,00	10 850,00
350,0*0,001					0,350		

8 Trubní vedení

25 344,00

10	R	894000001	Revizní šachta 600 x 600mm	kus	6,000	4 224,00	25 344,00
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

241 336,44

11	013	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	18,000	7 691,33	138 443,94
75*2,0*0,12					18,000		
12	013	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	15,750	4 540,00	71 505,00
75*2,0*0,14*0,75					15,750		
13	013	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	67,500	465,00	31 387,50
75*2*0,45					67,500		

997 Přesun sutě

81 399,76


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	33,075	998,00	33 008,85
			"stropní desky na deponii v areálu"				
					33,075		
15	R	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	43,200	266,56	11 515,39
					"jen z bouraného betonu"43,20		
					43,200		
16	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,200	331,37	14 315,18
17	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	388,800	14,47	5 625,94
					43,20*9 "Přepočtené koeficientem množství		
					388,800		
18	R	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	43,200	392,00	16 934,40
998 Přesun hmot							47 821,50
19	R	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	45,459	1 051,97	47 821,50

Celkem

647 384,20

ZL.č.5 - Odpočet PZD desek



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-177 391,20	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-177 391,20	
D		4	Vodorovné konstrukce				-177 391,20	
60	M	59341746X01	deska stropní plná PZD 800x290x90mm	kus	-62,000	273,28	-16 943,36	
	VV		124 "SD2		62,000			
61	M	59341746X02	deska stropní plná PZD 900x290x90mm	kus	-149,000	343,84	-51 232,16	
	VV		204+95 "SD4		149,000			
62	M	59341218X01	deska stropní plná PZD 1090x290x90mm	kus	-3,000	361,76	-1 085,28	
	VV		6 "SD5		3,000			
64	M	59341219X01	deska stropní plná PZD 1550x290x90mm	kus	-10,000	497,28	-4 972,80	
	VV		20 "SD1		10,000			
65	M	59341219X02	deska stropní plná PZD 1600x290x90mm	kus	-118,000	629,44	-74 273,92	
	VV		144+93 "SD3		118,500			
66	M	59341220X01	deska stropní plná PZD 1800x290x90mm	kus	-3,000	629,44	-1 888,32	
	VV		6 "SD7		3,000			
68	M	59341221X01	deska stropní plná PZD 1900x300x90mm	kus	-6,000	729,12	-4 374,72	
	VV		12 "SD6		6,000			
69	M	59341123X01	deska stropní plná PZD 2300x290x90mm	kus	-9,000	932,96	-8 396,64	
	VV		18 "SD8		9,000			
71	M	59341727	deska stropní vylehčená PZD 3290x290x140mm, 3kN/m2	kus	-10,000	1 422,40	-14 224,00	CS ÚRS 2023 02

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 05
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	12.08.2024	
Předmět změny:	Energokanál v objektu SO 01 (ubourání)	
Stanovisko projektanta stavby:		
AD souhlasí se změnou řešení. Jedná se o stav zjištěný při výstavbě, poloha a výškové umístění kanálů neodpovídalo původním podkladům ani provedeným průzkumům v přístupných částech kanálu.		
		

Příloha ZL.č.05 – fotodokumentace





ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	12.08.2024	
Předmět změny:	Záměna podlahy v kanceláři školníka č. 1.22 v objektu SO 01	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala v kanceláři školníka č. 1.22 s provedením nášlapné vrstvy ze zátěžového koberce. Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele, prostřednictvím investora, bylo rozhodnuto o provedení keramické dlažby na místo plánovaného zátěžového koberce v kanceláři školníka č. 1.22. Důvodem je snadná údržba keramické podlahy při propojení s místností dílny školníka č. 1.23, kde je keramická dlažba plánovaná. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 26.181,95 Kč	(+) 39.047,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 12.865,12 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 13.9.2024	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum:	
	12.9.2024	

ZL.č.06 - Záměna podlahy v m.č. 1.22

Stavba: 656823 - ZUŠ Střezina - II. etapa - fázování (zadání)
Objekt: Architek...

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 29. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 12 865,12

771 Podlahy z dlaždic 39 047,07

446	R	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	19,238	8,96	172,37
447	R	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	19,238	28,00	538,66
448	R	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	19,238	100,00	1 923,80
449	R	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	7,344	168,00	1 233,79
450	590	59054165X01	profil dilatační objektový, podlahový, materiál nerezová ocel	m	8,250	616,00	5 082,00
453	R	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	19,200	212,80	4 085,76
454	597	59761009X01	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x100mm	kus	35,000	168,00	5 880,00
456	R	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	19,238	618,00	11 889,08
457	597	59761008X01	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká matná do interiéru i exteriéru 600x600mm kladeno na stříh, protiskluznost R10/A	m2	22,600	356,16	8 049,22
462	R	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	19,238	10,00	192,38


776 Podlahy povlakové -26 181,95



464	R	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	-19,238	39,20	-754,13
465	R	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-19,238	11,20	-215,47
466	R	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	-19,238	28,00	-538,66
467	R	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-19,238	84,00	-1 615,99
469	R	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	-19,238	202,80	-3 901,47
6,75*2,85 "1.22					19,238		
471	697	69751014X01	koberec zátěžový výška vlasu 5mm, podložka rubu AB, celková gramáž 2340g/m3, zátěž 33	m2	-21,161	459,20	-9 717,13
19,238*1,1					21,161		
Součet					21,161		
473	R	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-19,200	88,48	-1 698,82
(6,75+2,85+6,75)+2,85 "1.22					19,200		
474	697	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m	-19,200	89,60	-1 720,32
475	R	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	-7,200	168,00	-1 209,60
9*0,8 "viz Z07 - D.1.1.1.22					7,200		
Součet					7,200		
476	553	55343124X01	profil přechodový Al vrtaný 30mm	m	-7,344	336,00	-2 467,58

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
477	R	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	-19,200	112,00	-2 150,40
478	R	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	-19,238	10,00	-192,38

Celkem bez DPH

12 865,12

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 06
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	12.08.2024	
Předmět změny:	Záměna podlahy v kanceláři školníka č. 1.22 v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
AD souhlasí se změnou řešení. Jedná se o dodatečný požadavek investora související s řešením interiéru.		
		

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 07
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	12.08.2024	
Předmět změny:	Bezpečnostní střešní přepady v objektu SO 01	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s provedením 28 ks bezpečnostních střešních přepadů.		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě předložené výrobní dokumentace byl upřesněn počet bezpečnostních střešních přepadů, který je pro daný stavební objekt dostatečný.		
Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. - výrobní dokumentace		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 81.536,00 Kč	(+) 29.120,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(-) 52.416,00 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 12.9.2024	Datum: 17.9.2024	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 12.9.2024	

ZL.č.7 - odpočet střešních přepadů

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum:


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-52 416,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-52 416,00
D	712		Povlakové krytiny				-52 416,00
257	K	712998202X01	Provedení povlakové krytiny střech - montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN150	kus	-28,000	896,00	-25 088,00
PP			Provedení povlakové krytiny střech - montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN150				
VV			28 "viz Z03 - D.1.1.1.22		28,000		
VV			Součet		28,000		
257	K	712998202X01	Provedení povlakové krytiny střech - montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN150	kus	10,000	896,00	8 960,00
PP			Provedení povlakové krytiny střech - montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN150				
VV			8ks - střecha ředitel		8,000		
VV			2ks - střecha krček		2,000		
VV			Součet		10,000		
258	M	28342773X01	přepad bezpečnostní atikový DN 150 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	-28,000	2 016,00	-56 448,00
PP			přepad bezpečnostní atikový DN 150 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P				
VV			28 "viz položka 712998202X01		28,000		
VV			Součet		28,000		
258	M	28342773X01	přepad bezpečnostní atikový DN 150 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	10,000	2 016,00	20 160,00
PP			přepad bezpečnostní atikový DN 150 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P				
VV			8ks - střecha ředitel		8,000		
VV			2ks - střecha krček		2,000		
VV			Součet		10,000		
Celkem bez DPH							-52 416,00

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 07
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	12.08.2024	
Předmět změny:	Bezpečnostní střešní přepady v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
AD souhlasí se změnou řešení. Po ověření potřebných průtočných profilů byl větší počet přepadů nahrazen menším počtem při respektování požadavku na kapacitu přepadů.		
		

střecha 2

střecha 1

střecha 4

střecha 3

střecha 5

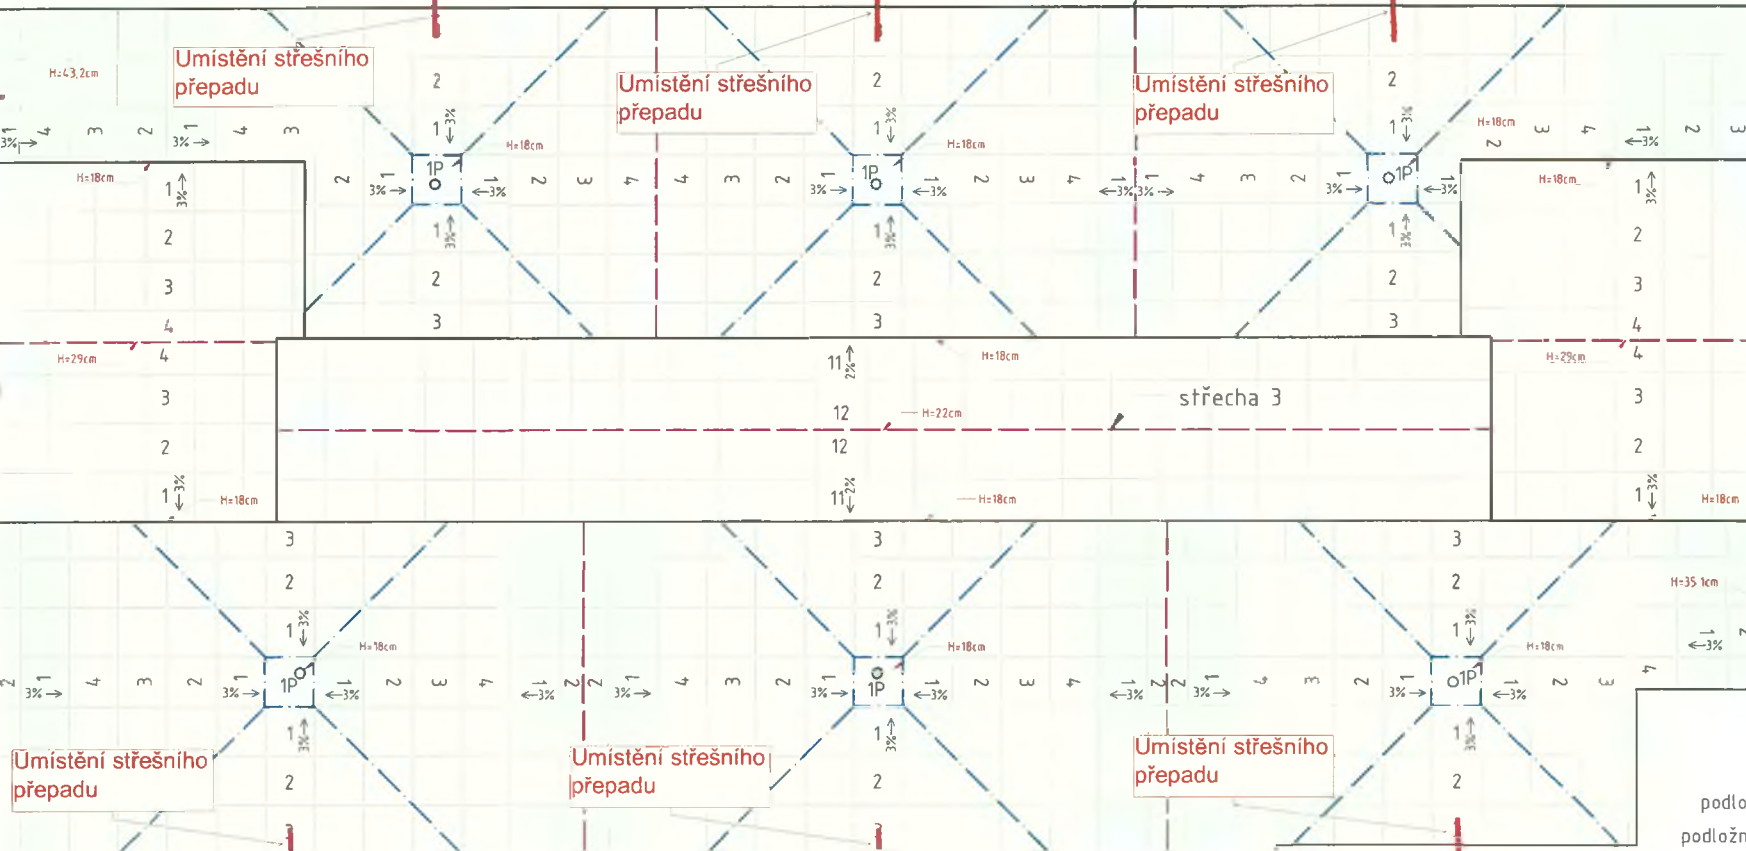
střecha 6

střecha 1-6

doporučená skladba (směrem od podkladu)



1. vrstva EPS70 základní izolace 16cm
2. vrstva EPS100 spádové klíny + EPS70 podložné desky

Prosím, před objednáním závazně zkontrolovat!



POZICE	ROZSAH SPÁDU / DRUH	SPÁD	ŠÍŘKA	DÉLKA
v plánu	od-do (mm)	%	mm	mm
1	20-50	3,00	1 000	1 000
2	50-80	3,00	1 000	1 000
3	80-110	3,00	1 000	1 000
4	110-140	3,00	1 000	1 000
11	20-40	2,00	1 000	1 000
12	40-60	2,00	1 000	1 000

Zakázka	Dodavatel:	Odběratel:
	Styrotrade	Coleman S.I., a.s.
	Akce:	Místo:
	ZUŠ Střezina	Hradec Králové
Datum:	Číslo zakázky:	
	3.7.2024 S3891 neu	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	12.08.2024	
Předmět změny:	Areálový vodovod pro objekt SO 01	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s výměnou areálových vodovodních přípojek pro objekt SO 01.		
Popis a zdůvodnění změny: Po zahájení stavebních prací a odkrytí stávajících areálových vodovodních přípojek vedoucích do objektu SO 01 bylo zjištěno, že přípojky jsou ve výborném technickém stavu. Z tohoto důvodu není nutné přípojky vyměňovat.		
Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. - půdorys přípojek		
Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 26.246,32,00 Kč	(+) 0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(-) 26.246,32 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 12.9.2024	Datum: 12.9.2024	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum: 12.9.2024	Datum: 12.9.2024	

ZL.č.08 - odpočet vodovodní přípojky

Stavba: 656823 - ZUŠ Střezina - II. etapa - fázování (zadání)

Objekt: Zdravotechnika

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-4 815,86

1

Zemní práce

-4 815,86

3	R	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-5,100	300,00	-1 530,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

(5,00-0,50*2)*1,50*0,85 "vodovod 5,100

Součet -5,100

5	R	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-15,000	1,00	-15,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

kanalizace

5,00*1,50*2 "vodovod 15,000

Součet 15,000

6	R	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-15,000	1,00	-15,00
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

8	R	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdňením kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	-5,100	127,00	-647,70
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

9	R	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-5,100	46,20	-235,62
---	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

15	R	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	-1,059	240,00	-254,16
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

2,00*3,14*0,0315*0,0315-2,00*3,14*0,025*0,025

"vodovod 1,059

Součet -1,059

16	583	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	-1,800	297,00	-534,60
----	-----	----------	-----------------------	---	--------	--------	---------

-1,800

Součet -1,800

19	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	-1,059	300,00	-317,70
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

2,00*3,14*0,0315*0,0315-2,00*3,14*0,025*0,025

"vodovod 1,059

Součet 1,059

20	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	-1,503	228,00	-342,68
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

2,50*3,14*0,0315*0,0315-2,50*3,14*0,025*0,02

"vodovod 1,503

Součet 1,503

21	583	58337302	Štěrkopísek frakce 0/16	t	-2,700	342,00	-923,40
----	-----	----------	-------------------------	---	--------	--------	---------

(52,451+3,104)*1,70

-2,700

ZL.č.08 - odpočet vodovodní přípojky

Stavba: 656823 - ZUŠ Střezina - II. etapa - fázování (zadání)

Objekt: Zdravotechnika

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

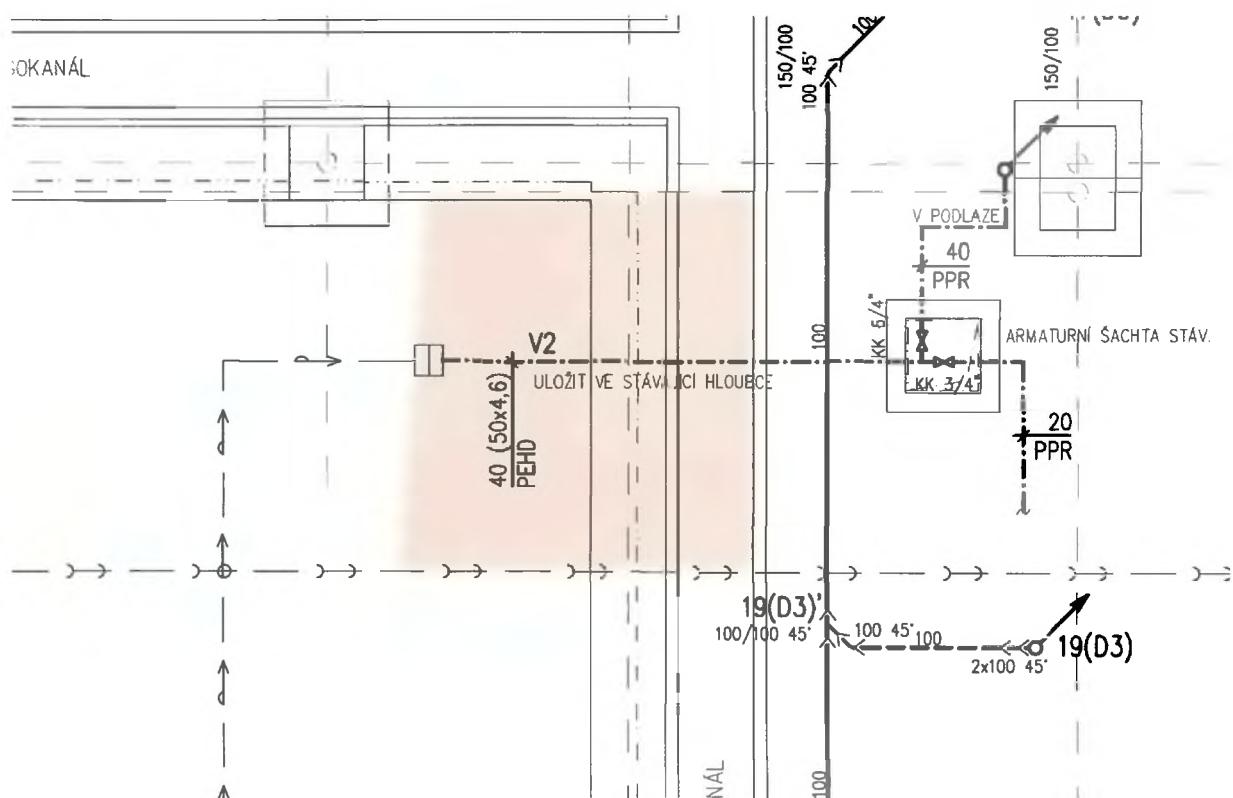
Datum: 25. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					2,700		
PSV Práce a dodávky PSV							-21 430,46
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							-21 430,46
80	R	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do O 50 mm	m	-9,000	11,25	-101,25
			9,00 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.02		9,000		
			Součet		9,000		
81	R	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 50 do O 110 mm	m	-8,000	18,75	-150,00
			8,00 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.02		8,000		
			Součet		8,000		
91	R	722176116	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m	-8,000	190,42	-1 523,36
			8,00 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.10 a D.1.1.4.1.12		8,000		
			Součet		8,000		
92	286	28613822	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 50x4,6mm	m	-8,120	273,00	-2 216,76
			8,000*1,015		8,120		
			Součet		8,120		
93	R	722176117	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 63 mm	m	-7,000	221,81	-1 552,67
			7,00 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.10 a D.1.1.4.1.12		7,000		
			Součet		7,000		
94	286	28613823	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 63x5,8mm	m	-7,105	368,25	-2 616,42
			7,000*1,015		7,105		
			Součet		7,105		
103	R	7221912X19	Napojení nového potrubí (PEHD) na stávající zemní šoupátko včetně potřebného materiálu	soubor	-2,000	6 500,00	-13 000,00
			2 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.10 až D.1.1.4.1.12		2,000		
			Součet		2,000		
122	R	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-8,000	18,00	-144,00
123	R	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	-7,000	18,00	-126,00
			7,00		7,000		
			Součet		7,000		

Celkem

-26 246,32

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 08
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	12.08.2024	
Předmět změny:	Areálový vodovod pro objekt SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
AD souhlasí se změnou řešení.		
		



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	12.08.2024	
Předmět změny:	Změna dveří za okno v bufetu v objektu SO 01	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s osazením fasádních dveří ve skleněné stěně v bufetu v objektu SO 01 směrem do dvora. Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele, prostřednictvím investora, dojde ke změně fasádních dveří v prosklené stěně v bufetu v objektu SO 01 za okno směrem do dvora. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 9.503,70 Kč	(+) 5.540,43 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(-) 3.963,27 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 13.9.2024	Datum: 12.9.2024	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 12.9.2024	

ZL.č.09 - změna fasádních dveří do bufetu Z07

Stavba:

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum:

Zadavatel:


Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-3 963,27
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 193,20
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 475,81
38	K	310271081	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárnic do P2	m2	0,600	2 459,69	1 475,81
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					717,39
108	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	0,600	338,40	203,04
PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn						
123	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	0,600	924,00	554,40
PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm						
125	M	28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	0,600	548,80	329,28
PP	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm						
126	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	-1,200	349,44	-419,33
PP	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm						
128	M	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl 30mm	m2	-0,480	131,04	-62,90
PP	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl 30mm						
129	K	622241301X03	Příplatek k montáži kontaktního zateplení montáž a dodání všech systémových doplňkových prvků, lišt a příslušenství zateplovacího systému nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce	m2	0,600	188,16	112,90
PP	Příplatek k montáži kontaktního zateplení montáž a dodání všech systémových doplňkových prvků, lišt a příslušenství zateplovacího systému nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce						
VV	446,897 "viz položka 622211031					446,897	
VV	Součet					446,897	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-6 156,47
D	766	Konstrukce truhlářské					936,36
383	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	1,000	197,16	197,16
PP	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm						
385	M	60794103X01	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 280mm	m	1,100	672,00	739,20
PP	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 280mm						
D	767	Konstrukce zámečnické					-9 021,47
406	K	767113150	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 16 m2	m2	-0,600	452,45	-271,47
PP	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 16 m2						
VV	13,1*1,9 "viz D03/1					24,890	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		13,1*1,9 "viz D03/2		24,890		
	VV		9,85*1,9 "viz D04/1		18,715		
	VV		8*1,9+1,8*2,45+0,28*1,9 "viz D04/2		20,142		
	VV		2*1,91*2,5+5*1,9+1*2,5+0,85*1,9 "viz D07		23,165		
	VV		viz D.1.1.1.19				
	VV		Součet		111,802		
411	M	55341336X06	sloupkopřičková fasáda s dvěma jednokřídlými dveřmi, systémová prosklená fasáda s otočnými dveřmi a s převážně neotvíravými výplněmi + 2 sklopné, 2000x1900+1000x2500+5000x1900+1000x2500+850x1900mm, nosná konstrukce fasády je tvořena obdelnikovými víceko	kus	1,000	-8 750,00	-8 750,00
	VV		odpočet za dveře háhrada Fixní okno				
	VV		Součet				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 928,64
494	K	781734111	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	0,600	2 352,00	1 411,20
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2				
	VV		0,6		0,600		
	VV		viz D.1.1.1.17				
	VV		Součet		0,600		
495	M	59623112	pásek obkladový cihlový hladký 280x65x14mm červený	kus	33,000	15,68	517,44
	PP		pásek obkladový cihlový hladký 280x65x14mm červený				
Celkem bez DPH							-3 963,27

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 09
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	12.08.2024	
Předmět změny:	Změna dveří za okno v bufetu v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby:		
AD souhlasí se změnou řešení. Jedná se o dodatečný požadavek uživatele na změnu umístění dveří.		
		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	03.09.2024	
Předmět změny:	Změna tloušťky fasádního izolantu v objektu SO 01 (venkovní žaluzie)	
Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace počítala s umístěním venkovních žaluzií v objektu SO 01 v kastlíku ve fasádním izolantu tl. 140 mm. Popis a zdůvodnění změny: Dodavatel žaluzií upozornil, že požadované žaluzie není možné schovat do kastlíku tl. 140 mm bez vytvoření tepelného mostu (nebylo by možné provést kastlík v provedení „zateplený“). Z tohoto důvodu (a vzhledem k situaci, že není možné provést zateplení obdobně jako v objektu SO 05 a SO 06, kde došlo k zateplení vnitřního průvlaku), bylo rozhodnuto o změně tloušťky fasádního izolantu stěn, kde jsou žaluzie umístěny nově na izolant tl. 160 mm. Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 60.375,84 Kč	(+) 69.847,89 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 9.472,05 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 13.9.2024	Datum: 12.9.2024	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum:	Datum: 12.9.2024	

ZL.č.10 - záměna polystyrenu na 160mm jižní a západní strana

Stavba:

Objekt:

SO 01 D.1.1.1. - Architek...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 472,05

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					9 472,05
124	M	28376042	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 140mm	m2	-110,700	352,80	-39 054,96
PP		deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 140mm					
124a	M	28376044	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 160mm	m2	110,700	403,20	44 634,24
PP		deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 160mm					
125	M	28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	-38,850	548,80	-21 320,88
PP		deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 140mm					
125a	M	28376447	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	38,850	649,00	25 213,65
PP		deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 160mm					

Celková cena bez DPH

9 472,05

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 10
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	03.09.2024	
Předmět změny:	Změna tloušťky fasádního izolantu v objektu SO 01 (venkovní žaluzie)	
Stanovisko projektanta stavby:		
AD souhlasí se změnou řešení. Změnový list řeší koordinaci vybraného dodavatele žaluzií a stavební připravenost pro umístění žaluzií s eliminací tepelných mostů.		
