

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/11816 Višňová, oprava povrchu

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice III/11816

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
SO 121 / 2Číslo ZBV:
11

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: „BES+MI - MÚK Dobříš - Višňová“
Sukova 625, 25601 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.3	-288 347,24	0,00	-288 347,24

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.4	-151 905,84	0,00	-151 905,84

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11	-440 253,08	0,00	-440 253,08

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																							
Název stavby dle SoD III/11816 Višňová, oprava povrchu Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Silnice III/11816	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 121 / 2	Číslo ZBV / Skupina změny: 11.3																					
Strany smlouvy o dílo č. S-1572/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: „BES+MI - MÚK Dobříš - Višňová" se sídlem Sukova 625, 25601 Benešov																							
Přílohy změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupiny</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	4	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupiny	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	24	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																					
2. Změnový list	4	počet listů																					
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																					
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																					
5. Přehled zařazení změn do skupiny	1	počet listů																					
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																					
Další doklady dle přehledu dokladů	24	počet listů																					
Iniciátor změny: Zhotovitel																							
Předmět Změny: Závěrečné ZBV																							
Popis a zdůvodnění Změny: Tato Změna během výstavby popisuje dílčí změny nastalé v rámci stavebního objektu (dále jen „SO“) 121 - Silnice III/11816. Dílčí změna č. 1 - recyklace V rámci ZBV 04 došlo k provedení zlepšení zemin in-situ v souladu s Technickými podmínkami TP 94. Díky této úpravě při recyklaci nedochází k odkopům, odvozům materiálu na skládku, doplnění štěrkodrti a úpravám pláně, což má vliv na snížení množství u položek č. 014102, 11372, 125738, 18110 a 56336. Vzhledem k provedení zlepšení zemin in-situ a změně výšky nivelety nevznikla potřeba vegetačních úprav a dochází tak ke kompletnímu odpočtu položek č. 11130, 18241 a 18247 Celková cena dílčí změny č. 1 je -124 838,95 Kč. Dílčí změna č. 2 - sanace propustku Původní řešení PDPS předpokládalo v rámci SO 121 sanaci čela propustu. Na základě obhlídky stavby byl zjištěn vyhovující stav daného propustu, tudíž nebylo nutné provádět položky č. 12931 a 9185D2. Bylo také sníženo množství u položky č. 11318.R. Celková cena dílčí změny č. 2 činí -142 774,91 Kč. Dílčí změna č. 3 - odvodnění silnice Původní řešení PDPS počítalo s případnou výměnou litinových poklopů a mříží u uličních vpustí. Na základě skutečně zjištěného stavu dochází ke snížení množství u položky č. 89911G, u které bylo zastiženo menší množství pro obnovu, než předpokládala PDPS a u položky č. 899121, kterou nebylo nutné čerpat z důvodu dobrého stavu mříží. Celková cena dílčí změny č. 3 činí -18 529,18 Kč. Dílčí změna č. 4 - spáry Oproti původnímu předpokladu Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) došlo ke snížení etapizací a bylo tak možné provádět část prací s plnou dopravní uzavírkou. V tomto případě tak byly nasazeny 2 finišery, díky čemuž nevznikla středová spára a nebylo zapotřebí plně využít položky č. 58910 a 919111, které byly na základě skutečně zaměřeného množství poníženy. Celková cena dílčí změny č. 4 činí -2 204,20 Kč. Zhotovitel vše oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 7“ ze dne 05.06.2024 (příloha č. 8). Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje k této změně vydala dne 10.06.2024 Výzvu zhotoviteli ke změně rozsahu díla, která slouží zároveň jako Pokyn k provedení změny (příloha č. 9). Tyto dílčí změny Zhotovitel ani Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť byly zjistitelné až v průběhu provádění stavebních prací. Jedná se o Změny nepodstatné, které jsou tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změny nepředvídatelné.																							

Změnový list											
Název stavby dle SoD III/11816 Višňová, oprava povrchu Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Silnice III/11816		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 121 / 2	Číslo ZBV / Skupina změny: 11.3								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-288 347,24</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-288 347,24</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">288 347,24</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných	-288 347,24	0,00	-288 347,24	288 347,24
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných								
-288 347,24	0,00	-288 347,24	288 347,24								
Technická pomoc Objednatele jméno Jan Dvořák podpis											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Roman Wilkonský podpis											
Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Šárka Veselá podpis											
Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis											
Zástupce Objednatele jméno Jiří Brzoň podpis											
Stavební dozor jméno Ing. Miroslav Bureš podpis											
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis											
Zhotovitel jméno Ing. Jan Freudl podpis											

Změnový list																							
Název stavby dle SoD III/11816 Višňová, oprava povrchu Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Silnice III/11816	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 121 / 2	Číslo ZBV / Skupina změny: 11.4																					
Strany smlouvy o dílo č. S-1572/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: „BES+MI - MÚK Dobříš - Višňová" se sídlem Sukova 625, 25601 Benešov																							
<u>Přílohy změnového listu:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;"><u>24</u></td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	4	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	<u>24</u>	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																					
2. Změnový list	4	počet listů																					
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																					
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																					
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																					
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																					
Další doklady dle přehledu dokladů	<u>24</u>	počet listů																					
Iniciátor změny: Zhotovitel																							
Předmět Změny: Závěrečné ZBV																							
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Tato změna během výstavby narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto stavebním objektu. Jedná se o zjištění skutečně provedeného množství u položek č. 572113, 572213 a 574E56. Celková hodnota této změny tak činí -151 905,84 Kč. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno d) resp. čl. 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.																							

Změnový list											
Název stavby dle SoD III/11816 Višňová, oprava povrchu Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Silnice III/11816		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 121 / 2	Číslo ZBV / Skupina změny: 11.4								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-151 905,84</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-151 905,84</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">151 905,84</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných	-151 905,84	0,00	-151 905,84	151 905,84
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných								
-151 905,84	0,00	-151 905,84	151 905,84								
Technická pomoc Objednatele jméno Jan Dvořák podpis											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Roman Wilkonský podpis											
Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Šárka Veselá podpis											
Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis											
Zástupce Objednatele jméno Jiří Brzoň podpis											
Stavební dozor jméno Ing. Miroslav Bureš podpis											
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis											
Zhotovitel jméno Ing. Jan Freudl podpis											

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11

Název stavby:

III/11816 Víšňová, oprava povrchu

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 121 / 2

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Silnice III/11816

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 693 503,81

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	231 913,85	1 925 417,66	231 913,85

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-440 253,08	0,00	231 913,85	13,69

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-440 253,08	1 485 164,58	-208 339,23	-12,30

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/11816 Višňová, oprava povrchu Číslo a název SO/PS: SO 121 - Silnice III/11816 Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 2 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	114,210	-40,224	-154,434	123,73	14 131,20	-19 108,12	---	-4 976,92	-19 108,12	-135,22
3	11130	SEJMUTÍ DRNU	m2	232,000	0,000	-232,000	49,01	11 370,32	-11 370,32	---	0,00	-11 370,32	-100,00
4	11318.R	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH SJEZDŮ VČETNĚ PROPUSTKŮ	m2	346,000	100,000	-246,000	476,32	164 806,72	-117 174,72	---	47 632,00	-117 174,72	-71,10
5	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	207,500	202,000	-5,500	449,33	93 235,98	-2 471,32	---	90 764,66	-2 471,32	-2,65
8	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	46,250	0,000	-46,250	32,77	1 515,61	-1 515,61	---	0,00	-1 515,61	-100,00
10	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	m	50,000	0,000	-50,000	66,85	3 342,50	-3 342,50	---	0,00	-3 342,50	-100,00
11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	774,000	100,000	-674,000	10,21	7 902,54	-6 881,54	---	1 021,00	-6 881,54	-87,08
14	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	462,500	0,000	-462,500	16,70	7 723,75	-7 723,75	---	0,00	-7 723,75	-100,00
15	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	m2	462,500	0,000	-462,500	4,43	2 048,88	-2 048,88	---	0,00	-2 048,88	-100,00
16	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	m2	340,000	43,950	-296,050	249,01	84 663,40	-73 719,41	---	10 943,99	-73 719,41	-87,07
22	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	660,000	125,000	-535,000	2,06	1 359,60	-1 102,10	---	257,50	-1 102,10	-81,06
24	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400	kus	7,000	6,000	-1,000	4 835,94	33 851,58	-4 835,94	---	29 015,64	-4 835,94	-14,29
25	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNĚ	kus	2,000	0,000	-2,000	6 846,62	13 693,24	-13 693,24	---	0,00	-13 693,24	-100,00
26	9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	kus	1,000	0,000	-1,000	22 257,69	22 257,69	-22 257,69	---	0,00	-22 257,69	-100,00
27	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	660,000	125,000	-535,000	2,06	1 359,60	-1 102,10	---	257,50	-1 102,10	-81,06
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						463 262,61	-288 347,24	0,00	174 915,37	-288 347,24	-62,24

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Miroslav Bureš, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/11816 Višňová, oprava povrchu Číslo a název SO/PS: SO 121 - Silnice III/11816 Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 2					
								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	2 409,600	2 183,165	-226,435	20,54	49 493,18	-4 650,97	- - -	44 842,21	-4 650,97	-9,40
19	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	2 759,850	2 385,700	-374,150	18,60	51 333,21	-6 959,19	- - -	44 374,02	-6 959,19	-13,56
21	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	m2	2 779,750	2 176,120	-603,630	232,42	646 069,50	-140 295,68	- - -	505 773,82	-140 295,68	-21,72
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						746 895,89	-151 905,84	0,00	594 990,05	-151 905,84	-20,34

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Miroslav Bureš, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

<

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	11
Název stavby:	III/11816 Višňová, oprava povrchu
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/11816
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 121 / 2

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	11 / 11
8. Ohlášení změn stavby č. 7 ze dne 05.06.2024	2 / 22
9. Výzva Zhotoviteli ke změně rozsahu díla ze dne 10.06.2024	1 / 24
10. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 12.12.2023 k doměrkům	1 / 25
11. Vyjádření Technického dozoru stavebníka k ZBV 11	1 / 26
12. Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 3/2023	2 / 27
13. Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 7/2023	2 / 29
14. Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 8/2023	2 / 31
15. Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 9/2023	2 / 33
Počet listů celkem	24

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: 2011 - III/11816 Višňová, oprava povrchu

NÁZEV SO: SO 121 - Silnice III/11816

CENA SO (ZE SMLOUVY): 1 693 503,81 Kč

CENA VŠECH ZBV: -208 339,23 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 1 485 164,58 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 121 - Silnice III/11816

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	114,210	123,73 Kč	14 131,20 Kč
doplňující popis		zemina, kamen, nestmelené vrstvy (recyklační středisko / skládka, dle dispozic zhotovitele)				
výkaz výměr		dle pol. 11130: 232*0,1*1,8=41,760 [A] dle pol. 12924: 185*0,15*1,8=49,950 [B] dle pol. 12931: 50*0,25*1,8=22,500 [C] Celkem: A+B+C=114,210 [D] Celkem 114,21 = 114,210 => A				
ZBV: 06				90,174		11 157,23 Kč
výkaz výměr						
ZBV: 11				-154,434		-19 108,12 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				49,950		6 180,31 Kč
2	014212	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	T	83,250	30,93 Kč	2 574,92 Kč
doplňující popis		pořízení zeminy schopné zúrodnění				
výkaz výměr		ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 370*1,25*0,1*1,8=83,250 [A] Celkem 83,25 = 83,250 => A				
technická specifikace						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				83,250		2 574,92 Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce						8 755,23 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1 - Zemní práce						
3	11130	SEJMUTÍ DRNU	m2	232,000	49,01 Kč	11 370,32 Kč
doplňující popis		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		sejmutí drnu / ornice tl. cca 0,1m ((370)/2*1,25): 232=232,000 [A] Celkem 232 = 232,000 => A				
ZBV: 11				-232,000		-11 370,32 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						

CELKEM:				0,000		0,00 Kč
4	11318	R ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH SJEZDŮ VČETNĚ PROPUSTKŮ	m2	346,000	476,32 Kč	164 806,72 Kč
doplňující popis		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele, vč. poplatku za skládku POZN.: Pro nízký poměr položky k celkové hodnotě stavby vykázáno jako agregovaná položka smíšených konstrukcí (bez propustku, s propustkem, s různými typy povrchu). Součástí položky je i separace odpadů a jejich skládkování dle platných norem.				
výkaz výměr		Odstranění konstrukce - - čela propustku a zeminy potřebné pro založení nového čela propustku v hloubce max. 1,0m, (1ks)): 6=6,000 [A] - konstrukce sjezdu s asfaltovým krytem (170*2): 340=340,000 [B] Celkem: A+B=346,000 [C] Celkem 346 = 346,000 => A				
ZBV: 11				-246,000		-117 174,72 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						

CELKEM:				100,000		47 632,00 Kč
64	113347	N ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	0,000	1 696,50 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
ZBV:	06			45,087		76 490,10 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
CELKEM:				45,087		76 490,10 Kč
5	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	207,500	449,33 Kč	93 235,98 Kč
doplňující popis		Povinný odkup vyfrézované směsi zhotovitelem dle SOD! POZN.: Vrchní vrstva stávající živice tl. cca 100mm dle provedených zkoušek (PAU) v kvalitativní třídě ZAS-T1. Část z tohoto vyfrézovaného materiálu bude následně použita pro provedení krajnic vč. dosypávky krajnic (R-mat). Z tohoto důvodu je požadováno provést frézu (min. danou část pro krajnice) ve frakci do vel. 32mm (0/32).				
výkaz výměr		frézování vozovky tl. průměrně 100mm v celé šíři vozovky: 2020*0,1=202,000 [A] v místě lokální sanace dofrézování stávající asfaltové konstrukce (případně odstranění podkladní vrstvy vozovky) tl. 60mm: 400*0,06=24,000 [B] Odpočet materiálu pro zpětné uložení do stavby: -185*0,1=-18,500 [C] Celkem: A+B+C=207,500 [D] Celkem 207,5 = 207,500 => A				
ZBV:	11			-5,500		-2 471,32 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				202,000		90 764,66 Kč
6	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	18,500	516,31 Kč	9 551,74 Kč
doplňující popis		vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: viz pol. 11372 - Část vyfrézovaného materiálu (výpočet dle této položky) bude následně použita pro provedení krajnic. Z tohoto důvodu je požadováno provést frézu (min. danou část pro krajnice) ve frakci do vel. 32mm (0/32).				
výkaz výměr		Materiálu pro zpětné uložení do stavby (zpevnění zemní krajnice (recyklát) tl. 0,10m): 185*0,1=18,500 [A] Celkem 18,5 = 18,500 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				18,500		9 551,74 Kč
7	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	18,500	171,91 Kč	3 180,34 Kč
doplňující popis		vč. naložení a dovozu materiálu (R-mat) z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně				
výkaz výměr		Materiál pro zpětné uložení do stavby (dle pol. 113724: 18,5=18,500 [A] Celkem 18,5 = 18,500 => A				
technická specifikace						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				18,500		3 180,34 Kč
8	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	46,250	32,77 Kč	1 515,61 Kč
doplňující popis		vč. naložení a dopravy zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně				
výkaz výměr		ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 370*1,25*0,1=46,250 [A] Celkem 46,25 = 46,250 => A				
ZBV: 11				-46,250		-1 515,61 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		-0,00 Kč
9	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	m2	185,000	40,11 Kč	7 420,35 Kč
doplňující popis		vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		Stržení krajnice v šířce cca 0,5m, prům tl. 0,15m: 370*0,5=185,000 [A] Celkem 185 = 185,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				185,000		7 420,35 Kč
10	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	m	50,000	66,85 Kč	3 342,50 Kč
doplňující popis		vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		pročištění příkopu příkopovým rypadlem: 50=50,000 [A] Celkem 50 = 50,000 => A				
ZBV: 11				-50,000		-3 342,50 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	774,000	10,21 Kč	7 902,54 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		dílčí plochy (sjezdy): 340*1,1=374,000 [A] doplnění konstrukce v místě lokální sanace, předpoklad 60%: 400=400,000 [B]				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		Celkem: A+B=774,000 [C] Celkem 774 = 774,000 => A				
ZBV:	11			-674,000		-6 881,54 Kč
		výkaz výměr				
		technická specifikace				
CELKEM:				100,000		1 021,00 Kč
12	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	m2	462,500	4,59 Kč	2 122,88 Kč
		doplňující popis				
		výkaz výměr				
		ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 370*1,25=462,500 [A] Celkem 462,5 = 462,500 => A				
		technická specifikace				
CELKEM:				462,500		2 122,88 Kč
13	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	m2	462,500	24,33 Kč	11 252,62 Kč
		doplňující popis				
		výkaz výměr				
		ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 370*1,25=462,500 [A] Celkem 462,5 = 462,500 => A				
		technická specifikace				
CELKEM:				462,500		11 252,63 Kč
14	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	462,500	16,70 Kč	7 723,75 Kč
		doplňující popis				
		výkaz výměr				
		ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 370*1,25=462,500 [A] Celkem 462,5 = 462,500 => A				
ZBV:	11			-462,500		-7 723,75 Kč
		výkaz výměr				
		technická specifikace				
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
15	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	m2	462,500	4,43 Kč	2 048,88 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis						
výkaz výměr		ohumusování tl. 100mm a osetí travním semenem, údržba: 370*1,25=462,500 [A] Celkem 462,5 = 462,500 => A				
ZBV: 11				-462,500		-2 048,88 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,01 Kč
1 - Zemní práce						249 435,70 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5 - Komunikace						
63	561441	N KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM	m2	0,000	492,47 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 06				141,360		69 615,56 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
CELKEM:				141,360		69 615,56 Kč
16	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	m2	340,000	249,01 Kč	84 663,40 Kč
doplňující popis		ŠDA ; tl. (min) 250mm				
výkaz výměr		obnova konstrukce sjezdu na pole s asfaltovým krytem celkové tl. konstrukce 350mm: 340=340,000 [A] Celkem 340 = 340,000 => A				
ZBV: 06				56,050		13 957,01 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
ZBV: 11				-296,050		-73 719,41 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				100,000		24 901,00 Kč
17	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2	185,000	88,35 Kč	16 344,75 Kč
doplňující popis		výzisk ze stavby - viz. pol. 113724 a 125734.				
výkaz výměr		zpevnění zemní krajnice (recyklát) tl. 0,10m: 185=185,000 [A] Celkem 185 = 185,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				185,000		16 344,75 Kč
18	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	2 409,600	20,54 Kč	49 493,18 Kč
doplňující popis		PI-C ; 0,4 kg/m2 plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy (v extravilánu, mimo obruby) 4,0%				
výkaz výměr		konstrukce vozovky: 1990*1,04=2 069,600 [A] obnova konstrukce sjezdu na pole s asfaltovým krytem celkové tl. konstrukce 350mm: 340=340,000 [B] Celkem: A+B=2 409,600 [C] Celkem 2409,6 = 2409,600 => A				
ZBV: 11				-226,435		-4 650,97 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				2 183,165		44 842,21 Kč
19	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	2 759,850	18,60 Kč	51 333,21 Kč
doplňující popis		PS-C ; 0,3 kg/m2 plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy (v extravilánu, mimo obruby) 1,5%				
výkaz výměr		konstrukce vozovky: 1990*1,015=2 019,850 [A] přidání 1x vrstvy v místě lokálních oprav: 400=400,000 [B] obnova konstrukce sjezdu na pole s asfaltovým krytem celkové tl. konstrukce 350mm: 340=340,000 [C] Celkem: A+B+C=2 759,850 [D] Celkem 2759,85 = 2759,850 => A				
ZBV: 11				-374,150		-6 959,19 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				2 385,700		44 374,02 Kč
20	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	2 330,000	169,49 Kč	394 911,70 Kč
doplňující popis		ACO 11+ ; tl. 40mm				
výkaz výměr		konstrukce vozovky: 1990=1 990,000 [A] obnova konstrukce sjezdu na pole s asfaltovým krytem celkové tl. konstrukce 350mm: 340=340,000 [B] Celkem: A+B=2 330,000 [C] Celkem 2330 = 2330,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				2 330,000		394 911,70 Kč
21	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	m2	2 779,750	232,42 Kč	646 069,49 Kč
doplňující popis		ACP 16+ ; tl. 60mm plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy (v extravilánu, mimo obruby) 2,5%				
výkaz výměr		konstrukce vozovky: 1990*1,025=2 039,750 [A] přidání 1x vrstvy v místě lokálních oprav: 400=400,000 [B] obnova konstrukce sjezdu na pole s asfaltovým krytem celkové tl. konstrukce 350mm: 340=340,000 [C] Celkem: A+B+C=2 779,750 [D] Celkem 2779,75 = 2779,750 => A				
ZBV: 11				-603,630		-140 295,68 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				2 176,120		505 773,82 Kč
62	5774AE	N VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	0,000	9 218,40 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 06				6,584		60 693,95 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
CELKEM:				6,584		60 693,95 Kč
22	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	660,000	2,06 Kč	1 359,60 Kč
doplňující popis		Zálivky spar vč. ošetření				
výkaz výměr		Spáry při provádění pokládky asfaltových vrstev po polovinách a napojení na stávající stavby: (300+30)*2=660,000 [A] Celkem 660 = 660,000 => A				
ZBV: 11				-535,000		-1 102,10 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				125,000		257,50 Kč
5 - Komunikace						1 161 714,50 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
8 - Potrubí						
23	891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	kus	5,000	7 197,20 Kč	35 986,00 Kč
doplňující popis		Alternativní položka - obecně znak planovodu n. vodovodu demonťované šoupě vč. likvidace dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		uliční znak - šoupě (plynovod nebo vodovod), včetně výměny, osazení a dodávka: 5=5,000 [A] Celkem 5 = 5,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				5,000		35 986,00 Kč
24	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400	kus	7,000	4 835,94 Kč	33 851,58 Kč
doplňující popis		vč. příp. rektifikace, pročištění a likvidace odpadu demonťovaný poklop vč. likvidace dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		uliční vstup - velký poklop, včetně výměny poklopu, osazení a dodávka: 7=7,000 [A]				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
Celkem 7 = 7,000 => A						
ZBV:	11			-1,000		-4 835,94 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				6,000		29 015,64 Kč
25	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	kus	2,000	6 846,62 Kč	13 693,24 Kč
doplňující popis		vč. příp. rektifikace, pročištění a likvidace odpadu demonťovaná mříž vč. likvidace dle dispozic zhotovitele				
výkaz výměr		vtokový objekt - uliční vpust', včetně výměny mříže, osazení a dodávka: 2=2,000 [A] Celkem 2 = 2,000 => A				
ZBV:	11			-2,000		-13 693,24 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
8 - Potrubí						65 001,64 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
9 - Ostatní konstrukce a práce						
26	9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	kus	1,000	22 257,69 Kč	22 257,69 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		obnova čela propustku DN600, šikmé čelo, včetně úpravy napojení na troubu a doplnění zeminy (1ks ; 5m): 1=1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 => A				
ZBV:	11			-1,000		-22 257,69 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				0,000		0,00 Kč
27	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	660,000	2,06 Kč	1 359,60 Kč
doplňující popis		Prořezávky spar				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		Spáry při provádění pokládky asfaltových vrstev po polovinách a napojení na stávající stavy: $(300+30)*2=660,000$ [A] Celkem 660 = 660,000 => A				
ZBV:	11			-535,000		-1 102,10 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				125,000		257,50 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce						257,50 Kč

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 7

„III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu“

K rukám:

Jiří Brzoň – Vedoucí oblasti, KSÚS
 Ing. Jan Fidler, DiS – Statutární zástupce ředitele, KSÚS
 Ing. Roman Vitner – Technický dozor investora, IBH spol. s r.o.
 Ing. Petr Pešťál – Autorský dozor investora, Atelier PROMIKA s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu“
Název veřejné zakázky	„III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu“
Zhotovitel	Společnost „BES+MI – MÚK Dobříš – Višňová“ Správce: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 43792553 Společník: MI Roads a.s. Se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČO 17331099
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S-1572/00066001/2023
Číslo SoD zhotovitele	S 026/2021
Termín plnění	Dle SoD do 25 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	49 839 915,68 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku **nepředvídatelných okolností**. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Objekt SO 121 – Silnice III/00412
Důvody potřeby změny, popis problému	Zadavatel v rámci uveřejněné zadávací projektové dokumentace zpracované společností Pontex, spol. s r.o. se sídlem Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha, IČO 40763439 nezastihl potřebu zhotovení elastického mostního závěru v obci Obořiště <u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u> A. Dojde k dodání a montáži elastického mostního závěru. Tyto skutečnosti ZD nepředpokládala. Z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel nemohl předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Zároveň tímto ohlášením zhotovitel oznamuje že provede doměření skutečně provedených výměr jednotlivých položek a činností v následujících objektech: III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu SO 121 - Silnice III/00412 III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu SO 122 - Silnice III/11816 III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu VON - Vedlejší a ostatní náklady III/11816 Višňová, oprava povrchu SO 121 - Silnice III/11816 III/11816 Višňová, oprava povrchu VON - Vedlejší a ostatní náklady
Čeho se zhotovitel domáhá	Akceptace úprav a vydání Pokynu.
Vliv na termín plnění	NE
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R – SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.

V Benešově dne 05.06.2024

V Praze dne

Za zhotovitele

Za objednatele změnu potvrzuje


Ing. Jan Freudl
jedenatel
B E S s.r.o.

Počet listů: 2



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

BES s.r.o.
se sídlem: Sukova 625
256 01 Benešov
IČO: 43792553
DIČ: CZ43792553

Vaše spisová značka Naše spisová značka:
bez zn./05.06.2024

Vyřizuje :
Jiří Brzoň

V Benešově dne :
10.06.2024

Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla :
„III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu“,

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. **S-1572/00066001/2023**, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vašim Oznámením nepředvídatelné okolnosti ze dne 05.06.2024, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem :

- doměrky skutečně provedených výměr jednotlivých položek a činností v následujících objektech:
- III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu SO 121 – Silnice III/00412
- III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu SO 122 – Silnice III/11816
- III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu VON – Vedlejší a ostatní náklady
- III/11816 Višňová, oprava povrchu SO 121 – Silnice III/11816
- III/11816 Višňová, oprava povrchu VON – Vedlejší a ostatní náklady
- Montáž elastického mostního závěru

V Benešově 10.06.2024

Jiří Brzoň
Vedoucí oblasti Benešov

Vyřizuje
Šárka Veselá

Datum
12.12.2023

**Věc: Vyjádření autorského dozoru stavby „III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová“
k doměrkům stavby**

V zastoupení firmy PONTEX, spol. s r.o. jako autorský dozor souhlasíme s předloženými doměrkami, které zpřesňují výměry jednotlivých položek.

Jednotlivé doměrky jsou stanoveny na základě geodetického zaměření nebo dle skutečného čerpání položky se souhlasem objednatele.

Ing. Šárka Veselá
Atelier PROMIKA s.r.o.

Vyřizuje: Ing. Vitner Roman

V Kladně dne: 16.7.2024

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jiří Brzoň

Věc: Vyjádření TDI k ZBV 11

Stavba: „III/11816 Višnová, oprava povrchu“

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž došlo v průběhu provádění stavebních prací na této stavbě konstatuji následující:

1. Popis změn, jejich odůvodnění a navrhovaná řešení

Tato změna během výstavby narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na SO 121.

Jedná se o položky č. 014102, 11130, 11318, 11372, 125738, 12931, 18110, 18241, 18247, 56336, 572113, 572213, 574E56, 58910, 89911G, 899121, 9185D2 a 919111.

2. Stanovisko TDI

Jako TDI potvrzuji, že zaměření skutečného množství uvedených položek odpovídá skutečnosti.

za IBH spol. s r.o.
Ing. Roman Vitner

Stavba: III/11816 Višňová, Oprava povrchu

Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 3/2023

Název akce:	Plocha ACP a ACO – etapa 1
Datum měření:	31. srpna 2023
Projektová dokumentace:	-
Vytyčovací síť:	Základní vytyčovací síť stabilizovaná 08/23
Souřadnicový systém:	JTSK
Výškový systém:	Bpv
Použité přístroje:	Leica TS 16 v. č. 3262051
Přesnost měření:	$m_{xy} = \pm 30 \text{ mm}$
Zaměřil:	Petr Švec
Zpracoval:	Ing. Tomáš Lauer

Popis prací: Zaměření obvodu bylo provedeno metodou číselné tachymetrie s připojením na body ZVS. Body byly měřeny po obvodu AB vrstev. Výpočet plochy byl proveden v programu BricsCAD V14 Pro. Seznam souřadnic zaměřených bodů obvodu je uložen v archivu firmy a je k dispozici na vyžádání.

Plocha vrstvy ACP v etapě 1 = 12013m²

Plocha vrstvy ACO v etapě 1 = 11551m²

Přílohy:

1. Situace obvodu ACP a ACO


1xA4

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

Ověřil:	Ing. Jiří Bouček	Za BES s.r.o.	Převzal:
Číslo ověření:	1165/2023		
Datum ověření:	13. 9. 2023		Dne:



Plocha ACP a ACO v etapě 1

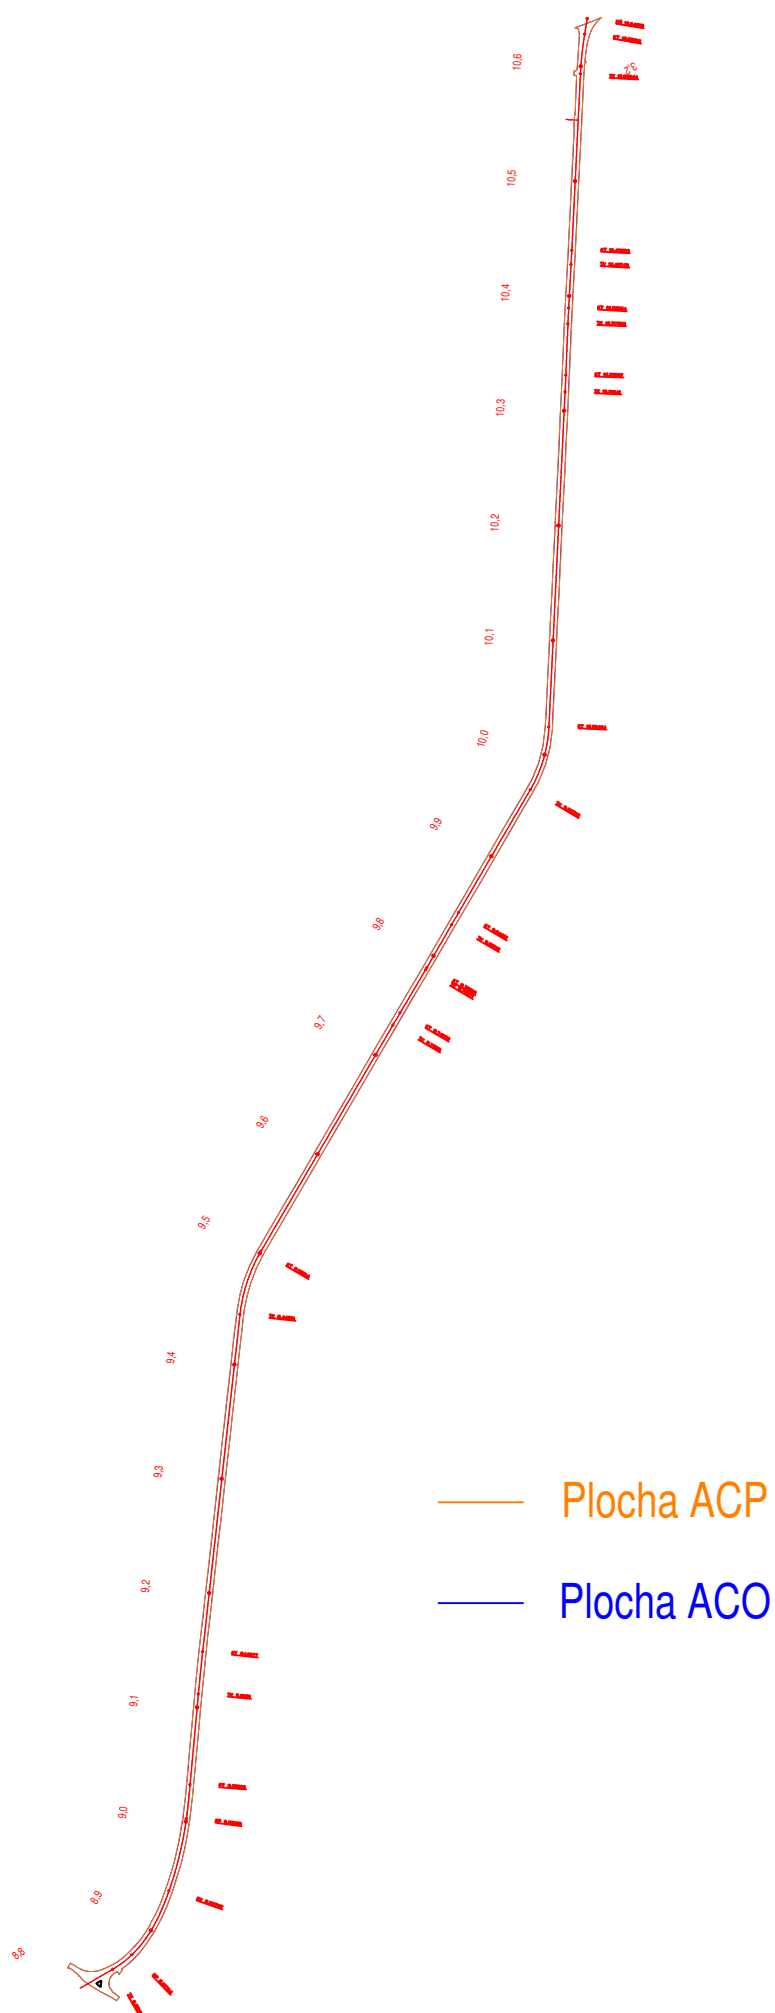



CCE Praha s.r.o., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
IČO: 26134497, DIČ: CZ26134497, tel: + 420-284 891 625, fax: + 420-284 890 654
E-mail: ccepraha@ccepraha.cz, www.ccepraha.cz



Stavba: III/11816 Višňová, Oprava povrchu Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 7/2023

Název akce: Plocha ACP a ACO – etapa 2
Datum měření: 28. září 2023
Projektová dokumentace: -
Vytyčovací síť: Základní vytyčovací síť stabilizovaná 08/23
Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv
Použité přístroje: Leica TS 16 v. č. 3262051
Přesnost měření: $m_{xy}=\pm 30\text{mm}$
Zaměřil: Petr Švec
Zpracoval: Ing. Tomáš Lauer

Popis prací: Zaměření obvodu bylo provedeno metodou číselné tachymetrie s připojením na body ZVS. Body byly měřeny po obvodu AB vrstev. Výpočet plochy byl proveden v programu BricsCAD V14 Pro. Seznam souřadnic zaměřených bodů obvodu je uložen v archivu firmy a je k dispozici na vyžádání.

Plocha vrstvy ACP v etapě 2 = 10911m²

Plocha vrstvy ACO v etapě 2 = 10658m²

Přílohy:


1. Situace obvodu ACP a ACO

1xA4

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

Ověřil:	Ing. Jiří Bouček	Za BES s.r.o.	Převzal:
Číslo ověření:	1293/2023		
Datum ověření:	5. 12. 2023		Dne:

Plocha ACP a ACO v etapě 2

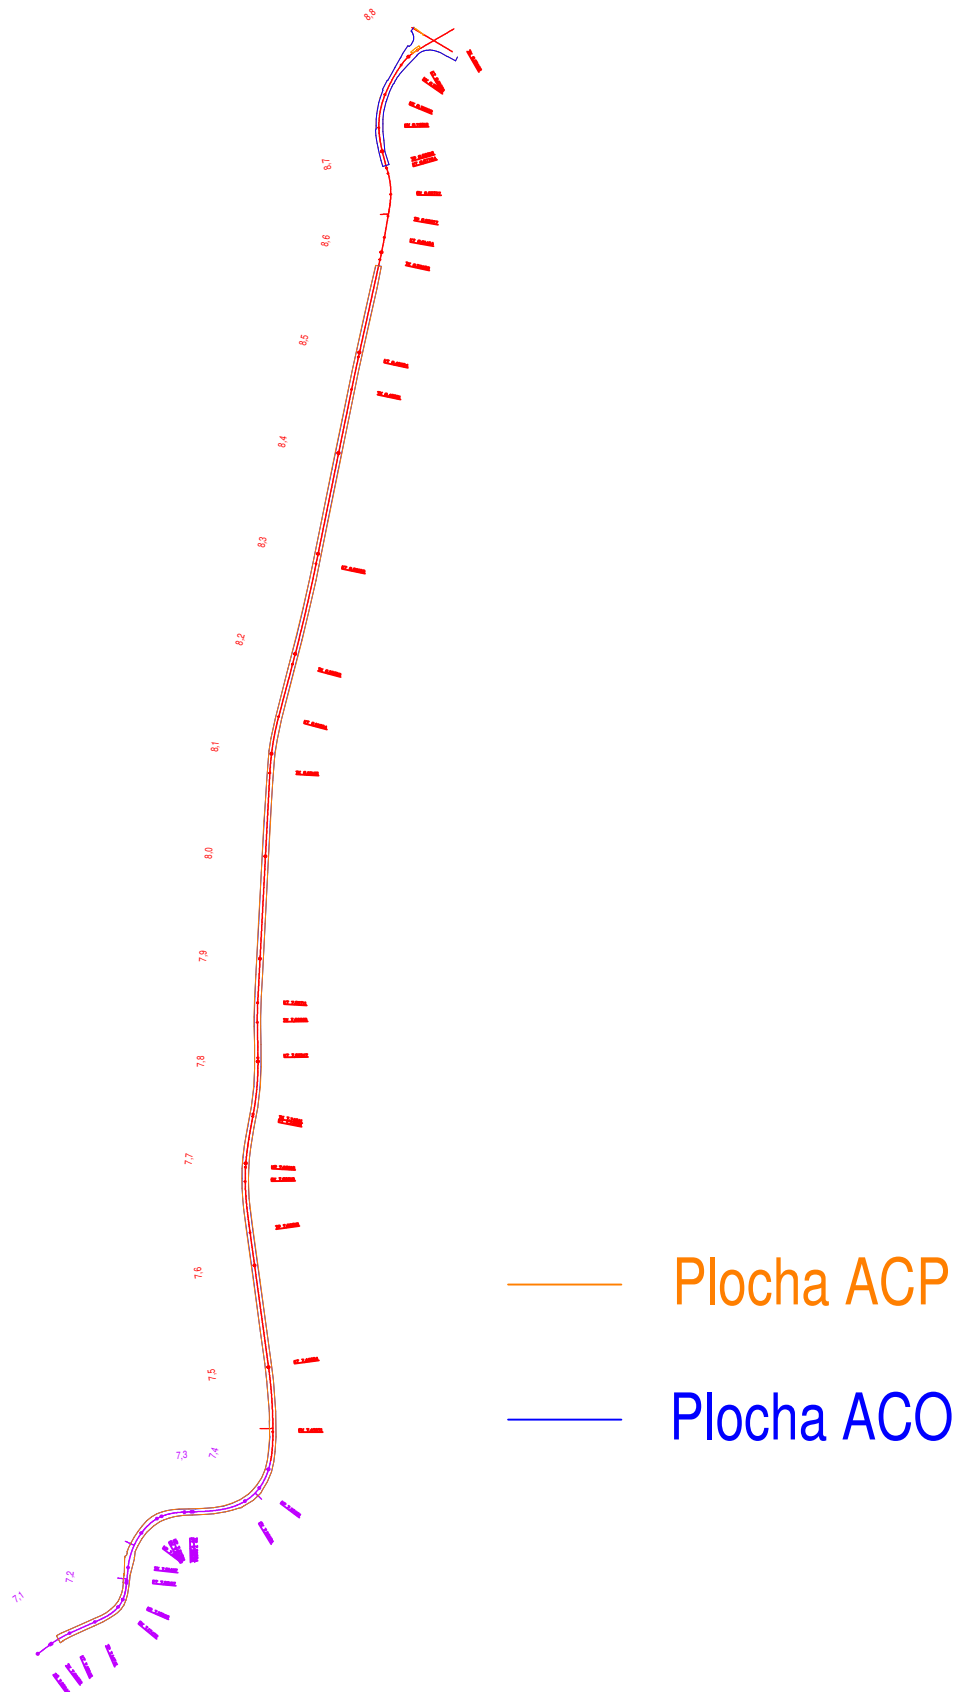



CCE Praha s.r.o., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
IČO: 26134497, DIČ: CZ26134497, tel: + 420-284 891 625, fax: + 420-284 890 654
E-mail: ccepraha@ccepraha.cz, www.ccepraha.cz



Stavba: III/11816 Višňová, Oprava povrchu Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 8/2023

Název akce: Plocha ACP a ACO – etapa 3
Datum měření: 31. října a 15. listopadu 2023
Projektová dokumentace: -
Vytyčovací síť: Základní vytyčovací síť stabilizovaná 08/23
Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv
Použité přístroje: Leica TS 16 v. č. 3262051
Přesnost měření: $m_{xy}=\pm 30\text{mm}$
Zaměřil: Petr Švec
Zpracoval: Ing. Tomáš Lauer

Popis prací: Zaměření obvodu bylo provedeno metodou číselné tachymetrie s připojením na body ZVS. Body byly měřeny po obvodu AB vrstev. Výpočet plochy byl proveden v programu BricsCAD V14 Pro. Seznam souřadnic zaměřených bodů obvodu je uložen v archivu firmy a je k dispozici na vyžádání.

Plocha vrstvy ACP v etapě 2 = 17030m²

Plocha vrstvy ACO v etapě 2 = 17476m²

Přílohy:


1. Situace obvodu ACP a ACO

1xA4

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

Ověřil:	Ing. Jiří Bouček	Za BES s.r.o.	Převzal:
Číslo ověření:	1294/2023		
Datum ověření:	5. 12. 2023		Dne:

Plocha ACP a ACO v etapě 3

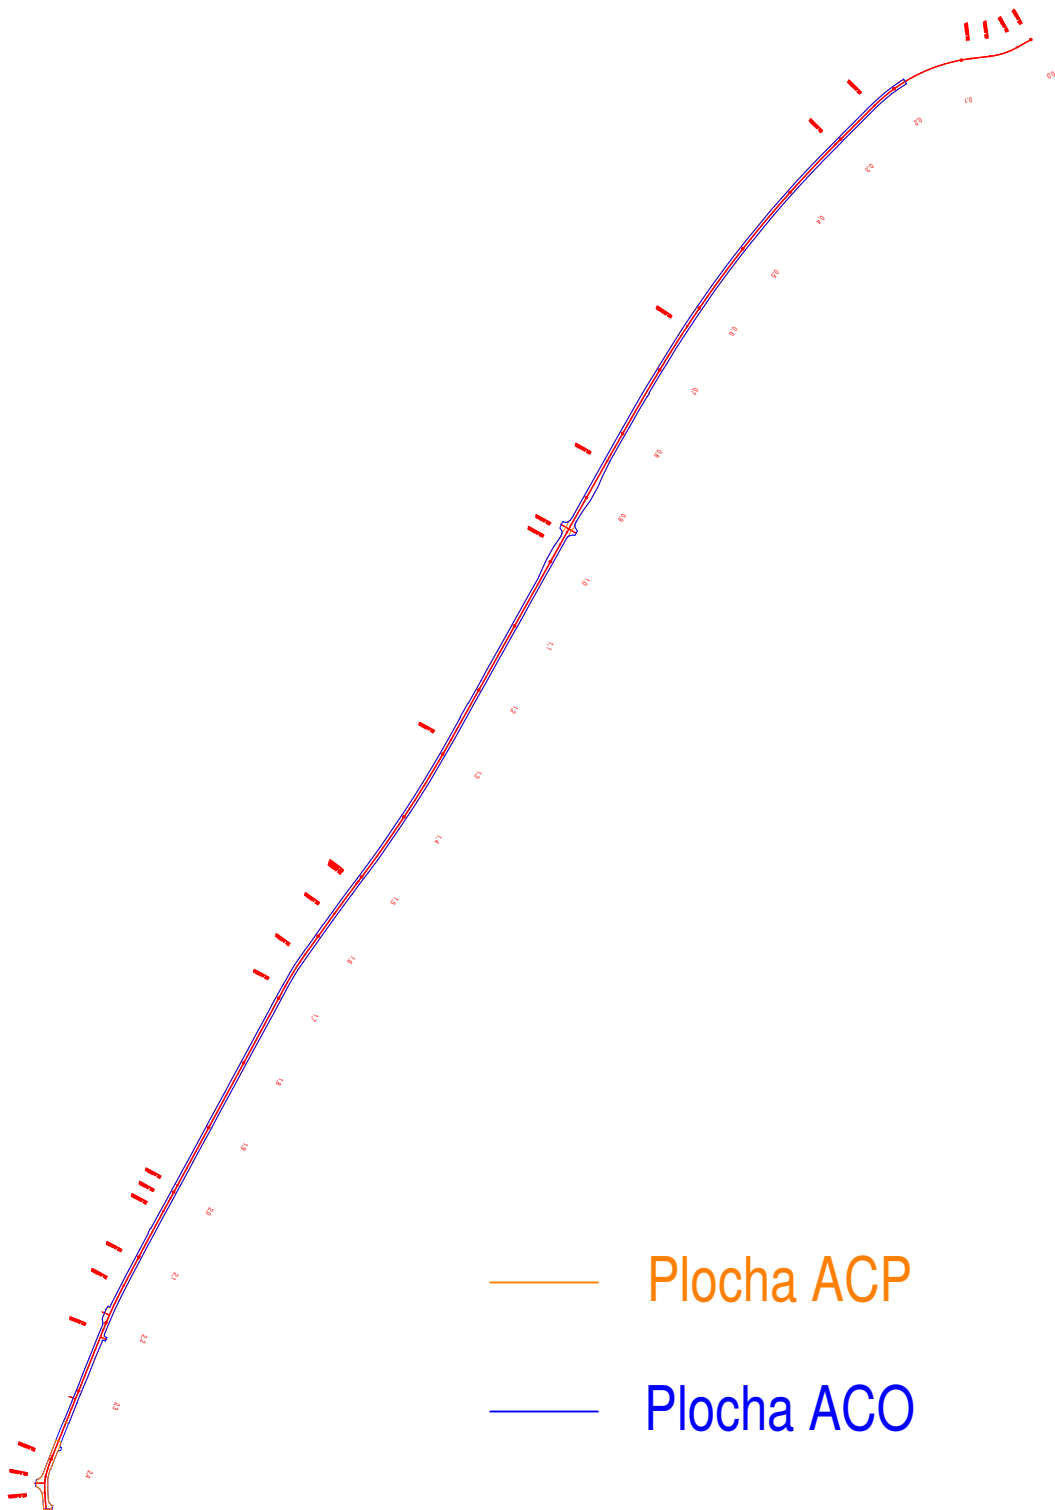



CCE Praha s.r.o., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
IČO: 26134497, DIČ: CZ26134497, tel: + 420-284 891 625, fax: + 420-284 890 654
E-mail: ccepraha@ccepraha.cz, www.ccepraha.cz



Stavba: III/11816 Višňová, Oprava povrchu Zápis o předání výsledků geodetických prací č. 9/2023

Název akce: Plocha ACP a ACO – etapa 4
Datum měření: 29. listopadu 2023
Projektová dokumentace: -
Vytyčovací síť: Základní vytyčovací síť stabilizovaná 08/23
Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv
Použité přístroje: Leica TS 16 v. č. 3262051
Přesnost měření: $m_{xy}=\pm 30\text{mm}$
Zaměřil: Petr Švec
Zpracoval: Ing. Tomáš Lauer

Popis prací: Zaměření obvodu bylo provedeno metodou číselné tachymetrie s připojením na body ZVS. Body byly měřeny po obvodu AB vrstev. Výpočet plochy byl proveden v programu BricsCAD V14 Pro. Seznam souřadnic zaměřených bodů obvodu je uložen v archivu firmy a je k dispozici na vyžádání.

Plocha vrstvy ACP v etapě 2 = 5916m²

Plocha vrstvy ACO v etapě 2 = 6333m²

Přílohy:

1. Situace obvodu ACP a ACO

1xA4

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

Ověřil:	Ing. Jiří Bouček	Za BES s.r.o.	Převzal:
Číslo ověření:	1295/2023		
Datum ověření:	5. 12. 2023		Dne:

Plocha ACP a ACO v etapě 4

