

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.: ---
Ze dne: ---
Č. j.: JMK 143741/2024
Sp. zn.: ---
Vyřizuje: Možný
Počet listů: 5
Počet příloh/listů: 0
Telefon: 541651557
Datum: 10.10.2024

Lesy České republiky, s. p.
Lesní správa Bučovice
Zámek 1
685 01 BUČOVICE

Oprava LC Pastýřská II – zaslání záznamu z místního šetření

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody si Vám dovoluje zaslat záznam z místního šetření ve věci zamýšlené opravy lesní cesty Pastýřská II.

S pozdravem

Příloha: Záznam z místního šetření

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Záznam z místního šetření

Věc: Oprava lesní cesty Pastýřská II v PR Rakovecké stráně a údolí bledulí a EVL Rakovecké údolí

Datum: 02.10.2024

Místo: Úsek cesty od zátočiny nad Junáckou studánkou ve směru ke kamennému brodu přes potok Rakovec v délce 3,000 km na pozemcích p. č. 23/1 a 24/3 v k. ú. Bukovinka

Účastníci: [REDAKCE] – Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství Jižní Morava [REDAKCE] – Krajský úřad Jihomoravského kraje (orgán ochrany přírody), [REDAKCE] ředitel společnosti AGOS BIO a.s. (subjekt obhospodařující přilehlé louky)

V rámci přípravy výše uvedeného zamýšleného záměru bylo při terénní pochůzce dohodnuto následující:

1. Oprava LC Pastýřská II bude provedena v předmětném úseku dle přiloženého soupisu prací a orientačního zákresu v mapě (je třeba upozornit, že tento zákres nekoresponduje v některých místech se soupisem prací) s přihlédnutím k vyznačení jednotlivých úseků přímo v terénu (vždy začátek a konec úseku růžovým sprejem), a to formou zapravení výtluků a opravou vybraných částí cesty buď celoplošnou nebo jen vyježděných kolejí. Dále se zde počítá s pročištěním stávajících zanesených svodnic, pomístním stržením krajnic a místy i s pročištěním příkopů.
2. Oprava cesty bude provedena v šířce 3,50 m, a to hrubým kamenivem s překrytím šterkodrtí dle přiloženého soupisu prací, s ohledem na zdejší přírodní hodnoty však nesmí být použit žádný recyklát.
3. Oprava cesty nebude spojena s výřezem ani vyvětčováním dřevin s výjimkou pravé strany cesty u Justýniny louky (1,350-1,470 km), kde si pročištění a přespádování příkopu s jeho vyústěním do žlíbku pod Martinovou studánkou vyžádá vyvětvení či odkácení přilehlého okraje porostu. Vyvětvení je přitom třeba provést na větvní kroužek a vzniklou biomasu přesunout do lesa dál od příkopu.
4. V místech, kde prochází cesta lesem, bude zemina ze stržených krajnic a vyčištěných příkopů rozhrnuta po obou stranách této lesní komunikace a vyspádovaná tak, aby z ní nevznikaly terénní nerovnosti. V úseku 2,250-2,400 km, kde levý svah prudce spadá do potoční nivy (výskyt bledulí) může být tato zemina rozhrnuta pouze na pravé straně nahoru do svahu. Tam kde cesta sousedí s Justýninou loukou (1,300-1,550 km) dále v okolí naučné tabule (1,300 km) a v těsné blízkosti slepencové skalky (2,650-2,680 km) nebude zemina rozhrnována, ale odvezena na myslivecké políčko ve Studeném žlebu, kde bude rozhrnuta a srovnána s úrovní terénu (v mapě je toto místo označeno hvězdičkou).

5. Veškeré stavební mechanismy včetně nákladních aut se budou pohybovat výhradně v ose opravované cesty a nesmí tedy zajiždět na louky či do lesních porostů ani zde parkovat.
6. Na loukách ani v lesních porostech na území PR a EVL nesmí být ani dočasně ukládán žádný materiál.
7. [REDAKCE] záměru s dostatečným časovým předstihem přizván k předání staveniště i pozdějšímu předání hotové stavby.
8. V rámci pochůzky bylo rovněž odsouhlaseno budoucí odstranění několika drobných částí výše již uvedené slepencové skalky (2,660-2,670 km; označeny růžovou tečkou) a diskutována byla také možnost případné stabilizace ujíždějícího svahu kousek za touto skalkou (2,700 km) vhodnými kovovými segmenty (podmínkou je jejich zapuštění do svahu tak, aby nebyly viditelné). Tyto práce však již budou součástí samostatného projektu.


Zapsal: [REDAKCE]

Vyjádření ostatních účastníků místního šetření:

[REDAKCE]: Bez připomínek

Přílohy:

1. Mapa s orientačním zákresem zamýšlených oprav a místem uložení zeminy
2. Soupis prací

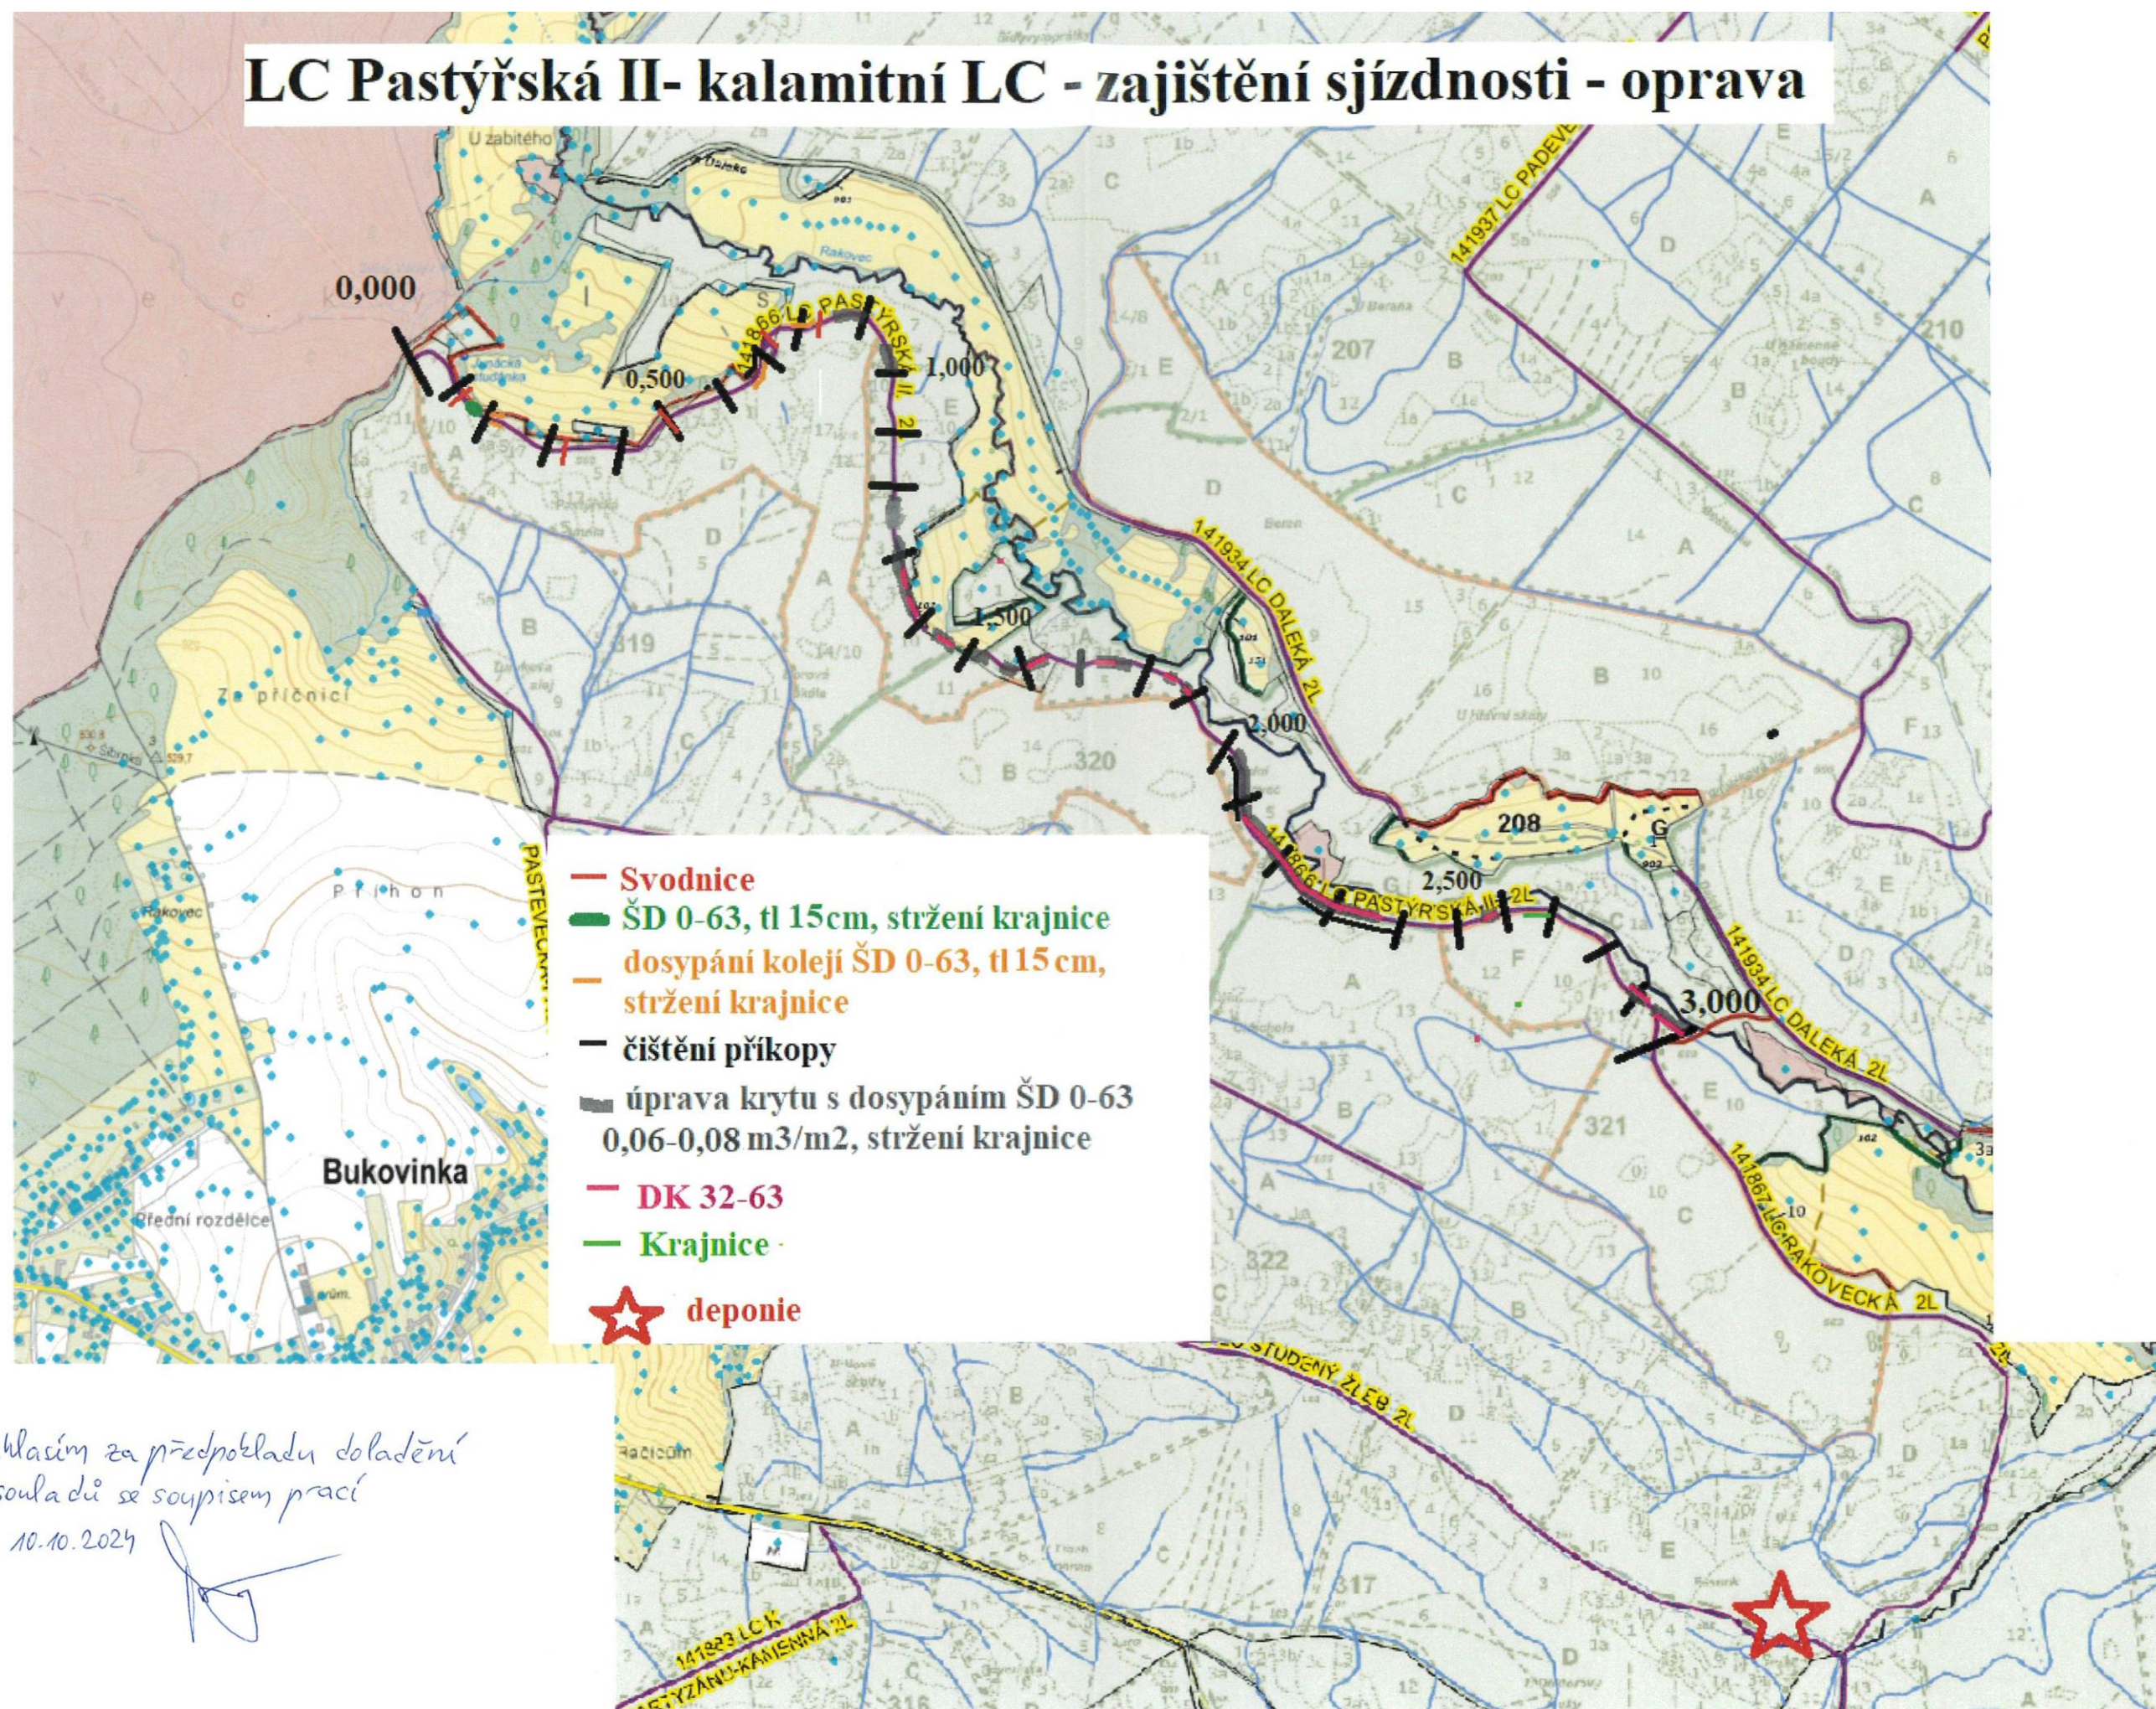

Příloha č. 2: Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Pastýřská II - kalamitní LC

KSO:
Místo: revír Bukovinka

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.9.2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Pastýřská II - kalamitní LC

Místo: revír Bukovinka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 23.9.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Pastýřská II - kalamitní LC

Místo: revír Bukovinka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 23.9.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

2	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	371,920		0,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3					
VV			odkopy (krajnice a příkopy)					
VV			"staničení 0,160-0,180 - krajnice obě strany" 20*0,5*0,2*2		4,000			
VV			"staničení 0,200-0,205 - krajnice obě strany" 5*0,5*0,2*2		1,000			
VV			"staničení 0,610-0,630 - krajnice levá/průpich do porostu" 20*1*0,2		4,000			
VV			"staničení 0,660-0,700 - krajnice obě strany" 40*0,5*0,2*2		8,000			
VV			"staničení 0,660-0,700 - příkopa levá strana včetně překopu přes nájezd na louku" ((1,4+0,4)/2*0,3)*40		10,800			
VV			"staničení 0,790-0,818 - krajnice obě strany" 28*0,5*0,2*2		5,600			
VV			"staničení 0,857-0,900 - krajnice obě strany" 43*0,5*0,2*2		8,600			
VV			"staničení 0,960-1,000 - krajnice obě strany" 40*0,5*0,2*2		8,000			
VV			"staničení 1,120-1,145 - krajnice obě strany" 25*0,5*0,2*2		5,000			
VV			"staničení 1,205-1,270 - krajnice obě strany" 65*0,5*0,2*2		13,000			
VV			"odvoz do 3km - staničení 1,290-1,385 - krajnice obě strany" 95*0,5*0,2*2		19,000			
VV			"odvoz do 3km - staničení 1,290-1,400 - příkopa pravá strana" ((1,4+0,4)/2*0,5)*110		49,500			
VV			"odvoz do 3km - staničení 1,445-1,475 - krajnice obě strany" 30*0,5*0,2*2		6,000			
VV			"odvoz do 3km - staničení 1,500-1,520 - krajnice obě strany" 20*0,5*0,2*2		4,000			
VV			"staničení 1,565-1,580 - krajnice obě strany" 15*0,5*0,2*2		3,000			
VV			"staničení 1,565-1,580 - příkopa pravá strana" ((1,4+0,4)/2*0,3)*15		4,050			
VV			"staničení 1,600-1,630 - krajnice obě strany" 30*0,5*0,2*2		6,000			
VV			"staničení 1,720-1,750 - krajnice obě strany" 30*0,5*0,2*2		6,000			
VV			"staničení 1,720-1,750 - příkopa pravá strana" ((1,4+0,4)/2*0,3)*30		8,100			
VV			"staničení 1,750-1,775 - krajnice obě strany" 25*0,5*0,2*2		5,000			
VV			"staničení 1,835-1,850 - krajnice obě strany" 15*0,5*0,2*2		3,000			
VV			"staničení 1,875-1,900 - krajnice obě strany" 25*0,5*0,2*2		5,000			
VV			"staničení 1,875-1,900 - krajnice obě strany" 25*0,5*0,2*2		5,000			
VV			"staničení 2,010-2,370 - krajnice obě strany" 360*0,5*0,2*2		72,000			
VV			"staničení 2,010-2,120 - příkopa pravá strana" ((1,4+0,4)/2*0,3)*110		29,700			
VV			"staničení 2,259-2,370 - příkopa pravá strana" ((1,4+0,4)/2*0,3)*111		29,970			
VV			"staničení 2,370-2,400 - krajnice obě strany" 30*0,5*0,2*2		6,000			
VV			"staničení 2,370-2,400 - příkopa pravá strana" ((1,4+0,4)/2*0,3)*30		8,100			
VV			"staničení 2,565-2,590 - krajnice obě strany" 25*0,5*0,2*2		5,000			
VV			"odvoz do 3km - staničení 2,620-2,680 - krajnice pouze pravá strana" 25*1*0,3		7,500			
VV			"staničení 2,800-2,850 - krajnice obě strany" 50*0,5*0,2*2		10,000			
VV			"staničení 2,880-2,940 - krajnice obě strany" 60*0,5*0,2*2		12,000			
VV			Součet		371,920			

18	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopu přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
VV			odvoz z míst, kde není možné odhodit do porostu kolem LC					
VV			Odvoz na LC Studený žleb					
VV			"staničení 0,660-0,700 - příkopa levá strana včetně překopu přes nájezd na louku" ((1,4+0,4)/2*0,5)*40		18,000			
VV			"odvoz do 3km - staničení 1,290-1,385 - krajnice obě strany" 95*0,5*0,2*2		19,000			
VV			"odvoz do 3km - staničení 1,290-1,400 - příkopa pravá strana" ((1,4+0,4)/2*0,5)*110		49,500			
VV			"odvoz do 3km - staničení 1,445-1,475 - krajnice obě strany" 30*0,5*0,2*2		6,000			
VV			"odvoz do 3km - staničení 1,500-1,520 - krajnice obě strany" 20*0,5*0,2*2		4,000			
VV			"odvoz do 3km - staničení 2,620-2,680 - krajnice pouze pravá strana" 25*1*0,3		7,500			
VV			Součet		104,000			

D 5 Komunikace pozemní 0,00

15	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	484,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštění plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm					
VV			DK 63-125 cca 141 tun					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"staničení 0,790-0,818 šířka 1m" 28*1		28,000			
VV			"staničení 1,355-1,360 šířka 1m" 5*1		5,000			
VV			"staničení 1,370-1,385 šířka 1m" 15*1		15,000			
VV			"staničení 1,450-1,470 šířka 1m" 20*1		20,000			
VV			"staničení 1,500-1,520 šířka 1m" 20*1		20,000			
VV			"staničení 1,565-1,580 šířka 1m" 15*1		15,000			
VV			"staničení 1,600-1,630 šířka 1m" 30*1		30,000			
VV			"staničení 1,720-1,750 šířka 1m" 30*1		30,000			
VV			"staničení 1,835-1,850 šířka 1m" 15*1		15,000			
VV			"staničení 1,890-1,895 šířka 1m - obě strany" 5*1*2		10,000			
VV			"staničení 2,045-2,060 šířka 1m" 15*1		15,000			
VV			"staničení 2,120-2,255 šířka 1m" 35*1		35,000			
VV			"staničení 2,259-2,370 šířka 1m" 111*1		111,000			
VV			"staničení 2,565-2,590 šířka 1m" 25*1		25,000			
VV			"staničení 2,800-2,835 šířka 1m" 35*1		35,000			
VV			"staničení 2,835-2,850 šířka 1m" 15*1		15,000			
VV			"staničení 2,880-2,940 šířka 1m" 60*1		60,000			
VV			Součet		484,000			
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	80,000		0,00	CS LESYCR_URS 2024 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
VV			dospění LC z ŠD 0-63 cca 27 tun					
VV			"staničení 0,160-0,180" 20*1,5		30,000			
VV			"staničení 0,200-0,205 - koleje šíře 1m" 5*1*2		10,000			
VV			"staničení 0,660-0,700" 40*1		40,000			
VV			Součet		80,000			
17	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	3 189,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2					
VV			dospění stávajícího povrchu LC ŠD 0-32 cca 439 tun					
VV			"staničení 0,790-0,818 celoplošně" 28*3,2		89,600			
VV			"staničení 0,857-0,900 celoplošně" 43*3,2		137,600			
VV			"staničení 0,960-1,000 celoplošně" 40*3,2		128,000			
VV			"staničení 1,045 - 1,120 celoplošně" 75*3,2		240,000			
VV			"staničení 1,205-1,270 celoplošně" 65*3,2		208,000			
VV			"staničení 1,290-1,385 celoplošně" 95*3,2		304,000			
VV			"staničení 1,445-1,475 celoplošně" 30*3,2		96,000			
VV			"staničení 1,500-1,520 celoplošně" 20*3,2		64,000			
VV			"staničení 1,565-1,580 celoplošně" 15*3,2		48,000			
VV			"staničení 1,600-1,630 celoplošně" 30*3,2		96,000			
VV			"staničení 1,720-1,750 celoplošně" 30*3,2		96,000			
VV			"staničení 1,750-1,775 celoplošně" 25*3,2		80,000			
VV			"staničení 1,835-1,850 celoplošně" 15*3,2		48,000			
VV			"staničení 1,875-1,900 celoplošně" 25*3,2		80,000			
VV			"staničení 2,010-2,370 celoplošně" 360*3,2		1 152,000			
VV			"staničení 2,565-2,590 celoplošně" 25*3,2		80,000			
VV			"staničení 2,880-2,930 celoplošně" 50*1		50,000			
VV			"staničení 2,940-3,000 celoplošně" 60*3,2		192,000			
VV			Součet		3 189,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
11	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnici ručně (molykami)					
VV			čištění stávajících svodnic					
VV			"staničení 0,115, 0,320, 0,500, 0,730, 0,820"					
VV			5*5		25,000			
VV			Součet		25,000			
D	998		Přesun hmot				0,00	
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	607,855		0,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

Souhlasím 10.10.2024
