



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 2267)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 47B

D_09 Úprava na stokách

SO 07.18.b Hradidlová komora HKB – 09.b před čp. 538

- **ZM 068.01 – změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci**



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	NEOBSAZENO

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

Důvodová zpráva – změnový list č. 47B

SO 07.18.b Hradidlová komora HKB – 09.b před čp. 538
ZM 068.01 – změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci

Na základě zjištěného stavu stávajících šachet a zjištěné nepřesnosti skutečného prostorového uspořádání trasy přítokového a odtokového potrubí vzhledem k předpokladu PD o průběhu stávajícího potrubí bylo za účasti zástupců kanalizačního provozu BVK, AD projektanta, TDS BVK, a.s. stanoveno, že je nutno provést úpravu tvaru a konstrukce hradidlové komory HKB-09.b z prefabrikované šachty na monolitickou. Změna nemá vliv na fungování hradidlových komor.

Hradidlová komora bude vybudována přímo nad kmenovou stokou B. Při výkopu bude obnaženo stávající potrubí stoky. Výkop bude proveden 0,5 m pod vrch potrubí. Prostor bude následně vyplněný prostým betonem C20/25.

Na tento beton bude provedena základová deska šachty tl. 0,17 m s vloženou výztuží dle armovacího výkresu. Vnitřní tvar šachty bude čtvercový o půdorysných rozměrech 1,5 x 1,5 m. Výška šachty bude 1,85 m. Strop šachty bude tvořený prefabrikovanou zákrytovou deskou s otvorem 1,0 m. Na tuto desku bude následně osazen kanalizační konus. Šachta bude ukončena samonivelačním poklopem.

V Brně dne :



Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 13
Brno

Váš dopis

-

Naše značka

-

Vyřizuje



Hradec Králové

2.10.2023

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA – ETAPY VII A VIII“

Stanovisko projektanta k úpravě tvarů hradidlových komor HKB.09.a a HKB.09.b

Vážení,

Na základě zjištěného stavu stávajících šachet a nepřesnosti podkladů o průběhu stávajícího potrubí bylo za účasti provozu BVK domluveno, že dojde k úpravám hradidlových komor HKB.09.a a HKB.09.b z prefabrikovaných šachet na monolitické. Změna nemá vliv na fungování hradidlových komor.

Na základě skutečnosti konstatujeme následující:

- Bude zpracován návrh technického řešení
- Návrh technického řešení u objektů ve správě BVK bude s nimi odsouhlasen
- Na základě odsouhlasení bude dopracována výkresová část a zpracován výkaz výměr

Předpokládaný rozsah úpravy dokumentace:

- Technická zpráva
- Výkresová část (půdorys, řezy)
- Výkaz výměr

Vypracoval:



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 2267) ÚSEK: D 03 – Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce		Změnový list č. 47B
OZNÁMENÍ ZMĚNY		PŘÍKAZ Č.:
SO 07.18.b Hradidlová komora HKB 09.b před čp. 538 ZM 068.01-změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci		
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava tvarů hradidlové komory HKB.09.b DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.18b ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.47B vícepráce, ZL č.47B méněpráce, ZL č.47B rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Na základě zjištěného stavu stávající šachty a nepřesnosti podkladů o průběhu stávajícího potrubí bylo za účasti provozu BVK domluveno, že dojde k úpravám hradidlové komory HKB.09.b z prefabrikované šachty na monolitickou. Změna nemá vliv na fungování hradidlové komory. NAVRHL: [REDACTED] DATUM: _____ PŘÍKAZ VYDAL: _____ DATUM: _____		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BVK a.s. [REDACTED]		ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [REDACTED]

PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 2267)			47B
ÚSEK: D 09 – Úprava na stokách			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
SO 07.18.b Hradidlová komora HKB 09.b před čp. 538 ZM 068.01-změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci			
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svatky - Brno	DATUM:	
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
Mail			
PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava tvarů hradidlové komory HKB.09.b			
DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.18b			
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s.			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.47B vícepráce, ZL č.47B méněpráce, ZL č.47B rozdílový“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
Vícepráce:	665 617,03 Kč	139 779,58 Kč	805 396,61 Kč
Méněpráce:	- 49 822,26 Kč	- 10 462,67 Kč	- 60 284,93 Kč
Rozdíl:	615 794,77 Kč	129 316,90 Kč	745 111,67 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Petr Rašovský			DATUM:
VYJÁDŘENÍ:			
OD: _____	PODPIS: _____	ATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BVK a.s. _____		ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085
Stavba: Nábřeží řeky Svatky - PPO města Brna – etapy VII a VIII
Objekt: SO 07.18.b - Hradidlová komora HKB - 09.b před čp. 538
SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce
ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci
KSO: CC-CZ:
Místo: Nábřeží Svatky Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 449 92 785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785
Uchazeč: IČ: 463 42 796
Společnost "PPO nábřeží Svatky - Brno" DIČ: CZ46342796
Projektant: IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419
Zpracovatel: IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			615 794,77
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	615 794,77	129 316,90
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			745 111,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20MT085		
Stavba:	Nábřeží řeky Svratky - PPO města Brna – etapy VII a VIII		
Místo:	Nábřeží Svratky	Datum:	30. 11. 2023
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	
Uchazeč:	Společnost "PPO nábřeží Svratky - Brno"	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		615 794,77	745 111,67
D_09	Úprava na stokách	615 794,77	745 111,67
01	SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce	615 794,77	745 111,67
	SO 07.18.b - Hradidlová komora HKB - 09.b před čp.538		
02	ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci	615 794,77	745 111,67
	ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci-MÉNĚPRÁCE	-49 822,26	-60 284,93
	ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci-VÍCEPRÁCE	665 617,03	805 396,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nábřeží řeky Svatky - PPO města Brna – etapy VII a VIII

Objekt: SO 07.18.b - Hradidlová komora HKB - 09.b před čp. 538

Soupis: SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Úroveň 3: ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nábřeží Svatky	Datum:	30. 11. 2023
Zadavatel:		IČ:	449 92 785
	Statutární město Brno	DIČ:	CZ44992785
Uchazeč:		IČ:	463 42 796
	Společnost "PPO nábřeží Svatky - Brno"	DIČ:	CZ46342796
Projektant:		IČ:	262 36 419
		DIČ:	CZ26236419
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	

Poznámka:
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH		615 794,77	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	615 794,77	21,00%	129 316,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	745 111,67

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nábřeží řeky Svatky - PPO města Brna – etapy VII a VIII

Objekt: D_09 - Úprava na stokách

Soupis: 01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Úroveň 3:

ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci

Místo:	Nábřeží Svatky	Datum:	30. 11. 2023
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	
Uchazeč:	Společnost "PPO nábřeží Svatky - Brno"	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	615 794,77
HSV - Práce a dodávky HSV	496 794,77
1 - Zemní práce	313 209,42
4 - Vodorovné konstrukce	-1 519,95
5 - Komunikace pozemní	11 638,65
8 - Trubní vedení	172 226,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	617,10
997 - Přesun sutě	1 753,65
998 - Přesun hmot	-1 130,60
OST - Ostatní	119 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nábřeží řeky Svatky - PPO města Brna – etapy VII a VIII

Objekt: D_09 - Úprava na stokách

Soupis: 01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Uroveň 3: ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci

Místo: Nábřeží Svatky Datum: 30. 11. 2023
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč: Společnost "PPO nábřeží Svatky - Brno" Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem												
615 794,77										-10,14873		3,89624
D HSV Práce a dodávky HSV												
496 794,77										-10,14873		3,89624
D 1 Zemní práce												
313 209,42										-8,71523		3,89624
1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2,960	68,90	203,94	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,29000	0,85840
P			Poznámka k položce: hmotnost suť 0,29 t/m2									
VV			výkres D.09.102									
VV			-16,066 "původní výměra									
VV			Mezisoučet									
VV			4,9*2,9 "podkladní vrstva									
VV			výkres D.11.402									
VV			dle tabulky kubatur									
VV			2,15*2,24									
VV			Mezisoučet									
VV			Součet									
2	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	2,960	383,00	1 133,68	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,62500	1,85000
P			Poznámka k položce: hmotnost suť 0,625 t/m2									
VV			výkres D.09.102									
VV			-16,066 "původní výměra									
VV			Mezisoučet									
VV			4,9*2,9 "podkladní vrstva									
VV			výkres D.11.402									
VV			dle tabulky kubatur									
VV			2,15*2,24									
VV			Mezisoučet									
VV			Součet									
3	K	113154253	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	3,360	91,90	308,78	SO 07.18.b	0,00006	0,00020	0,12800	0,43008
P			Poznámka k položce: hmotnost suť 0,128 t/m2									
VV			výkres D.09.102									
VV			-136,891 "původní výměra									
VV			Mezisoučet									
VV			116,0 "obrusná vrstva, plocha odečtena digitálně									
VV			(4,9+0,5)*(2,9+0,5) "ložní vrstva									
VV			výkres D.11.402									
VV			dle tabulky kubatur									
VV			2,15*(2,24+0,5)									
VV			Mezisoučet									
VV			Součet									
4	K	113154254	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2,960	125,40	371,18	SO 07.18.b	0,00012	0,00036	0,25600	0,75776
P			Poznámka k položce: hmotnost suť 0,256 t/m2									
VV			výkres D.09.102									
VV			-16,066 "původní výměra									
VV			Mezisoučet									
VV			4,9*2,9 "podkladní vrstva									
VV			výkres D.11.402									
VV			dle tabulky kubatur									
VV			2,15*2,24									
VV			Mezisoučet									
VV			Součet									
5	K	131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	7,998	446,20	3 568,71	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
VV			-81,86 "původní výměra									
VV			Mezisoučet									
VV			výkres D.09.102									
VV			pro hradidlovou komoru									
VV			4,9*2,9*(3,15-0,6)									
VV			výkres D.11.402									
VV			dle tabulky kubatur									
VV			51,27									
VV			6,0*((0,25+0,1)/2*2,24)									
VV			Mezisoučet									
VV			Součet									
6	K	132311401	Hloubení vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	2,232	2 378,00	5 307,70	D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
VV			D.09.102									
VV			obnažení stávající stoky do hloubky min. 0,5 m									
VV			3,6*2,9*0,5									
VV			-0,83*3,6 "stoka									
VV			Součet									
7	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	-43,540	154,80	-6 739,99	SO 07.18.b	0,00149	-0,06487	0,00000	0,00000
VV			výkres D.11.402									
VV			-55,43 "původní výměra									
VV			Mezisoučet									
VV			11,89 "rýha									
VV			Součet									
8	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	-43,540	43,00	-1 872,22	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
VV			dle položky zřízení									
VV			-55,43									
VV			11,89									
VV			Součet									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
9	K	151301902-R	Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření s ponecháním pažin ve výkopu hloubky do 8 m dle technologie dodavatele včetně lezního oddělení s ochranným košem	m2	51,840	5 917,60	306 768,38	SO 07.18.c	0,03945	2,04509	0,00000	0,00000
		WV	14,4*(3,1+0,5)		51,840							
10	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	10,230	82,20	840,91	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	-100,502 "původní výměra		-100,502							
		WV	zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět									
		WV	16,33*2		32,660							
		WV	ornice									
		WV	5,779*0,2*2		2,312							
		WV	přebytečná zemina na meziskládku									
		WV	89,858+2,232-16,33		75,760							
		WV	Součet		10,230							
11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,230	239,20	2 447,02	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	přebytečná zemina									
		WV	-65,53 "původní výměra		-65,530							
		WV	Mezisoučet		-65,530							
		WV	89,858+2,232"výkop		92,090							
		WV	-16,33 "zpětný zásyp		-16,330							
		WV	Mezisoučet		75,760							
		WV	Součet		10,230							
12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i	m3	102,300	6,70	685,41	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	10 příplateků									
		WV	-10*65,53		-655,300							
		WV	10*75,76		757,600							
		WV	Součet		102,300							
13	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	10,230	44,50	455,24	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	přebytečná zemina z meziskládky									
		WV	-65,53 "původní výměra		-65,530							
		WV	75,76		75,760							
		WV	Součet		10,230							
14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,414	200,00	3 682,80	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		P	Poznámka k položce:									
		WV	hmotnost zeminy 1,8 t/m3									
		WV	-65,53*1,8 "původní výměra		-117,954							
		WV	75,76*1,8		136,368							
		WV	Součet		18,414							
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	7,998	8,90	71,18	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	-81,86 "původní výměra		-81,860							
		WV	89,858		89,858							
		WV	Součet		7,998							
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-5,348	62,30	-333,18	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	-60,588 "původní výměra		-60,588							
		WV	Mezisoučet		-60,588							
		WV	náhrada výkopku									
		WV	výkres D.09.102									
		WV	36,236 "výkop		36,236							
		WV	-(6,38*1,97+1,8*1,8*0,24) "sachta		-13,346							
		WV	výkres D.11.402									
		WV	dle tabulky kubatur									
		WV	16,02		16,020							
		WV	Mezisoučet		38,910							
		WV	zemina z výkopu									
		WV	výkres D.11.402									
		WV	dle tabulky kubatur									
		WV	16,33		16,330							
		WV	Součet		-5,348							
17	M	58331202	šterkodrti netříděná do 100mm amfibolit	t	-10,696	345,00	-3 690,12	SO 07.18.b	1,00000	-10,69600	0,00000	0,00000
		WV	-44,258*2,0 "původní výměra		-88,516							
		WV	38,91*2,0		77,820							
		WV	Součet		-10,696							
		D 4	Vodorovné konstrukce				-1 519,95			-0,01112		0,00000
18	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	-0,289	3 232,90	-934,31	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	výkres D.09.102									
		WV	-1,7*1,7*0,1 "pod HK		-0,289							
19	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo práčů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	-0,013	45 049,40	-585,64	SO 07.18.b	0,85540	-0,01112	0,00000	0,00000
		P	Poznámka k položce:									
		WV	hmotnost 4,44 kg /m2									
		WV	-1,7*1,7*0,00444		-0,013							
		D 5	Komunikace pozemní				11 638,65			0,00000		0,00000
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7,776	169,10	1 314,92	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	výkres D.09.102									
		WV	-11,25 "původní výměra		-11,250							
		WV	Mezisoučet		-11,250							
		WV	4,9*2,9 "podkladní vrstva		14,210							
		WV	výkres D.11.402									
		WV	dle tabulky kubatur									
		WV	2,15*2,24		4,816							
		WV	Mezisoučet		19,026							
		WV	Součet		7,776							
21	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	7,776	615,70	4 787,68	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	výkres D.09.102									
		WV	-11,25 "původní výměra		-11,250							
		WV	Mezisoučet		-11,250							
		WV	4,9*2,9 "podkladní vrstva		14,210							
		WV	výkres D.11.402									
		WV	dle tabulky kubatur									
		WV	2,15*2,24		4,816							
		WV	Mezisoučet		19,026							
		WV	Součet		7,776							
22	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm	m2	7,776	555,60	4 320,35	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	výkres D.09.102									
		WV	-11,25 "původní výměra		-11,250							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
		VV	2,939*1,9 "dle položky rozebrání dlažeb z lomového kamene		5,584							
		VV	6,406*2,3 "dle položky bourání zdiva kamenného		14,734							
		VV	8,9*0,302 "dle položky bourání potrubí z betonu		2,688							
		VV	3,393*1,76 "dle položky bourání šachet		5,972							
		VV	Mezisoučet		69,210							
		VV	Součet		3,897							
	D	998	Přesun hmot				-1 130,60			0,00000		0,00000
45	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-10,149	55,70	-565,30	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	K	998274124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	-10,149	55,70	-565,30	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	D	OST	Ostatní				119 000,00			0,00000		0,00000
47	K	OST002	Projektová příprava	kpl	1,000	119 000,00	119 000,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nábřeží řeky Svatky - PPO města Brna – etapy VII a VIII

Objekt: SO 07.18.b - Hradidlová komora HKB - 09.b před čp. 538

Soupis: SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Úroveň 3: ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci-MÉNĚPRÁCE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nábřeží Svatky	Datum:	30. 11. 2023
Zadavatel:		IČ:	449 92 785
	Statutární město Brno	DIČ:	CZ44992785
Uchazeč:		IČ:	463 42 796
	Společnost "PPO nábřeží Svatky - Brno"	DIČ:	CZ46342796
Projektant:		IČ:	262 36 419
		DIČ:	CZ26236419
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	

Poznámka:
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH		-49 822,26	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-49 822,26	21,00%	-10 462,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-60 284,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - PPO města Brna – etapy VII a VIII

Objekt:

D_09 - Úprava na stokách

Soupis:

01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Úroveň 3:

ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci-MÉNĚPRÁCE

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

30. 11. 2023

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

Společnost "PPO nábřeží Svatky - Brno"

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-49 822,26
HSV - Práce a dodávky HSV		-49 822,26
1 - Zemní práce		-12 635,51
4 - Vodorovné konstrukce		-1 519,95
5 - Komunikace pozemní		0,00
8 - Trubní vedení		-34 536,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		-1 130,60
OST - Ostatní		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nábřeží řeky Svatky - PPO města Brna – etapy VII a VIII

Objekt: D_09 - Úprava na stokách

Soupis: 01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Uroveň 3: ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci-MÉNĚPRÁCE

Místo: Nábřeží Svatky Datum: 30. 11. 2023
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč: Společnost "PPO nábřeží Svatky - Brno" Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem										-10,14873		3,89624
D HSV Práce a dodávky HSV										-10,14873		3,89624
D 1 Zemní práce										-8,71523		3,89624
1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2,960	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,29000	0,85840
P			Poznámka k položce: hmotnost suť 0,29 t/m2									
VV			výkres D.09.102									
VV			-16,066 "původní výměra									
VV			Mezisoučet									
VV			4,9*2,9 "podkladní vrstva									
VV			výkres D.11.402									
VV			dle tabulky kubatur									
VV			2,15*2,24									
VV			Mezisoučet									
VV			Součet									
2	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	2,960	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,62500	1,85000
P			Poznámka k položce: hmotnost suť 0,625 t/m2									
VV			výkres D.09.102									
VV			-16,066 "původní výměra									
VV			Mezisoučet									
VV			4,9*2,9 "podkladní vrstva									
VV			výkres D.11.402									
VV			dle tabulky kubatur									
VV			2,15*2,24									
VV			Mezisoučet									
VV			Součet									
3	K	113154253	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	3,360	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00006	0,00020	0,12800	0,43008
P			Poznámka k položce: hmotnost suť 0,128 t/m2									
VV			výkres D.09.102									
VV			-136,891 "původní výměra									
VV			Mezisoučet									
VV			116,0 "obrusná vrstva, plocha odečtena digitálně									
VV			(4,9+0,5)*(2,9+0,5) "ložní vrstva									
VV			výkres D.11.402									
VV			dle tabulky kubatur									
VV			2,15*(2,24+0,5)									
VV			Mezisoučet									
VV			Součet									
4	K	113154254	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2,960	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00012	0,00036	0,25600	0,75776
P			Poznámka k položce: hmotnost suť 0,256 t/m2									
VV			výkres D.09.102									
VV			-16,066 "původní výměra									
VV			Mezisoučet									
VV			4,9*2,9 "podkladní vrstva									
VV			výkres D.11.402									
VV			dle tabulky kubatur									
VV			2,15*2,24									
VV			Mezisoučet									
VV			Součet									
5	K	131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	7,998	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
VV			-81,86 "původní výměra									
VV			Mezisoučet									
VV			výkres D.09.102									
VV			pro hradidlovou komoru									
VV			4,9*2,9*(3,15-0,6)									
VV			výkres D.11.402									
VV			dle tabulky kubatur									
VV			51,27									
VV			6,0*((0,25+0,1)/2*2,24)									
VV			Mezisoučet									
VV			Součet									
6	K	132311401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	2,232	0,00	0,00	D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
VV			D.09.102									
VV			obnažení stávající stoky do hloubky min. 0,5 m									
VV			3,6*2,9*0,5									
VV			-0,83*3,6 "stoka									
VV			Součet									
7	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepršení nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	-43,540	154,80	-6 739,99	SO 07.18.b	0,00149	-0,06487	0,00000	0,00000
VV			výkres D.11.402									
VV			-55,43 "původní výměra									
VV			Mezisoučet									
VV			11,89 "rýha									
VV			Součet									
8	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepršení nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	-43,540	43,00	-1 872,22	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
VV			dle položky zřízení									
VV			-55,43									
VV			11,89									
VV			Součet									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
9	K	151301902-R	Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření s ponecháním pažin ve výkopu hloubky do 8 m dle technologie dodavatele včetně lezního oddělení s ochranným košem	m2	51,840	0,00	0,00	SO 07.18.c	0,03945	2,04509	0,00000	0,00000
		WV	14,4*(3,1+0,5)		51,840							
10	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	10,230	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	-100,502 "původní výměra		-100,502							
		WV	zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět									
		WV	16,33*2		32,660							
		WV	ornice									
		WV	5,779*0,2*2		2,312							
		WV	přebytečná zemina na meziskládku									
		WV	89,858+2,232-16,33		75,760							
		WV	Součet		10,230							
11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,230	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	přebytečná zemina									
		WV	-65,53 "původní výměra		-65,530							
		WV	Mezisoučet		-65,530							
		WV	89,858+2,232"výkop		92,090							
		WV	-16,33 "zpětný zásyp		-16,330							
		WV	Mezisoučet		75,760							
		WV	Součet		10,230							
12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i	m3	102,300	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	10 příplateků									
		WV	-10*65,53		-655,300							
		WV	10*75,76		757,600							
		WV	Součet		102,300							
13	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	10,230	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	přebytečná zemina z meziskládky									
		WV	-65,53 "původní výměra		-65,530							
		WV	75,76		75,760							
		WV	Součet		10,230							
14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,414	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		P	Poznámka k položce:									
		WV	hmotnost zeminy 1,8 t/m3									
		WV	-65,53*1,8 "původní výměra		-117,954							
		WV	75,76*1,8		136,368							
		WV	Součet		18,414							
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	7,998	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	-81,86 "původní výměra		-81,860							
		WV	89,858		89,858							
		WV	Součet		7,998							
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-5,348	62,30	-333,18	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	-60,588 "původní výměra		-60,588							
		WV	Mezisoučet		-60,588							
		WV	náhrada výkopku									
		WV	výkres D.09.102									
		WV	36,236 "výkop		36,236							
		WV	-(6,38*1,97+1,8*1,8*0,24) "sachta		-13,346							
		WV	výkres D.11.402									
		WV	dle tabulky kubatur									
		WV	16,02		16,020							
		WV	Mezisoučet		38,910							
		WV	zemina z výkopu									
		WV	výkres D.11.402									
		WV	dle tabulky kubatur									
		WV	16,33		16,330							
		WV	Součet		-5,348							
17	M	58331202	šterkodrti netříděná do 100mm amfibolit	t	-10,696	345,00	-3 690,12	SO 07.18.b	1,00000	-10,69600	0,00000	0,00000
		WV	-44,258*2,0 "původní výměra		-88,516							
		WV	38,91*2,0		77,820							
		WV	Součet		-10,696							
		D 4	Vodorovné konstrukce				-1 519,95			-0,01112		0,00000
18	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	-0,289	3 232,90	-934,31	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	výkres D.09.102									
		WV	-1,7*1,7*0,1 "pod HK		-0,289							
19	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo práčů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	-0,013	45 049,40	-585,64	SO 07.18.b	0,85540	-0,01112	0,00000	0,00000
		P	Poznámka k položce:									
		WV	hmotnost 4,44 kg /m2									
		WV	-1,7*1,7*0,00444		-0,013							
		D 5	Komunikace pozemní				0,00			0,00000		0,00000
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7,776	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	výkres D.09.102									
		WV	-11,25 "původní výměra		-11,250							
		WV	Mezisoučet		-11,250							
		WV	4,9*2,9 "podkladní vrstva		14,210							
		WV	výkres D.11.402									
		WV	dle tabulky kubatur									
		WV	2,15*2,24		4,816							
		WV	Mezisoučet		19,026							
		WV	Součet		7,776							
21	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	7,776	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	výkres D.09.102									
		WV	-11,25 "původní výměra		-11,250							
		WV	Mezisoučet		-11,250							
		WV	4,9*2,9 "podkladní vrstva		14,210							
		WV	výkres D.11.402									
		WV	dle tabulky kubatur									
		WV	2,15*2,24		4,816							
		WV	Mezisoučet		19,026							
		WV	Součet		7,776							
22	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm	m2	7,776	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		WV	výkres D.09.102									
		WV	-11,25 "původní výměra		-11,250							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
		VV	2,939*1,9 "dle položky rozebrání dlažeb z lomového kamene		5,584							
		VV	6,406*2,3 "dle položky bourání zdiva kamenného		14,734							
		VV	8,9*0,302 "dle položky bourání potrubí z betonu		2,688							
		VV	3,393*1,76 "dle položky bourání šachet		5,972							
		VV	Mezisoučet		69,210							
		VV	Součet		3,897							
D		998	Přesun hmot				-1 130,60			0,00000		0,00000
45	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-10,149	55,70	-565,30	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	K	998274124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	-10,149	55,70	-565,30	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
D		OST	Ostatní				0,00			0,00000		0,00000
47	K	OST002	Projektová příprava	kpl	1,000	0,00	0,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nábřeží řeky Svatky - PPO města Brna – etapy VII a VIII

Objekt: SO 07.18.b - Hradidlová komora HKB - 09.b před čp. 538

Soupis: SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Úroveň 3: ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci-VÍCEPRÁCE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nábřeží Svatky	Datum:	30. 11. 2023
Zadavatel:		IČ:	449 92 785
	Statutární město Brno	DIČ:	CZ44992785
Uchazeč:		IČ:	463 42 796
	Společnost "PPO nábřeží Svatky - Brno"	DIČ:	CZ46342796
Projektant:		IČ:	262 36 419
		DIČ:	CZ26236419
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	

Poznámka:
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH		665 617,03	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	665 617,03	21,00%	139 779,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	805 396,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - PPO města Brna – etapy VII a VIII

Objekt:

D_09 - Úprava na stokách

Soupis:

01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Úroveň 3:

ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci-VÍCEPRÁCE

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

30. 11. 2023

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

Společnost "PPO nábřeží Svatky - Brno"

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	665 617,03
HSV - Práce a dodávky HSV	546 617,03
1 - Zemní práce	325 844,93
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	11 638,65
8 - Trubní vedení	206 762,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	617,10
997 - Přesun sutě	1 753,65
998 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	119 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nábřeží řeky Svatky - PPO města Brna – etapy VII a VIII

Objekt: D_09 - Úprava na stokách

Soupis: 01 - SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

Uroveň 3: ZM 068.01 - změna tvaru a provedení HK z prefa na monolitickou konstrukci- VÍCEPRÁCE

Místo: Nábřeží Svatky Datum: 30. 11. 2023
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč: Společnost "PPO nábřeží Svatky - Brno" Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem										665 617,03		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				546 617,03			-10,14873		3,89624
D	1		Zemní práce				325 844,93			-10,14873		3,89624
1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2,960	68,90	203,94	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,29000	0,85840
	P		Poznámka k položce: hmotnost suť 0,29 t/m2									
	VV		výkres D.09.102									
	VV		-16,066 "původní výměra			-16,066						
	VV		Mezisoučet			-16,066						
	VV		4,9*2,9 "podkladní vrstva			14,210						
	VV		výkres D.11.402									
	VV		dle tabulky kubatur									
	VV		2,15*2,24			4,816						
	VV		Mezisoučet			19,026						
	VV		Součet			2,960						
2	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	2,960	383,00	1 133,68	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,62500	1,85000
	P		Poznámka k položce: hmotnost suť 0,625 t/m2									
	VV		výkres D.09.102									
	VV		-16,066 "původní výměra			-16,066						
	VV		Mezisoučet			-16,066						
	VV		4,9*2,9 "podkladní vrstva			14,210						
	VV		výkres D.11.402									
	VV		dle tabulky kubatur									
	VV		2,15*2,24			4,816						
	VV		Mezisoučet			19,026						
	VV		Součet			2,960						
3	K	113154253	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	3,360	91,90	308,78	SO 07.18.b	0,00006	0,00020	0,12800	0,43008
	P		Poznámka k položce: hmotnost suť 0,128 t/m2									
	VV		výkres D.09.102									
	VV		-136,891 "původní výměra			-136,891						
	VV		Mezisoučet			-136,891						
	VV		116,0 "obrusná vrstva, plocha odečtena digitálně			116,000						
	VV		(4,9+0,5)*(2,9+0,5) "ložní vrstva			18,360						
	VV		výkres D.11.402									
	VV		dle tabulky kubatur									
	VV		2,15*(2,24+0,5)			5,891						
	VV		Mezisoučet			140,251						
	VV		Součet			3,360						
4	K	113154254	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2,960	125,40	371,18	SO 07.18.b	0,00012	0,00036	0,25600	0,75776
	P		Poznámka k položce: hmotnost suť 0,256 t/m2									
	VV		výkres D.09.102									
	VV		-16,066 "původní výměra			-16,066						
	VV		Mezisoučet			-16,066						
	VV		4,9*2,9 "podkladní vrstva			14,210						
	VV		výkres D.11.402									
	VV		dle tabulky kubatur									
	VV		2,15*2,24			4,816						
	VV		Mezisoučet			19,026						
	VV		Součet			2,960						
5	K	131351203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	7,998	446,20	3 568,71	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		-81,86 "původní výměra			-81,860						
	VV		Mezisoučet			-81,860						
	VV		výkres D.09.102									
	VV		pro hradidlovou komoru									
	VV		4,9*2,9*(3,15-0,6)			36,236						
	VV		výkres D.11.402									
	VV		dle tabulky kubatur									
	VV		51,27			51,270						
	VV		6,0*((0,25+0,1)/2*2,24)			2,352						
	VV		Mezisoučet			89,858						
	VV		Součet			7,998						
6	K	132311401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	2,232	2 378,00	5 307,70	D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		D.09.102									
	VV		obnažení stávající stoky do hloubky min. 0,5 m									
	VV		3,6*2,9*0,5			5,220						
	VV		-0,83*3,6 "stoka			-2,988						
	VV		Součet			2,232						
7	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	-43,540	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00149	-0,06487	0,00000	0,00000
	VV		výkres D.11.402									
	VV		-55,43 "původní výměra			-55,430						
	VV		Mezisoučet			-55,430						
	VV		11,89 "rýha			11,890						
	VV		Součet			-43,540						
8	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	-43,540	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	VV		dle položky zřízení									
	VV		-55,43			-55,430						
	VV		11,89			11,890						
	VV		Součet			-43,540						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
9	K	151301902-R	Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření s ponecháním pažin ve výkopu hloubky do 8 m dle technologie dodavatele včetně lezního oddělení s ochranným košem	m2	51,840	5 917,60	306 768,38	SO 07.18.c	0,03945	2,04509	0,00000	0,00000
		vv	14,4*(3,1+0,5)		51,840							
10	K	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	10,230	82,20	840,91	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		vv	-100,502 "původní výměra		-100,502							
		vv	zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět									
		vv	16,33*2		32,660							
		vv	ornice									
		vv	5,779*0,2*2		2,312							
		vv	přebytečná zemina na meziskládku									
		vv	89,858+2,232-16,33		75,760							
		vv	Součet		10,230							
11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,230	239,20	2 447,02	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		vv	přebytečná zemina									
		vv	-65,53 "původní výměra		-65,530							
		vv	Mezisoučet		-65,530							
		vv	89,858+2,232"výkop		92,090							
		vv	-16,33 "zpětný zásyp		-16,330							
		vv	Mezisoučet		75,760							
		vv	Součet		10,230							
12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i	m3	102,300	6,70	685,41	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		vv	10 příplateků									
		vv	-10*65,53		-655,300							
		vv	10*75,76		757,600							
		vv	Součet		102,300							
13	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	10,230	44,50	455,24	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		vv	přebytečná zemina z meziskládky									
		vv	-65,53 "původní výměra		-65,530							
		vv	75,76		75,760							
		vv	Součet		10,230							
14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,414	200,00	3 682,80	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		P	Poznámka k položce:									
		vv	hmotnost zeminy 1,8 t/m3									
		vv	-65,53*1,8 "původní výměra		-117,954							
		vv	75,76*1,8		136,368							
		vv	Součet		18,414							
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	7,998	8,90	71,18	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		vv	-81,86 "původní výměra		-81,860							
		vv	89,858		89,858							
		vv	Součet		7,998							
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-5,348	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		vv	-60,588 "původní výměra		-60,588							
		vv	Mezisoučet		-60,588							
		vv	náhrada výkopku									
		vv	výkres D.09.102									
		vv	36,236 "výkop		36,236							
		vv	-(6,38*1,97+1,8*1,8*0,24) "sachta		-13,346							
		vv	výkres D.11.402									
		vv	dle tabulky kubatur									
		vv	16,02		16,020							
		vv	Mezisoučet		38,910							
		vv	zemina z výkopu									
		vv	výkres D.11.402									
		vv	dle tabulky kubatur									
		vv	16,33		16,330							
		vv	Součet		-5,348							
17	M	58331202	šterkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	-10,696	0,00	0,00	SO 07.18.b	1,00000	-10,69600	0,00000	0,00000
		vv	-44,258*2,0 "původní výměra		-88,516							
		vv	38,91*2,0		77,820							
		vv	Součet		-10,696							
		D 4	Vodorovné konstrukce				0,00			-0,01112		0,00000
18	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	-0,289	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		vv	výkres D.09.102									
		vv	-1,7*1,7*0,1 "pod HK		-0,289							
19	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo práčů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	-0,013	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,85540	-0,01112	0,00000	0,00000
		P	Poznámka k položce:									
		vv	hmotnost 4,44 kg /m2									
		vv	-1,7*1,7*0,00444		-0,013							
		D 5	Komunikace pozemní				11 638,65			0,00000		0,00000
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7,776	169,10	1 314,92	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		vv	výkres D.09.102									
		vv	-11,25 "původní výměra		-11,250							
		vv	Mezisoučet		-11,250							
		vv	4,9*2,9 "podkladní vrstva		14,210							
		vv	výkres D.11.402									
		vv	dle tabulky kubatur									
		vv	2,15*2,24		4,816							
		vv	Mezisoučet		19,026							
		vv	Součet		7,776							
21	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	7,776	615,70	4 787,68	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		vv	výkres D.09.102									
		vv	-11,25 "původní výměra		-11,250							
		vv	Mezisoučet		-11,250							
		vv	4,9*2,9 "podkladní vrstva		14,210							
		vv	výkres D.11.402									
		vv	dle tabulky kubatur									
		vv	2,15*2,24		4,816							
		vv	Mezisoučet		19,026							
		vv	Součet		7,776							
22	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm	m2	7,776	555,60	4 320,35	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		vv	výkres D.09.102									
		vv	-11,25 "původní výměra		-11,250							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
		VV	2,939*1,9 "dle položky rozebrání dlažeb z lomového kamene		5,584							
		VV	6,406*2,3 "dle položky bourání zdiva kamenného		14,734							
		VV	8,9*0,302 "dle položky bourání potrubí z betonu		2,688							
		VV	3,393*1,76 "dle položky bourání šachet		5,972							
		VV	Mezisoučet		69,210							
		VV	Součet		3,897							
D		998	Přesun hmot				0,00			0,00000		0,00000
45	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-10,149	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	K	998274124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	-10,149	0,00	0,00	SO 07.18.b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
D		OST	Ostatní				119 000,00			0,00000		0,00000
47	K	OST002	Projektová příprava	kpl	1,000	119 000,00	119 000,00		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.09_001: ZMĚNA 068 – Úpravy tvarů na hradidlových komorách

SO 07.18.a. Hradidlová komora HKB-09.a u Ronda

SO 07.18.b. Hradidlová komora HKB-09.b před čp. 538

ZMĚNA 068 – ÚPRAVY TVARŮ NA HRADIDLOVÝCH KOMORÁCH

Na základě zjištěného stavu stávajících šachet a nepřesnosti podkladů o průběhu stávajícího potrubí bylo za účasti provozu BVK domluveno, že dojde k úpravám hradidlových komor HKB.09.a a HKB.09.b z prefabrikovaných šachet na monolitické. Změna nemá vliv na fungování hradidlových komor.

SO 07.18.a. Hradidlová komora HKB-09.a u Ronda

Hradidlová komora bude vybudována přímo nad kmenovou stokou B. Při výkopu bude obnaženo stávající potrubí stoky. Výkop bude provedený 0,5 m pod vrch potrubí. Prostor bude následně vyplněný prostým betonem C20/25. Na tento beton bude provedena základová deska šachty tl. 0,17 m s vloženou výztuží dle armovacího výkresu. Vnitřní tvar šachty bude čtvercový o půdorysných rozměrech 1,5 x 1,5 m. Výška šachty bude 1,85 m. Strop šachty bude tvořený prefabrikovanou zákrytovou deskou s otvorem 1,0 m. Na tuto desku bude následně osazen kanalizační konus. Šachta bude ukončena samonivelačním poklopem.

Betonáž šachty bude ze 3 stran probíhat do pažení. Z jedné strany bude oboustranné bednění. Na odtoku ze šachty bude osazeno hradidlo DN 400. Ovládací tyč hradidla bude vytažena skrz zákrytovou desku, ve které bude vyvrtán otvor. Ovládání bude zakryto litinovým šoupátkovým poklopem. Po osazení hradidla bude v šachtě provedena kyneta z betonu C30/37. Ze šachty bude provedeno propojení litinovým potrubím DN 400 do kmenové stoky B. Propoj nebude nijak hrazený a výškově bude dno propojovacího potrubí 0,4 m nad dnem šachty. Napojení do šachty a kmenové stoky B bude provedeno jádrovým odvrtem DN 450 mm. Mezikruží bude vyplněno vysocerozpínavou sanační maltou odolnou agresivnímu prostředí. Litinové potrubí bude obetonováno betonem C20/25 v min. tl. 150 mm. Vlastní šachta bude provedena z ŽB C30/37. Obnovení asfaltové obrusné vrstvy bude provedeno v celé šíři dotčené komunikace s min. přesahem 10 m od hrany výkopu. Přesah ložní vrstvy bude min. 0,25 m přes hrany výkopu. V místech napojení nové části silnice i/42 na stávající vozovku bude spára mezi novou a stávající vozovkou provedena zaříznutím s následným ošetřením asfaltovou modifikovanou zálivkou.

Stávající potrubí mezi šachtou a zaústěním do toku bude vybouráno a osazeno nové.

Úpravou nedošlo k dotčení nových pozemků.

SO 07.18.b. Hradidlová komora HKB-09.b u čp. 538

Hradidlová komora bude vybudována přímo nad kmenovou stokou B. Při výkopu bude obnaženo stávající potrubí stoky. Výkop bude provedený 0,5 m pod vrch potrubí. Prostor bude následně vyplněný prostým betonem C20/25. Na tento beton bude provedena základová deska šachty tl. 0,17 m s vloženou výztuží dle armovacího výkresu. Vnitřní tvar šachty bude čtvercový o půdorysných rozměrech 1,5 x 1,5 m. Výška šachty bude 1,85 m. Strop šachty bude tvořený prefabrikovanou zákrytovou deskou s otvorem 1,0 m. Na tuto desku bude následně osazen kanalizační konus. Šachta bude ukončena samonivelačním poklopem.


Betonáž šachty bude ze 3 stran probíhat do pažení. Z jedné strany bude oboustranné bednění. Na odtoku ze šachty bude osazeno hradidlo DN 400. Ovládací tyč hradidla bude vytažena skrz zákrytovou desku, ve které bude vyvrtán otvor. Ovládání bude zakryto litinovým šoupátkovým poklopem. Po osazení hradidla bude v šachtě provedena kyneta z betonu C30/37. Ze šachty bude provedeno propojení litinovým potrubím DN 400 do kmenové stoky B. Propoj nebude nijak hrazený a výškově bude dno propojovacího potrubí 0,4 m nad dnem šachty. Napojení

do šachty a kmenové stoky B bude provedeno jádrovým odvrtem DN 450 mm. Mezikruží bude vyplnění vysocerozpínavou sanační maltou odolnou agresivnímu prostředí. Litinové potrubí bude obetonováno betonem C20/25 v min. tl. 150 mm. Vlastní šachta bude provedena z ŽB C30/37. Obnovení asfaltové obrusné vrstvy bude provedeno v celé šíři dotčené komunikace s min. přesahem 10 m od hrany výkopu. Přesah ložní vrstvy bude min. 0,25 m přes hrany výkopu. V místech napojení nové části silnice i/42 na stávající vozovku bude spára mezi novou a stávající vozovkou provedena zaříznutím s následným ošetřením asfaltovou modifikovanou zálivkou.


Stávající potrubí mezi šachtou a zaústěním do toku bude vybouráno a osazeno nové.

Úpravou nedošlo k dotčení nových pozemků.


V Hradci Králové, prosinec 2023




PŮDORYS

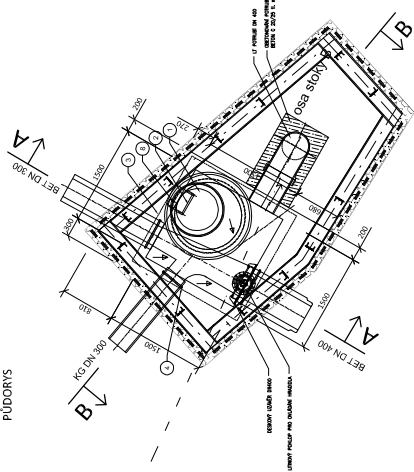

REZ A - A

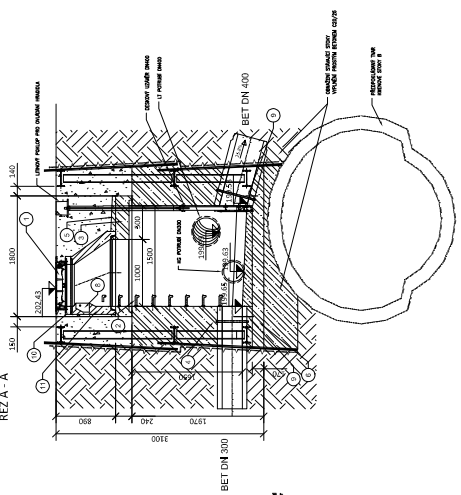

REZ B - B

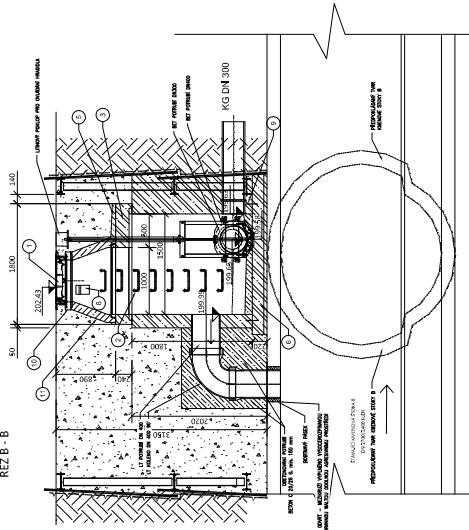

LEGENDA:

- 1 - KRUHOVÝ KANALIZAČNÍ POKROV DN600
- 2 - OCELOVÉ STUPADLO SACHET S POLYETYLENOVÝM POTIAHEM
- 3 - PREFABRIKOVANÁ PŘECHODOVÁ ČTYRKOVÁ DESKA - TZK-Q 150-100/27 ZDK-TYP Q.1
- 4 - BERTONITOVÝ BOBITNÝ PÁSEK 25 x 20 mm, LEPENÍ POMOČI
- 5 - PRŮJZHEM VĚTŠÍHO VÝŠKOVÉHO KANALIZAČNÍHO VÝVODU
- 6 - ŽELEZOBETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA TL. 170 mm
- 7 - ŠTERKOPISKOVÝ PODSP. TL. 0,15 m
- 8 - KARSOVÉ OCELOVÉ STUPADLO S PE POTIAHEM, OTVOR 135 x 200 x 175 mm
- 9 - TESNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY
- 10 - VÝKONNÁ PRSTENEC DN 600, VÝŠKA 80 mm
- 11 - PŘECHODOVÁ SRUŽ - KONUS TL. 120 mm, DN 1000

POZNÁMKA:

- ŠACHTA BUDE PROVĚŘENA Z ŽELEZOBETONU C30/37 TL. STĚNY MIN 200 mm

LEGENDA ŠRAF:

- PROSTÝ BETON C30/37
- ŽELEZOBETON C30/37
- STAVAJÍCÍ TERÉN
- VYKLENÁ ZEMINA

rozhodne zad je nutné v tomto místě provádět pomocnou konstrukci. Výkres bude upraven. Zhotovitel zašle AD potřebné podklady. Probíhá kontrola rozpočtáře. Zodpovídá AD a TDI

23.1.2024 V den konání kontrolního dne vyhotoví AD zápis do stavebního deníku a přiloží výkres, který bude obsahovat zmenšený rozsah pomocné konstrukce. TDI společně se zástupci zhotovitele do technického dne 30.1.2024 prověří, zda nevznikají méněpráce. Zodpovídá AD,TDI, Zhotovitel

6. Úpravy tvarů na hradidlových komorách ZM068

31.10.2023 Dne 16.8. 2023 proběhla schůzka za účasti provozu BVK, zhotovitele a TDI, kde bylo domluveno, že dojde k úpravám tvarů šachet HKB 09a a HKB 09b na základě jejich zjištěného stavu. Změnu DPS zpracuje AD do 14.11.2023 Zodpovídá AD

14.11.2023 AD zaslal výkres tvarů pro HKB 09a i HKB09B, chybí vyjádření k HKB 09b. Neexistuje správce těchto dvou hradidlových komor. K tvarům obou komor se vyjádří provoz BVK a zhotovitel potvrdí proveditelnost. Poté bude AD zpracuje výkres výztuže a zašle veškeré podklady na OI MMB, kvůli určení budoucího správce. Zodpovídá AD

28.11.2023 Technicky bylo řešení odsouhlaseno TDI i provozem BVK. AD zaslal zástupci OI MMB podklady pro určení budoucího správce.

AD zpracuje VV do 1.12.2023. Zodpovídá AD za VV a OI MMB za určení budoucího správce
12.12.2023 Řešení bude vloženo na sdílené úložiště. AD zaslal požadované podklady pro určení budoucího správce zástupci OI MMB.

9.1.2024 Zhotovitel nacenil VV a probíhá kontrola rozpočtáře TDI (BVK) kontrola je přislíbena do příštího KD. Zástupce OI MMB informoval, že předal podklady pro určení budoucího správce – info na příštím KD.

Zodpovídá TDI za kontrolu VV a OI MMB za určení budoucího správce

24.1.2024 Kontrola rozpočtáře proběhla. Zhotovitel zkontroluje ZL. Na dnešním KD byla dořešena částka za zpracování PD. Budoucí správce zatím nebyl stanoven, ale pravděpodobně bude správcem ŘSD (Info OI MMB) Za ZL zodpovídá zhotovitel

7. Schodišťová zídka u kolonády ZM069

31.10.2023 Zhotovitel upozornil na nesoulad v délce štetovnic a hloubce výkopu v místě schodišťové zídky u kolonády, která je součástí objektu SO 07.19 – Betonové gravitační zídky. Pravděpodobně dojde k úpravě DPS a to i s ohledem na vzdálenost mostního objektu. Zástupce AD Vyhotoví své závazné stanovisko a poté zpracuje technické řešení. Zodpovídá AD

14.11.2023 AD svolá ještě na tento týden schůzku se správcem mostu a TDI. Poté vyhotoví závazné stanovisko a zpracuje změnovou DPS. Info na příštím KD. Zodpovídá AD

28.11.2023 Schůzka se správcem mostu, kde AD představil koncept řešení proběhla. AD zpracuje revizi DPS do 5.12.2023. Zodpovídá AD

12.12.2023 AD zaslal změnu DPS v elektronické podobě. Řešení bylo na KD odsouhlaseno zhotovitelem i TDI. Tištěnou verzi dokumentace a VV AD vyhotoví do 19.12.2023. Zodpovídá AD

9.1.2024 TDI obdržel tištěnou verzi DPS včetně VV. Kontrola rozpočtáře (Bkom) přislíbena do příštího KD.

Zodpovídá TDI

23.1.2024 Zhotovitel zašle naceněný VV, kontrola rozpočtáře TDI (BKom) pokračuje. Po konání KD byla přislíbena do 30.1.2024. Zodpovídá zhotovitel za zaslání naceněného VV a TDI za kontrolu

8. Nově zjištěné zaústění do koryta řeky km 39.875 ZM 22.04

14.11.2023 V rámci postupu prací bylo zjištěno nové zaústění do koryta řeky ve staničení 39.875, které není v DPS a je funkční. Pravděpodobně se jedná o dešťovou kanalizaci z areálu koupaliště Riviéra. AD připraví návrh řešení. Info na příštím KD.

28.11.2023 AD obdržel zaměření od zhotovitele. Návrh řešení zpracuje do 8.12.2023. Zodpovídá AD

12.12.2023 Zástupce AD informoval, že má dnes schůzku na místě se zástupce Starez a technické řešení zpracuje do 15.12.2023. Zodpovídá AD

9.1.2024 Zástupce AD informoval, že dle informací od zástupce Starez budou do konce týdne výsledky kamerových zkoušek, na základě kterých bude možné zpracovat řešení. AD prověří, zda v tomto místě dochází k navýšení terénu. Zodpovídá AD

23.1.2024 AD na dnešním KD informoval, že na základě výsledků kamerových zkoušek provede Starez úpravy na vnitřní areálové kanalizaci. Terén v místě zaústění je navržen ve stávajícím stavu. Projektant prověřil, že na základě výše uvedeného nejsou zapotřebí žádné úpravy v odsouhlasené projektové dokumentaci. Místo bude provedeno dle PD. Zhotovitel PPO je v kontaktu se zástupci Sportovního klubu Policie Kometa a informuje je při provádění prací v místě, aby si mohli na své náklady upravit stávající nátok pro závlahy. Bod bude vypuštěn. Za kontaktování Sportovního klubu Policie Kometa zodpovídá zhotovitel
