

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II. Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 431 - Přeložka VO		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 431/001	Číslo ZBV: 5
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: Starmosty s.r.o. Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČ: 07122764			
Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	184 601,93	184 601,93
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	184 601,93	184 601,93
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II. Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 431 - Přeložka VO	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 431/001	Číslo ZBV / Skupina změny: 5 . 3
---	--	---

Strany smlouvy o dílo S-2693/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 07.09.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Starmosty s.r.o., Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

Přílohy Změnového listu:			Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů	1	počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách	3	počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů	

Iniciátor Změny: zhotovitel

Předmět Změny: Chodník a komunikace

Název (dílčí) Změny:

Chodník

Na základě dopracování PDPS do stupně RDS bylo upřesněno množství a na základě této skutečnosti došlo k navýšení rozsahu na opravě chodníku.

Dokladem je příloha č. 12 Geodetické zaměření opravy chodníku a příloha č. 14 zápis ve SD ze dne 21.4.2024

Dopad do položek č. 6, č. 20 a č. 101

Siezd / komunikace

Na základě dopracování PDPS do stupně RDS bylo upřesněno množství a na základě této skutečnosti došlo k navýšení rozsahu u siezdu komunikace.

Dokladem je příloha č. 13 Geodetické zaměření komunikace / DOPS

Dopad do položek č. 2, č. 5, 14, č.15, č.16, č.17, č.18 a č.19

Jedná se o Změnu nepodstatatnou, nepředvídanou, resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby Silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění Změn závazků dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek Zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných Zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje podstatnou Změnu Závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	184 601,93	184 601,93	184 601,93

Technická pomoc Objednatele jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Michal Kabela podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Pavel Hrdina podpis

Stavební dozor: jméno Ing. David Křemeček podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele: jméno Jan Zákostelský, DiS. podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler,Dis. podpis

Zhotovitel: jméno Michal Kabela podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Název Stavby:	III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 431/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Přeložka VO

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
238 801,14

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	238 801,14	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	184 601,93	184 601,93	77,30%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	423 403,07	184 601,93	77,30%

Rozpis položek a cen Změny ZBV 5													
Název stavby dle SoD: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II. Číslo a název SO/PS: SO 431 Přeložka VO Číslo a název rozpočtu: SO 431 Přeložka VO								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 431					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	4,704	12,318	7,614	1 191,44	5 604,53	0,00	9 071,62	14 676,15	9 071,62	161,86%
5	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	4,704	12,318	7,614	986,06	4 638,43	0,00	7 508,26	12 146,69	7 508,26	161,87%
6	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	30,000	88,000	58,000	704,83	21 144,90	0,00	40 880,14	62 025,04	40 880,14	193,33%
14	562102	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II	M3	1,176	3,064	1,888	2 695,77	3 170,23	0,00	5 089,61	8 259,84	5 089,61	160,54%
15	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1,400	4,546	3,146	1 102,75	1 543,85	0,00	3 469,25	5 013,10	3 469,25	224,71%
16	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	33,600	73,776	40,176	207,66	6 977,38	0,00	8 342,95	15 320,33	8 342,95	119,57%
17	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	18,200	39,740	21,540	731,16	13 307,11	0,00	15 749,19	29 056,30	15 749,19	118,35%
18	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	15,400	34,036	18,636	914,63	14 085,30	0,00	17 045,04	31 130,34	17 045,04	121,01%
19	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	12,600	28,332	15,732	890,34	11 218,28	0,00	14 006,83	25 225,11	14 006,83	124,86%
20	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	30,000	88,000	58,000	1 024,56	30 736,80	0,00	59 424,48	90 161,28	59 424,48	193,33%
Nové položky													
101	93831.N	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU	M2	0,000	88,000	88,000	45,62	0,00	0,00	4 014,56	4 014,56	4 014,56	100,00%
Celkem								112 426,81	0,00	184 601,93	297 028,74	184 601,93	

Za Zhotovitele: Michal Kabela

Za Objednatele: Ing. David Křemeček

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název stavby:	III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 431 - Přeložka VO
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 431/001

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách č. 01	3
08 Oznámení zhotovitele ze dne	1
09 Souhlas investora s navrženým řešením	1
10 Vyjádření TDS ze dne 13.5.2024	1
11 Vyjádření AD ze dne 6.9.2024	1
12 Geodetické zaměření opravy chodníku	1
13 Geodetické zaměření komunikace / DSPS	3
14 Zápis ve SD ze dne 21.4.2024	1
Počet listů celkem	9

Soupis prací SO po všech změnách														
Název stavby dle SoD: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II. Číslo a název SO/PS: SO 431 Přeložka VO Číslo a název rozpočtu: SO 431 Přeložka VO								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								SO 431						
								celkem po všech změnách						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0 Všeobecné konstrukce a práce														
	)	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	13,742	13,742	0,000	430,60	5 917,31	0,00	0,00	5 917,31	0,00	0,00%
			0,35*(0,2)*60=4,200 [A] 0,6*(0,46+0,25)*(7,2+8,2+7,0)=9,542 [B] Celkem: A+B=13,742 [C]											
2		014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	4,704	12,318	7,614	1 191,44	5 604,53	0,00	9 071,62	14 676,15	9 071,62	161,86%
			AB vozovka 4,704=4,704 [A] ZBV 5 Oprava chodníku 7,614=7,614[B] Celkem: A+B=12,318[C]											
3		02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	7 380,83	7 380,83	0,00	0,00	7 380,83	0,00	0,00%
			vytyčení a zaměření objektu											
4		02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	3 251,07	3 251,07	0,00	0,00	3 251,07	0,00	0,00%
			v tištěné a digitální formě											
1 Zemní práce														
5		11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	4,704	12,318	7,614	986,06	4 638,43	0,00	7 508,26	12 146,69	7 508,26	161,87%
			asfaltová vozovka (1,0*0,2+1,4*0,12+1,8*0,05+2,2*0,05+2,6*0,04)*7,0=4,704 [A] ZBV 5 Oprava chodníku 15,732*0,2+15,732*0,12+15,732*0,05+18,636*0,05+21,54*0,04=7,614[B] Celkem: A+B=12,318[C]											
6		11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	30,000	88,000	58,000	704,83	21 144,90	0,00	40 880,14	62 025,04	40 880,14	193,33%
			chodník ze zámkové dlažby 0,5*60=30,000 [A] ZBV 5 Oprava chodníku PDPS: -30,0= -30,000 [B] RDS - oprava celého chodníku dle geodet. Zaměření 88,0=88,000 [C] Celkem: A+B+C=88,000 [D]											
7		11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	2,000	2,000	0,000	184,37	368,74	0,00	0,00	368,74	0,00	0,00%
8		125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	18,446	18,446	0,000	218,22	4 025,29	0,00	0,00	4 025,29	0,00	0,00%
			přebytečná zemina z výkopů 0,35*(0,2)*60=4,200 [A] 0,6*(0,46+0,25)*(7,2+8,2+7,0)=9,542 [B] 4,704=4,704 [C] Celkem: A+B+C=18,446 [D]											
9		13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	17,296	17,296	0,000	1 185,60	20 506,14	0,00	0,00	20 506,14	0,00	0,00%
			kabelová trasa 0,35*0,35*60=7,350 [A] 0,6*(1,2-0,46)*(7,2+8,2+7,0)=9,946 [B] Celkem: A+B=17,296 [C]											
10		17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTUTNĚNÍ	M3	18,446	18,446	0,000	23,34	430,53	0,00	0,00	430,53	0,00	0,00%
			přebytečná zemina z výkopů 0,35*(0,2)*60=4,200 [A] 0,6*(0,46+0,25)*(7,2+8,2+7,0)=9,542 [B] 4,704=4,704 [C] Celkem: A+B+C=18,446 [D]											
11		17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHTUTNĚNÍM	M3	9,736	9,736	0,000	193,71	1 885,96	0,00	0,00	1 885,96	0,00	0,00%
			0,35*(0,35-0,2)*60=3,150 [A] 0,6*(1,2-0,46-0,25)*(7,2+8,2+7,0)=6,586 [B] Celkem: A+B=9,736 [C]											
12		17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,200	4,200	0,000	546,12	2 293,70	0,00	0,00	2 293,70	0,00	0,00%
			pískové lože											

		0,35*0,2*60=4,200 [A]											
4 Vodorovné konstrukce													
13	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,672	0,672	0,000	3 810,03	2 560,34	0,00	0,00	2 560,34	0,00	0,00%
		beton C12/15-X0											
		0,6*0,05*(7,0+7,2+8,2)=0,672 [A]											
5 Komunikace													
14	562102	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II	M3	1,176	3,064	1,888	2 695,77	3 170,23	0,00	5 089,61	8 259,84	5 089,61	160,54%
		SC-C											
		1,4*0,12*7,0=1,176 [A]											
		ZBV 5 Oprava chodníku											
		RDS: 15,732*0,12=1,888 [B]											
		Celkem: A+B=3,064 [D]											
15	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1,400	4,546	3,146	1 102,75	1 543,85	0,00	3 469,25	5 013,10	3 469,25	224,71%
		1,0*0,2*7,0=1,400 [A]											
		ZBV 5 Oprava chodníku											
		RDS: 15,732*0,2=3,146[B]											
		Celkem: A+B=4,546[C]											
16	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	33,600	73,776	40,176	207,66	6 977,38	0,00	8 342,95	15 320,33	8 342,95	119,57%
		PS-CP 0,35 Kg/m2											
		(2,6+2,2)*7,0=33,600 [A]											
		ZBV 5 Oprava chodníku											
		Navýšení živice dle geodetického zaměření viz pol č. 574B34 a 574D46											
		40,176=40,176 [B]											
		Celkem: A+B=73,776 [C]											
17	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	18,200	39,740	21,540	731,16	13 307,11	0,00	15 749,19	29 056,30	15 749,19	118,35%
		ACO 11+, PnB 45/80-65											
		2,6*7,0=18,200 [A]											
		ZBV 5 Oprava chodníku											
		Navýšení živice dle geodetického zaměření											
		21,54=21,540[B]											
		Celkem: A+B=39,74[C]											
18	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	15,400	34,036	18,636	914,63	14 085,30	0,00	17 045,04	31 130,34	17 045,04	121,01%
		ACL 16+, PnB 25/55-60											
		2,2*7,0=15,400 [A]											
		ZBV 5 Oprava chodníku											
		Navýšení živice dle geodetického zaměření, dle výkresu č. 3 SO 431 PDPS											
		odměřeno z DWG 21,54-(3,89*0,2+6,65*0,2+3,98*0,2)=18,636 [B]											
		Celkem: A+B=34,036[C]											
19	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	12,600	28,332	15,732	890,34	11 218,28	0,00	14 006,83	25 225,11	14 006,83	124,86%
		1,8*7,0=12,600 [A]											
		ZBV 5 Oprava chodníku											
		Navýšení živice dle geodetického zaměření, dle výkresu č. 3 SO 431 PDPS											
		odměřeno z DWG 21,54-2*(3,89*0,2+6,65*0,2+3,98*0,2)=15,732 [B]											
		Celkem: A+B=28,332 [C]											
20	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	30,000	88,000	58,000	1 024,56	30 736,80	0,00	59 424,48	90 161,28	59 424,48	193,33%
		oprava chodníku											
		0,5*60=30,000 [A]											
		ZBV 5 Oprava chodníku											
		PDPS -30,0=-30,000 [B]											
		RDS - oprava celého chodní ku dle geodet. Zaměření											
		88,0=88,000 [C]											
		Celkem: A+B+C=88,000 [D]											
7 Přidružená stavební výroba													
21	702322	ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	60,000	60,000	0,000	7,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00%
		60=60,000 [A]											
22	703442	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	M	5,000	5,000	0,000	508,78	2 543,90	0,00	0,00	2 543,90	0,00	0,00%
		ocelová chránička (žárově zinkovaná) na kabelový svod											

		2,5*2=5,000 [A]											
23	742258	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD	KUS	2,000	2,000	0,000	2 725,95	5 451,90	0,00	0,00	5 451,90	0,00	0,00%
24	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	90,000	90,000	0,000	286,95	25 825,50	0,00	0,00	25 825,50	0,00	0,00%
		kabel CYKY 4-Jx16											
		dodávka a montáž											
		90=90,000 [A]											
25	742H22	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	10,000	10,000	0,000	101,41	1 014,10	0,00	0,00	1 014,10	0,00	0,00%
		AYKY 4-Jx16, kabelový svod z holých vodičů											
		2*5=10,000 [A]											
26	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	4,000	4,000	0,000	375,75	1 503,00	0,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00%
		4=4,000 [A]											
27	742Z22	DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X)	M	62,000	62,000	0,000	21,00	1 302,00	0,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00%
		vodič VO											
28	743C11	SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ	KUS	2,000	2,000	0,000	3 870,71	7 741,42	0,00	0,00	7 741,42	0,00	0,00%
		pojistková skříň SP100											
		dodávkaa montáž											
29	744I01	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	2,000	2,000	0,000	54,85	109,70	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00%
30	744R12	SVORKA OD 4 DO 16 MM2	KUS	3,000	3,000	0,000	393,26	1 179,78	0,00	0,00	1 179,78	0,00	0,00%
		proudová svorka na kabel svodu											
		dodávka a montáž											
31	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS.	KUS	1,000	1,000	0,000	8 454,41	8 454,41	0,00	0,00	8 454,41	0,00	0,00%
		výchozí revize, včetně zprávy											
8 Potrubí													
32	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	49,280	49,280	0,000	95,69	4 715,60	0,00	0,00	4 715,60	0,00	0,00%
		chránička HDPE 110/94, včetně utěsnění konců a protahovacího lanka											
		2*(7,0+7,2+8,2)*1,1=49,280 [A]											
33	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,688	2,688	0,000	4 856,76	13 054,97	0,00	0,00	13 054,97	0,00	0,00%
		0,6*0,2*(7,0+7,2+8,2)=2,688 [A]											
9 Ostatní konstrukce a práce													
34	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	14,000	14,000	0,000	141,64	1 982,96	0,00	0,00	1 982,96	0,00	0,00%
		prořiznutí spáry mezi novou a starou vozovkou											
		2*7=14,000 [A]											
35	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	14,000	14,000	0,000	175,37	2 455,18	0,00	0,00	2 455,18	0,00	0,00%
		zalití spáry mezi sataou a novou vozovkou											
		2*7=14,000 [A]											
Nové položky													
101	93831.N	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU	M2	0,000	88,000	88,000	45,62	0,00	0,00	4 014,56	4 014,56	4 014,56	100,00%
		JC dle OTSKP 2024											
		ZBV 5 Oprava chodníku											
		očištění dlaždic - oprava původního chodníku dle geodet. Zaměření											
		88,0=88,000 [A]											
		Celkem						238 801,14	0,00	184 601,93	423 403,07	184 601,93	16,79

Příjemce:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Jan Zákostelský, DiS.

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov



V Praze, dne 18.10.2023

Věc: Oznámení zhotovitele objednateli o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci na základě §18, odst. 1, písmeno f Směrnice R-Sm-36 ze dne 1.1.2022

Název akce: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.


Číslo smlouvy: S-2693/00066001/2023

Při zahájení demolice stávající opěrné zdi nedošlo k realizaci přeložky NN SO 401, která není součástí naší SoD. Z tohoto důvodu bude nutné dočasně vynechat dilatační celek zdi DC2. Dojde ke změně pracovního postupu v důsledku překážející podpěry NN SO 401.

Změna v postupu prací: zhotovení dilatačních celků DC1, DC3, DC4 a DC5, kdy bude vynechán dilatační celek DC2, propojení mezi DC1, DC2 a DC3 bude zhotoveno provizorním pažením. Výkop podél celé stěny bude provizorně zasypán a následně bude provizorně zhotoven živičný kryt. Po vyřešení překážek, bude provizorní násyp odtěžen, vybetonován dilatační celek DC2 a bude zhotoveno vozovkové souvrství.

Žádáme objednatele o sdělení dalšího postupu.

S pozdravem



**Starmosty s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha Modřany
Michal Kabela**

Vyřizuje / telefon

Říčany

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39“ po projednání s TDS a AD souhlasí s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

S ohledem na objektivně nepředvídatelné skutečnosti zjištěné na stavbě během provádění prací týkající nerealizace přeložky vedení NN společností ČEZ, bylo nutné vynechat dilatační celek zdi DC2. S ohledem na tuto skutečnost dojde ke změně postupu provádění prací.

Dojde ke zhotovení dilatačních celků DC1, DC3, DC4, DC5. Propojení mezi DC1 DC2 a DC3 bude po dobu zimní technologické přestávky zhotoveno provizorním pažením. Výkop celé stěny bude provizorně zasypán a následně provizorně zhotoven živichý kryt, tak aby mohla probíhat zimní údržba na komunikaci III/6031. Následně dojde k odtěžení násypu, vybetonování DC2 a bude zhotoveno vozovkové souvrství.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc:	Vyjádření TDS k ZBV 5
Stavba:	III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č. p .39 - II
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Objekt:	SO 431 Přeložka VO
Zhotovitel:	Starmosty s.r.o.

1. Výše uvedený návrh ZBV vyplývá z upřesnění rozsahu na základě během stavby zjištěných skutečností. Jedná se úpravu dotčených položek týkající se opravy chodníku a sjezdu / komunikace. Změny dokumentovány geodetickým zaměřením (viz příslušné přílohy).
2. Potvrzuji, že změna je vyvolána v průběhu provádění stavby. Navrhovaná změna zároveň negativně neovlivňuje postup a bezpečnost průběhu stavby, ani její následné užívání.
3. S návrhem výše uvedeného ZBV souhlasím.

Dne 13.5.2024

S pozdravem



Technický dozor stavby

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Aleš Čermák MBA
Zborovská 11
Praha, 150 00

Čj : PX 2024
V Praze : 6. září 2024
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina



Akce: III/6031 Senohraby, průtah
Věc: Vyjádření AD č. 6

Vážený pane řediteli,



AD obdržel emailem dne 29. 8. 2024 doplněný koncept ZBV č. 5, jehož předmětem je rozšířená úprava vozovky po přeložce napájecího kabelu veřejného osvětlení.

V rámci zadávací dokumentace byl veden ve společné rýze s SO 401. Energetické elektrické kabely, jejichž přeložka je předmětem SO 401, však nebyly provedeny současně a bylo nutné provést zapravení rýhy po přeložce.

AD s návrhem ZBV č. 5 souhlasí

S pozdravem za Pontex, spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina





Q

50/2

39/2

56

Q

358/2

Q

49/2

473/12

Hlavní

476/17

544

rekonstrukce chodníku 32m2

Q

414/3

527/3

Q

527/1

rekonstrukce chodníku 56m2

571

53/1

100

62/2

613

64



GEODETICKÁ DOKUMENTACE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Název

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY „III/6031 v k.ú. Senohraby , okres Praha-východ, č. zak.: 6/2024

Zhotovitel:

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o., IČO 61682764, Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV , tel: 318 628 853, e-mail: office@geodetpb.cz

Investor:

KRAJSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.

Použité přístroje

Způsob stabilizace měřických bodů

SOKKIA IX603, GNSS-Sokkia GRX3.**hřeby, fixem**

Souřadnicový systém	Výškový systém	Třída přesnosti určení polohy	Střední chyba určení polohy (m _{xy})	Třída přesnosti určení výšek	Střední chyba určení výšek (m _h)
S-JTSK	Bpv	3	-	3	-

Použité podklady

Projekt stavby, mapa DKM**-Geodetický základ:**

Pro měření byla využita vytyčovací síť, která byla přibližně určena pomocí GNSS-RTK v S-JTSK a Bpv pomocí sítě referenčních stanic Trimble VRS Now Czech. Zpřesnění vytyčovací sítě bylo provedeno polární metodou a trigonometricky.

-Metoda měření:

Geodetické zaměření bylo provedeno polární metodou a výšky trigonometricky.

-Výpočty a zpracování naměřených hodnot:

Výpočet souřadnic měřických bodů a náčrt byl proveden v programu Kokeš v 16.11. Souřadnice měřických bodů jsou uvedeny v „Seznamu souřadnic“. Měřický náčrt půdorysu s čísly měřických a podrobných bodů byl vyhotoven v měřítku 1 : 200.


-Poznámka:**-Obsah elaborátu:**

1. Technická zpráva (Geodetická dokumentace vytyčení stavby)
2. Měřický náčrt s čísly bodů
3. Seznam souřadnic
4. CD (dwg , dgn , txt , pdf

Zaměřil :	Ověřil :	Převzal :
Dne : 26.4.2024	Dne : 29.4.2024	Dne :
	Ing. Vladimír Luks poř. č. 2217/2024	
Zhotovil :		
Dne : 29.4.2024		
Rychlík Roman		



Odp.geodet	Zaměřil	Zpracoval	Kreslil	Kontroloval	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. Pod Anenskou 245 Příbram IV www.geodetpb.cz	
Ing. Vladimír Luks	Roman Rychlík	Roman Rychlík	Roman Rychlík	Ing. Vladimír Luks		
Kat. území	Senohraby		Souř. systém	S – JTSK		
Objednal	KSÚS		Výšk. systém	B.p.v.	Formát	A3
III/6031 SENOHRABY , PRŮTAH					Datum	27.04.2024
					Číslo zakázky	6/2024
					Měřítko	Číslo výkresu
Zaměření skutečného provedení stavby					1:200	1

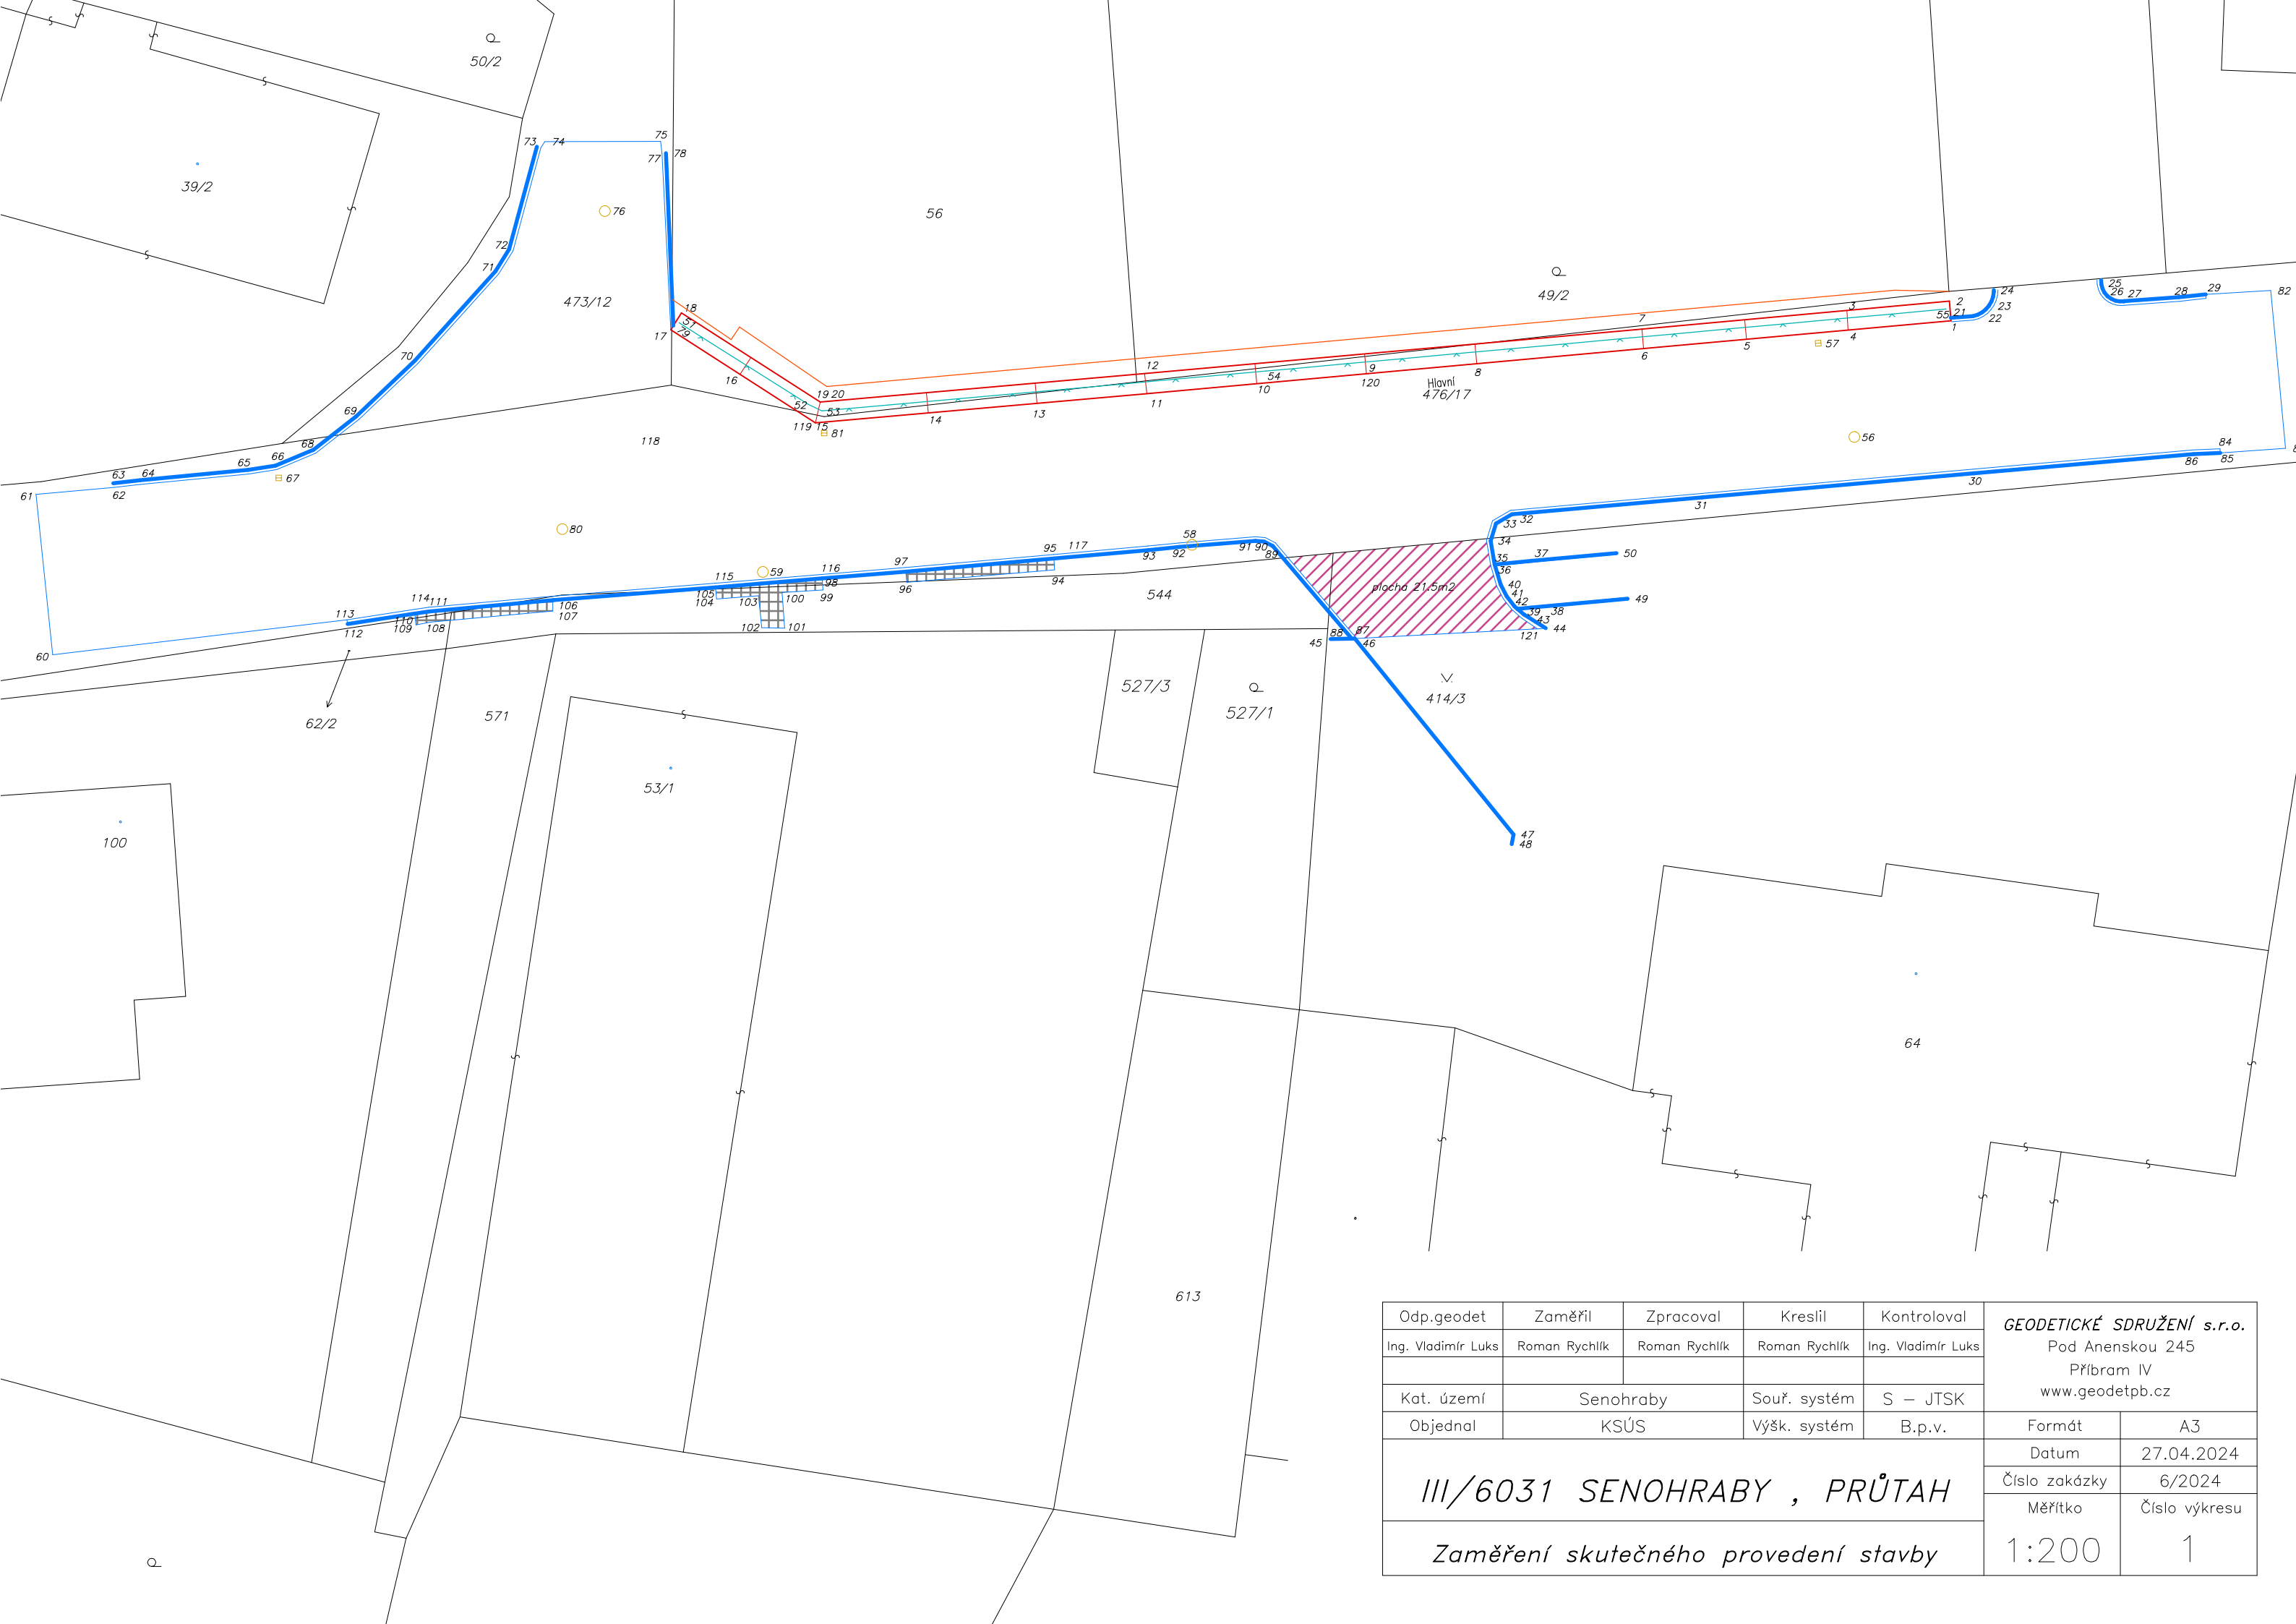

Odp.geodet	Zaměřil	Zpracoval	Kreslil	Kontroloval	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. Pod Anenskou 245 Příbram IV www.geodetpb.cz	
Ing. Vladimír Luks	Roman Rychlík	Roman Rychlík	Roman Rychlík	Ing. Vladimír Luks		
Kat. území	Senohraby		Souř. systém	S – JTSK		
Objednal	KSÚS		Výšk. systém	B.p.v.	Formát	A3
III/6031 SENOHRABY , PRŮTAH					Datum	27.04.2024
					Číslo zakázky	6/2024
					Měřítko	Číslo výkresu
Zaměření skutečného provedení stavby					1:200	1

Datum

Denní záznamy stavby

19.4.2014 POČASÍ: ZATAŽENO +10°C + 9°C

PRÁCE PRAC. DOBA: 700-1400 HOD.

POČET PRAC.: 1 THP + 9 D

MECHANIZACE: DL. NÁČASÍ; PÁS. BAGEL; NÁČAS. AHO

PLOV. PRÁCE:

- UKLÁDKA SIL. OBLUŽNÍKŮ V KOT. 0,450-0,494

- UKLÁDKA DOUSTHO SOUKRSTVÍ PŘI CHOKAČK. V
VČ. HUTNĚNÍ

20.4.2014 POČASÍ: ZATAŽENO +12°C + 5°C

PRAC. DOBA: 700-1400 HOD.

POČET PRAC.: 9 D

MECHANIZACE: DL. NÁČASÍ

PLOV. PRÁCE:

- UKLÁDKA ZÁMKOVÉ NÁČASÍ VČ. ČIŠTĚNÍ
V KOT. 0,450-0,494

- UKLÁDKA STAVENISŤ

21.4.2014 POČASÍ: ZATAŽENO +3°C + 6°C

PRAC. DOBA: 700-1400 HOD.

POČET PRAC.: 9 D

MECHANIZACE: DL. NÁČASÍ

PLOV. PRÁCE:

- UKLÁDKA ZÁMKOVÉ NÁČASÍ

V KOT. 0,450-0,494

- UKLÁDKA STAVENISŤ

22.4.2014 ZÁPIS KADPP:

BYLA PROVĚDĚNA KONSOLIDAČNÍ PRÁCE

Z HLBOŠKÁ DO PP POUŽIVÁ DO P

ZABĚLPEFEN DÁLŠÍ STAVENISŤ.
