

Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

Strany smlouvy o dílo SMLD-0925/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 04.09.2024 (dále jen Smlouva):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, jíž se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a soupis prací SO po změnách.

4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.

5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Krycí list Evidence změny

Název Stavby dle SoD: III/24628 Spomyšl - Jeviněves	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/24628 km 3,256 - 4,738		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Silnice Topolany a.s.
Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČ: 057 58 734

Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1

Změna č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-470 031,10	0,00	-470 031,10

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence změny - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/24628 Spomyšl - Jeviněves Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/24628 km 3,256 - 4,738	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny / Skupina změny: 1
---	---	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo SMLD-0925/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 04.09.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>		
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel		
2. Změnový list	2	počet listů	Zhotovitel		
6. Seznam dokladů	1	počet listů	Projektant (AD)		
7. Soupis prací SO po změnách	1	počet listů	Stavební dozor		

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Doměrky dle skutečného provedení

Název (díličí) Změny: Doměrky dle skutečného provedení

Popis a zdůvodnění Změny:

Předložené změny plochy nově provedené komunikace vznikly na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací viz. Příloha č.1 - GZ.

Rozsah provedených sanací byl zaměřen za účasti TDS p. Nováka, naměřeno 178 m² - viz. Příloha č.2 - Stavební deník.

Byla provedena výšková úprava 3 ks kanálů, čtvrtý je z velké části mimo komunikaci a nebyl upravován dle dohody s TDS - viz. Příloha č.2 Stavební deník, z tohoto důvodu se 1 kus odečítá.

Tato změna je vyjádřena položkami 93818, 572223, 574A44, R položka (sanace) a 89921.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna Vyhrazená do Skupiny 1.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-470 031,10	0,00	-470 031,10	470 031,10

Technická pomoc Objednatele: _____

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

[illegible]

Projektant (autorský dozor): jméno xxx podpis

Stavební dozor: jméno Michal Novák podpis

Zástupce Objednatelů odpovědný za cenové
projednání změny:

jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: iméno Lenka Chmelová podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Bc. Marek Volák	podpis

Přehled dalších dokladů

Číslo Změny:	1
Název stavby:	III/24628 Spomyšl - Jeviněves
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. III/24628 km 3,256 - 4,738
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Příloha č. 1 - Geodetické zaměření skutečného provedení	2
09 Příloha č. 2 - stavební deník	4
Počet listů celkem	7

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/24628 Spomyšl - Jevíněves Číslo a název SO/PS: sil. III/24628 km 3,256 - 4,738 Číslo a název rozpočtu: sil. III/24628 km 3,256 - 4,738								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) - / 1 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	705,40	705,40	0,00	550,00	387 970,00	0,00	0,00	387 970,00	0,00	0,00%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	13,60	13,60	0,00	79,00	1 074,40	0,00	0,00	1 074,40	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	20 155,20	18 452,00	-1 703,20	2,00	40 310,40	-3 406,40	0,00	36 904,00	-3 406,40	-8,45%
		<i>Dle geodetického zaměření 9226 m2 *2= 18 452 m2</i>											
5	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S	m3	403,10	403,10	0,00	4 396,00	1 772 027,60	0,00	0,00	1 772 027,60	0,00	0,00%
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	20 155,20	18 452,00	-1 703,20	15,00	302 328,00	-25 548,00	0,00	276 780,00	-25 548,00	-8,45%
		<i>Dle geodetického zaměření 9226 m2 *2= 18 452 m2</i>											
7	574A44	asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2	10 077,60	9 226,00	-851,60	262,00	2 640 331,20	-223 119,20	0,00	2 417 212,00	-223 119,20	-8,45%
		<i>Dle geodetického zaměření 9226 m2</i>											
8	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	13,60	13,60	0,00	90,00	1 224,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00%
9	931311	těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2	m	13,60	13,60	0,00	40,00	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00%
10	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	375,00	178,00	-197,00	1 097,50	411 562,50	-216 207,50	0,00	195 355,00	-216 207,50	-52,53%
		<i>Dle skutečného provedení zaměřeného a odsouhlaseného TDS</i>											
11	89921	výšková úprava poklopů	ks	4,00	3,00	-1,00	1 750,00	7 000,00	-1 750,00	0,00	5 250,00	-1 750,00	-25,00%
		<i>Dle skutečného provedení zaměřeného a odsouhlaseného TDS</i>											
12	12922	čištění krajnic od nánosů tl. do 100mm	m2	1 482,00	1 482,00	0,00	47,00	69 654,00	0,00	0,00	69 654,00	0,00	0,00%
13	56962	zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm	m2	1 482,00	1 482,00	0,00	45,00	66 690,00	0,00	0,00	66 690,00	0,00	0,00%
14	014103.R	uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	207,48	207,48	0,00	190,00	39 421,20	0,00	0,00	39 421,20	0,00	0,00%
15	91228	směrové sloupky z plast. hmot včetně odrazového pásu	ks	54,00	54,00	0,00	450,00	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00%
16	91551	VDZ - předem připravené symboly - (optická brzda)	ks	1,00	1,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
17	915111	VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	370,50	370,50	0,00	180,00	66 690,00	0,00	0,00	66 690,00	0,00	0,00%
		Celkem						5 891 127,30	- 470 031,10	0,00	5 421 096,20	- 470 031,10	- 1,03

PROTOKOL Č. 001/S-24-078**Název zakázky: III/24628 Spomyšl - Jeviněves**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje**
příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: **Silnice Topolany a.s.**
Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

Bylo provedeno: Zaměření plochy komunikace

Dne: 11.11.2024

Projektová dokumentace: -

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přístrojové vybavení: Hilty PLT 300 + PLC 400

Softwarové vybavení: GstarCad 2022 edition, GeoWin

Měřil: Jan Kaššák

Měření: Bylo provedeno zaměření plochy vrstvy ACO 11+ ve staničení 3,256 – 4,738.
Plocha byla měřena po 20 m (2 kontrolní body v každém profilu).
Přesnost měření myx 0.003, mz 0.003.
Kompletní data využita k výpočtu uvedených hodnot jsou uložena v archivu
firmy a jsou na vyžádání k dispozici.

Výsledky:

Konstrukce	Druh vrstvy	Plocha (m2)	Počet profilů	Počet bodů
km 3,256 – 4,738	ACO 11+	9 226	74	148

V Tušimicích dne: 15.11.2024

Jan Kaššák
výkon zeměměřických činností

KSÚS SK - SPOMYŠL - JEVINĚVES

číslo zakázky: S-24-078

měřeno dne 11.11.2024

celková plocha komunikace: 9 226m²

Spomyšl


Parcelní číslo 403: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Způsob využití: ostatní komunikace

Jeviněves

Parcelní číslo 560/1: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Způsob využití: silnice

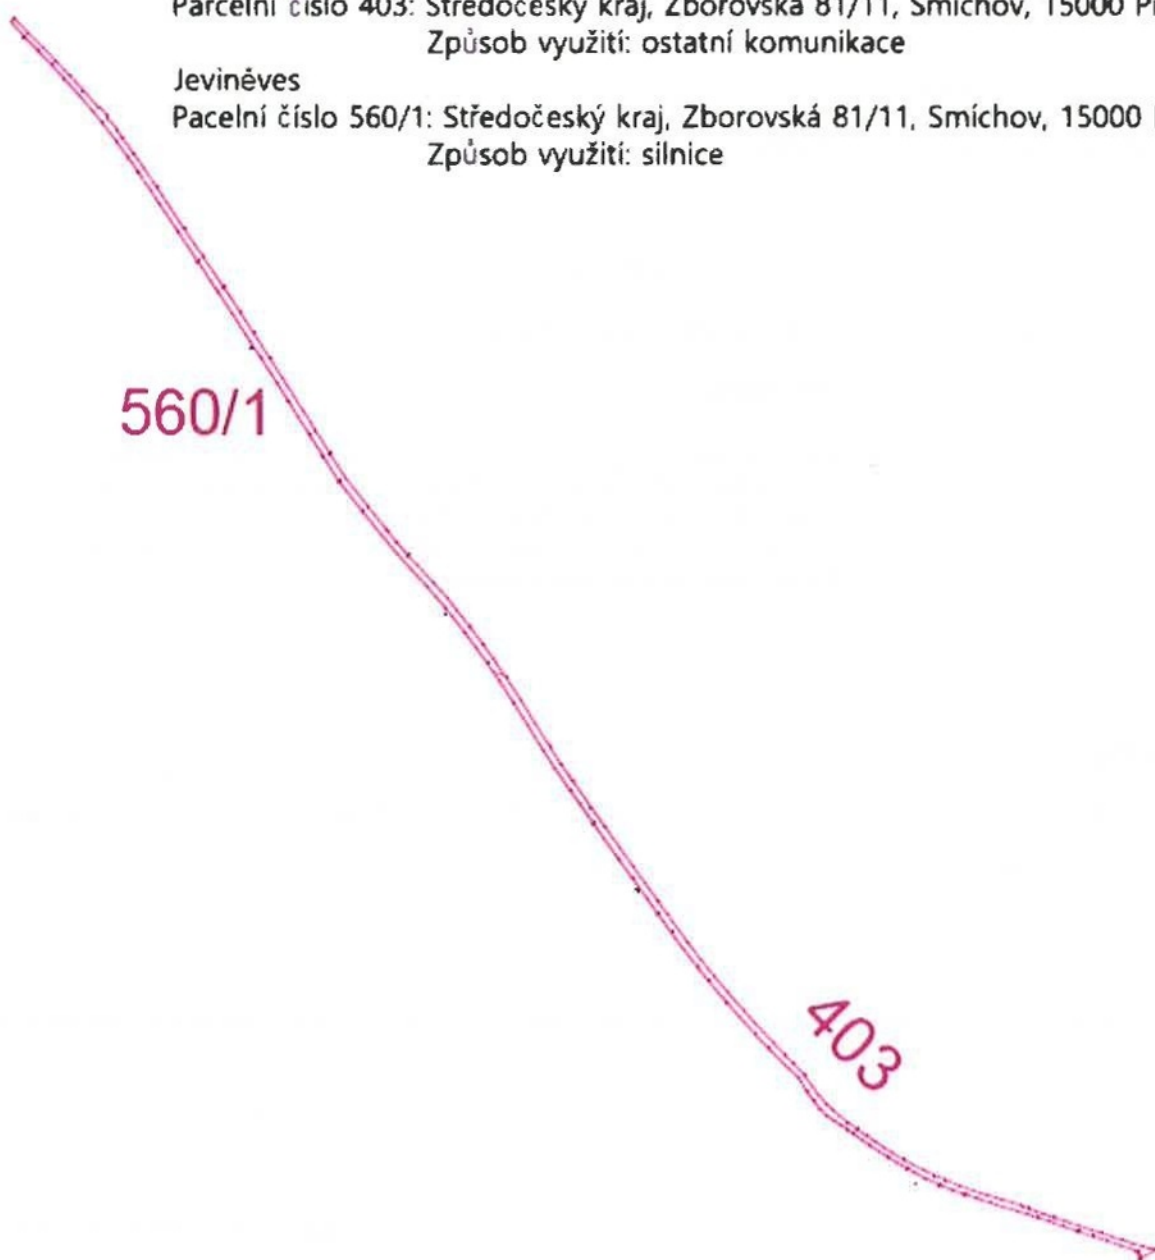

STAVEBNÍ a MONTÁŽNÍ DENÍK

samopropisovací 3 x 10 číslovaných listů



Stavba:

III / 24 6LP

Spoušť - Jevíněves

S 24 - 078

Předání staveniště

31. 10.

2024

Počasí: počasí + 9°C

31. 10.

2024

Samozřejmě okraje vodorovně
a obce SpolečněČištění krajnic od návozu,
odvoz materiáluKontrola stavu byl prováděn a za
účasti TD p. Nováka naměřeno 14H

Počasí: počasí + 8°C

1. 11.

2024

Frézování komunikace
za měřidlo povrchuČištění krajnic od návozu
odvoz materiálu

Oblačno až počasí + 8°C

4. 11.

2024

Proveden spojovací podtlak
Pokládka AČL 16 + vyrovnávka

Počasí: oblačno + 6°C

5. 11.
2014


Proveden spojovací postřik
Pokládka ACO 11 + H. 10 mm
Pokládka ACO 16 + vyrovnávka
řezání a bourání napojení
Výšková úprava 3 ks kanálů,
čtrnáct je z velké části mimo komplex
a celý upravován



Počasí: oblačno + 6°C

6. 11.
2014

Proveden spojovací postřik
Pokládka ACO 11 + H. 10 mm
Pokládka ACO 16 + vyrovnávka
řezání a bourání napojení



Počasí: oblačno + 6°C

7. 11.
2014

Proveden spojovací postřik
Pokládka ACO 11 + H. 10 mm
Pokládka ACO 16 + vyrovnávka
řezání a bourání napojení



Počasí: oblačno, +6 °C

8.11.

doply

zametání povrchu

bouřně, zářivo

provedení spoj. postřihu

vyrovnaní tci 16

příložka tci 11 11-100 mm

ukončení prací, uklid staveniště

