

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 08

Předmět díla:	Nízkoprahové denní centrum		
Objekt:			
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram VII		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny: Úprava připojení plynu, osazení novými prvky a plynoměrem pro podružné měření.			
Odůvodnění změny: Zhotovitel předložil návrh na úpravu připojení plynu, osazení novými prvky a plynoměrem pro podružné měření zpracovaný podle nové PD dodané objednatelem			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	-
			ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ano
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		ano	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	93.510,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	- 20.053,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	73.457,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	15.426,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	88.883,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	08	
termíny	Termín realizace změny:	shodný s dodáním díla	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	4.11.2024	[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	4.11.2024	[redacted]
	TDI:	[redacted]	[redacted]
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 2		

Položkový rozpočet nový podle dodané PD

S:	2023/47	Nízkoprahové denní centrum - azylový dům Znojmo
O:	09	Plynovod
R:	1	Plynovod

Náklad po odpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Odpočet	Množství	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						8 574			
1	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku 12*0,5*0,1	m3	0,60000	981,00	589		0,60	589
1	2 132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	4,80000	858,00	4 118	-2,00	2,80	2 402
2	3 162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,50000	167,00	251	-1,50	0,00	0
3	4 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce(skládkovně) kód odpadu 17 05 04	m3	1,50000	435,00	653	-1,50	0,00	0
6	5 174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,30000	490,00	1 617	-2,00	1,30	637
4	6 175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,90000	600,00	540		0,90	540
5	7 spec. 2	Písek pro obsyp potrubí, doprava do 5 km	m3	0,99000	815,00	807	-0,99	0,00	0
Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod						96 210			
8	723150366	Chránička D 44,5x3,2 mm	m	0,50000	433,00	521		0,50	217
9	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	1,00000	2 170,00	3 226		1,00	2 170
10	723160206	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 6/4"	soubor	1,00000	3 505,00	4 400		1,00	3 505
11	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	1,00000	528,00	598		1,00	528
12	723160336	Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4"	soubor	1,00000	533,00	603		1,00	533
13	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	1,00000	433,00	463		1,00	433
14	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	40,20	184		2,00	80
15	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	35,00000	35,60	1 400		35,00	1 246
8	16 723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,00000	297,00	297	-1,00	0,00	0
18	723235415	Nadprůtoková pojistka plynu G 1" FM průtok V 2,5 m3/h s vnitřním a vnějším závitem	kus	1,00000	1 751,00	1 922		1,00	1 751
19	723170214	Potrubí plynové plastové ze síťovaného Pe, PN 10 D 26/3,0 mm spojované lisovacími tvarovkami	m	15,00000	634,00	11 130		15,00	9 510
20	723170224	Ochrana plynového potrubí ze síťovaného Pe korugovanými trubkami D 26	m	15,00000	74,30	1 890		15,00	1 115
9	21 723181013	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	5,00000	637,00	3 710	-2,50	2,50	1 593
22	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	15,00000	998,00	16 995		15,00	14 970
23	723190107	Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2" F x G 1/2" M délky 50 cm spojovaná na závit	soubor	1,00000	574,00	574		1,00	574
10	24 723220314	Koleno přechodové G 1" F x D 32 s vnitřním závitem	kus	2,00000	454,00	1 276	-1,00	1,00	454
25	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	397,00	397		1,00	397
7	26 723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	489,00	489	-1,00	0,00	0
27	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,00000	875,00	2 625		3,00	2 625
28	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	1 611,00	1 611		1,00	1 611
29	723234321-1	Regulátor tlaku plynu středotlaký dvoustupňový výkon do 25 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,00000	7 633,00	7 633		1,00	7 633
30	783607750	Provedení krycího dvojnásobného nátěru potrubí DN do 50 mm	m	15,00000	103,00	1 545		15,00	1 545
31	55234	Výstražná fólie - Pozor plyn	m	15,00000	9,00	135		15,00	135
32	552349	Signalizační vodič	m	15,00000	29,00	435		15,00	435
33	999671	Podružný plynoměr G4, rozteč 100mm + mtz	ks	1,00000	1 910,00	2 355		1,00	1 910
34	999671	popis Popisky, značení směru	kpl	1,00000	889,00	889		1,00	889
35	RMA T0001	Uchycení potrubí - objímky, závěsy	ks	15,00000	138,00	2 070		15,00	2 070
36	Skříň.DrokosPD90	Plynoměrná skříň Drokos PD90 + základ bed.dílce + mtz	kpl	1,00000	17 776,00	17 776		1,00	17 776
37	Skříň.SkutečS300	Plynoměrná skříň Hutira S2300 480x350x200 + sokl S2300 520x350x200	kpl	1,00000	6 666,00	6 666		1,00	6 666
38	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	952,57000	1,00	953		952,57	953
Díl: HZS Ostatní náklady						19 540			
40	HZS1212.169	Demontáž stávající skříňe a plynoměrného vybavení	kpl	1,00000	1 500,00	1 500		1,00	1 500
41	HZS129.3	Stavební přípomocce - prostupy	kusy	1,00000	4 520,00	9 040		1,00	4 520

CELKEM

93 510

Položkový rozpočet originální - úprava dle ZL č. 08

Stavba :	NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM - AZYLOVÝ DŮM
Objekt :	ZNOJMO, POZEMEK p. č. 2965 VENKOVNÍ KANALIZACE, VODOVOD, PLYNOVOD - ROZPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množ.	cena / MJ	celkem (Kč)	Zbývá		Vydej	Odečet množství	Odečet celkem (Kč)
							Množství	Celkem			
Díl: 0	0	Zařízení staveniště	-	1,00	6 500,00	6 500,00	0,50	3 250			
spec. 1	1	Zařízení staveniště			0,00	6 500,00					
Celkem za		0 Zařízení staveniště			0,00	6 500,00					
Díl: 1	1	Zemní práce									
1	2	132112131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,00	858,00	1 716,00	2,00	1 716	2,00		
	3	132151103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	62,00	448,00	27 776,00	62,00	27 776			
	4	151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	24,00	129,00	3 096,00	24,00	3 096			
	5	151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	24,00	28,00	672,00	24,00	672			
2	6	162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,00	167,00	4 342,00	26,00	4 342	1,50		
3	7	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	m3	26,00	435,00	11 310,00	26,00	11 310	1,50		
4	8	175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	1,40	600,00	840,00	1,40	840			
	9	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	8,00	397,00	3 176,00	8,00	3 176			
5	10	spec. 2 Písek pro obsyp potrubí, doprava do 5 km	m3	5,00	815,00	4 075,00	5,00	4 075	0,99		
6	11	174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,00	490,00	980,00	2,00	980	2,00		
	12	174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním strojně	m3	36,00	124,00	4 464,00	36,00	4 464			
Celkem za		1 Zemní práce			0,00	62 447,00					
Díl: 3	3	Různé kompletní konstrukce			0						
spec. 3	13	Zemní nádrž plastová na dešťovou vodu 5 000 l, pro běžné zatížení, samonosná (dod., montáž, osazení)	kus	1,00	40 754,05	40 754,05	0,00	0			
Celkem za		3 Různé kompletní konstrukce			0,00	40 754,05					
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce			0						
	14	451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štéropisků	m3	5,00	981,00	4 905,00	5,00	4 905			
	15	452386111 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	1,00	530,00	530,00	1,00	530			
	16	452311161 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,25	3 821,00	955,25	0,00	0			
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce			0,00	6 390,25					
Díl: 8	8	Trubní vedení			0						
	17	871313121 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 160 mm	m	60,00	36,00	2 160,00	60,00	2 160			
	18	877315211 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 160	kus	2,00	74,00	148,00	2,00	148			
	19	871315221 Kanalizační potrubí z PVC SN 8, DN 160	m	60,00	290,00	17 400,00	60,00	17 400			
spec.	20	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,00	393,00	786,00	2,00	786			
	21	894211111 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí do DN 200 dno beton tř. C 25/30 (do 1,5m)	kus	1,00	11 116,00	11 116,00	1,00	11 116			
	22	894411111 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,00	15 553,00	15 553,00	1,00	15 553			
spec.	23	Poklop s rámem 600 mm s bet.výplní D400	kus	1,00	5 348,00	5 348,00	1,00	5 348			
	24	899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,00	890,00	890,00	1,00	890			
	25	894812202 Revzní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pr.útočné 30°, 60°, 90°	kus	1,00	12 929,00	12 929,00	1,00	12 929			
	26	894812257 Revzní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	1,00	6 548,00	6 548,00	0,00	0			
spec.	27	Napojení na stáv. kan.připojku - třmenová odbočka DN 160	kus	1,00	4 336,00	4 336,00	1,00	4 336			
	28	899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	58,00	28,00	1 624,00	58,00	1 624			
	29	871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	25,00	17,00	425,00	25,00	425			
spec. 3	30	Potrubí vodovodní PE- 100 SDR 11, D 32 x 3 mm	m	25,00	781,00	19 525,00	25,00	19 525			
	31	892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 40 - 70	m	25,00	31,00	775,00	25,00	775			
	32	892241111 Tlaková zkouška potrubí do DN 80	m	25,00	20,00	500,00	25,00	500			
	33	892351111 Tlaková zkouška potrubí do DN 150 - 200	m	58,00	25,00	1 450,00	58,00	1 450			
	34	899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	25,00	22,00	550,00	25,00	550			
	35	879 17-1111 Montáž napojení vodovodní přípojky DN 32	kus	1,00	2 818,00	2 818,00	1,00	2 818			
spec.	36	Pomocné čerpadlo vč. plov. sací soupravy a automatiky, 95 l/min, 230 V, H=48 m	souřad	1,00	15 009,00	15 009,00	1,00	15 009			
spec.	37	Pomocné lešení	kus	1,00	1 997,00	1 997,00	1,00	1 997			
Celkem za		8 Trubní vedení			0,00	121 887,00					
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot			0						
	38	998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	22,34	126,00	2 814,83	17,87	2 252			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			0,00	2 814,83					
Díl: 9	9	Ostatní konstrukce			0						
prop 1	39	prostup, rýhy, stavební přípomoc	souřad	1,00	4 528,00	4 528,00	0,00	0			
Celkem za		9 Ostatní konstrukce			0,00	4 528,00					
Díl: 722	722	Vnitřní vodovod			0						
	40	722232045 Kohout kulový G 1"	kus	1,00	621,00	621,00	1,00	621			
	41	722232063 Kohout kulový s vypouštěním G 1"	kus	1,00	766,00	766,00	1,00	766			
	42	734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závit G 1	kus	2,00	135,00	270,00	2,00	270			
	43	998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod do 50 m vodorovně, výšky do 6 m	t	0,00	694,00	0,94	0,00	1			
Celkem za		722 Vnitřní vodovod			0,00	1 657,94					
Díl: 723	723	Vnitřní plynovod			0						
	44	723170114 Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami	m	25,50	539,00	13 744,50	25,50	13 745	25,50		13 745
	45	spec. Napojení elektrotvarovkou PE32 na stáv. plynovodní přípojku	souřad	1,00	1 890,00	1 890,00	1,00	1 890	1,00		1 890
	46	723220214 Sroubení přechodové G 1" F x D 32 s vnitřním závit	kus	1,00	454,00	454,00	1,00	454	1,00		
	47	723181023 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	2,50	637,00	1 592,50	2,50	1 593	2,50		
	48	spec. Potrubí ocelové s ochr. Opláštěním	m	2,00	859,00	1 718,00	2,00	1 718	2,00		1 718
	49	723150367 Chránička D 57x3,2 mm	m	0,50	659,00	329,50	0,50	330	0,50		330
	50	723230155 Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 1000 mm pro bajonetové uzávěry	kus	1,00	2 360,00	2 360,00	1,00	2 360	1,00		2 360
7	51	723231163 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřutkový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00	489,00	489,00	1,00	489	1,00		
8	52	723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,00	297,00	297,00	1,00	297	1,00		
	53	998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,02	697,00	11,43	0,02	11	0,02		11
Celkem za		723 Vnitřní plynovod			0,00	22 885,93					

CELKEM

213 267

20 053

Předmět díla:	Nízkoprahové denní centrum		
Objekt:			
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram VII		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny: úprava trasy kanalizační a vodovodní přípojky, osazení vodovodní přípojky vodoměrem			
Odůvodnění změny: Zhotovitel předložil návrh na úpravu trasy kanalizační a vodovodní přípojky a osazení vodovodní přípojky vodoměrem na základě požadavku objednatele na změnu místa připojení a na zřízení podružného měření odběru vody.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ano	
	dodatek k PD	-	
	dokumentace skut. provedení	-	
	jiné	-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	21.716,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	- 43.318,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	- 21.602,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	- 4.536,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-26.138,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	shodný s dodáním díla	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19.11.2024	[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	19.11.2024	[redacted]
	TDI:		[redacted]
	Projektant:		[redacted]
	Objednatel:		[redacted]
přílohy	Přílohy: 2		

Položkový rozpočet ZL č.11 - Kanalizace a vodoinstalace

S:	2023/47	Nížkoprahové denní centrum - azylový dům Znojmo					
O:	06	Kanalizace, vodovod + zemní práce					
R:	1	vícepráce					Náklad po odpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Odpočet	Množství	Celkem
Díl: 8						16 607,00			
Trubní vedení									
12	1 877315211	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 160	kus	30,00	74,00	2 220,00	2,00	28,00	2 072
	2 286111125	Trubka kanalizační KGEN SN 8 PVC 200 x 5,9 x 1000 mm	kus	9,00	519,00	4 671,00		9,00	4 671
	3 28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	13,00	393,00	5 109,00		13,00	5 109
	4 28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	2,00	270,50	541,00		2,00	541
	5 28651693.A	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	3,00	185,50	556,50		3,00	557
	6 28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	8,00	306,00	2 448,00		8,00	2 448
	7 28651708.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC	kus	1,00	450,50	450,50		1,00	451
	8 28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	1,00	124,00	124,00		1,00	124
	9 28651813.A	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	2,00	243,50	487,00		2,00	487
Díl: 722						5 256,70			0
	10 722182004	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj	m	12,00	66,40	796,80		12,00	797
	11 283772392	Trubice izolační MIRELON STABIL 32 x 9 mm	m	12,00	35,70	428,40		12,00	428
	12 722221123	Kohout vodovodní, kulový, zahradní, MAR FIV.08003, DN 20 mm x DN 25 mm	kus	1,00	416,50	416,50		1,00	417
	13 722235145	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, PN 40 mm	kus	1,00	1 455,00	1 455,00		1,00	1 455
	14 722235216	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm	kus	1,00	935,00	935,00		1,00	935
	15 722264328	Vodoměr bytový TV Enbra ET DN 20 x 130 mm, Qn 4	kus	1,00	1 225,00	1 225,00		1,00	1 225
CELKEM						21 716			

Položkový rozpočet - úprava dle ZL č. 11 - Kanalizace a vodoinstalace

S:	2023/47	Nížkoprahové denní centrum - azylový dům Znojmo					
O:	06	Kanalizace, vodovod + zemní práce					
R:	2	méněpráce					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	871315221	Kanalizační potrubí z PVC SN 8, DN 160	m	-9,00000	290,00	-2 610
21	894211111	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí do DN 200 dno beton tř. C 25/30 (do 1,5m)	kus	-1,00000	11 116,00	-11 116
22	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	-1,00000	15 553,00	-15 553
23	spec.	Poklop s rámem 600 mm s bet výplní D400	kus	-1,00000	5 348,00	-5 348
27	spec.	Napojení na stáv. kan.připojku - třmenová odbočka DN 160	kus	-1,00000	4 336,00	-4 336
29	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	-5,00000	17,00	-85
30	spec. 3	Potrubí vodovodní PE- 100 SDR 11, D 32 x 3 mm	m	-5,00000	781,00	-3 905
31	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 40 - 70	m	-5,00000	31,00	-155
32	892241111	Tlaková zkouška potrubí do DN 80	m	-5,00000	20,00	-100
34	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	-5,00000	22,00	-110
CELKEM						-43 318

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 12

Předmět díla:	Nízkoprahové denní centrum
Objekt:	
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Zhotovitel:	ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram VII
TDI:	
Projektant:	

Popis změny: Vypouštěcí ventil retenční nádrže, vč. šachty

Odůvodnění změny: Zhotovitel předložil návrh na vypouštěcí ventil retenční nádrže, vč. šachty

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zahrnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zahrnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ano
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	18.160,- Kč
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	-
	celkem v Kč bez DPH	

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	18.160,- Kč
	Výše DPH sazba: 21%	3.814,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH	21.974,- Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	

termíny	Termín realizace změny:	shodný s dodáním díla
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne

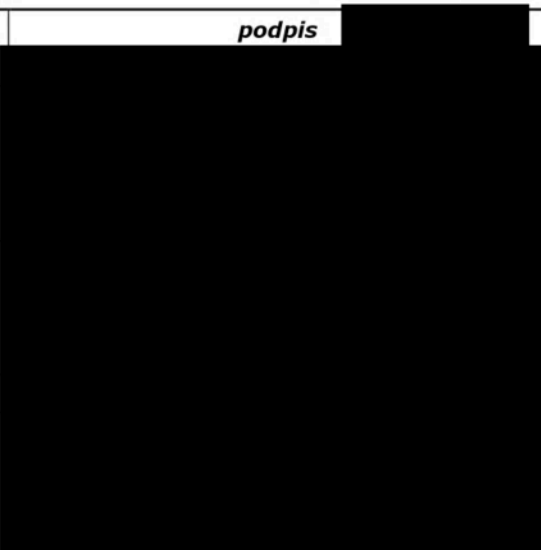
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	13.11.2024	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	13.11.2024	
	TDI:		
	Projektant:		

přílohy	Přílohy: 1
----------------	------------

Položkový rozpočet - ZL č.12 - Vypouštěcí ventil retenční nádrže, vč. Šachty

S:	2023/47	Nížkoprahové denní centrum - azylový dům Znojmo		
O:	07	Vypouštěcí ventil retenční nádrže, vč. šachty		
R:	1	Vypouštěcí ventil retenční nádrže, vč. šachty		Náklad po odpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Odpočet	Množství	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						2 347			
1	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	1,00	1 117,00	1 117		1,00	1 117
2	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,70	167,00	117	0,70	0,00	0
3	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce(skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	0,70	435,00	305	0,70	0,00	0
4	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,30	490,00	147		0,30	147
5	175101101R01	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,34	600,00	206		0,34	206
6	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	0,35	464,50	163		0,35	163
7	583424801	Kamenivo drcené 4/8 Olbramovice, JHM	t	0,35	839,00	294		0,35	294
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						196			0
11	8451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	0,20	981,00	196	0,20	0,00	0
Díl: 722 Vnitřní vodovod						16 234			0
9	722171212	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 25 x 2,3 mm	m	2,00	589,00	1 178		2,00	1 178
10	89443111	Osazení plastové šachty, vč. poklopu	kus	1,00	1 578,00	1 578		1,00	1 578
11	28601	Šachta na rozvod vody DN 270 BOWA	kus	1,00	2 280,00	2 280		1,00	2 280
12	912	Hzs - Vodař tř.7,	h	4,00	605,00	2 420		4,00	2 420
13	72201	Tvarovky - spojky, rychlospojky, zátka, trn pro připojení hadice 3/4	kpl	1,00	975,00	975		1,00	975
14	42221	Šoupátko IS závitové HAWLE uzavírací přípojkové 2491 DN 3/4"	kus	1,00	5 506,00	5 506		1,00	5 506
15	42222	Nářadí ruční HAWLE 3410 klíč k armaturám domovních přípojek dl.830mm	kus	1,00	2 297,00	2 297		1,00	2 297
CELKEM						18 160			18 160

Předmět díla:	Nízkoprahové denní centrum		
Objekt:			
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram VII		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: <i>Dodatečnou úpravu chodníků a venkovních úprav.</i>			
Odůvodnění změny: <i>Zhotovitel dle požadavku objednatele předložil návrh na dodatečnou úpravu chodníků a venkovních úprav.</i>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ano	
	dodatek k PD	-	
	dokumentace skut. provedení	-	
	jiné	-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	137.534,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	- 128.089,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Květoň	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	9.445,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	1.983,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	11.428,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	shodný s dodáním díla	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	25.11.2024	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	25.11.2024	
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
Přílohy: 1			

Položkový rozpočet

S:	2023/47	Nížkoprahové denní centrum - azylový dům Znojmo
O:	10	Chodník, venkovní úpravy
R:	1	Chodník, venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	16,00000	140,00	2 240
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	39,29800	246,50	9 687
		mezi budovami : (3,0*2,85+1,85*7,0)*0,33		7,09500		
		přístup z ulice : (2,1*1,8+6,5*1,5+0,5*1,0)*0,33		4,62990		
		pojízdna plocha : (8,1*3,5+4,5*0,5+2,65*1,8)*0,53		18,74610		
		stávající budova : 16*0,5*0,2		1,60000		
		okapový chodník : 43,8*0,5*0,33		7,22700		
3	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,29800	167,00	6 563
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 39,29800		39,29800		
4	171201231	Poplatek zauložení zeminy a kamení na recyklační skládce(skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	39,29800	435,00	17 095
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 39,29800		39,29800		
5	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	26,29000	55,00	1 446
		zámk.dlažba : 11,7*1,1		12,87000		
		okap.chodník : (4,2+8)*1,1		13,42000		
6	564851113	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	23,90000	212,00	5 067
		okapový chodník : 43,8*0,5		21,90000		
		šlapáky : 2,0		2,00000		
7	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	43,37000	301,00	13 054
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 35,37000		35,37000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 8,00000		8,00000		
8	639571205	Kačírek pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm	m2	8,00000	393,50	3 148
		stávající budova : 16*0,5		8,00000		
9	639571311	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	8,00000	76,40	611
		stávající budova : 16*0,5		8,00000		
10	564720001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	47,23000	137,00	6 471
		dopočet okap.chodník : 11,7		11,70000		
		dopočet zámk. dlažba tl.6cm : 35,53		35,53000		
11	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,40000	238,00	1 999
		sod : -62,5		-62,50000		
		skutečnost : 35,53+35,37		70,90000		
12	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	11,70000	309,00	3 615
		sod : -59,2		-59,20000		
		mezi budovami : 3,0*2,85+1,85*7,0		21,50000		
		přístup z ulice : 2,1*1,8+6,5*1,5+0,5*1,0		14,03000		
		pojízdna plocha : 8,1*3,5+4,5*0,5+2,65*1,8		35,37000		
13	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku	m2	4,20000	775,00	3 255

sod : -19,7 -19,70000
okapový chodník : 43,8*0,5 21,90000
šlapáky : 2,0 2,00000

14	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x40mm přírodní	m2	-64,37500	354,00	-22 789
15	59245110	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	35,53000	418,50	14 869

mezi budovami : 3,0*2,85+1,85*7,0 21,50000
přístup z ulice : 2,1*1,8+6,5*1,5+0,5*1,0 14,03000

16	592451170	Dlažba 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	35,37000	524,00	18 534
pojízdňá plocha : 8,1*3,5+4,5*0,5+2,65*1,8				35,37000		

17	63101	ACO Vario rohožka, polymerbetonová vana s pozinkovaným roštem 100 x 50cm, vč. osazení	kus	1,00000	5 945,00	5 945
18	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	3 125,00	3 125
19	9601	Souprava zemní teleskopická domovní ŠOUPĚ 9601 3/4"-2"	kus	1,00000	1 652,00	1 652
20	9602	Deska podkladová VARIO	kus	1,00000	298,00	298
21	9603	Poklop uliční lehký VODA, vč.osazení	kus	1,00000	1 650,00	1 650
22	286974	Poklop šachtový litinový B125 QUATTRO ČTVERCOVÝ 800x800mm	kus	1,00000	5 975,00	5 975
23	916661111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	14,80000	115,50	1 709

sod : -78,5 -78,50000
pojízdňá plocha : 9,8+2,0 11,80000
mezi budovami : 15,0+3,5 18,50000
přístup z ulice (30cm) : 2*8,1+1,0 17,20000
okapový chodník : 9,3-1,8+14,5+9,3+14,5 45,80000

24	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	4,00000	530,00	2 120,00
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

napojení u stáv. vjezdu : 4 4,00000

25	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	15,24400	196,00	2 988
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 14,80000*1,03				15,24400		

26	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	35,20000	25,00	880
27	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,52000	383,50	1 350
28	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,52000	271,50	956
29	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód - odpadu 17 01 01	t	3,52000	350,00	1 232
56	009001	D+m venkovní čistící zóna	m2	-16,20	6 500,00	-105 300,00

Vícepráce	137 534
Méněpráce	-128 089
CELKEM	9 445

Skladba A, celková tl.33cm

- Zámková dlažba 200x100x60mm
- Lože tl.4cm
- Štěrkodrť tl.23cm (položky použity tl.15+8cm)

Skladba B, celková tl.52cm

- Zámková dlažba 200x100x80mm
- Lože tl.4cm
- Štěrkodrť tl.41cm (položky použity tl.15+25cm)

Skladba C okap. chodník, celková tl.33cm

- Bet. dlažba 500x500x50mm
- Lože tl.3cm
- Štěrkodrť tl.25cm (položky použity tl.17+8cm)

Předmět díla:		Nízkoprahové denní centrum	
Objekt:			
Objednatel:		Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo	
Zhotovitel:		ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram VII	
TDI:		[redacted]	
Projektant:		[redacted]	
Popis změny: <i>Dodatečné práce na fasádě.</i>			
Odůvodnění změny: <i>Zhotovitel předložil návrh na dodatečné práce na fasádě o položky, které chyběly v rozpočtu a výměry dle skutečnosti.</i>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ano	
	dodatek k PD	-	
	dokumentace skut. provedení	-	
	jiné	-	
údaje o ceně složení ceny změn	hodnota přípočtů (víceprací)	85.091,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	- 44.087,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	41.004,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	8.611,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	49.615,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	shodný s dodáním díla	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	22.11.2024	[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	22.11.2024	
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1		

Položkový rozpočet

S:	2023/47	Nížkoprahové denní centrum - azylový dům Znojmo
O:	08	fasáda
R:	1	fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	20,510	63,10	1 294
		okna : 1,2*1,5*6		10,800		
		0,6*1,05		0,630		
		1,0*0,6*2		1,200		
		1,2*1,0*2		2,400		
		dveře : 1,24*2,04		2,530		
		parapety : 11,8*0,25		2,950		
2	622311033	Zakládací sada ETICS, profil soklový + okapní profil, PVC, pro tl. izolantu 100-170 mm	m	42,582	455,50	19 396
		(13,6+8,316)*2		43,832		
		-1,25		-1,250		
3	622432111	Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrná SOKL	m2	10,500	697,00	7 319
4	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	44,020	50,60	2 227
		okna : (1,2+1,5+1,5)*6		25,200		
		0,6+1,05+1,05		2,700		
		(1,0+0,6+0,6)*2		4,400		
		(1,2+1,0+1,0)*2		6,400		
		dveře : 1,24+2,04+2,04		5,320		
5	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny OSTĚNÍ včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	7,309	319,50	2 335
		okna : (1,2+1,5)*2*6*0,13		4,212		
		(0,6+1,05)*2*0,13		0,429		
		(1,0+0,6)*2*2*0,13		0,832		
		(1,2+1,0)*2*2*0,13		1,144		
		dveře : (1,24+2,04+2,04)*0,13		0,692		
6	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny SOKL včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	10,500	315,00	3 308
7	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	12,841	68,00	873
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,84080		12,841		
8	622211022	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do - pórobetonu tl přes 80 do 120 mm	m2	13,674	623,00	8 519
		(8,56+13,84)*2*3,65		163,520		
		-1,5*1,2*6		-10,800		
		-0,6*1,05		-0,630		
		-1,0*0,6*2		-1,200		
		-1,0*1,2*2		-2,400		

-1,55*2,12
sod : -131,53

-3,286
-131,530

9	622511041	Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 4,0 mm vnějších stěn	m2	12,841	358,00	4 597
		sod : -138,1949		-138,195		
		skutečnost : 145,2		145,200		
		ostění : (1,2+1,5+1,5)*6*0,13		3,276		
		(0,6+1,05+1,05)*0,13		0,351		
		(1,0+0,6+0,6)*0,13*2		0,572		
		(1,0+1,2+1,2)*0,13*2		0,884		
		(1,55+2,12+2,12)*0,13		0,753		
10	283754906R1	Deska izolační XPS tl. 120 mm	m2	27,248	441,00	12 016
		((8,56+13,84)*2-1,55)*0,6*1,05		27,248		
11	28375939	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 120mm	m2	-12,894	428,00	-5 519
		sod : -138,10692		-138,107		
		skutečnost : 145,20		145,200		
		XPS : -25,95		-25,950		
		prořez : 119,25*0,05		5,963		
12	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DEKDREN T20	m	25,600	227,50	5 824
		14,3+8,3+3		25,600		
97	28376379	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 50mm	m2	-29,932	446,92	-13 377
99	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-28,506	273,90	-7 808
57	009002	D+m vnitřní čistící zóna	m2	-17,950	968,41	-17 383
57	009002	D+m vnitřní čistící zóna	m2	2,180	7 973,83	17 383
Vícepráce						85 091
Méněpráce						-44 087
CELKEM						41 004

Předmět díla:		Nízkoprahové denní centrum	
Objekt:			
Objednatel:		Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo	
Zhotovitel:		ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram VII	
TDI:		[redacted]	
Projektant:		[redacted]	
Popis změny: <i>Dodatečné práce na bráně + zábradlí</i>			
Odůvodnění změny: <i>Zhotovitel předložil návrh na dodatečné práce na bráně a zábradlí o položky, které chyběly v rozpočtu a výměry dle skutečnosti.</i>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ano	
	dodatek k PD	-	
	dokumentace skut. provedení	-	
	jiné	-	
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	16.228,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	- 38.739,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	- 22.511,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	4.727,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	- 27.238,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	shodný s dodáním díla	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	28.11.2024	[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	28.11.2024	[redacted]
	TDI:		[redacted]
	Projektant:		[redacted]
	Objednatel:		[redacted]
přílohy	Přílohy: 1		

Položkový rozpočet

S:	2023/47	Nížkoprahové denní centrum - azylový dům Znojmo
O:	11	Brána + zábradlí
R:	1	Brána + zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	767002	D+m zábradlí s madlem - dopočet	m	0,740	11 280,00	8 347
		SOD : -2,7		-2,700		
		skutečnost : 1,72*2		3,440		
2	783222921	Údržba, nátěr syntetický kov.konstr. 2x přímo na rez hladký	m2	12,124	363,00	4 401
		brána : 1,65*1,7*2*2		11,220		
		sloupky : 1,8*(3,14*0,08)*2		0,904		
3	78301	Očištění ocel.kartáčem,ručně + přebroušení	m2	12,124	287,00	3 480
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 12,12432		12,124		

CELKEM	16 228
---------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	2023/47	Nížkoprahové denní centrum - azylový dům Znojmo
O:	11	Brána + zábradlí
R:	1	Brána + zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
112	767005	D+m dvoukřídlá vjezdová brána š. 3,38 m výšky 1,9 m - stejné provedení jako vstupní branka	kus	-1,000	38 739,00	-38 739

CELKEM	-38 739
---------------	----------------
