

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo:
Zastoupená:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
MUDr. Jiřím Laštůvkou, zastupujícím generálním
ředitelem
25488627
CZ25488627

Obchodní rejstřík:
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

POHL cz, a.s.

Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
Bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Obchodní rejstřík:

Na Pomezí 2483, 525 63 Roztoky

25606468

(dále jen „**Zhotovitel**“)

vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
4934

I.

- 1) Smluvní strany, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nová budova laboratoří – modulární stavba, krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk – Design & Build“ uzavřely dne 23. 11. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla představujícího realizaci investičního záměru Objednatele výstavby objektu – modulární stavby laboratoří formou „Design & Build“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“).
- 2) Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě z důvodu opravy písařské chyby v čl. VIII odst. 3 Smlouvy. Dále dne 25.9.2024 uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 3 (změnový list 1 - 3) k Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvýšila o 47 766,79 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 18 825 543,79 Kč bez DPH.

II.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou teda za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba úpravy rozsahu Díla spočívající ve vícepracích a méněpracích v důsledku změny rozsahu Díla.
- 2) Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XVIII. odst. 8 ve spojení s čl. XIX. odst. 4 a čl. VII odst. 3 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě v důsledku výslovně vyžádaných víceprací Objednatelem při realizaci díla.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce byly Objednatelem výslovně vyžádány a odsouhlaseny v rámci projednání celkové koncepce realizace Díla a Zhotovitelem budou realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací realizovány činnosti dle
a) přílohy č. 1 – Změnový list 009 Změna vybavení modulové stavby – nutná změna technologie teplé užitkové vody dle požadavků hygieny, změna technologie vytápění, doplnění klimatizačních jednotek, navýšení IT prvků, doplnění světlíků, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a vedlejší režijní náklady +1 060 946,52 Kč a -338 151,85 Kč, kdy se jedná o změnu - dodatečné činnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 1 399 098,37 Kč.
- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací realizovány činnosti dle
a) přílohy č. 2 – Změnový list 007 Bourání zpevněné plochy, přemístění panelů a doplnění chodníků – nutná změna umístění stavby a realizace nových zpevněných ploch, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a vedlejší režijní náklady +802 814,38 Kč,
b) přílohy č. 3 – Změnový list 010 Změna kanalizační přípojky – nutná doplnění drenážního vsakovacího žebra pro svádění dešťové vody a nutná změna provedení kanalizační přípojky objektu, a s tím související dodávky, služby, stavební práce a vedlejší režijní náklady +419 778,72 Kč, kdy se jedná o změnu - dodatečné činnosti, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 1 222 593,10 Kč.

III.

Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvyšuje o 1 945 387,77 Kč bez DPH. Tímto dodatkem č. 3 se tímto mění čl. VII odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní

„Cena za provedení všech činností dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Činnosti dle čl. II. odst. 2, písm. a) této smlouvy</i>	<i>1 520 413 Kč bez DPH</i>
<i>Ostatní činnosti dle této smlouvy</i>	<i>19 250 518,56 Kč bez DPH</i>
<i>Cena CELKEM</i>	<i>20 770 931,56 Kč bez DPH</i>


IV.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne:

Vdne:

.....





Přílohy:

Změnový list ZL009_Změna vybavení modulové stavby

Změnový list ZL007_Bourání zpevněné plochy, přemístění panelů a doplnění chodníků

Změnový list ZL010_Změna kanalizační přípojky



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka					
Z2023-040966	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVÍŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD					
Označení rozpočtu	Název rozpočtu					
ZL007	Bourání zpevněné plochy, přemístění panelů a doplnění chodníků					
Název stavby:		NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVÍŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD				
Objednatel:		Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem-Severní terasa				
Zhotovitel:		POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky				
Projektant:		Demoliční výměr - [REDACTED]				
Technický dozor:		[REDACTED]				
Rozpočtoval:		[REDACTED]				
Za zhotovitele:		Ing. Jan Masár	Za TDS:	vz. Majmír Sklenář	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		26.07.2024	Datum:		Celkem (bez DPH)	802 814,38 Kč
				DPH		Kč
				DPH 21%	168 591,02	Kč
				DPH 15%		Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	971 405,40	Kč
Razítko a podpis		Razítko a podpis				

Poznámka:

Vzhledem ke změně umístění stavby mimo plochu vybouraných garáží na pokyn objednatele a požadavku na samostatné oddělení vstupů do pracovišť bylo nutné doprojektovat a bude nutné zrealizovat nové zpevněné plochy.

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL007	Bourání zpevněné plochy, přemístění panelů a doplnění chodníků

Položkový rozpočet

Celkem ZL

802 814,38 Kč bez DPH

Drenážní vsakovací žebro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

DHSVPráce a dodávky HSV772 814,38

D1Zemní práce85 108,60

1	K	113106240	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem	m2	392,035	56,20	22 032,37	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106240

2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	157,271	160,00	25 163,36	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104

VV"Komunikace" 48,10*4*0,4586,580

VV"Parkovací stání" 12,0*6,0*0,4532,400

VV"Zámková dlažba" ((23,5*2,35)+(16,1*1,3*2)+(23,5*1,3))*0,3038,291

VVSoučet157,271

3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	157,271	87,70	13 792,67	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103

VV"Komunikace" 48,10*4*0,4586,580

VV"Parkovací stání" 12,0*6,0*0,4532,400

VV"Zámková dlažba" ((23,5*2,35)+(16,1*1,3*2)+(23,5*1,3))*0,3038,291

VVSoučet157,271

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	157,271	22,00	3 459,96	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

VV"Komunikace" 48,10*4*0,4586,580

VV"Parkovací stání" 12,0*6,0*0,4532,400

VV"Zámková dlažba" ((23,5*2,35)+(16,1*1,3*2)+(23,5*1,3))*0,3038,291

VVSoučet157,271

5	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	392,035	52,70	20 660,24	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112

VV"Komunikace" 48,10*4192,400

VV"Parkovací stání" 12,0*6,072,000

VV"Zámková dlažba" ((23,5*2,35)+(16,1*1,3*2)+(23,5*1,3))127,635

VVSoučet392,035

D5Komunikace pozemní258 714,39

6	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	264,400	145,00	38 338,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111

VV"Komunikace" 48,10*4192,400

VV"Parkovací stání" 12,0*6,072,000

VVSoučet264,400

7	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	264,400	209,00	55 259,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111

VV"Komunikace" 48,10*4192,400

VV"Parkovací stání" 12,0*6,072,000

VVSoučet264,400

8	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	127,635	274,00	34 971,99	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111

VV"Zámková dlažba" ((23,5*2,35)+(16,1*1,3*2)+(23,5*1,3))127,635

9	K	584121112	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2	m2	264,400	139,00	36 751,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/584121112

VV"Komunikace" 48,10*4192,400

VV"Parkovací stání" 12,0*6,072,000


VVSoučet264,400

10	M	59381004	panel silniční 3,00x2,00x0,15m	kus	44,000	0,00	0,00	Využitý z místa stavby
----	---	----------	--------------------------------	-----	--------	------	------	------------------------

11	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	127,635	338,00	43 140,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211112								
12	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	130,188	386,00	50 252,57	CS ÚRS 2024 02
VV127,635*1,02 'Přepočtené koeficientem množství130,188								
D9Ostatní konstrukce a práce, bourání							159 361,55	
13	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	278,00	556,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111								
14	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	456,00	456,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	806,00	806,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	915311113	Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 5 m2	kus	1,000	14 600,00	14 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915311113								
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	124,200	349,00	43 345,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213								
VV48,1+4,0+48,1					100,200			
VV6,0+12,0+6,0					24,000			
VVSoučet					124,200			
18	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	126,684	232,00	29 390,69	CS ÚRS 2024 02
VV124,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství126,684								
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	63,000	298,00	18 774,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213								
VV23,5+19,75+19,75					63,000			
20	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	64,260	120,00	7 711,20	CS ÚRS 2024 02
VV63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství64,260								
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,986	4 240,00	21 140,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121								
VV124,2*0,3*0,1					3,726			
VV63,0*0,2*0,1					1,260			
VVSoučet					4,986			
22	K	979094441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	392,035	57,60	22 581,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979094441								
D997Přesun sutě							208 405,81	
23	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	156,814	734,00	115 101,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571								
24	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	156,814	595,00	93 304,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612								
D998Přesun hmot							61 224,03	
25	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	194,362	315,00	61 224,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998226011								
DVRNVedlejší rozpočtové náklady							30 000,00	
DVRN4Inženýrská činnost							30 000,00	
29	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000								
VV28,0*1,0*0,45					12,600			

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL007	Bourání zpevněné plochy, přemístění panelů a doplnění chodníků

Zadávací dokumentace




LEGENDA SÍTÍ:

- NAVRŽ. JEDNOTNÁ KANALIZACE
- NAVRŽ. ROZVOD VODY
- NAVRŽ. ROZVOD TEPLA
- NAVRŽ. ROZVOD NN
- NAVRŽ. ROZVOD SLP-OPTIKA
- NAVRŽ. ROZVOD OPZ

NÁVRH PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRO VÝSTAVBU DOČASNÝCH LABORATORŮ
OKB A SKLADU KRVE.

Modernizace a dostavba nemocnice, KZ,a.s.-Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.- pracoviště Rur
Generel nemocnice a studie proveditelnosti



- POZNÁMKY:
- STAVBA DLE VYHLÁŠKY č. 460/2021 Sb. PATŘÍ DO KATEGORIE 0 A TUDÍŽ NEVZNIKÁ ŽÁDNÝ POŽÁRNÍ NEBEZPEČNÝ PROSTOR A NÁSTUPNÍ PLOCHA PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU
 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VJEZDEM URČÍ ZHOTOVITEL STAVBY, POPŘ. BUDE ŘEŠENO V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
 - STAVBOU NEVZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO
 - NA STAVBĚ NEJSOU ŽÁDNÉ GEOTECHNICKÉ SONDY
 - HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ JSOU NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

PŘEHLED BODŮ				
Číslo bodu	Popis	X	Y	Z
1		-721054,96	-949325,14	0,00
2		-721054,69	-949325,30	0,00
3		-721052,26	-949328,10	0,00
4		-721043,04	-949344,24	0,00
5		-721033,83	-949365,85	0,00
6		-721035,01	-949368,57	0,00
7		-721024,86	-949336,49	0,00
8		-721043,30	-949369,89	0,00
9		-721048,01	-949358,85	0,00
10		-721015,65	-949358,11	0,00

KOMUNIKACE Z BETONOVÝCH PANELŮ

OBJEKT LABORATOŘÍ

PARKOVACÍ STÁNÍ Z BETONOVÝCH PANELŮ

ZPEVNĚNÁ PLOCHA, ZÁMKOVÁ DLAŽBA II. 60mm, BÁRVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

SÍŤOVACÍ KABEL PODZEMNÍ

VEDENÍ NIN PODZEMNÍ

VODOVOD

KANALIZACE

PLYNOVOD STL

ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ JAKO JEJICH VYTÝČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ SE SPRÁVCI SÍTÍ

LEGENDA



STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
Z2023-040966	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVÍŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL009	Změna vybavení modulové stavby	

Název stavby:	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVÍŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD
Objednatel:	Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem-Severní terasa
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky
Projektant:	Demoliční výměr - Martin Pařenica (Ústí nad Labem, 29.8.2023), Modulová stavba - CUBESPACE s.r.o.
Technický dozor:	vz. Mojmir Sklenář (zástupce KZ UL)
Rozpočtoval:	Břetislav Růžička (POHL cz)

Za zhotovitele:	Ing. Jan Masár	Za TDS:	vz. Mojmir Sklenář	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	11.07.2024	Datum:		Celkem (bez DPH)	755 854,67 Kč
 Ing. Jan Masár cn=Ing. Jan Masár, c=CZ, o=POHL cz, a.s., ou=5, email=jan.masar@pohl.cz 11.07.2024 Razítko a podpis	 Ing. Jiří Pacovský Digitálně podepsal Ing. Jiří Pacovský Datum: 2024.10.22 09:24:54 +02'00' Razítko a podpis	DPH			Kč
		DPH 21%		158 729,48	Kč
		DPH 15%			Kč
		Cena celkem (včetně DPH)		914 584,15	Kč

Poznámka:

Při projekčních pracích, zjišťování podkladů a požadavků provozů bylo nutné změnit technologie teplé užitkové vody, vytápění, došlo k doplnění klimatizačních jednotek, doplnění světlíků do střechy a doplnění elektroinstalace.

Změna z centrálních el. zásobníků vody na menší zásobníky a dle požadavků na hygienu. Na základě požadavku klienta.
Dodatečné prostupy nad rámec zadání VŘ. Charakter požadavku, že každý modul je nunté mít kdykoliv možnost vyjmout ze sestavy.
Požadavek na změnu vytápění z centrální plynového na el. konvektory v každém modulu.
Požadavek klienta, že vybrané moduly budou osazeny klimatizační jednotkou.
Navýšení datových zásuvek z 13ks na 39ks. Původně počítáno s 4 PC pracoviště a nově 13 PC pracovišť.
Navýšení pracovních míst na žádost klienta.
Decentralizace modulové sestavy. Charakter požadavku, že každý modul je nunté mít kdykoliv možnost vyjmout ze sestavy.
Doplnění světlíků na žádost klienta.

Tyto požadavky byly projednány se zástupci KZ.

Ceny jsou použity průzkumem trhu v daném místě a čase.

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL009	Změna vybavení modulové stavby


Položkový rozpočet


PČ	Typ	MCP/VCP	Položka	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	R	MCP	STIEBEL ELTRON PSH 120 Universal - výrobek a montáž	ks	-2	20 561,00 Kč	-41 122,00 Kč
2	R	VCP	Tlakový ohřívač vody 5L - výrobek a montáž	ks	6	6 882,75 Kč	41 296,50 Kč
3	R	VCP	Tlakový ohřívač vody 10L - výrobek a montáž	ks	5	7 572,75 Kč	37 863,75 Kč
4	R	VCP	OHŘÍVAČ VODY 50 l - výrobek a montáž	ks	2	15 335,25 Kč	30 670,50 Kč
5	R	VCP	Dodatečné prostupu podlahou, topný kabel - materiál a práce	ks	11	3 150,00 Kč	34 650,00 Kč
6	R	VCP	Dodatečné prostupu stěnou - materiál a práce	ks	6	2 555,00 Kč	15 330,00 Kč
7	R	VCP	KONVEKTOR , 1500W - výrobek a práce	ks	14	5 530,00 Kč	77 420,00 Kč
8	R	MCP	Plynové vytápění - kotel, rozvody a otopná tělesa	ks	-1	231 263,85 Kč	-231 263,85 Kč
9	R	VCP	Klimatizace venkovní jednotka, 4.4 Kw - výrobek a montáž	ks	12	45 779,20 Kč	549 350,40 Kč
10	R	VCP	Klimatizace vnitřní jednotka - výrobek a montáž	ks	12	7 413,60 Kč	88 963,20 Kč
11	R	VCP	Navýšení datových zásuvek - 13ks na 39ks, montáž, dodatečný kabelkanál	ks	26	998,00 Kč	25 948,00 Kč
12	R	VCP	Podružný data router	ks	7	2 456,31 Kč	17 194,17 Kč
13	R	MCP	Centrální rozvaděč - výrobek a práce	ks	-1	65 766,00 Kč	-65 766,00 Kč
14	R	VCP	Rozvodnice každý modul a rozvaděč - výrobek a práce	ks	14	7 800,00 Kč	109 200,00 Kč
15	R	VCP	Světlík kopulový fixní PC manžeta 15 cm 70×100 cm - výrobek a montáž	ks	4	16 530,00 Kč	66 120,00 Kč
Celkem							755 854,67

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL009	Změna vybavení modulové stavby

Příloha č.1
DSP

Zadávací doumentace situace

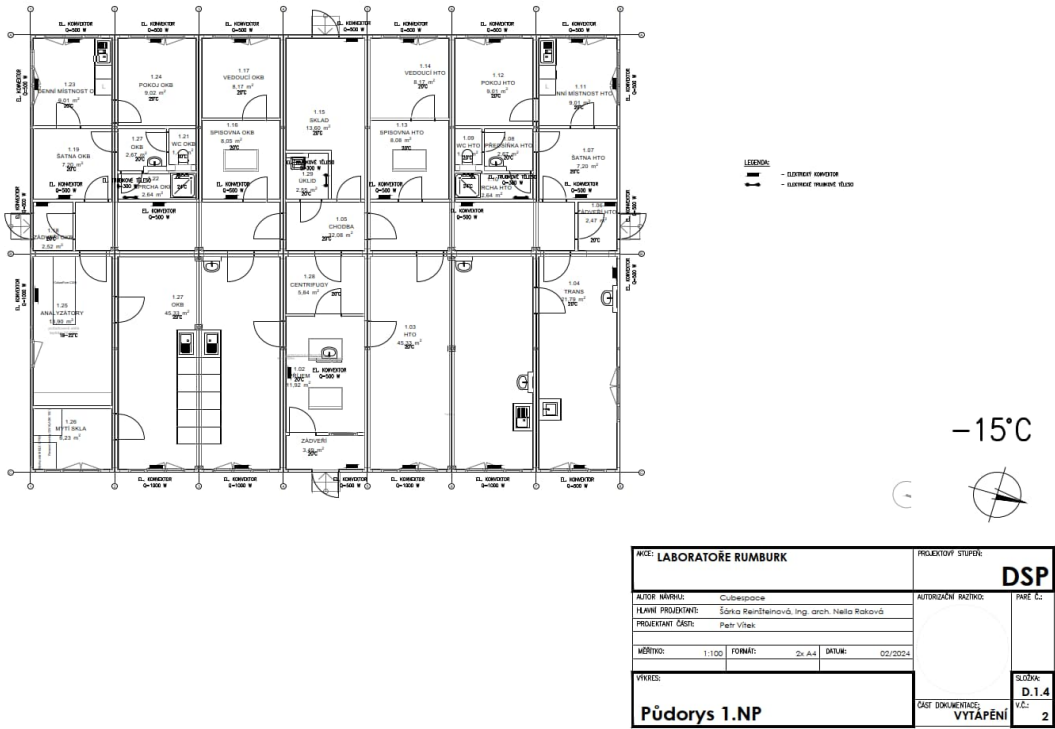

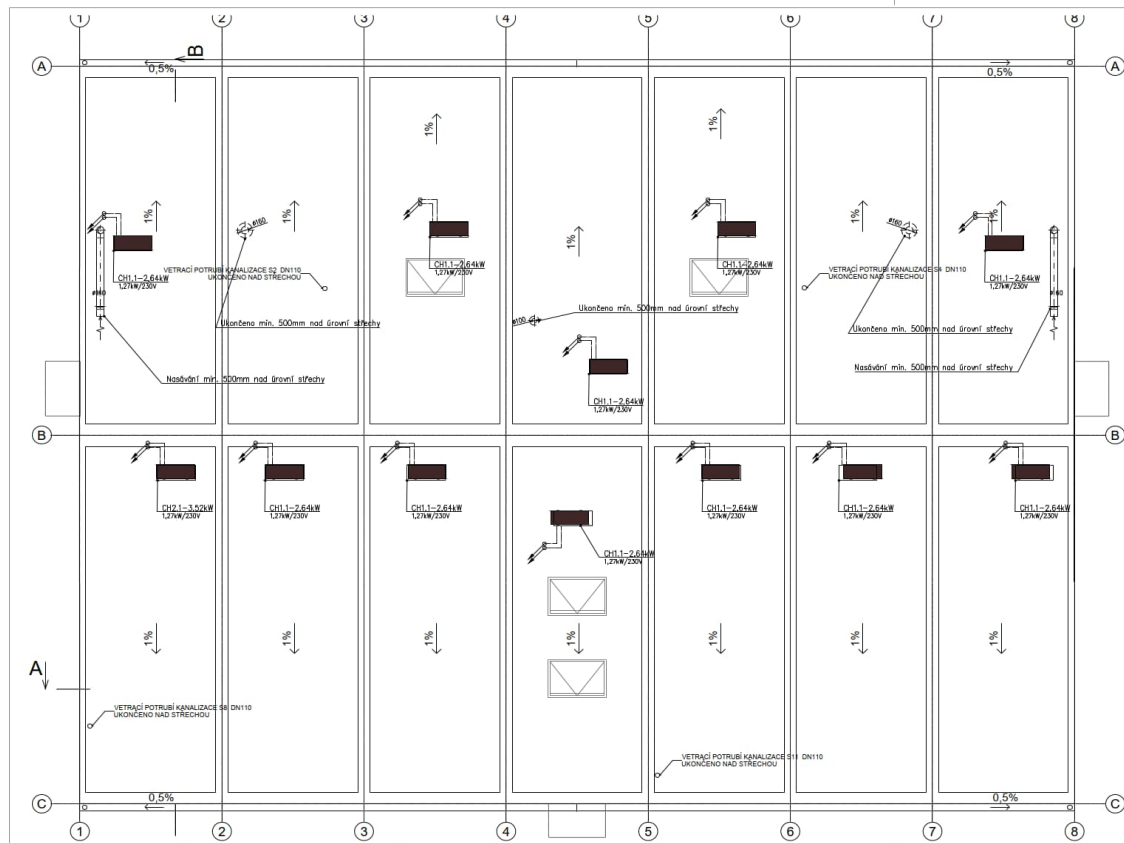

Legenda:

1. VETRAČÍ POTRUBÍ KANALIZACE DN110
2. VETRAČÍ POTRUBÍ KANALIZACE DN150
3. DHL 1-2.64W DN110
4. DHL 1-2.64W DN150
5. VETRAČÍ POTRUBÍ KANALIZACE DN110
6. VETRAČÍ POTRUBÍ KANALIZACE DN150
7. DHL 1-2.64W DN110
8. DHL 1-2.64W DN150

Poznámky:

Všechny potrubí a kanalizace musí být provedeny s minimální výškou nad úrovní střechy min. 500mm.

Krajská zdravotní a.s.

Sociální palác 3315/12A, 401 13 (301) nad Láznemi
tel.: +420 477 111 111, email: jan.vagner@kzdrav.cz

Laboratoř Rumburk

DSP + DPS
Dokumentace pro stavební povolení a
provedení stavby


KEJMAR
TZA - KEJMAR
Hodská 417,
109 00, Praha 10
www.kejmar.cz

Ing. Jiří Kágr
Ing. Martin Kágr

D.1.4.b,c ZAŘÍZENÍ PRO
OCHLAZOVÁNÍ STAVEB A
VZDUCHOTECHNIKY


Přodorys 1np

02/2024 1:50 101 00



Typ souvisejícího systému	RZ přechod	drátový	potrubní	potrubní	PUMP
	drátový	drátový	drátový	drátový	drátový
bezpečnostní kabelový systém (bez přechodů) (viz tab. 10 a 11)	12	8	2	0	0
drátový kabelový systém (bez přechodů) (viz tab. 10 a 11)	50	38	25	0	0
drátový kabelový systém (bez přechodů) (viz tab. 10 a 11)	138	75	30	0	0
drátový kabelový systém (bez přechodů) (viz tab. 10 a 11)	200	220	150	0	0

[illegible][illegible][illegible][illegible]

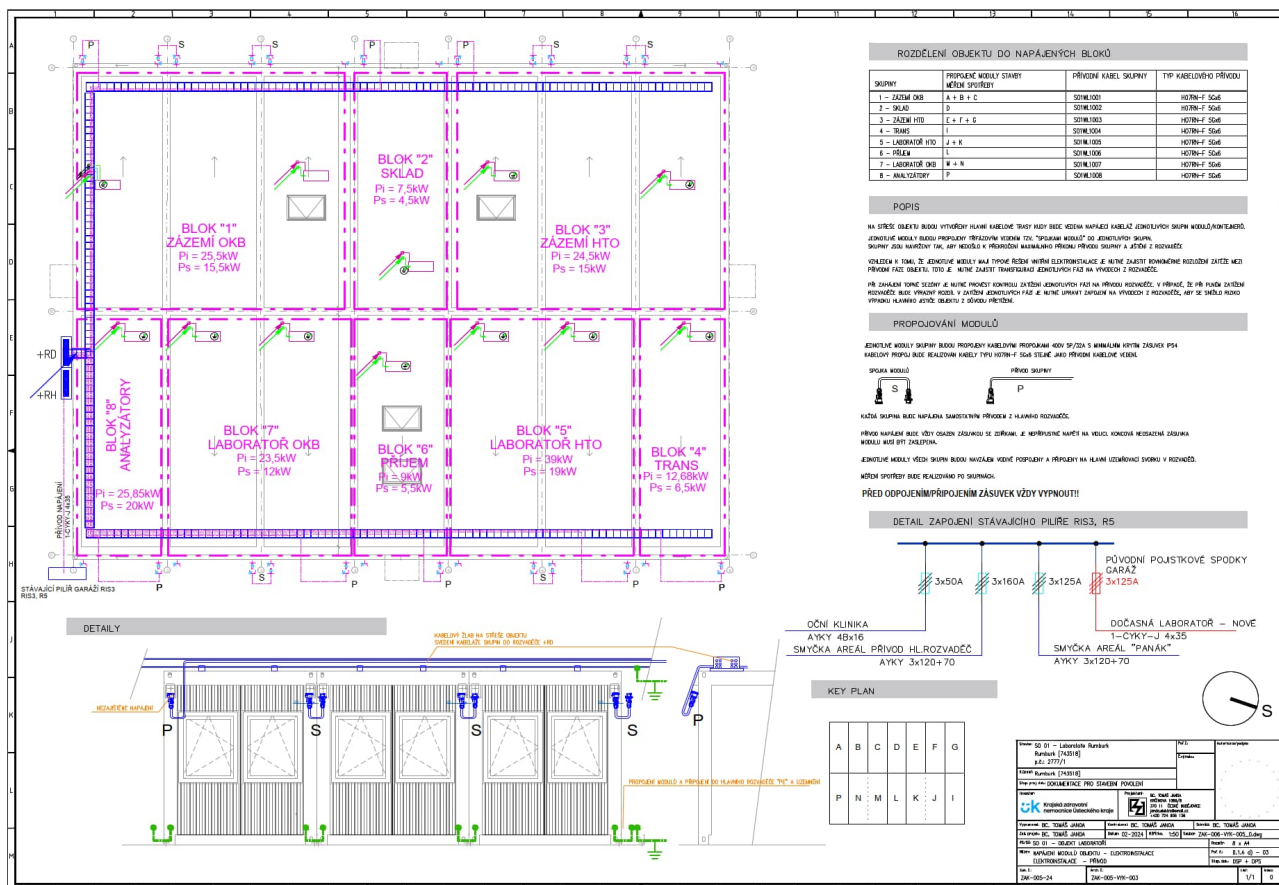

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
Z2023-040966	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVIŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL010	Změna Kanalizační přípojky	

Název stavby:	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVIŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD
Objednatel:	Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem-Severní terasa
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky
Projektant:	Demoliční výměr - Martin Pařenica (Ústí nad Labem, 29.8.2023), Modulová stavba - CUBESPACE s.r.o.
Technický dozor:	vz. Mojmir Sklenář (zástupce KZ UL)
Rozpočtoval:	Lukáš Hykyš

Za zhotovitele:	Ing. Jan Masár	Za TDS:	vz. Mojmir Sklenář	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	12.07.2024	Datum:		Celkem (bez DPH)	419 778,72 Kč
 Ing. Jan Masár Ing. Jan Masár, c=CZ, cn=Ing. Jan Masár, o=POHL cz, a.s., ou=5, email=jan.masar@pohl.cz 12.07.2024 Razítko a podpis	 Ing. Jiří Pacovský Digitálně podepsal Ing. Jiří Pacovský Datum: 2024.10.22 09:25:32 +02'00' Razítko a podpis	DPH		Kč	
		DPH 21%		88 153,53 Kč	
		DPH 15%		Kč	
		Cena celkem (včetně DPH)		507 932,25 Kč	

Poznámka:

Při inženýrské činnosti a projektování stavby bylo zjištěno, že nelze dešťové vody svádět na terén (dle zadávací dokumentace) ani je svádět do kanalizačního řadu. Z tohoto důvodu bylo nutné oproti zadávací dokumentaci doplnit drenážní vsakovací žebro.

Dále bylo zjištěno, že stávající kanalizační řad je uložen velmi mělko a není možné dle zadávací dokumentace provést napojení pro odpad laboratoří. Z tohoto důvodu bude provedeno delší kanalizační připojení a to do stávající kanalizační šachty v areálu nemocnice. Budou zřízeny dvě revizní šachty. Tento ZL neobsahuje případnou výměnu stávající napojovací kanalizační šachty, která je v havarijním stavu, ani případnou přeložku kanalizace, která může být v kolizi se základy laboratoří. Jiným možným řešením by bylo zřízení přečerpávací stanice, ale toto by bylo velmi nákladné a vyžadovalo by budoucí náklady na provoz a údržbu.

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL010	Změna Kanalizační přípojky

Položkový rozpočet

Drenážní vsakovací žebro

Celkem ZL

419 778,72 Kč bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							271 098,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							268 054,80	
D 1 Zemní práce							110 153,86	
1	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	98,000	36,80	3 606,40	CS ÚRS 2024 01
VV 49*2				98,000				
2	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	98,000	15,20	1 489,60	CS ÚRS 2024 01
3	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	4,000	213,00	852,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	4,000	58,30	233,20	CS ÚRS 2024 01
5	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	27,440	839,00	23 022,16	CS ÚRS 2024 01
VV 49,0*0,8*0,7				27,440				
6	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	60,200	485,00	29 197,00	CS ÚRS 2024 01
VV 21,5*1,75*1,60				60,200				
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	121,346	85,20	10 338,68	CS ÚRS 2024 01
VV 27,44+60,2				87,640				
VV 33,706				33,706				
VV Součet				121,346				
8	K	167111121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,706	250,00	8 426,50	CS ÚRS 2024 01
VV 33,706				33,706				
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	33,706	255,00	8 595,03	CS ÚRS 2024 01
VV 27,44+60,2				87,640				
VV -16,072				-16,072				
VV -3,763				-3,763				
VV -5,88				-5,880				
VV -28,219				-28,219				
VV Součet				33,706				
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	16,072	230,00	3 696,56	CS ÚRS 2024 01
VV 49*0,8*0,41				16,072				
11	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	32,144	532,00	17 100,61	CS ÚRS 2024 01
VV 16,072*2 *Přepočtené koeficientem množství				32,144				
12	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	39,200	91,00	3 567,20	CS ÚRS 2024 01
VV 49*0,8				39,200				
14	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,200	6,82	21,82	CS ÚRS 2024 01
15	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,064	111,00	7,10	CS ÚRS 2024 01
VV 3,2*0,02 *Přepočtené koeficientem množství				0,064				
D 2 Zakládání							11 772,80	
16	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	43,000	74,60	3 207,80	CS ÚRS 2024 01
VV 21,5*2				43,000				
17	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	150,000	23,00	3 450,00	CS ÚRS 2024 01
18	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	150,000	34,10	5 115,00	CS ÚRS 2024 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							2 347,10	

19	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	49,000	47,90	2 347,10	CS ÚRS 2024 01
D		4	Vodorovné konstrukce	46 445,63				
20	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	3,763	1 350,00	5 080,05	CS ÚRS 2024 01
VV		21,5*1,75*0,1			3,763			
21	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	5,880	1 180,00	6 938,40	CS ÚRS 2024 01
VV		49*0,8*0,15			5,880			
22	K	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhuštění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	28,219	1 220,00	34 427,18	CS ÚRS 2024 01
VV		21,5*1,75*0,75			28,219			
D		8	Trubní vedení	46 138,50				
23	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	49,000	169,00	8 281,00	CS ÚRS 2024 01
24	M	286111118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	50,470	250,00	12 617,50	CS ÚRS 2024 01
VV		49*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			50,470			
25	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	2,000	796,00	1 592,00	CS ÚRS 2024 01
26	K	894812003	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	4,000	1 560,00	6 240,00	CS ÚRS 2024 01
27	K	894812031	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm	kus	4,000	1 150,00	4 600,00	CS ÚRS 2024 01
28	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za užití šachtové roury	kus	4,000	91,20	364,80	CS ÚRS 2024 01
29	K	894812061	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)	kus	2,000	1 690,00	3 380,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	894812062	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)	kus	2,000	4 120,00	8 240,00	CS ÚRS 2024 01
31	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	49,000	16,80	823,20	CS ÚRS 2024 01
D		998	Přesun hmot	51 196,91				
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	45,307	1 130,00	51 196,91	CS ÚRS 2024 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV	3 044,00				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 044,00				
33	K	721242105	Lapače sítěšních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	4,000	761,00	3 044,00	CS ÚRS 2024 01

Prodloužení přípojky kanalizace o 28 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							148 679,92	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				148 679,92	
	D	1	Zemní práce				70 655,72	
1	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	56,000	36,80	2 060,80	CS ÚRS 2024 01
VV				28*256,000				
2	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	56,000	15,20	851,20	CS ÚRS 2024 01
3	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	4,000	213,00	852,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	4,000	58,30	233,20	CS ÚRS 2024 01
5	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	32,200	611,00	19 674,20	CS ÚRS 2024 01
VV				28*1,0*1,1532,200				
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,000	594,00	2 970,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	64,400	142,00	9 144,80	CS ÚRS 2024 01
VV				32,200*264,400				
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	64,400	83,30	5 364,52	CS ÚRS 2024 01
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	64,400	85,20	5 486,88	CS ÚRS 2024 01
VV				32,20*264,400				

10	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,400	164,00	2 525,60	CS ÚRS 2024 01
VV			15,40	15,400				
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,400	155,00	2 387,00	CS ÚRS 2024 01
VV			32,20	32,200				
VV			-12,6	-12,600				
VV			-4,2	-4,200				
VV			Součet	15,400				
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,600	230,00	2 898,00	CS ÚRS 2024 01
VV			28,0*1,0*0,45	12,600				
13	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	25,200	532,00	13 406,40	CS ÚRS 2024 01
VV			12,6*2 'Přepočtené koeficientem množství	25,200				
14	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	28,000	91,00	2 548,00	CS ÚRS 2024 01
VV			28*1,0	28,000				
16	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	28,000	6,82	190,96	CS ÚRS 2024 01
17	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,560	111,00	62,16	CS ÚRS 2024 01
VV			28*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	0,560				
D 4			Vodorovné konstrukce	4 956,00				
19	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	4,200	1 180,00	4 956,00	CS ÚRS 2024 01
VV			28,000*1,00*0,15	4,200				
D 8			Trubní vedení	30 376,24				
20	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	28,000	179,00	5 012,00	CS ÚRS 2024 01
21	M	28611261	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12	m	28,840	466,00	13 439,44	CS ÚRS 2024 01
VV			28*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	28,840				
22	K	877310440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 150	kus	1,000	288,00	288,00	CS ÚRS 2024 01
23	M	28617480	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160	kus	1,000	592,00	592,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	2,000	796,00	1 592,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	894812003	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 01
26	K	894812031	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 01
27	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za užití šachtové roury	kus	2,000	91,20	182,40	CS ÚRS 2024 01
28	K	894812061	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)	kus	2,000	1 690,00	3 380,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	28,000	16,80	470,40	CS ÚRS 2024 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 615,00				
30	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	0,500	7 230,00	3 615,00	CS ÚRS 2024 01
D 997			Přesun sutě	56,93				
31	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,044	998,00	43,91	CS ÚRS 2024 01
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,044	296,00	13,02	CS ÚRS 2024 01
D 998			Přesun hmot	39 020,03				
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	34,531	1 130,00	39 020,03	CS ÚRS 2024 01

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL010	Změna Kanalizační přípojky

Zadávací dokumentace

