

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

081-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu :

A

B

C

x

Zakázky:

E211H8U21MQ7

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Ostružná - výpravní budova

IC6000383392

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

50.1835517N, 17.0507583E

Opatření proti hnízdění ptactva

Opatření proti hnízdění ptactva včetně odstranění hnízd a očištění omítky od trusu dle přiložené projektové dokumentace.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 31.3.2025

Příloha: projektová dokumentace včetně foto

Vzdálenost v KM

90

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

20.01.2025

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

20.01.2025

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

22.01.2025 v 8:43

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

23.01.2025

22.01.2025

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	081/2024-25		
Název majetku	Ostružná - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383392
zahájení prací	03.03.2025	ukončení prací	31.03.2025

popis prací

Požadavek - Opatření proti hnízdění ptactva.

Opatření proti hnízdění ptactva včetně odstranění hnízd a očištění omítky od trusu dle přiložené projektové dokumentace.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 31.3.2025

Příloha: projektová dokumentace vč.foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ					
	Cena za zakázku celkem				112 213,21	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

22.01.2025
podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 081
Stavba: 081 Ostružná - výpravní budova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

081

Stavba:

081 Ostružná - výpravní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

opatření proti hnízdění ptactva
- 02

VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

081 Ostružná - výpravní budova

Objekt:

01 - opatření proti hnízdění ptactva

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	625681012	Ochrana proti holubům hrotový systém dvouřadý, účinná šíře 15 cm	m			
VV		17+13+13+(2*6)+18+13					
2	K	629995105	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou nástřikem čističe s následným omytím tlakovou vodou	m2	1		
3	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	kpl			
VV		"příplatek za čištění fasády ve výšce"1					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod			
5	K	946111116	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m montáž	kus			
6	K	946111216	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus			
7	K	946111816	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m do 6,6 m demontáž	kus			
8	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl			
9	K	952902141	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky	m2	2		
D		998	Přesun hmot				
10	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 081 Ostružná - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod			
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor			
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny			

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	081/2024-25		
Název majetku	Ostružná - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383392
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 31.03.2025
popis prací Požadavek - Opatření proti hnízdění ptactva: Přípravné práce Očištění vnějších ploch tlakovou vodou Čištění budov Montáž hrotového systému Úklidové práce, předání stavby		termín 3. den po zaslání objednávky 4. den po zaslání objednávky 6. den po zaslání objednávky 13. den po zaslání objednávky 14. den po zaslání objednávky	

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant:		EGO⁺ plus
Navrhl - vypracoval:		
Kontroloval:		
Investor: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava	Kraj: Olomoucký	
Gen. projektant Egoé plus a.s. Bílovice 519, 687 12 Bílovice		Stupeň: - Zákazkové číslo: - Počet A4: 12 A4 Měřítko: - Datum: 16.12.2024 Revize: 001
Stavba: Opatření proti hnízdění ptactva - Ostružná, Zábřeh na Moravě, Staré Město u U.H., Prostějov		Příloha: 01
Název přílohy: Technická zpráva		Souprava:

Opatření proti hnízdění ptactva
Ostružná, Zábřeh na Moravě, Staré Město u U.H.,
Prostějov

Vypracoval:

Datum: 12 / 2024

1.	Účel dokumentace	3
2.	Popis stávajícího stavu ve stanici	3
2.1.	Stávající stav – výskyt a ochranná opatření	3
3.	Navrhovaná opatření	7
3.1.	Odstranění stávajících škod	7
3.2.	Nový návrh zabezpečení proti ptactvu	7
3.3.	Specifikace materiálů a navrženého řešení	8
3.4.	Příklady technického provedení ochrany z jiných staveb	9
3.5.	Upozornění.....	11

1. Účel dokumentace

Tato zpráva byla vypracována na základě objednávky č. 24_635201112, vystavenou Správou železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava Přívoz z 30.1.2020.

Předmětem objednávky je dokumentace aktuálního stavu škod způsobených ptactvem na konstrukcích zastřešení nástupišť a prostorů pro cestující, včetně dopadů na nástupiště a další součásti stanice. Na základě zjištěného stavu je proveden návrh nových konstrukčních opatření pro snížení škod způsobených ptactvem.

V dané stanici byly posouzeny a zdokumentovány

- Ostružná – výpravní budova
- Zábřeh na Moravě – historická výpravní budova u služebního přechodu a přístavba budovy v uliční úrovni
- Staré Město u Uherského Hradiště – celá výpravní budova a samostatný objekt toalet
- Prostějov – okenní nika z ulice

2. Popis stávajícího stavu ve stanici

2.1. Stávající stav – výskyt a ochranná opatření


Ostružná


Na východní fasádě, pod římsou střechy, se vyskytuje početné hnízdění vlaštovek/jiříček. Opatření provedena nejsou.



Zábřeh na Moravě

Na severovýchodní fasádě historické budovy, přístavby v uliční úrovni a pod střešní římsou hodinové věže se vyskytuje početné hnízdění vlaštovek/jiříček. Dle informací od správce se výskyt hnízd po předchozím odstranění opakoval. Opatření provedena nejsou.

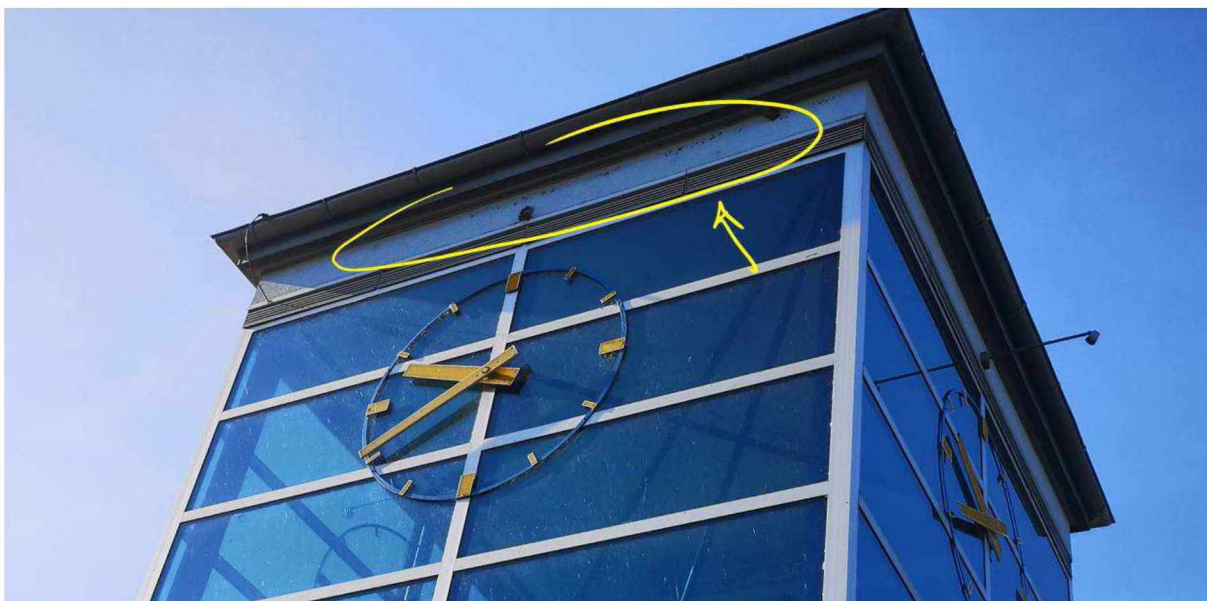

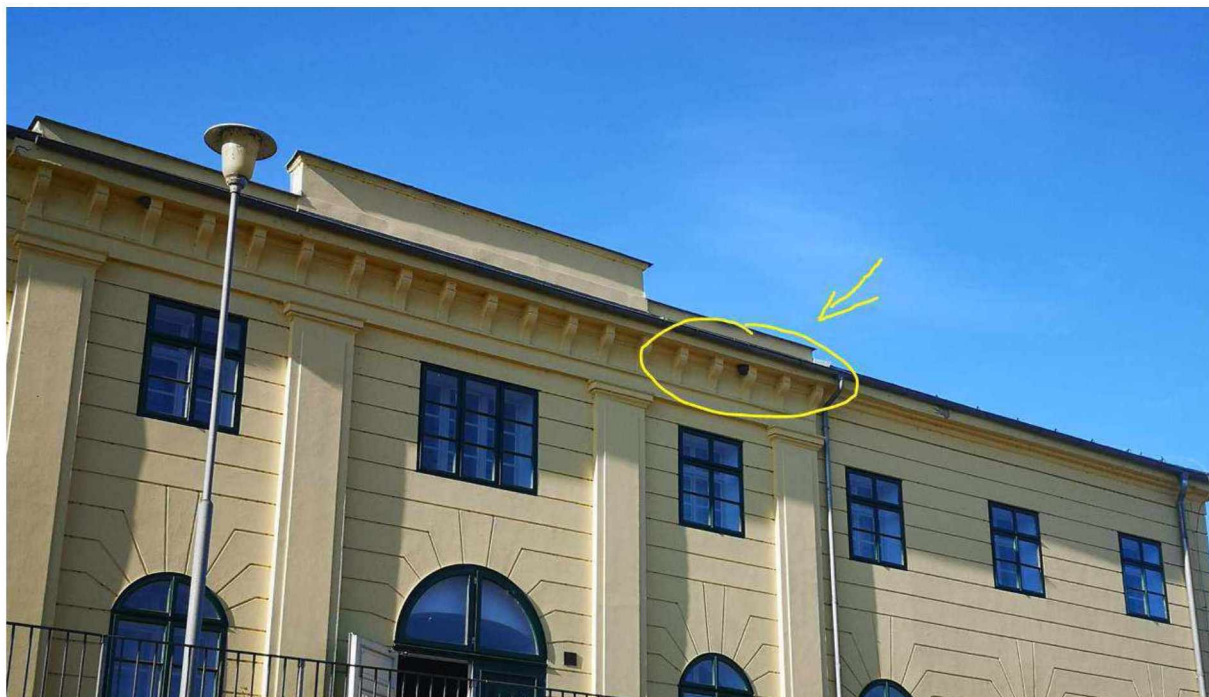

Staré Město u Uherského Hradiště

Pod římsami střechy celé výpravní budovy a samostatného objektu toalet se vyskytuje početné hnízdění vlaštovek/jiříček.

Na hranách střech dochází k sedání holubů – opatření byla provedena v minulosti osazením hrotového systému, část liniových hrotů je již uvolněná.





Prostějov hlavní nádraží

Na fasádě z ulice dochází v okenní nise a taktéž na vykonzolované tabuli OS k sedání holubů a znečišťování chodníku. Opatření provedena nejsou.





3. Navrhovaná opatření

Navrhované práce spočívají v odstranění stávajících škod a osazení ochranných prostředků pro zamezení přítomnosti ptactva v budoucnu.

3.1. Odstranění stávajících škod

Před instalací nových prvků, zamezujících přístupu ptáků, budou konstrukce daném místě zbaveny hnízd, výkalů a dalších projevů přítomnosti ptactva. Odstranění hnízd musí proběhnout v zimním období, mimo období hnízdění – konzultovat s ornitologickými organizacemi.

Přesný rozsah čištění/mytí bude dohodnut dle aktuálního stavu v době provádění prací. Tato dokumentace definuje stav v době prohlídky stanice před vypracováním této zprávy.

3.2. Nový návrh zabezpečení proti ptactvu

Ostružná

Bude osazen dvojhrotový liniový systém proti hnízdění vlaštovek/jiříček

- pod celý obvod střešní římsy a pod římsu přístavby 1NP u koleje.

Rozsah viz zákresy do fotografií.

Zábřeh na Moravě

Bude osazen dvojhrotový liniový systém proti hnízdění vlaštovek/jiříček

- pod římsu nové přístavby odbavovací haly
- pod římsu střechy hodinové věže
- pod římsu střechy po třech stranách historické výpravní budovy (tedy mimo stranu u koleje)

Rozsah viz zákresy do fotografií.

Staré Město u Uherského Hradiště

Bude osazen dvojhrotový liniový systém proti hnízdění vlaštovek/jiříček

- Pod veškeré římsy střechy výpravní budovy, mimo část nad zastřešením u koleje
- Pod římsy střechy objektu toalet, mimo část nad zastřešením u koleje

Rozsah viz zákresy do fotografií.

V době provádění bude revidován stav provedených opatření (hrotových systémů) proti sedání holubů a poškozené části budou opraveny/nahrazeny.

Prostějov hlavní nádraží


V okenní nise z uliční strany bude osazena síť proti holubům, síť bude zalícována s obvodem zdiva/parapetu.

Na vykonzolované tabuli orientačního systému bude osazen hrotový systém, stejně jako na tabuli s názvem stanice nad vstupem do VB.

3.3. Specifikace materiálů a navrženého řešení


Celoplošné zasítování:

- polyethylenová síť, černá/tmavá, oko 50x50 mm
- nerezová napínací lanka, kotvená do stávajících konstrukcí pomocí pozinkovaných úhelníků nebo šroubovaných ok, dle aktuálního stavu a místa v konstrukci
- spojování sítí a jejich kotvení k napínacím lankům pomocí hliníkových ok

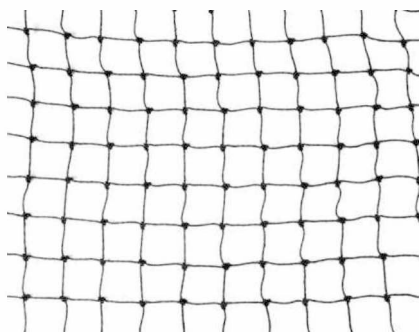

Hroty

- liniová ochrana horního líce prvku proti usednutí ptáka či proti hnízdění
- plastová transparentní lišta s jednou až čtyřmi řadami hrotů, podle rozměrů horního líce zabezpečovaného prvku
- hrotový systém bude na prvek nalepen lepícím tmelem

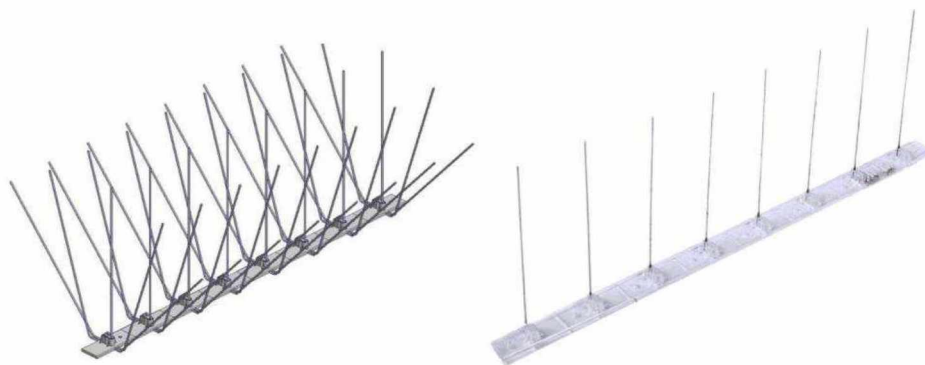

3.4. Příklady technického provedení ochrany z jiných staveb


Hrotový systém proti sedání, zejména holubů:




Hrotový systém proti hnízdění vlaštovek / jiříček:



Celoplošné zasíťování:

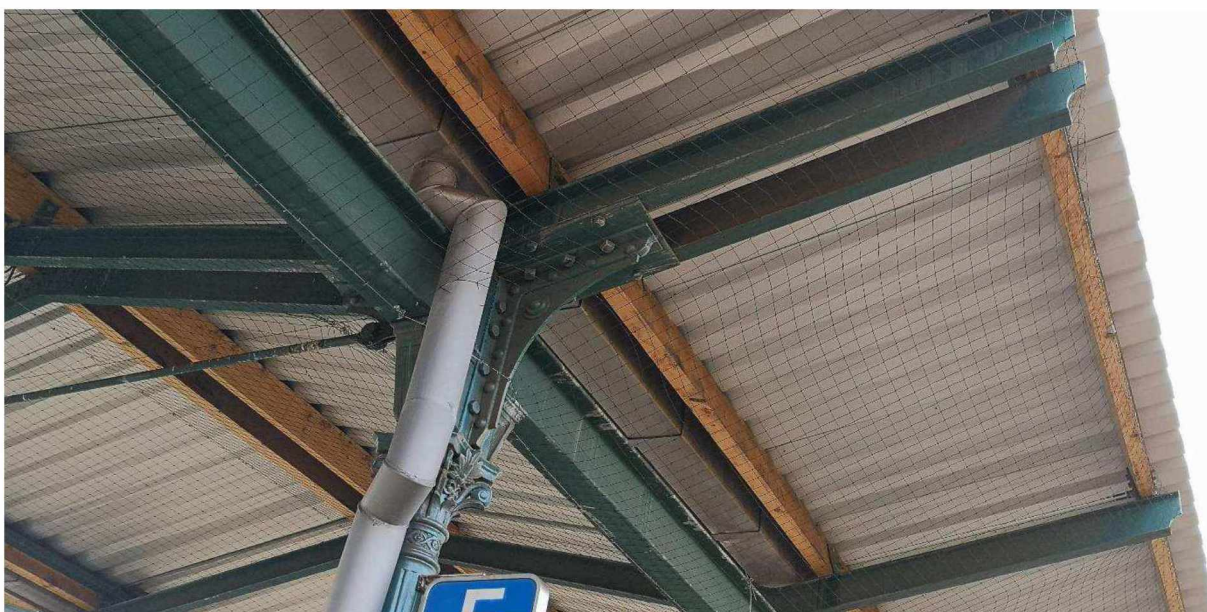

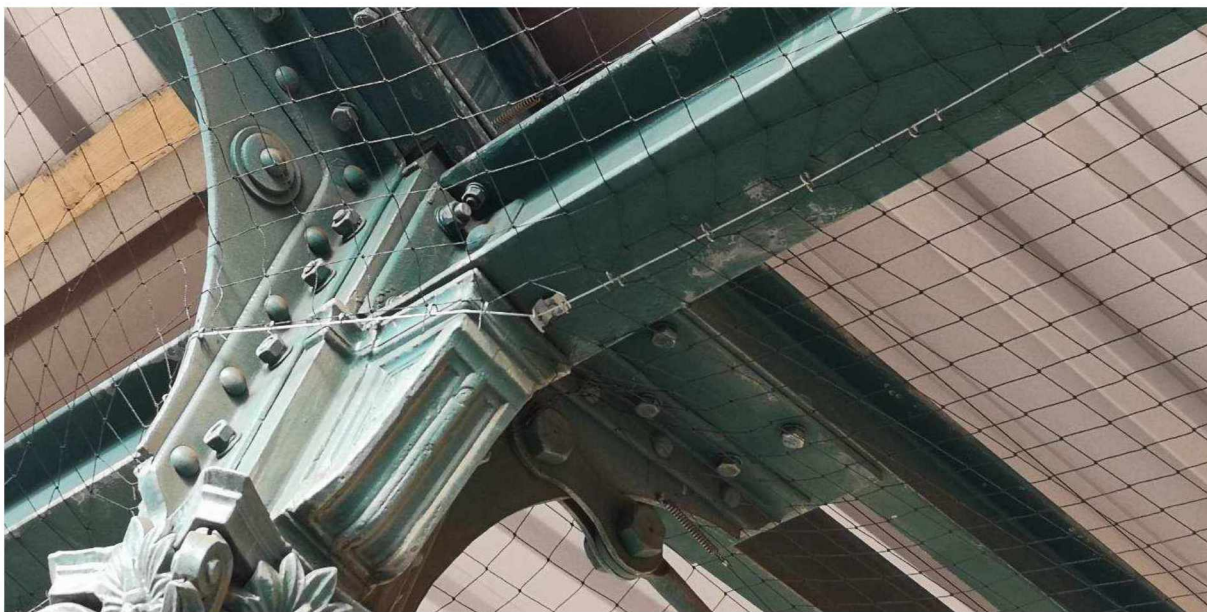

3.5. Upozornění

Zhotovitel prací zvolí takové pracovní postupy a zařízení, které jsou v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu pracovníků. Technologické postupy předloží objednateli před zahájením prací.

Přesný HMG prací a případnou výluku kolejí sdělí zhotoviteli objednatel. Zhotovitel je zodpovědný za bezpečnost práce a železničního provozu.
