



Název zakázky : Výstupní-TTV

ZL č.4

Adam Hořejší

08.10.2024

Stanislav Jokiel

11.10.2024

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : TTV-přeložky IS Vodafone u TTV č.110 a 111

1) VPC-navýšení stávající položky č.1-hloubení nezapažených jam-celkem **31,5 m3**

2) VCP-zpětné zásypy-písek-tl.10 cm+zemina-60 cm+folie-dle SoD-položky SoD č.14 a 16-délka celkem **45 bm**


PŘÍČINA / DŮVOD : Na základě zjištěných skutečností a kolizí nových základů TTV č. 110 a 111 a stávajících IS Vodafone musí dojít k přeložení IS Vodafone a vymístění mimo pozice nových základů TTV. Optické kabely IS Vodafone musejí být v celkové délce 45 bm ručně vykopány a přeloženy do nově vykopaných rýh, které se nacházejí mimo pozice nových základů TTV č. 110 a 111. Hloubka výkopů stávajících rýh a nových rýh je 0,7 m a šířka 0,5 m, délka 2*45 bm. Přeložené kabely budou zasypany 10 cm písku a opatřeny výstražnou folií-délka 45 bm. Tyto postupy byly odsouhlaseny správcem IS Vodafone.

Tyto práce mají vliv na cenu díla.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :

1) rozpočet k ZL č.4

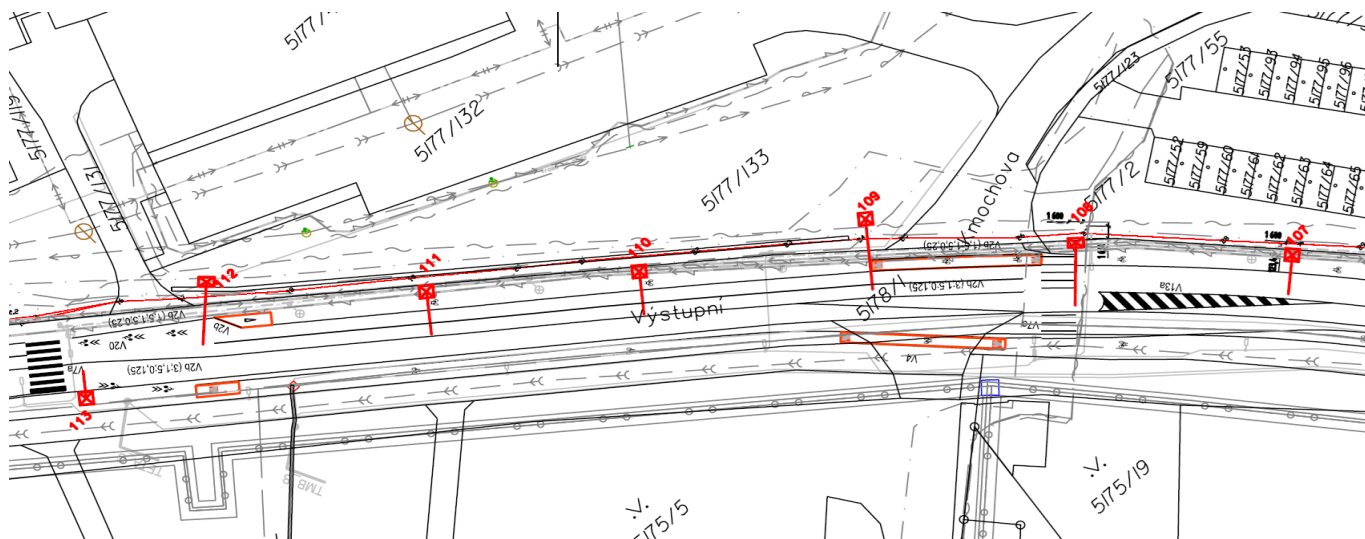

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Adam Hořejší
Stavbyvedoucí

Karel Lank

Technický dozor investora
