

Zhotovitel:	Změnový list	Číslo dokumentu :	7
ZISTAV s.r.o.		Počet příloh :	1
U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary		Účinnost od :	
IČ: 26316803, DIČ: C226316803			

NÁZEV STAVBY	Stavební úpravy Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Změny povrchových úprav nášlapných vrstev.		Číslo :	7
---	--	---------	----------

Komu:		Od:	Bc. Lukáš Havel			Datum:	07.12.2024		
Odesláno:		Poštou:		E-mail:	☒	Osobně:		Kurýr:	
Oznámení změny vyvoláno:				záměrem objednatel	záměrem provozovatele	chybou v dokumentac	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností	
				☒	☒				

Předmět změny : Záměna nášlapných vrstev + vyrovnaní podlah.

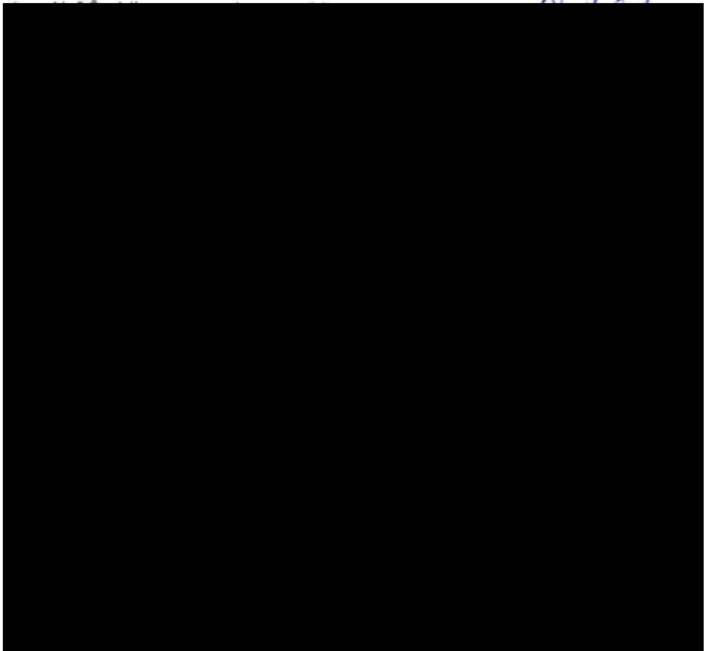
Důvod změny: Vyrovnaní stávajících dřevěných podlah a záměna nášlapné vrstvy.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původní řešení: Projektová dokumentace neřešila.

Nové řešení: Záměna nášlapných vrstev + vyrovnaní podlah.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /	Změna závazku ze smlouvy v Kč:
1) Odpočet	70 664,94
2) Připočet	
[ABS]	Hodnota změny závazku v %:
	4,07

Odsouhlasil a potvrdil:		Datum:	2.1.2025
Objednatel:		Datum:	16.12.24
AD:		Datum:	16.12.2024
TDS:		Datum:	16.12.2024
Zhotovitel - jednatel:		Datum:	16.12.2024
Zhotovitel - stavbyvedoucí:		Datum:	16.12.2024
Správce objektu:		Datum:	16.12.2024
Provozovatel objektu:		Datum:	16.12.2024

Vydání čís.:	1	Verze:	1	Počet stran:	1	Iniciátor změny:	Objednatel
Dopad na termín:	NE	Prodloužení o počet dnů:	0	Dopad na projekt	NE		

Přílohy: 1 - soupis prací

Rozdělovník : 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v objektu Komenského 759, Sokolov -změna
Objekt:
Místo: Sokolov
Zadavatel: Karlovarský kraj
Zhotovitel: ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14 360 17 Karlovy Vary

80 - Podlahy

Datum: 25. 1. 2024
Projektant: Projekt stav s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							70 664,94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 478,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 071,20
1	K	632451231	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 30 do 35 mm	m2			3 071,20
			8,8				
D	998		Přesun hmot				406,80
2	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t			406,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				67 186,94
D	762		Konstrukce tesařské				78 592,73
3	K	76250001R	Vstupy do tříd	hod			17 360,00
4	K	762511292	Podlahové kce podkladové dvourstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2			56 298,00
5	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2			2 593,80
6	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%			2 340,93
D	776		Podlahy povlakové				-11 405,79
7	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m			-6 678,00
8	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m			-6 121,50
9	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m			1 673,10
			0,9*11				
10	M	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro	m			2 090,29
11	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2			-1 099,05
12	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2			-5 409,05
13	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			-3 361,80
14	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			-2 300,40
15	K	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m			-880,40
16	K	776421414	Montáž kobercových lišt vč. řezaného soklu	m			6 148,00
17	M	5905417R	Kobercová soklová lišta TLE 55/2,5m	m			1 575,50
			54,7819047619048*1,05 Přepočtené koeficientem množství				
18	K	77645001R	Dod+mtz atyp dveří prahy š. 900mm	kus			1 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%			1 157,52
