

Změnový list číslo	77
--------------------	----

Identifikace akce

Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
-------------	--

Číslo akce SMVS:

Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
-------------	--

Zastoupen:	Objednatelem
------------	--------------

Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
-------------	--

SPST:	Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM
-------	-------------------------------------

Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
-------------	--

Předmět změnového listu				
-------------------------	--	--	--	--

Výměna pozic rozvaděčů pro gastro + zohlednění skutečné délky, SO 101 hala

Část díla dotčená změnovým listem

D.1.4.07 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD, UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD (SIL), SO 101 hala

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V původním řešení v tabulce rozvaděčů je uvažováno:

v 1.PP okruh „SBC-1R1“ s příkonem 17 kW a jištěním 32A

v 1.NP okruh „SBC-1Best1“ s příkonem 230 kW a jištěním 400A

Nové řešení :

Nové řešení zahrnuje výměnu pozic rozvaděčů SBC-1R1 a SBC-1REST1 a s tím související dílčí práce.

Zdůvodnění změny :

Změna vznikla na základě upozornění AD na chybu (záměnu) u přívodů (okruhů) u místností -1.R1.001 a 1.R7.001. Jedná se o samostatnou restauraci (nájemní prostor přes tři podlaží). Kuchyň pro tuto restauraci se ale uvažuje v 1.PP, tedy okruhy mají být v podlažích opačně oproti Projektové dokumentaci 1 – okruh SBC-1Rest1 s vyšším příkonem a jištěním v 1.PP a okruh SBC-1R1 má být v 1.NP. S ohledem na charakter řešené změny, kterou zadavatel jednatelji s náležitou péčí nemohl předvídat a která je nezbytná pro řádné a funkční provedení díla, se jedná o změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZVZ.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

S dopadem na výkresovou dokumentaci.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :

Záznam o změně je uveden v zápisu z KDČ. Ze dne 18.6.2024 v bodu 33/1.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla

Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 77

Přílohy:

1. Rozpočet změny
2. Zadání změny, komentář AD
3. Grafická část z modelu

Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
---	---------

Odpočty z ceny díla - \$222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
--	---------

Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
---	---------

Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
---	---------

Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
--	---------

Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
--	---------

Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	147 192,00 Kč
--	---------------

Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
--	---------

Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
--	---------

Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	147 192,00 Kč
---	---------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	147 192.00 Kč
--	---------------

Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	178 102.32 Kč
--	---------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt: 6 - Dodatek č.6
Soupis:

ZL 77 - Výměna pozic rozvaděčů pro gastro + zohlednění skutečné délky

Místo:

Datum: 08.10.2024

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

147 192,00

D		D11	Kabely						143 618,00
1	M	1407389R	Kabel 5x120 (B2ca s1 d0)	m	52,000	2 738,00	142 376,00	SOD	
	vv		položky ze smluvního rozpočtu D1.4.07; Hmotnost: 6,898 kg/m						
	vv		-52		-52,000				
	vv		+104		104,000				
	vv		Součet		52,000				
2	M	1407391R	Kabel 5x16 (B2ca s1 d0)	m	3,000	414,00	1 242,00	SOD	
	vv		-47		-47,000				
	vv		+50		50,000				
	vv		Součet		3,000				
D		D14	Ostatní						2 188,00
3	K	1407465R	Stavební přípomoc, zednické zapravení a koordinace s ostatními profesemi	hod	4,000	385,00	1 540,00	SOD	
4	K	1407477R	Přesun hmot	tun	0,359	1 805,00	648,00	SOD	
	vv		6,898*52/1000		0,359				
D		D20	Projekční práce						1 386,00
5	K	220890084R00	Účast projektanta na stavbě	h	2,000	693,00	1 386,00	RTS	



Dobrý den,

u přívodů pro gatro technologie jsem si při kontrole všiml záměny u přívodů (okruhů) u místností -1.R1.001 a 1.R7.001, jedná se o samostatnou restauraci (nájemní prostor přes tři podlaží).

V tabulce rozvaděčů je uvažováno:


v 1.PP okruh „SBC-1R1“ s příkonem 17 kW a jištěním 32A


v 1.NP okruh „SBC-1Rest1“ s příkonem 230 kW a jištěním 400A

Takto je to i ve výkrese.

Kuchyň pro tuto restauraci se ale uvažuje v 1.PP, tedy ty dva okruhy mají být v podlažích naopak – okruh SBC-1Rest1 s vyšším příkonem a jištěním v 1.PP a okruh SBC-1R1 má být v 1.NP.

V rámci RPD prosím o úpravu.



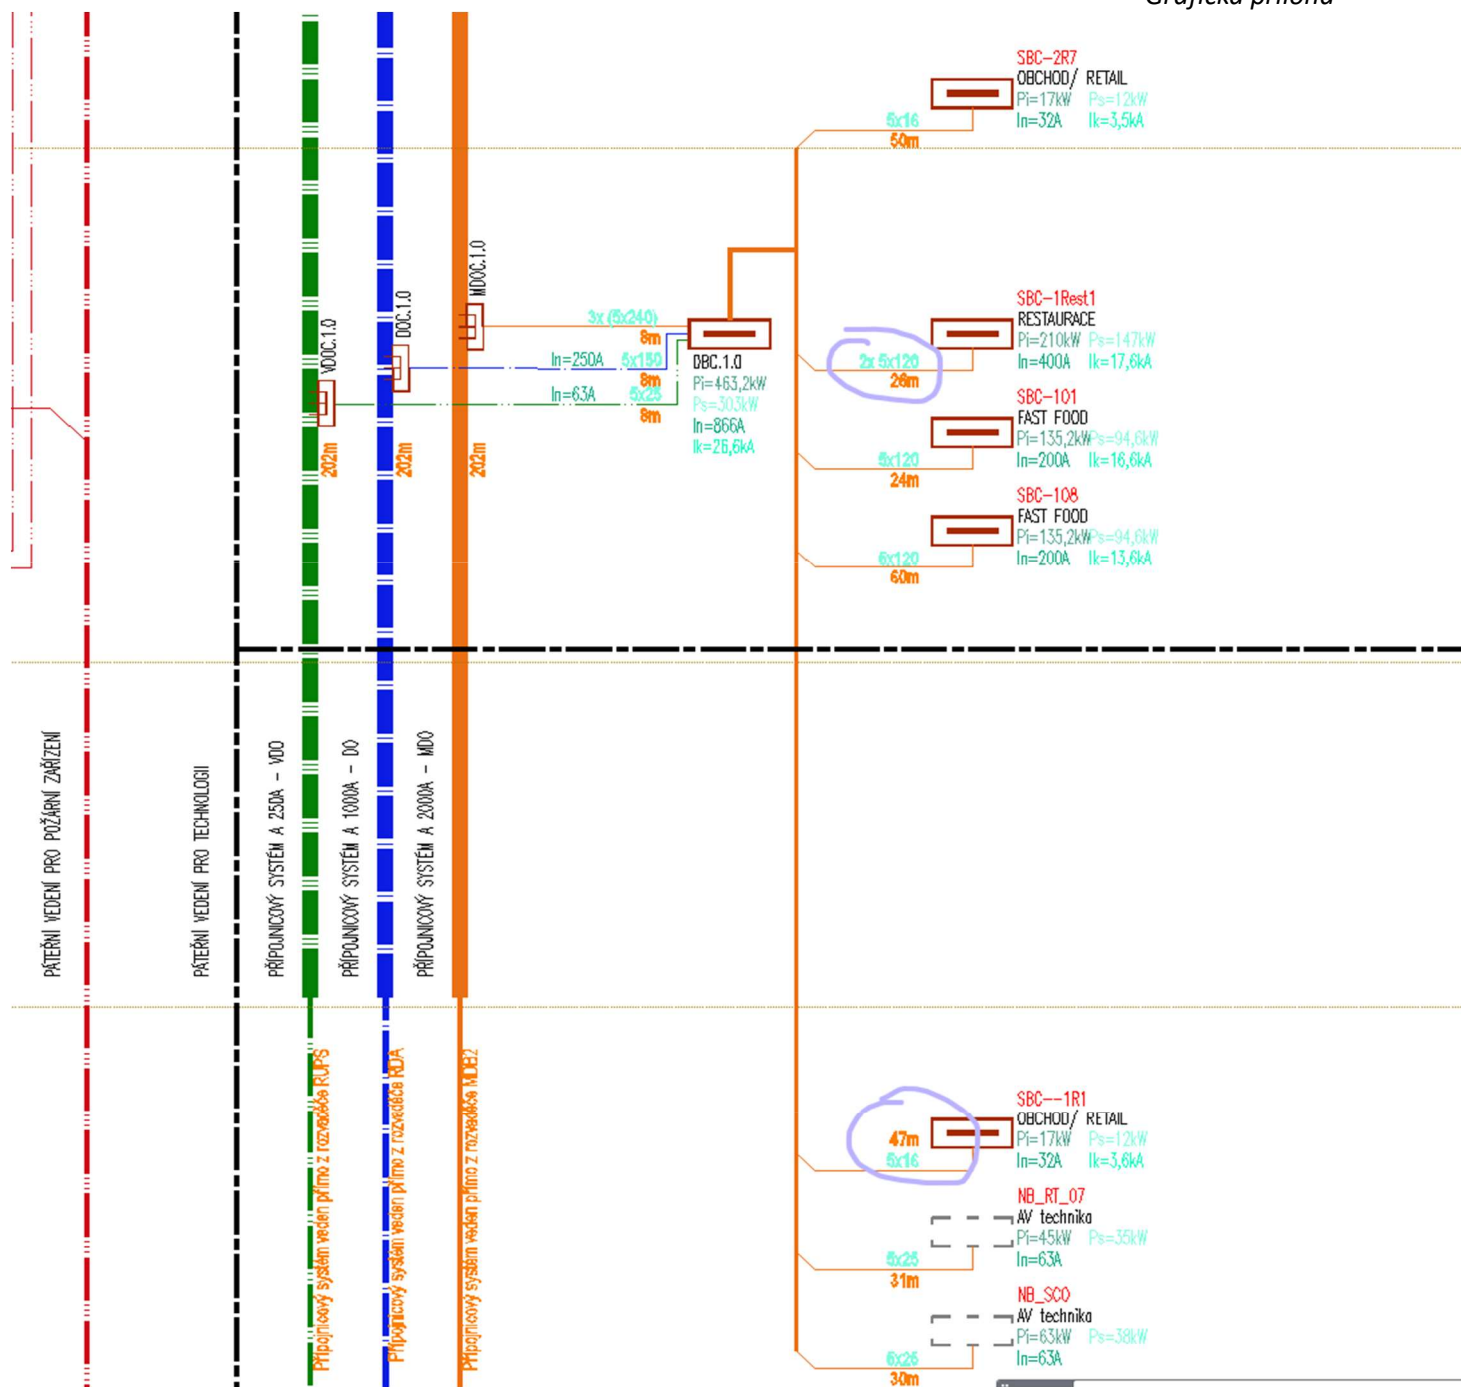

Délky zobrazené v ZD neodpovídají realitě, skutečné délky jsou 50m a 52m, jelikož trasy vedou přes 1PP.

