

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 040

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě		
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY		
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.		
TDI:	SAFETYPRO s.r.o.		
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.		
Popis změny: Stabilizace zeminy pod zpevněné plochy			
Odůvodnění změny: Na základě zátěžových zkoušek, které proběhly ve dvou etapách měření. Výsledek zátěžových zkoušek vykazuje nižší hodnoty než je požadováno v projektu. Dále projektová dokumentace v tom případě příkazuje provést stabilizaci zeminy v potřebném rozsahu. Nicméně s těmito položkami nebylo počítáno v původním výkazu výměr jelikož se jedná o nepředvídatelnou skutečnost, která nastala dle aktuálních okolností a zjištění souvrství pod původním terénem. Na základě požadavků projektu a nevyhovujících zátěžových zkoušek byl vytvořen tento změnový list.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	264 977,27 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	264 977,27 Kč	
	Výše DPH 21% sazba:	55 645,23 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	320 622,49 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	květen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Příloha č. 1 - protokoly ze zátěžových zkoušek č.1 ; Příloha č. 3 - zakreslené zkoušky + zakreslený rozsah sanace pod		

Tabulka evidence změn


číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
	XX	XX	XX	4 754 682,93	-402 445,68	55 989 147,36	67 746 868,30
Změnový list č.028			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	X				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list č.017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Změnový list č.030			X	611 928,83	0,-	611 928,83	740 433,88
Změnový list č.031			X	580 926,44	0,-	580 926,44	702 920,99
Změnový list č.032			X	710 544,96	0,-	710 544,96	859 759,40
Změnový list č.033			X	92 289,72	0,-	92 289,72	111 670,56
Změnový list č.034			X	2 934 429,36	0,-	2 934 429,36	3 550 659,53
Změnový list č.036	X				-1 362,23	-1 362,23	-1 648,30
Změnový list č.037			X	24 368,93	0,-	24 368,41	29 486,41
Změnový list č.038	X				-20 463,25	-20 463,25	-24 760,54
Změnový list č.039			X	863 772,06	0,-	863 772,06	1 045 164,19
Změnový list č. 040			X	264 977,27	0,-	264 977,27	320 622,49
Součty				11 244 559,70	-429 268,16	62 452 201,13	75 567 163,97

 L 1211	Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006 Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace	List 1/1
	Protokol o zkoušce č. 1765/24/ZZ	Výtisk č.: 1 2 3

Stavba: * Znojmo - Louka
Stavební objekt: * SO 02
Konstrukční celek: * zemní pláň
Specifikace materiálu: * původní
Popis zkušebního místa: příjezdová komunikace - střed
Zkoušeno dne: 16.12.2024

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

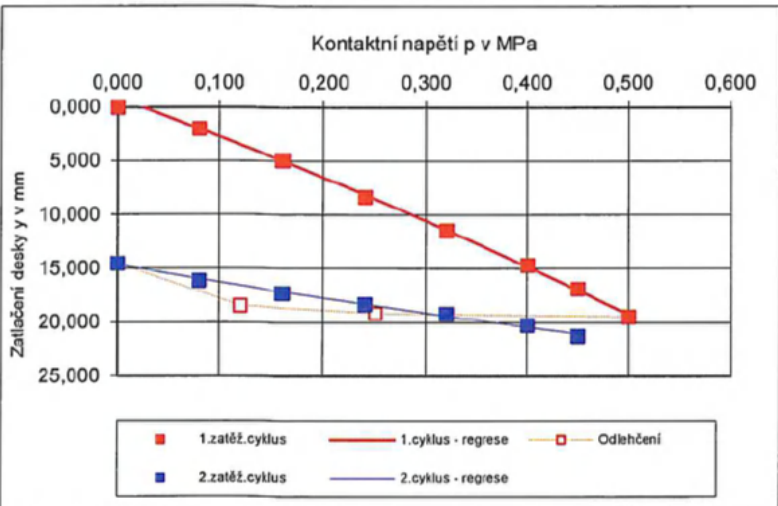

Průměr desky mm: 300
Teplota vzduchu °C: 7
Teplota vrstvy °C: 5

	1. cyklus		2. cyklus	
	p MPa	y1 mm	y2 mm	
	0,00	0,00	14,48	
1	0,08	1,96	16,08	
2	0,16	4,92	17,28	
3	0,24	8,30	18,28	
4	0,32	11,44	19,20	
5	0,40	14,66	20,24	
6	0,45	16,84	21,24	
7	0,50	19,44		

odlehčení		
1	0,25	19,14
2	0,12	18,40
3	0,00	14,48

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet			1. cyklus	2. cyklus
Konstanta	a0		-0,875	14,633
Koeficienty	a1		34,895	16,410
R kvadrát	a2		10,767	-4,883

Modul přetvárnosti

E_{def1}	5,6	MPa
E_{def2}	15,8	MPa
E_{def2}/E_{def1}	2,83	

Objednatel zkoušky: Karel Vobúrka s.r.o.
Kopečná 940/14
602 00 Brno

Zkoušel:

Místo zkoušení:

Protokol uzavřen dne: 16.12.2024

Vedoucí ZL :

Objednávka (zakázka): 083/2024/ZZ

poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.

**data převzata od subdodavatele ZL č.

*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl při

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani ž

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být mēn

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Konec protokolu



L 1211

Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

List 1/1


Protokol o zkoušce č. 1766/24/ZZ

Výtisk č.:
1 2 3

Stavba: * Znojmo - Louka
Stavební objekt: * SO 02
Konstrukční celek: * zemní pláň
Specifikace materiálu: * původní
Popis zkušebního místa: parkoviště - střed
Zkoušeno dne: 16.12.2024

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

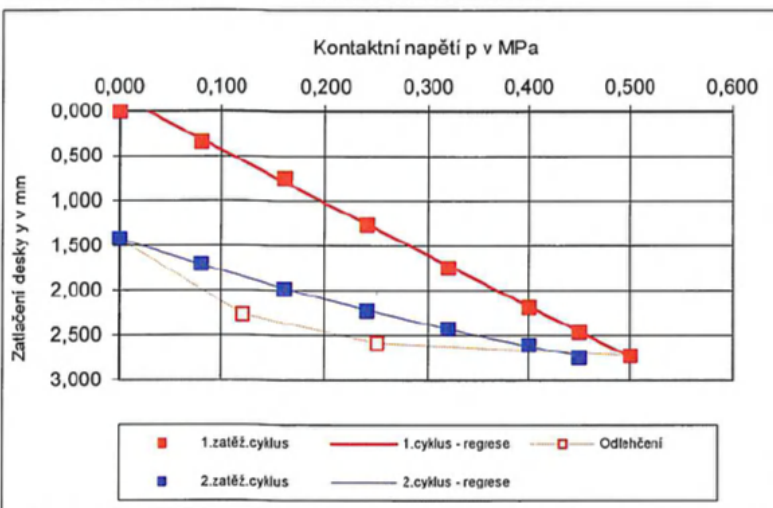

Průměr desky mm: 300
Teplota vzduchu °C: 7
Teplota vrstvy °C: 5

	1. cyklus	2. cyklus
p	y1	y2
MPa	mm	mm
0,00	0,00	1,42
0,08	0,34	1,70
0,16	0,74	1,98
0,24	1,26	2,22
0,32	1,74	2,42
0,40	2,18	2,60
0,45	2,46	2,74
0,50	2,72	

odlehčení

1	0,25	2,58
2	0,12	2,26
3	0,00	1,42

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet	Konstanta	a0	-0,168	1,420
	Koeficienty	a1	6,066	3,748
	R kvadrát	a2	-0,526	-1,879

Modul přetvárnosti	E_{def1}	38,8	MPa
	E_{def2}	77,5	MPa
	E_{def2}/E_{def1}	2,00	

Objednatel zkoušky: Karel Vobúrka s.r.o.
Kopečná 940/14
602 00 Brno

Zkoušel:

Místo zkoušení:

Protokol uzavřen dne: 16.12.2024

Vedoucí ZL :

Objednávka (zakázka): 083/2024/ZZ

poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.

**data převzata od subdodavatele ZL č.

*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl p

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznámá schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani
Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být mě

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Konec protokolu



Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

List 1/1

Protokol o zkoušce č. 1767/24/ZZ


Výtisk č.:
1 2 3

Stavba: * Znojmo - Louka
Stavební objekt: * SO 02
Konstrukční celek: * zemní pláň
Specifikace materiálu: * původní
Popis zkušebního místa: parkoviště - příjezd (roh)
Zkoušeno dne: 16.12.2024

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300
Teplota vzduchu °C: 7
Teplota vrstvy °C: 5

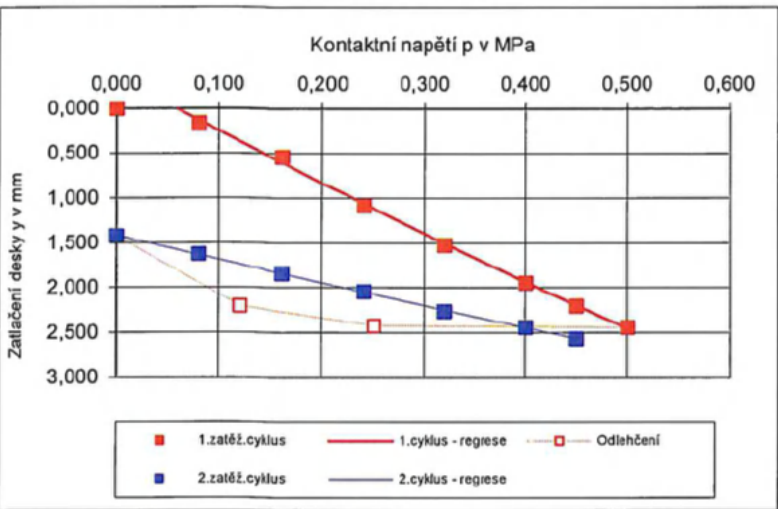

	1. cyklus	2. cyklus
p	y1	y2
MPa	mm	mm
0,00	0,00	1,42
0,08	0,16	1,62
0,16	0,54	1,84
0,24	1,08	2,04
0,32	1,52	2,26
0,40	1,94	2,44
0,45	2,20	2,56
0,50	2,44	

odlehčení

1	0,25	2,42
2	0,12	2,20
3	0,00	1,42

Stanovení modulu přetvárnosti		1. cyklus	2. cyklus
Regresní výpočet	Konstanta a0	-0,357	1,414
	Koeficienty a1	6,178	2,718
	R kvadrát a2	-1,120	-0,366
Modul přetvárnosti	E _{def1}	40,0	MPa
	E _{def2}	88,1	MPa
	E _{def2} /E _{def1}	2,20	

Objednatel zkoušky: Karel Vobůrka s.r.o.
Kopečná 940/14
602 00 Brno

Zkoušel:

Místo zkoušení:

Protokol uzavřen dne: 16.12.2024

Vedoucí ZL :

Objednávka (zakázka): 083/2024/ZZ

poznámka: * data převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.

**data převzata od subdodavatele ZL č.

*** v případě, že je jako vzorkař uveden objednatel, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku tak, jak byl

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Protokol nebo jeho části nesmí být mě

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.

Konec protokolu


Protokol o zkoušce

číslo protokolu: 002/2025/02.02/ZN

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednavatel: Karel Vobúrka s.r.o., Kopečná 940/14, 602 00 Brno	Číslo objednávky /smlouvy: 1/ZA/2025
Stavba ²⁾ : Znojmo, ul. Loucká	Konstrukce ²⁾ : zemní pláš
Stavební objekt ²⁾ : místní komunikace - fara	Staničení ²⁾ : 10m od vjezdu
Zkoušený materiál ²⁾ : původní	Tloušťka vrstvy ²⁾ : neuvedeno
Výrobce ²⁾ : neuvedeno	Počasí: jasno
Teplota vrstvy ¹⁾ : 3 °C	Datum zkoušky: 10.01.2025
Teplota vzduchu ¹⁾ : 3 °C	
Zkušební metody: ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin-Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace	

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

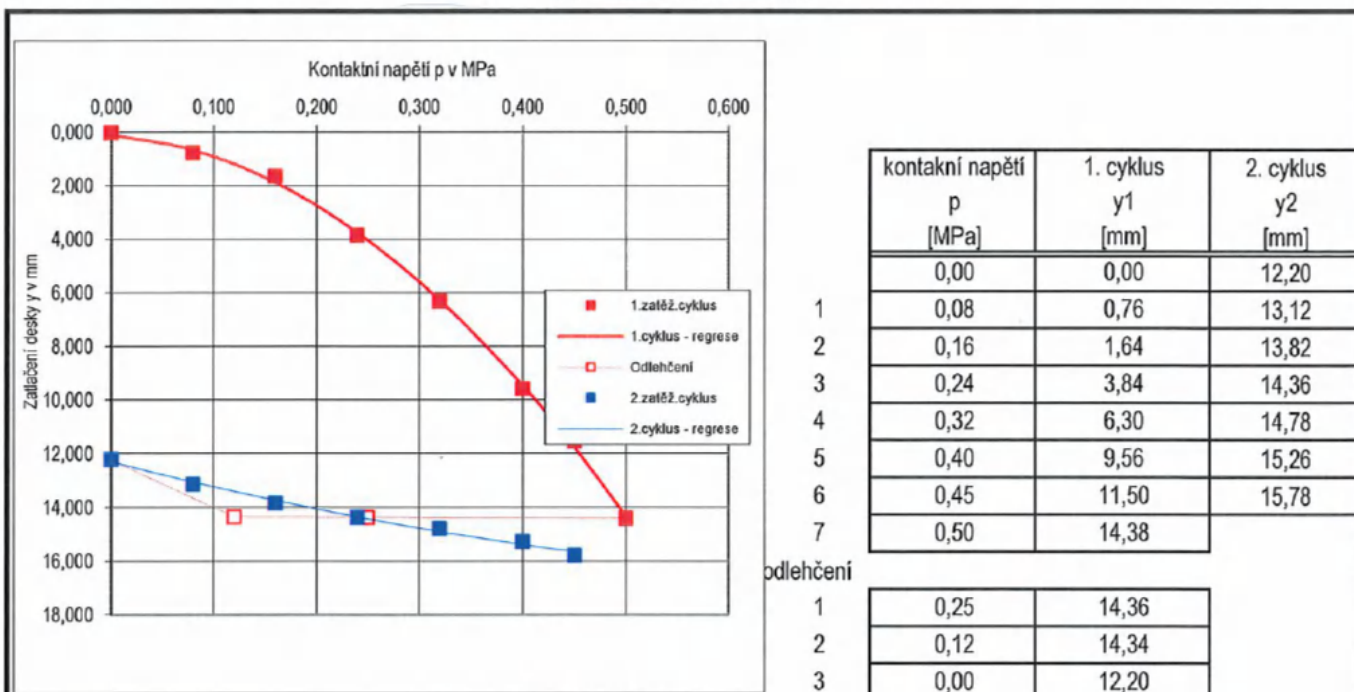

Stanovení modulu přetvárnosti			1. cyklus	2. cyklus
Regresní výpočet	Konstanta	a0	0,099	12,284
	Koeficienty	a1	2,938	9,890
	R kvadrát	a2	50,927	-5,381
Modul přetvárnosti	E_{def1}		7,9 MPa	
	E_{def2}		30,1 MPa	
	E_{def2}/E_{def1}		3,80	

Prohášení:

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem. Protokol může být reprodukován jediné celky, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Nejistoty měření jsou přístupné u vedoucího laboratoře a jsou vypočteny na základě interního předpisu.

Poznámka:

¹⁾Zkoušky mimo rozsah akreditace. ²⁾Informace převzata od objednatele, laboratoř poskytnutých objednatel.

Protokol uzavřen dne 13.01.2025

Zkušební technik	Vedoucí laboratoře
Zkoušel	




Protokol o zkoušce

číslo protokolu: 003/2025/02.02/ZN

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednavatel: Karel Vobúrka s.r.o., Kopečná 940/14, 602 00 Brno	Číslo objednávky /smlouvy: 1/ZA/2025
Stavba ²⁾ : Znojmo, ul. Loucká	Konstrukce ²⁾ : zemní pláš
Stavební objekt ²⁾ : místní komunikace - fara	Staničení ²⁾ : u schodiště
Zkoušený materiál ²⁾ : původní	Tloušťka vrstvy ²⁾ : neuvedeno
Výrobce ²⁾ : neuvedeno	Počasí: jasno
Teplota vrstvy ¹⁾ : 3 °C	Datum zkoušky: 10.01.2025
Teplota vzduchu ¹⁾ : 3 °C	
Zkušební metody: ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin-Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace	

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

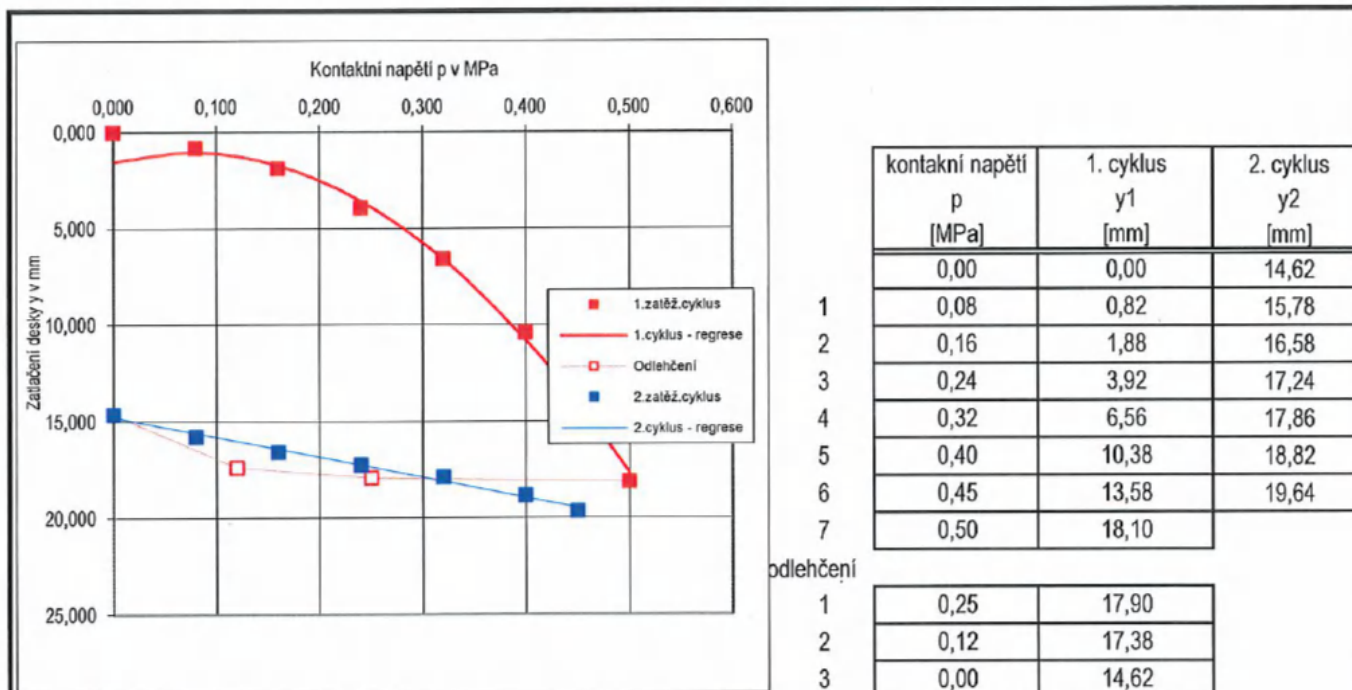

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet

Konstanta	a0	1. cyklus	2. cyklus
Koeficienty	a1	-13,555	10,203
R kvadrát	a2	91,498	0,418

Modul přetvárnosti

E_{def1}	7,0 MPa
E_{def2}	21,7 MPa
E_{def2}/E_{def1}	3,10

Prohášení:

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem. Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Nejistoty měření jsou přístupné u vedoucího laboratoře a jsou vypočteny na základě interního předpisu.

Poznámka:

¹⁾Zkoušky mimo rozsah akreditace. ²⁾Informace převzata od objednatele, ležnost dat poskytnutých objednatelem.

Protokol uzavřen dne 13.01.2025

Zkušební technik			
Zkoušel			




Protokol o zkoušce

číslo protokolu: 004/2025/02.02/ZN

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednavatel: Karel Vobúrka s.r.o., Kopečná 940/14, 602 00 Brno	Číslo objednávky /smlouvy: 1/ZA/2025
Stavba ²⁾ : Znojmo, ul. Loucká	Konstrukce ²⁾ : zemní pláš
Stavební objekt ²⁾ : místní komunikace - fara	Staničení ²⁾ : roh budovy
Zkoušený materiál ²⁾ : původní	Tloušťka vrstvy ²⁾ : neuvedeno
Výrobce ²⁾ : neuvedeno	Počasí: jasno
Teplota vrstvy ¹⁾ : 3 °C	Datum zkoušky: 10.01.2025
Teplota vzduchu ¹⁾ : 3 °C	
Zkušební metody: ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin-Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace	

VÝSLEDKY ZKOUŠKY

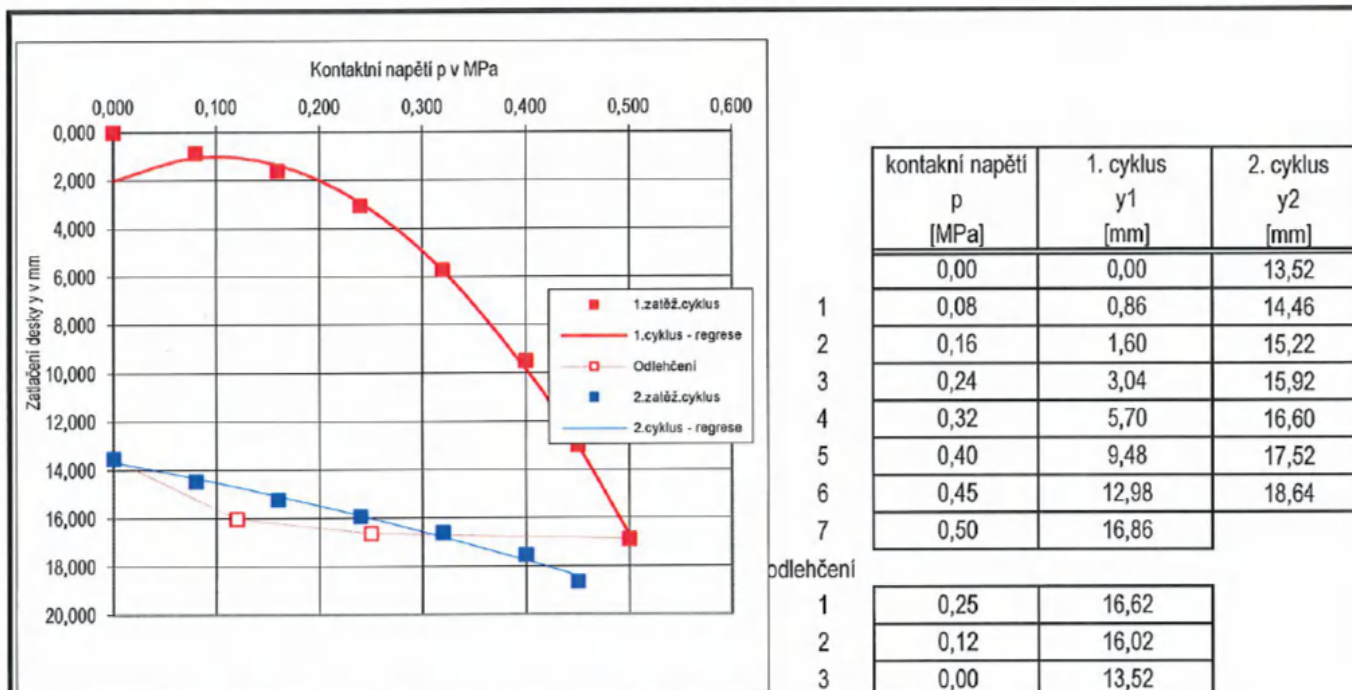

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet

Konstanta	a0	1. cyklus	2. cyklus
Koeficienty	a1	-19,813	7,894
R kvadrát	a2	98,308	5,847

Modul přetvárnosti

E_{def1}	7,7 MPa
E_{def2}	21,4 MPa
E_{def2}/E_{def1}	2,79

Prohášení:

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem. Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Nejistoty měření jsou přístupné u vedoucího laboratoře a jsou vypočteny na základě interního předpisu.

Poznámka:

¹⁾Zkoušky mimo rozsah akreditace. ²⁾Informace převzata od objednatele, laboratoř neodpovídá za relevantnost dat poskytnutých objednatelem.

Protokol uzavřen dne 13.01.2025

Zkušební technik
Zkoušel



PRÍLOHA Č. 3 - ZAKLADNÝ ZKOUŠKY + ROZSAH SANACE ZEMIN

ICE LOUČKA

PŘEDPOKLÁDANÁ PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ NN
(BUDE UPŘESNĚNA PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI)

NOVĚ OBNOVENÝ VSTUP
(v místě zazděných dveří)

SO 05a

PŘELOŽKA ROZVODNÉ SKŘINE A PŘÍPOJKY ELEKTRO NN

* krabici umístit na osu dveří a okna
* krabici umístit pod okno (na osu okna)
* krabici umístit na osu oken

VSTUP

DN 250

-8,79

UV

o=1,72m

Retenční rigol

9x Info sloupek / zábrana proti najetí

VSTUP DO SÁLU

*bezbariérový

NOVÁ RAMPA

sklon 1:16 (6,25%); d.4,8m

LÁVKA

přemostění retenčního rigolu

DEŠŤOVÁ KANALIZACE D3

PP DN 315 SN12, DL. 59,42 m

PP DN 250 SN12, DL. 8,79 m

PP DN 200 SN12, DL. 33,17 m

Retenční rigol

SO 03

VENKOVNÍ KANALIZ.

SO 02

Nová ocelová pergola

Stávající dřevěná pergola bude odst.

ZADNÍ VSTUP (PÓDIUM)

SPLASKOVÁ KANALIZ.

PP DN 160 SN12

Nové ocelové venkovní schodiště
Stávající jednoramenné venkovní schodiště
s dřevěnými náslapy bude odstraněno

✗ - ZÁŤEŽOVÁ ZKOUŠKA ZE DNE 16.12.2024

✗ - ZÁŤEŽOVÁ ZKOUŠKA ZE DNE 10.1.2025

■ - ROZSAH SANACE ZEMIN

809

27

3060

34

33/3

24/3

PS

SO 01

JÍZDÁRNA

+/- 0,000 = + 211,150

SO 04b

NAVRŽENÁ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA PED63 DÉLKA 9m

Spojovací krček

Atika +7,05

VSTUPNÍ HALA

+ 0,300 = + 211,450

SO 04a

PŘELOŽKA ELEKTRO NN DÉLKA 22,5m

RUŠENÁ ČÁST ELEKTRO NN DÉLKA 17,85m

REKOLAUDACE A PŘELOŽKA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY PED90 DÉLKA 28,5m

RUŠENÁ ČÁST PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY PED90 DÉLKA 18,8m

SO 02

HLAVNÍ VSTUP

*bezbariérový

SO 05b

DEŠŤOVÁ KANALIZACE D1

PP DN 500 SN12, DL. 72,91 m

PP DN 200 SN12, DL. 5,32 m

PP DN 160 SN12, DL. 22,71 m

SO 06

NOVÁ TRASA PRODLOUŽENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V D.80M

(celková délka kabelů cca 175 m)

SPLASKOVÁ KANALIZACE S1

PP DN 250 SN12, DL. 61,66 m

PP DN 200 SN12, DL. 21,64 m

DEŠŤOVÁ KANALIZACE D1

PP DN 500 SN12, DL. 8,00

PP DN 200 SN12, DL. 8,08

SO 03

VENKOVNÍ KANALIZACE

c						
S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ				
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY				
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Přípočty						Celkem
						264 977,27 Kč
Díl:	1	Zemní práce				94 763,83
1	122 10-0010,RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 do 500 m3	m3	99,300	149,39	14 834,43
		331 * 0,3		99,30000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,250	208,60	21 746,55
		331 * 0,3		99,30000		
3	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	993,000	16,45	16 334,85
		104,25*10		993,00000		
4	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění	m3	99,300	32,98	3 274,91
		331 * 0,3		99,30000		
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů (minimálně 70% k recyklaci!)	m3	99,300	353,45	35 097,59
		331 * 0,3		99,30000		
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	331,000	10,50	3 475,50
Díl:	5	Komunikace				170 213,44
7	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	662,000	216,00	142 992,00
		331 * 2 (tl. 150 mm)		662,00000		
9	289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	331,000	82,24	27 221,44
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5,92
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	0,104	56,76	5,92
		300 * 347,5/1000000		0,10425		

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny

CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 040		
Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu	
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD	
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD	
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS	
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny	

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 041

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě		
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNÝ		
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.		
TDÍ:	SAFETYPRO s.r.o.		
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.		
Popis změny: Dodávka RH rozvaděče a svislých konstrukcí			
Odůvodnění změny: V rámci požadavků technických úprav projektu na rozsah díla muselo dojít k doplnění rozvaděče RH, který nebyl předpokládán v původním projektu. K doplnění rozvaděče RH bylo nezbytné přistoupit, aby bylo možné dílo dokončit a eliminovalo se výrazné zvýšení nákladů související s dodatečným technickým řešením. Díky tomuto rozvaděči bude mít dílo přívod elektřiny a bude ho možné dokončit a předat jako funkční celek ze strany el. zařízení. Dále tento změnový list zohledňuje podpůrné svislé a základové konstrukce, do kterých bude rozvaděč osazen.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	490 954,31 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	490 954,31 Kč	
	Výše DPH 21% sazba:	103 100,41 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	594 054,72 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	květen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDÍ:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Příloha: Příloha_č.1_1.CN, Příloha_č.2_2.CN		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení cen	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
	XX	XX	XX	4 754 682,93	-402 445,68	55 989 147,36	67 746 868,30
Změnový list č.028			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	X				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list č.017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Změnový list č.030			X	611 928,83	0,-	611 928,83	740 433,88
Změnový list č.031			x	580 926,44	0,-	580 926,44	702 920,99
Změnový list č.032			X	710 544,96	0,-	710 544,96	859 759,40
Změnový list č.033			X	92 289,72	0,-	92 289,72	111 670,56
Změnový list č.034			X	2 934 429,36	0,-	2 934 429,36	3 550 659,53
Změnový list č.036	X				-1 362,23	-1 362,23	-1 648,30
Změnový list č.037			X	24 368,93	0,-	24 368,41	29 486,41
Změnový list č.038	X				-20 463,25	-20 463,25	-24 760,54
Změnový list č.039			X	863 772,06	0,-	863 772,06	1 045 164,19
Změnový list č. 040			X	264 977,27	0,-	264 977,27	320 622,49
Změnový list č. 041			X	490 954,31	0,-	490 954,31	594 054,72
Součty				11 735 514,01	-429 268,16	62 943 156,00	76 161 218,69



PSG Construction a.s. -elektro

C		
S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDARNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNÝ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Přípočty		Celkem
		434 185,00 Kč

Díl:	XXX	ROZVADĚČ RH: - dle výkresu č. 5 vyrobí oprávněná firma	434 185,00			
131.		oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá				
		rozměry: 2x 800 x 2060 x 247 mm (š x v x h), IP 30 – s požární odolností EI 30	ks	1,00	38 785,00	38 785,00
132.		hlavní vypínač 3x400A, vč. přípojovacích svorek	ks	1,00	19 950,00	19 950,00
133.		přepětová ochrana typ 1, TN-C, 100kA (10/350 us), na DIN lištu	ks	1,00	25 950,00	25 950,00
134.		hlavní jistič 3x400A (nastav. 3x400A), vč. přípojovacích svorek	ks	2,00	35 455,00	70 910,00
135.		napěťová spoušť 230V	ks	2,00	25 480,00	50 960,00
136.		pojistkový odpínač vel. 1 - 3x160A	ks	5,00	2 378,00	11 890,00
137.		nožová pojistka PN1gG 200A	ks	9,00	562,00	5 058,00
138.		nožová pojistka PN1gG 160A	ks	3,00	690,00	2 070,00
139.		nožová pojistka PN1gG 125A	ks	3,00	650,00	1 950,00
140.		pojistkový odpínač vel. 14, na DIN lištu	ks	1,00	550,00	550,00
141.		pojistka 32A	ks	3,00	4 760,00	14 280,00
142.		pojistkový odpínač vel. 22, na DIN lištu	ks	2,00	420,00	840,00
143.		pojistka 63A	ks	6,00	4 900,00	29 400,00
144.		proudový chránič 4x40A, 30mA, char. G/A+	ks	1,00	745,00	745,00
145.		proudový chránič 4x63A, 30mA, char. G/A+	ks	4,00	3 785,00	15 140,00
146.		proudový chránič s nadproudovou ochranou 1Nx16A, char. C, 30mA, char. G/A	ks	4,00	482,00	1 928,00
147.		vypínač 3x16A, na DIN lištu	ks	10,00	1 987,00	19 870,00
148.		jistič 1x6A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	12,00	964,00	11 568,00
149.		dtto, 1x10A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	57,00	489,00	27 873,00
150.		dtto, 1x16A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	27,00	354,00	9 558,00
151.		dtto, 3x16A, 10kA, char. C, na DIN lištu	ks	5,00	354,00	1 770,00
152.		dtto, 3x20A, 10kA, char. C, na DIN lištu	ks	3,00	650,00	1 950,00
153.		dtto, 3x25A, 10kA, char. C, na DIN lištu	ks	5,00	650,00	3 250,00
154.		dtto, 3x20A, 15-20kA, char. B, na DIN lištu	ks	1,00	880,00	880,00
155.		dtto, 3x40A, 15-20kA, char. B, na DIN lištu	ks	2,00	990,00	1 980,00
156.		dtto, 3x63A, 15-20kA, char. B, na DIN lištu	ks	3,00	990,00	2 970,00
157.		dtto, 3x125A, 15-20kA, char. B, na DIN lištu	ks	2,00	1 785,00	3 570,00
158.		stykač 24V DC, 160A (AC), 4p.	ks	1,00	1 785,00	1 785,00
159.		stykač 230V, 25A, 2p, na DIN lištu	ks	5,00	4 582,00	22 910,00
160.		stykač 230V, 25A, 4p, na DIN lištu	ks	1,00	8 745,00	8 745,00
161.		imp. relé 230V, 16A, 2p, na DIN lištu	ks	5,00	1 650,00	8 250,00
162.		soumrakový spínač 230V, 16A, 1 přep. kontakt, vč. senzoru	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
163.		propojky, svorky atd.	ks	280,00	55,00	15 400,00

CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 041					434 185,00 Kč
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------

Vedoucí střediska elektro



PSG Construction a.s.

Napajedelská 1552

765 02 Otrokovice



DW STAVBY BRNO s.r.o

C						
S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDARNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ				
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDARNY				
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Přípočty						Celkem
						397 932,37 Kč
Díl:	XXX	ROZVÁDĚČ RH: - dle výkresu č. 5 vyrobí oprávněná firma				397 932,37
131.		oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá				
		rozměry: 2x800 x 2060 x 247 mm (š x v x h), IP 30 – s požární odolností EI 30	ks	1,00	34 785,00	34 785,00
132.		hlavní vypínač 3x400A, vč. přípojovacích svorek	ks	1,00	16 950,00	16 950,00
133.		přepětová ochrana typ 1, TN-C, 100kA (10/350 us), na DIN lištu	ks	1,00	19 950,00	19 950,00
134.		hlavní jistič 3x400A (nastav. 3X400A), vč. přípojovacích svorek	ks	2,00	29 455,00	58 910,00
135.		napěťová spoušť 230V	ks	2,00	25 480,00	50 960,00
136.		pojistkový odpínač vel. 1 - 3x160A	ks	5,00	2 478,00	12 390,00
137.		nožová pojistka PN 1gG 200A	ks	9,00	582,00	5 238,00
138.		nožová pojistka PN 1gG 160A	ks	3,00	590,00	1 770,00
139.		nožová pojistka PN 1gG 125A	ks	3,00	550,00	1 650,00
140.		pojistkový odpínač vel. 14, na DIN lištu	ks	1,00	510,00	510,00
141.		pojistka 32A	ks	3,00	4 850,00	14 550,00
142.		pojistkový odpínač vel. 22, na DIN lištu	ks	2,00	350,00	700,00
143.		pojistka 63A	ks	6,00	5 900,00	35 400,00
144.		proudový chránič 4x40A, 30mA, char. G/A+	ks	1,00	695,00	695,00
145.		proudový chránič 4x63A, 30mA, char. G/A+	ks	4,00	3 905,00	15 620,00
146.		proudový chránič s nadproudovou ochranou 1Nx16A, char. C, 30mA, char. G/A	ks	4,00	361,00	1 444,00
147.		vypínač 3x16A, na DIN lištu	ks	10,00	2 026,00	20 260,00
148.		jistič 1x6A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	12,00	885,00	10 620,00
149.		dtto, 1x10A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	57,00	489,00	27 873,00
150.		dtto, 1x16A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	27,00	241,00	6 507,00
151.		dtto, 3x16A, 10kA, char. C, na DIN lištu	ks	5,00	241,00	1 205,00
152.		dtto, 3x20A, 10kA, char. C, na DIN lištu	ks	3,00	690,00	2 070,00
153.		dtto, 3x25A, 10kA, char. C, na DIN lištu	ks	5,00	675,00	3 375,00
154.		dtto, 3x20A, 15-20kA, char. B, na DIN lištu	ks	1,00	750,00	750,00
155.		dtto, 3x40A, 15-20kA, char. B, na DIN lištu	ks	2,00	850,00	1 700,00
156.		dtto, 3x63A, 15-20kA, char. B, na DIN lištu	ks	3,00	980,00	2 940,00
157.		dtto, 3x125A, 15-20kA, char. B, na DIN lištu	ks	2,00	1 850,00	3 700,00
158.		stykač 24V DC, 160A (AC), 4p.	ks	1,00	1 990,00	1 990,00
159.		stykač 230V, 25A, 2p, na DIN lištu	ks	5,00	3 990,00	19 950,00
160.		stykač 230V, 25A, 4p, na DIN lištu	ks	1,00	978,00	978,00
161.		imp. relé 230V, 16A, 2p, na DIN lištu	ks	5,00	1 465,00	7 325,00
162.		soumrakový spínač 230V, 16A, 1 přep. kontakt, vč. senzoru	ks	1,00	1 447,37	1 447,37
163.		propojky, svorky atd.	ks	280,00	49,00	13 720,00
CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 041						397 932,37 Kč

Nabídku zpracoval:



C						
S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ				
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY				
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Přípočty						Celkem
						490 954,31 Kč
Díl:	XXX	ROZVÁDEČ Rk: - dle výkresu č. 5 vyrobí oprávněná firma				429 766,96
131.		oceloplechová pro montáž pod omítku, vč. rámu, b. bílá				
		rozměry: 2x 800 x 2060 x 247 mm (š x v x h), IP 30 – s požární odolností EI 30	ks	1,00	34 785,00	34 785,00
132.		hlavní vypínač 3x400A, vč. připojovacích svorek	ks	1,00	16 950,00	16 950,00
133.		přepětová ochrana typ 1, TN-C, 100kA (10/350 us), na DIN lištu	ks	1,00	19 950,00	19 950,00
134.		hlavní jistič 3x400A (nastav. 3X400A), vč. připojovacích svorek	ks	2,00	29 455,00	58 910,00
135.		napětová spoušť 230V	ks	2,00	25 480,00	50 960,00
136.		pojistkový odpínač vel. 1 - 3x160A	ks	5,00	2 478,00	12 390,00
137.		nožová pojistka PN1gG 200A	ks	9,00	582,00	5 238,00
138.		nožová pojistka PN1gG 160A	ks	3,00	590,00	1 770,00
139.		nožová pojistka PN1gG 125A	ks	3,00	550,00	1 650,00
140.		pojistkový odpínač vel. 14, na DIN lištu	ks	1,00	510,00	510,00
141.		pojistka 32A	ks	3,00	4 850,00	14 550,00
142.		pojistkový odpínač vel. 22, na DIN lištu	ks	2,00	350,00	700,00
143.		pojistka 63A	ks	6,00	5 900,00	35 400,00
144.		proudový chránič 4x40A, 30mA, char.G/A+	ks	1,00	695,00	695,00
145.		proudový chránič 4x63A, 30mA, char.G/A+	ks	4,00	3 905,00	15 620,00
146.		proudový chránič s nadproudou ochranou 1Nx16A, char. C, 30mA, char. G/A	ks	4,00	361,00	1 444,00
147.		vypínač 3x16A, na DIN lištu	ks	10,00	2 026,00	20 260,00
148.		jistič 1x6A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	12,00	885,00	10 620,00
149.		dtto, 1x10A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	57,00	489,00	27 873,00
150.		dtto, 1x16A, 10kA, char. B, na DIN lištu	ks	27,00	241,00	6 507,00
151.		dtto, 3x16A, 10kA, char. C, na DIN lištu	ks	5,00	241,00	1 205,00
152.		dtto, 3x20A, 10kA, char. C, na DIN lištu	ks	3,00	690,00	2 070,00
153.		dtto, 3x25A, 10kA, char. C, na DIN lištu	ks	5,00	675,00	3 375,00
154.		dtto, 3x20A, 15-20kA, char. B, na DIN lištu	ks	1,00	750,00	750,00
155.		dtto, 3x40A, 15-20kA, char. B, na DIN lištu	ks	2,00	850,00	1 700,00
156.		dtto, 3x63A, 15-20kA, char. B, na DIN lištu	ks	3,00	980,00	2 940,00
157.		dtto, 3x125A, 15-20kA, char. B, na DIN lištu	ks	2,00	1 850,00	3 700,00
158.		stykač 24V DC, 160A (AC), 4p.	ks	1,00	1 990,00	1 990,00
159.		stykač 230V, 25A, 2p, na DIN lištu	ks	5,00	3 990,00	19 950,00
160.		stykač 230V, 25A, 4p, na DIN lištu	ks	1,00	978,00	978,00
161.		imp. relé 230V, 16A, 2p, na DIN lištu	ks	5,00	1 465,00	7 325,00
162.		soumrakový spínač 230V, 16A, 1 přep. kontakt, vč. senzoru	ks	1,00	1 447,37	1 447,37
163.		propojky, svorky atd.	ks	280,00	49,00	13 720,00
164.		koordináční přírážka 8%	kpl	1,00	397 932,37	31 834,59

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				20 831,15
12	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	2,91	3 065,02	8 911,55
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. 3,15*1*0,5+4,1*0,65*0,5						
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	15,00000	624,36	9 365,40
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 3,15+3,15+4,1+4,1+0,5				15,00		
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	15,00000	170,28	2 554,20

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
3,15+3,15+4,1+4,1+0,5				15,00		
				2,9075		

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce	29 886,62
	311 23-0215.RAA	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm O 15 na matu 2,5 Mpa, tl. zdiva 450 mm	24 267,38

3,15*3,6*0,45 - (1*2,1*0,45) - (1,65*1*0,3)				3,66	6 625,00	
				3,6630		

34	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	6,00	624,36	3 746,16
34	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	3,00	624,36	1 873,08

Díl:	96	Bourání konstrukcí	4 285,75
------	----	--------------------	----------

151b	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	1,16	2 005,00	2 331,82
------	--------------	--	----	------	----------	----------

plocha základů pod nosné stěny: 0,2*(3,15*1+4,1*0,65)				1,16		

151	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,16	1 680,08	1 953,93
-----	--------------	--	----	------	----------	----------

plocha základů pod nosné stěny: 0,2*(3,15*1+4,1*0,65)				1,16300		

Díl:	1	Zemní práce	5 297,29
------	---	-------------	----------

2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,91	1 012,36	2 943,44
---	--------------	---	----	------	----------	----------

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 3,15*1*0,5+4,1*0,65*0,5				2,9075		

4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,90750	208,60000	606,50
---	--------------	---	----	---------	-----------	--------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 3,15*1*0,5+4,1*0,65*0,5				2,9075		

5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2,90750	16,45000	47,83
---	--------------	--	----	---------	----------	-------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 3,15*1*0,5+4,1*0,65*0,5				2,9075		

6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,90750	210,08000	610,81
---	--------------	--	----	---------	-----------	--------

výměra - viz položka 162701105R00 : 3,15*1*0,5+4,1*0,65*0,5				2,9075		

7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	5,81500	10,50000	61,06
---	--------------	--	----	---------	----------	-------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 3,15*1+4,1*0,65				5,8150		

9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2,90750	353,45000	1 027,66
---	--------------	--	----	---------	-----------	----------

výměra - viz položka 162701105R00 : 3,15*1*0,5+4,1*0,65*0,5				2,9075		

Díl:	711	Izolace proti vodě	886,55
------	-----	--------------------	--------

209	711471051R00	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie	m2	5,81500	56,93	331,05
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------

3,15*1+4,1*0,65				5,8150		

216	28325010R75	Fólie HDPE 1000x0,75 mm	m2	5,81500	95,53	555,51
-----	-------------	-------------------------	----	---------	-------	--------

3,15*1+4,1*0,65				5,8150		

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny

CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 041		#ODKAZ!
--------------------------	--	---------

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
-----------	---

Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 042

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě		
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY		
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.		
TDI:	SAFETYPRO s.r.o.		
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.		
Popis změny: Bourání stávající skladby podlahy a betonáž nové skladby podlahy ve 2. NP nad rámec SoD			
Odůvodnění změny: Po odstranění vrchních vrstev (terasová dlažba, podkladní betonová mazanina) dle projektu. Došlo k nepředvídatelnému zjištění, že podkladní souvrství nebylo v rovinatosti a soudržném stavu, jak bylo uvažováno v projektu. Tudíž při zásahu (drážky pro vedení rozvodů ZTI dle PD) do stávajícího souvrství došlo ke statickému narušení a podkladní vrstvy se musely odstranit v množství, které stanovil TDS a AD. Nahrazen byl novou skladbou, kterou navrhl TDS s AD. Na základě těchto skutečností byl vytvořen tento změnový list.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	82 634,52 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	82 634,52 Kč	
	Výše DPH 21% sazba:	17 353,25 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	99 987,76 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	prosinec 2024 - únor 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy			

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
	XX	XX	XX	4 754 682,93	-402 445,68	55 989 147,36	67 746 868,30
Změnový list č.028			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	X				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list č.017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Změnový list č.030			X	611 928,83	0,-	611 928,83	740 433,88
Změnový list č.031			x	580 926,44	0,-	580 926,44	702 920,99
Změnový list č.032			X	710 544,96	0,-	710 544,96	859 759,40
Změnový list č.033			X	92 289,72	0,-	92 289,72	111 670,56
Změnový list č.034			X	2 934 429,36	0,-	2 934 429,36	3 550 659,53
Změnový list č.036	X				-1 362,23	-1 362,23	-1 648,30
Změnový list č.037			X	24 368,93	0,-	24 368,41	29 486,41
Změnový list č.038	X				-20 463,25	-20 463,25	-24 760,54
Změnový list č.039			X	863 772,06	0,-	863 772,06	1 045 164,19
Změnový list č. 040			X	264 977,27	0,-	264 977,27	320 622,49
Změnový list č. 041			X	490 954,31	0,-	490 954,31	594 054,72
Změnový list č.042			X	82 634,52	0,-	82 634,52	99 987,76
Součty				11 818 148,53	-429 268,16	63 025 790,50	76 261 206,45

c						
S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ				
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY				
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	769_x	Truhlářské a ostatní výrobky				
Odpočty						Celkem
Odpočty						0,00 Kč
Přípočty						Celkem
						82 634,52 Kč
Díl:	96	Bourání konstrukcí				12 807,54
150	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,41038	1 997,94	12 807,54
206 : ((87,31)-(1,625*21,05))*0,05 6,41038						
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				23 696,77
382	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním (minimálně 70% k recyklaci!)	t	16,66698	68,11	1 135,19
Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 150,153 : Součet: : 6,875 16,66698						
383	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	16,66698	42,57	709,51
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 150,153 : Součet: : 6,875 16,66698						
384	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km (minimálně 70% k recyklaci!)	t	16,66698	51,08	851,35
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 150,153 : Součet: : 6,875 16,66698						
385	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km (minimálně 70% k recyklaci!)	t	333,33950	8,51	2 836,72
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 150,153 : Součet: : 137,509 333,33950						
386	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	333,33950	42,57	14 190,26
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 150,153 : Součet: : 137,509 333,33950						
387	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	333,33950	5,11	1 703,36
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 150,153 : Součet: : 137,509 333,33950						
388	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů (minimálně 70% k recyklaci!)	t	16,66698	136,22	2 270,38
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 150,153 : Součet: : 6,875 16,66698						

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce	46 130,20			
119	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. SP8 - dlažba : ((87,31)-(1,625*21,05))*0,05	m3	5,57589	3 575,85	19 938,56
127	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny SP8 - dlažba : ((87,31)-(1,625*21,05))*0,05/2	m3	2,78795	122,60	341,80
130	631361921RT3	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm SP8 - dlažba : ((87,31)-(1,625*21,05))*12,63/6*1,2/1000	t	0,14085	30 650,18	4 316,99
232	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie SP8 - dlažba : ((87,31+11)-(1,625*21,05))	m2	64,10375	10,22	655,14
371	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	3,00000	9 342,99	280,29
1	713 12-1111.RV5	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé do, EPS 100 80 MM m.215, 214 (52,2+26,74)*1,05	m2	82,88700	248,50	20 597,42

CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 037			82 634,52 Kč
Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu		
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD		
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD		
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS		
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny		

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 043

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNÝ
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
TDI:	SAFETYPRO s.r.o.
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.

Popis změny: Střešní výlez na přístavu

Odůvodnění změny: Z důvodu nutné obsluhy vzduchotechnických jednotek na přístavbě objektu bylo nutné doplnit střešní výlez z interiéru do prostoru ploché střechy přístavby. Na základě čehož byl vytvořen tento změnový list.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		5 275,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		5 275,00 Kč
	Výše DPH 21% sazba:		1 107,75 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		6 382,75 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	leden - únor 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Příloha č. 1 : Technický_list_střešeního_výlezu		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
	xx	xx	xx	4 754 682,93	-402 445,68	55 989 147,36	67 746 868,30
Změnový list č.028			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	X				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list č.017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Změnový list č.030			X	611 928,83	0,-	611 928,83	740 433,88
Změnový list č.031			x	580 926,44	0,-	580 926,44	702 920,99
Změnový list č.032			X	710 544,96	0,-	710 544,96	859 759,40
Změnový list č.033			X	92 289,72	0,-	92 289,72	111 670,56
Změnový list č.034			X	2 934 429,36	0,-	2 934 429,36	3 550 659,53
Změnový list č.036	X				-1 362,23	-1 362,23	-1 648,30
Změnový list č.037			X	24 368,93	0,-	24 368,41	29 486,41
Změnový list č.038	X				-20 463,25	-20 463,25	-24 760,54
Změnový list č.039			X	863 772,06	0,-	863 772,06	1 045 164,19
Změnový list č. 040			X	264 977,27	0,-	264 977,27	320 622,49
Změnový list č. 041			X	490 954,31	0,-	490 954,31	594 054,72
Změnový list č.042			X	82 634,52	0,-	82 634,52	99 987,76
Změnový list č.043			X	5 275,00	0,-	5 275,00	6 382,75
Součty				11 823 423,53	-429 268,16	63 031 065,50	76 267 589,20

Technický list - střešní výlez

Popis: Střešní výlez Puloplastics je vhodný do veškerých typů staveb.
Instalace je vhodná do plochých střech a střech s mírným sklonem do 25°.
Výlezy nabízíme ve velké rozměrové škále a mnoha provedení.

Materiálové provedení a popis: PVC manžeta a laminátové víko

Podsvětliková manžeta je z tvrzeného PVC profilu.
Jedná se o silnostěnný 3-komorový systém, který je zateplený PUR 40 mm.
Výborně tepelně izolační parametry ($up=0,67W/m^2.K$).
PVC manžeta je kompatibilní s PVC folií i živičnou hydroizolací.
Možnost vařit PVC folii přímo na manžetu
Na manžetě je zhotovená okapnice pro ukončení detailu napojení.
Manžeta je kolmá (rovná) kdy světlost manžety je zároveň stavební otvor.
Ovladatelnost výlezu je komfortní, vzhledem k nízké váze otevíraného křídla.
Výklopné křídlo lze otevřít do úhlu cca 80°.
Otevírací rám je vyráběn z tvrzeného PVC materiálu, vícekomorový.
Otevírací rám je opatřen dvojitým těsněním.
Ovládací klička výlezu je v nerezovém provedení, klička je uzamykatelná.
Pneumatické písty jsou navrženy pro komfortní ovládání, barevné provedení je bílé.
Poklop Puloplastics je izolovaný PUR pěnou o standardní tloušťce 40 mm.
Sendvičové provedení výlezu zajišťuje výborné tepelně-izolační parametry.
Ovladatelnost výlezu je komfortní, vzhledem k nízké váze otevíraného křídla.

Up součinitel prostupu tepla manžetou	0,67 W/m ² .K
Ug součinitel prostupu tepla laminátový víkem	0,66 W/m ² .K

τD65 světelná propustnost	Prosvětlující
vzduchotěsnost	Třída 2
vodotěsnost	nezatéká

Uzavřený výlez



Výlez plně otevřený



Pohled z interiéru



c									
S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ							
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY							
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ							
Přípočty									Celkem
									5 275,00 Kč
Díl:	764	Konstrukce klempířské							5 275,00
1	765 32-2715.R00	Výlez na střechu - Dodávka		kpl	1,0000	3 835,0000	3 835,00		
					1 x výlez 600 x 800 mm		1,0000		
2	446 12-2001.R00	Výlez na střechu - Montáž		kpl	1,0000	1 440,0000	1 440,00		
					1 x montáž výlez 600 x 800 mm		1,0000		

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny

CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 040				
Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu			
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD			
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD			
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS			
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny			

Protokol o změně díla


Změnový list číslo 044

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě		
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY		
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.		
TDI:	SAFETYPRO s.r.o.		
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.		
Popis změny: Vedlejší rozpočtové náklady a aktualizovaný Harmonogram			
Odůvodnění změny: Na základě předloženého aktualizovaného Harmonogramu ze dne 14.08.2024 výstavby došlo k posunu termínu. Díky tomuto podkladu byl vytvořen tento Změnový list. Aktualizovaný Harmonogram není finální v závislosti na vývoj situace na staveništi se může tento harmonogram dále v čase měnit. Harmonogram byl vytvořen na základě následujících nepředvídatelných skutečností: Archeologické vykopávky/průzkumy • Zastavení prací od 23.09.2024 – 25.09.2024 (tj. 3 dní) – důvod archeologické nálezy (stávající zdi), viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 23.09.2024 • Zastavení prací od 25.10.2024 - 31.10.2024 (tj. 7 dní) – důvod archeologický nálezy (stávající chodby), viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 25.10.2024 • Zastavení prací od 15.11.2024 – 26.11.2024 (tj. 12 dní) – důvod archeologické nálezy (stávající zdi), viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 15.11.2024 • Zastavení prací od 16.12.2024 – 23.01.2025 (tj. 28 dní - vyjma Vánoční výluky) – důvod archeologické nálezy (stávající zdi), sanace podloží, viz. předložené zátěžové zkoušky, které poukazují na nesoudržné podkladní vrstvy, které je nutno sanovat, dle odsouhlaseného postupu TDS a AD. Výše zmiňované nepředvídatelné a zhotovitelem nezaviněné skutečnosti v celkovém souhrnu činí 50 dnů prodloužení. Byť prodloužení z důvodů okolností archeologického průzkumu (viz čl. VI. odst. 6 písm. b) Smlouvy) v celkovém souhrnu činí rovných 50 dnů, Zhotovitel v rámci proaktivního přístupu, zefektivnění postupu prací a ve snaze eliminovat posun procesu výstavby vytvořil ve spolupráci se zástupcem Objednatele (TDS) dne 8.01.2025 aktualizovaný harmonogram prací s dopadem do termínu o pouhých 30 dnů (viz příloha č. 1). Ten byl Objednatelem na KD č. 37 dne 16.01.2025 odsouhlasen s tím, že byl dán požadavek na zprocesování posunu termínu plnění prostřednictvím změnového listu, který bude následně v souladu s čl. XI. odst. 30 Smlouvy vtělen do dodatku ke Smlouvě.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	47 998,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	47 998,00 Kč	
	Výše DPH 21% sazba:	10 079,58 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	58 077,58 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	září 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano, 30 dní - konkrétně do 25.09.2025	
souhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		

ods	Projektant:	
	Objednatel (statutární zástupce):	
příloh	Přílohy: Příloha č.1: HMG Jízdárna Louckého kláštera	

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
	xx	xx	xx	4 754 682,93	-402 445,68	55 989 147,36	67 746 868,30
Změnový list č.028			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	X				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list č.017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Změnový list č.030			X	611 928,83	0,-	611 928,83	740 433,88
Změnový list č.031			x	580 926,44	0,-	580 926,44	702 920,99
Změnový list č.032			X	710 544,96	0,-	710 544,96	859 759,40
Změnový list č.033			X	92 289,72	0,-	92 289,72	111 670,56
Změnový list č.034			X	2 934 429,36	0,-	2 934 429,36	3 550 659,53
Změnový list č.036	X				-1 362,23	-1 362,23	-1 648,30
Změnový list č.037			X	24 368,93	0,-	24 368,41	29 486,41
Změnový list č.038	X				-20 463,25	-20 463,25	-24 760,54
Změnový list č.039			X	863 772,06	0,-	863 772,06	1 045 164,19
Změnový list č. 040			X	264 977,27	0,-	264 977,27	320 622,49
Změnový list č. 041			X	490 954,31	0,-	490 954,31	594 054,72
Změnový list č. 042			X	82 634,52	0,-	82 634,52	99 987,76
Změnový list č. 043			X	5 275,00	0,-	5 275,00	6 382,75
Změnový list č. 044			X	47 998,00	0,-	47 998,00	58 077,58
Součty				11 871 421,53	-429 268,16	63 079 063,50	76 325 666,78

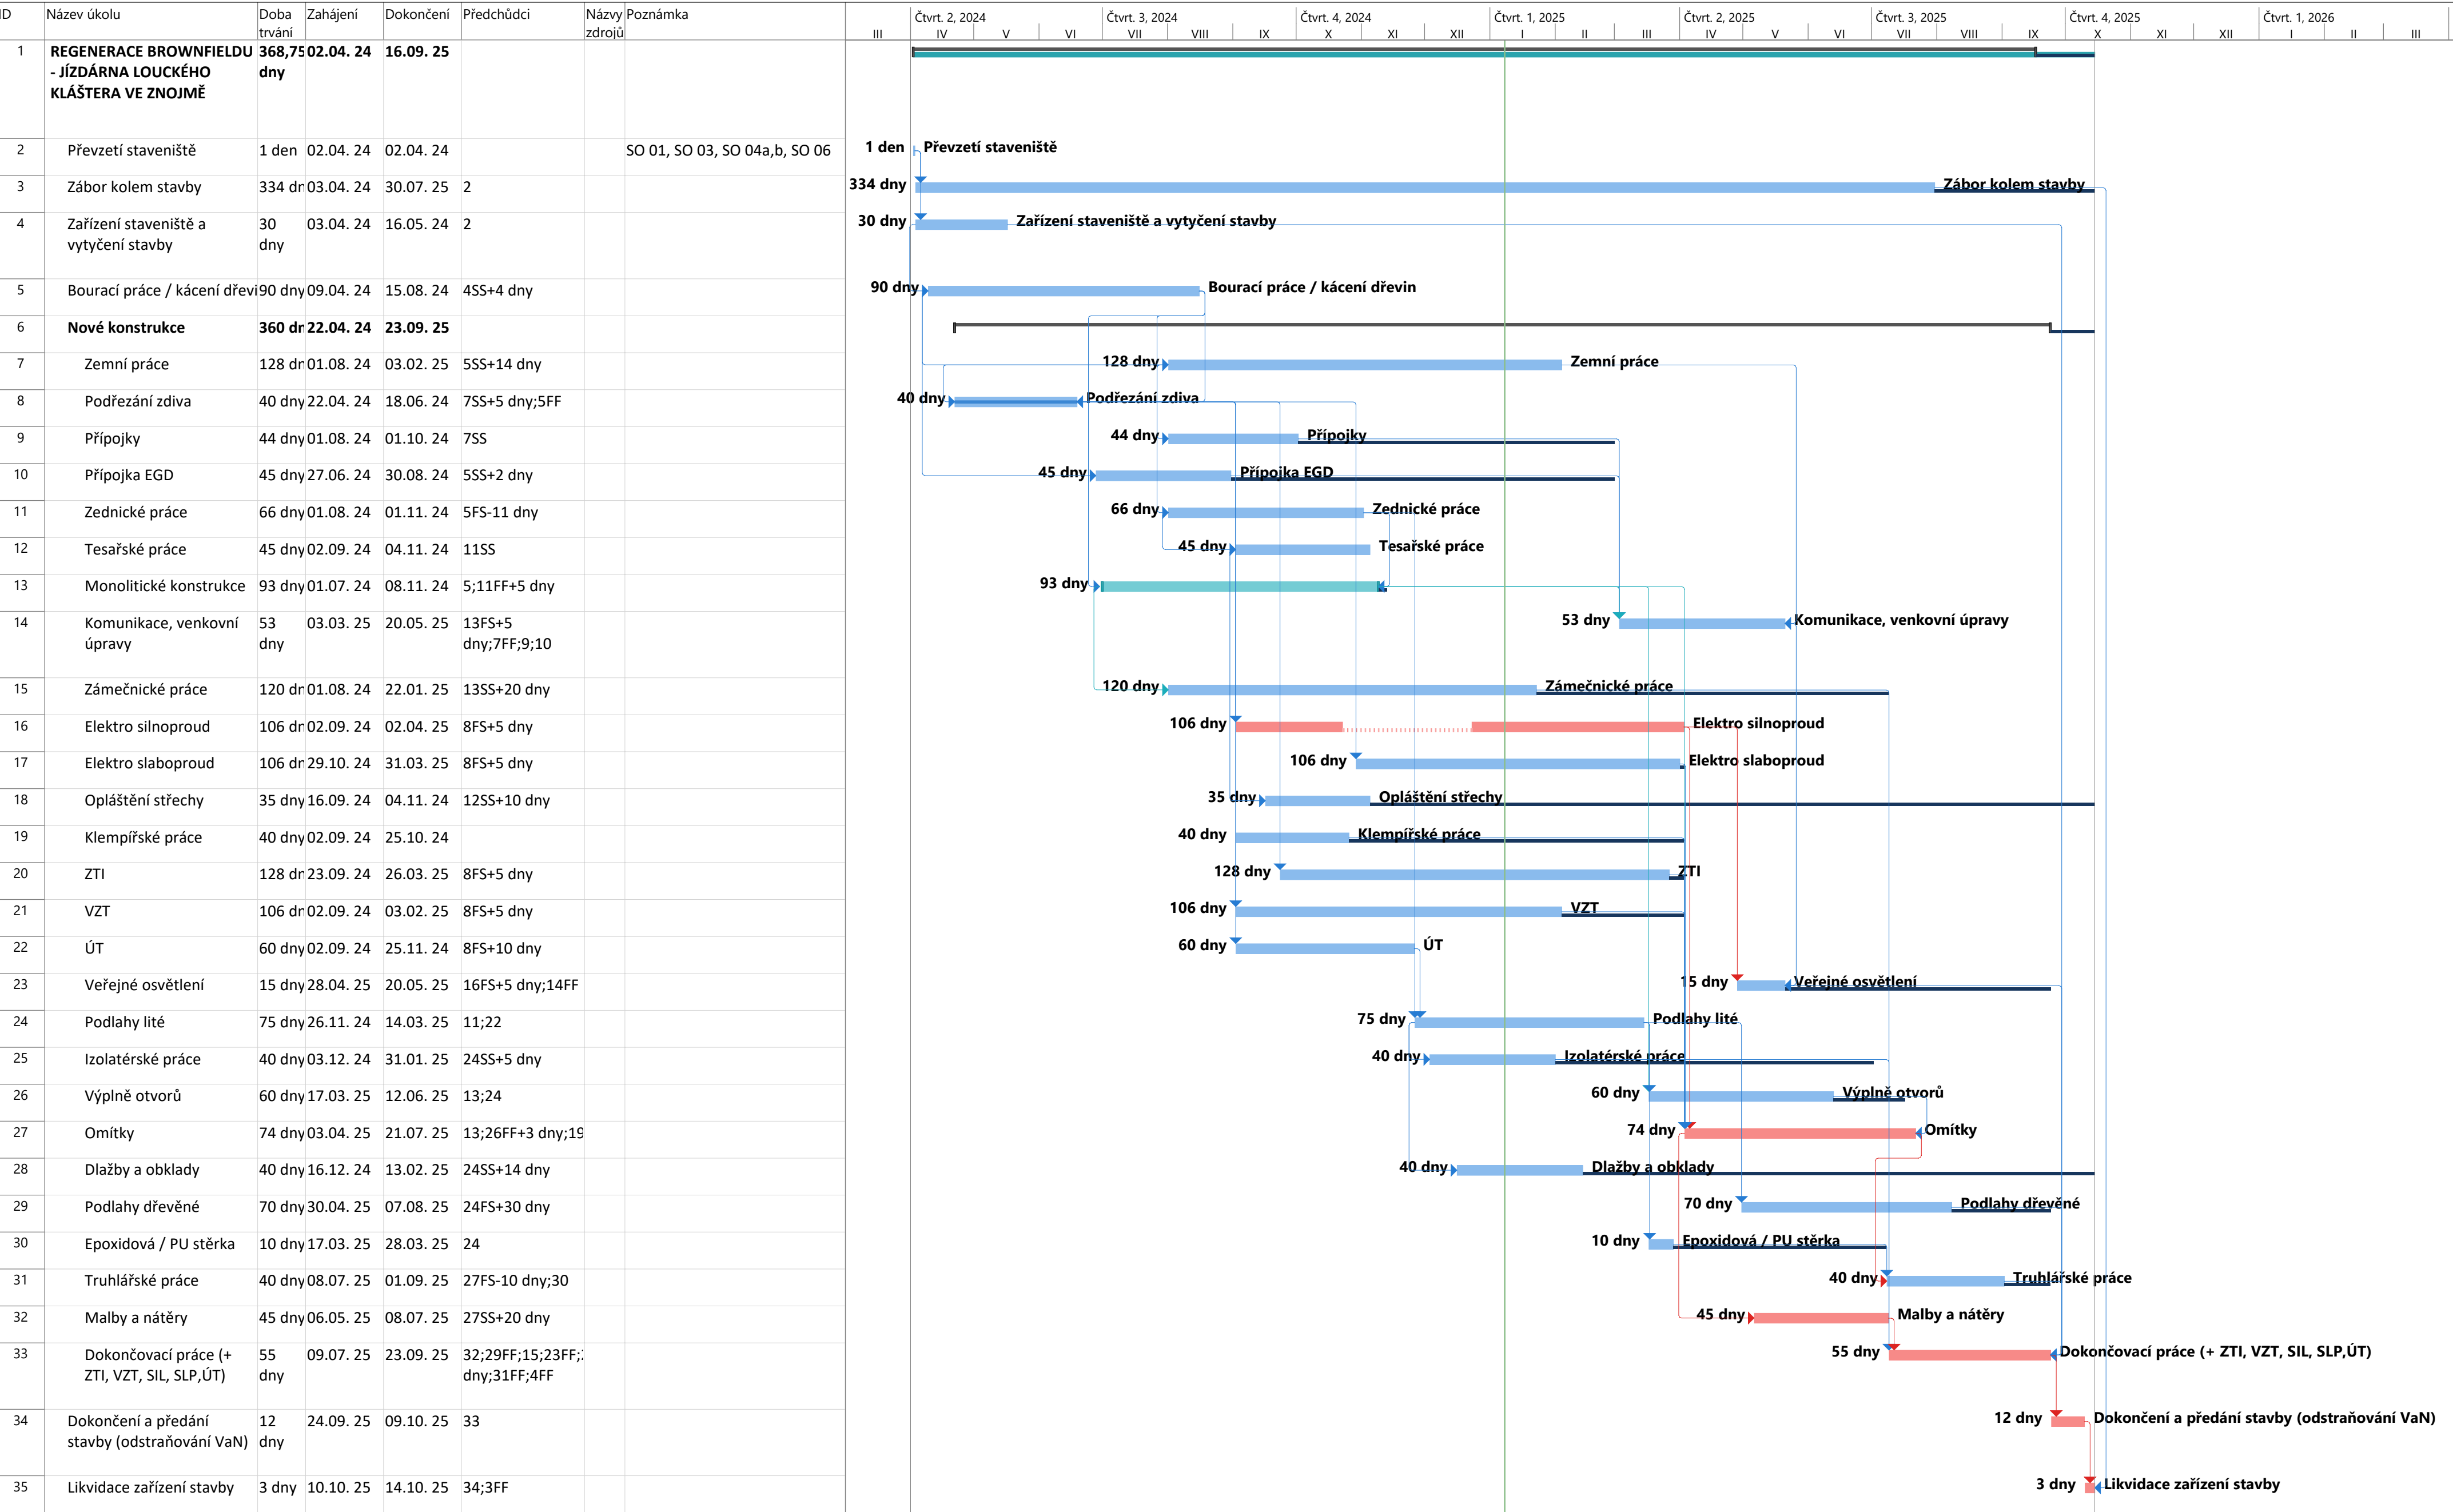

Projekt: HMG Jízdárna Louckéh
Datum: 08.01. 25

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

◆

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

◆

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Časová rezerva

C

S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Přípočty						Celkem
						47 998,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				43 333,33
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	43 333,33	43 333,33

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

((650000 dle SoD / 15 měsíců) / 30 dní) × 30 dní prodloužení

43 333,33333

Díl: ON		Ostatní náklady				4 664,67
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	4 000,00	3 999,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

((60000 dle SoD / 15 měsíců) / 30 dní) × 30 dní prodloužení

4 000,00000

9	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	sada	1,00000	666,67	665,67
---	------------	---------------------------------------	------	---------	--------	--------

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

((10000 dle SoD / 15 měsíců) / 30 dní) × 30 dní prodloužení

666,66667

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 045

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
TDI:	SAFETYPRO s.r.o.
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.

Popis změny: Vnitřní povrchy stěn

Odůvodnění změny: Z důvodu dispozičních změn, které jsou zohledněny ve Změnovém listě č. 06 muselo dojít k úpravě rozsahu vnitřních povrchů stěn, které se dotkly obkladačských a omítkařských prací. Na základě tohoto požadavku byl vypracován tento změnový list.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	119 792,90 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-133 688,87 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-13 895,97 Kč	
	Výše DPH 21% sazba:	-2 918,15 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-16 814,13 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	leden - únor 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy			

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
	XX	XX	XX	4 754 682,93	-402 445,68	55 989 147,36	67 746 868,30
Změnový list č.028			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	X				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list č.017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Změnový list č.030			X	611 928,83	0,-	611 928,83	740 433,88
Změnový list č.031			x	580 926,44	0,-	580 926,44	702 920,99
Změnový list č.032			X	710 544,96	0,-	710 544,96	859 759,40
Změnový list č.033			X	92 289,72	0,-	92 289,72	111 670,56
Změnový list č.034			X	2 934 429,36	0,-	2 934 429,36	3 550 659,53
Změnový list č.036	X				-1 362,23	-1 362,23	-1 648,30
Změnový list č.037			X	24 368,93	0,-	24 368,41	29 486,41
Změnový list č.038	X				-20 463,25	-20 463,25	-24 760,54
Změnový list č.039			X	863 772,06	0,-	863 772,06	1 045 164,19
Změnový list č. 040			X	264 977,27	0,-	264 977,27	320 622,49
Změnový list č. 041			X	490 954,31	0,-	490 954,31	594 054,72
Změnový list č. 042			X	82 634,52	0,-	82 634,52	99 987,76
Změnový list č. 043			X	5 275,00	0,-	5 275,00	6 382,75
Změnový list č. 044			X	47 998,00	0,-	47 998,00	58 077,58
Změnový list č. 045	X				-13 895,97	-13 895,97	-16 814,13
Součty				11 871 421,53	-443 144,13	63 079 063,50	76 325 666,78

c									
S:	GNS/N005.10		REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ						
O:	01		STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY						
R:	D.1.1		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
Odpočty								Celkem	
								-133 688,87 Kč	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady						-133 688,87	
	362	771575109RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	78,94000	-609,31	-48 098,93		
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : SP8 - dlažba : 214 + 215 26,74+52,2 78,94000									
	363	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	51,90000	-215,69	-11 194,31		
214-215 : (6,65*2+3,45*2+0,15*2+7,85*4) 51,90000									
	364	771479001RS	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	51,90000	-21,57	-1 119,48		
214-215 : (6,65*2+3,45*2+0,15*2+7,85*4) 51,90000									
	365	597623100X	Dlaždice - Parametry dle PD - výkres O1	m2	78,94000	-434,61	-34 308,11		
SP8 - dlažba : 214 + 215 26,74+52,2 78,94000									
	366	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	3,00000	-50 137,79	-1 504,13		
50 m vodorovně									
	374	781415016RU2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	32,61900	-663,24000	-21 634,22556		
otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu : m.106.105 (‘3,2*2+3,1*2+2,9+3,1+2)*2 41,20000 otvory (0,9*2,02*2+2,15*1,15*2) -8,58100									
	376	597813565RB	Obkládačka - parametry dle PD - 600/300 - viz výkres O1	m2	32,61900	-485,29000	-15 829,67451		
otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu : m106,105 (‘3,2*2+3,1*2+2,9+3,1+2)*2 41,20000 Otvory (0,9*2,02*2+2,15*1,15*2) -8,58100									
Přípočty								Celkem	
								119 792,90 Kč	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady						119 792,90	
	214	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	46,35400	485,29	22 495,13		
Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. m. 224+225+226+227+228 5,16+4,09+6,27+6,18+1,8 za obklady cca 30% plochy pol.374 781415016RU2 74,47*30% 23,50000 22,85400									
	372	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	65,81000	64,71000	4 258,56510		
odměřeno kreslícím programem : (2,15*2+19,*2+2*2*0,9*2+1,05+1,2+1,9*2+2*3,45) 65,81000									
	374	781415016RU2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	76,18000	663,24000	50 525,62320		
otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu : m.227,228,226,225,224									

		$((2,15*2+1,9*2)*2+(1,9*2+2*3,45)+(2*2+0,9*2)*2+(1,05+1,2)*2)$		43,00000		
		m105,108				
		$(3,1*2+1)*2$		14,40000		
		m115,118				
		$((7,75+2*1,5+3,45+0,35*2+2,9)+(6,6+4*0,35+0,7+3,35+2*0,2+2,5+0,65+0,4*2))*0,8$		27,36000		
		otvory				
		0,8*2,2*4+0,7*2,2		-8,58000		
376	597813565RB	Obkládačka - parametry dle PD - 600/300 - viz výkres O1	m2	47,32000	485,29000	22 963,92280
		otvory neodečteny - obklad ostění a parapetu :				
		m.227,228,226,225,224				
		$((2,15*2+1,9*2)*2+(1,9*2+2*3,45)+(2*2+0,9*2)*2+(1,05+1,2)*2)*1,20$		55,90000		
		otvory				
		0,8*2,2*4+0,7*2,2		-8,58000		
377	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	3,00000	46 703,00000	1 401,09000
107	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	75,65200	136,22	10 305,32
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pempzou apod.) a oprášením,				
		m. 106,118,213				
		$(5,306+3,15+2,1+1,35+3,3)*2+(5,4*2*3,8)+1*2,1$		75,65200		
379	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	98,42200	79,69	7 843,25
		m. 106,118,224,227,213				
		$(5,306+3,15+2,1+1,35+3,3)*2+(5,4*2*3,8)+(4,3+1,4+1,2)*3,3+2,1*1*2$		98,42200		

CENA ZA ZMĚNOVY LIST 045		-13 895,97 Kč
--------------------------	--	---------------

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 046

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
TDI:	SAFETYPRO s.r.o.
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.

Popis změny: Truhlářské výrobky

Odůvodnění změny: Z důvodu změny v dispozici objektu a následně vzešlých nových technických požadavků na dané prostory, které vzešly ze strany Objednatel je nutné provést revizi rozsahu dodání truhlářských výrobků. Na tomto základě byl provedený tento změnový list.

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o ceně složených změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-91 466,97 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-91 466,97 Kč
	Výše DPH 21% sazba:		-19 208,06 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-110 675,03 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	leden - únor 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy			

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
	XX	XX	XX	4 754 682,93	-402 445,68	55 989 147,36	67 746 868,30
Změnový list č.028			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	X				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list č.017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Změnový list č.030			X	611 928,83	0,-	611 928,83	740 433,88
Změnový list č.031			x	580 926,44	0,-	580 926,44	702 920,99
Změnový list č.032			X	710 544,96	0,-	710 544,96	859 759,40
Změnový list č.033			X	92 289,72	0,-	92 289,72	111 670,56
Změnový list č.034			X	2 934 429,36	0,-	2 934 429,36	3 550 659,53
Změnový list č.036	X				-1 362,23	-1 362,23	-1 648,30
Změnový list č.037			X	24 368,93	0,-	24 368,41	29 486,41
Změnový list č.038	X				-20 463,25	-20 463,25	-24 760,54
Změnový list č.039			X	863 772,06	0,-	863 772,06	1 045 164,19
Změnový list č. 040			X	264 977,27	0,-	264 977,27	320 622,49
Změnový list č. 041			X	490 954,31	0,-	490 954,31	594 054,72
Změnový list č. 042			X	82 634,52	0,-	82 634,52	99 987,76
Změnový list č. 043			X	5 275,00	0,-	5 275,00	6 382,75
Změnový list č. 044			X	47 998,00	0,-	47 998,00	58 077,58
Změnový list č. 045	X				-13 895,97	-13 895,97	-16 814,13
Změnový list č. 046	X				-91 466,97	-91 466,97	-110 675,03
Součty				11 871 421,53	-534 611,10	62 973 700,50	76 198 177,62

c									
S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ							
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY							
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ							
Odpočty									Celkem
									-91 466,97 Kč
Díl:	769_x	Truhlářské a ostatní výrobky							-91 466,97000
349	DPU	D + M desky pod umyvadlo, kompletně dle výkresu O1	bm	2,40000	-15 052,65000	-36 126,360			
				1,2*2	2,40000				
357	SZN1	D + M zařizovací nábytek - CATERING, kompletně dle výkresu O1	ks	1,00000	-55 340,61000	-55 340,61000			
CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 046							-91 466,97 Kč		

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 035

Předmět díla:	Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě
Objekt:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNÝ
Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.
TDI:	SAFETYPRO s.r.o.
Projektant:	Atelier GNS s.r.o.

Popis změny: Revize svítidel

Odůvodnění změny: Na základě požadavků, které vzešli ze strany Objednatele a budoucího provozovatele na provoz a účel sálu (místnost č. 100). Došlo k úpravě svítidel v sále za technicky lepší svítidla se systémem DALI. Díky těmto požadavkům byl vytvořen tento změnový list

údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		96 356,96 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-57 904,35 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		38 452,61 Kč
	Výše DPH 21% sazba:		8 075,05 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		46 527,66 Kč
termín	Termín realizace změny:	leden - červen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Příloha_č. 1		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 4.1.1. SOD	
	XX	XX	XX	4 754 682,93	-402 445,68	55 989 147,36	67 746 868,30
Změnový list č.028			X	91 149,22	0,-	91 149,22	110 290,55
Změnový list č.029	X				-4 977,00	-4 887,00	-6 046,37
Změnový list č.017			X	315 489,98	0,-	315 489,98	381 742,88
Změnový list č.030			X	611 928,83	0,-	611 928,83	740 433,88
Změnový list č.031			x	580 926,44	0,-	580 926,44	702 920,99
Změnový list č.032			X	710 544,96	0,-	710 544,96	859 759,40
Změnový list č.033			X	92 289,72	0,-	92 289,72	111 670,56
Změnový list č.034			X	2 934 429,36	0,-	2 934 429,36	3 550 659,53
Změnový list č.036	X				-1 362,23	-1 362,23	-1 648,30
Změnový list č.037			X	24 368,93	0,-	24 368,41	29 486,41
Změnový list č.038	X				-20 463,25	-20 463,25	-24 760,54
Změnový list č.039			X	863 772,06	0,-	863 772,06	1 045 164,19
Změnový list č. 040			X	264 977,27	0,-	264 977,27	320 622,49
Změnový list č. 041			X	490 954,31	0,-	490 954,31	594 054,72
Změnový list č. 042			X	82 634,52	0,-	82 634,52	99 987,76
Změnový list č. 043			X	5 275,00	0,-	5 275,00	6 382,75
Změnový list č. 044			X	43 333,33	0,-	43 333,33	52 433,33
Změnový list č. 045	X				-13 895,97	-13 895,97	-16 814,13
Změnový list č. 046	X				-91 466,97	-91 466,97	-110 675,03
Změnový list č. 035			X	38 452,61	0,-	38 452,61	46 527,66
Součty				11 909 874,14	-534 611,10	63 012 153,20	76 244 705,28

Podklady od Projektantů, zaslané 29.11.2024

List1				List1			
SV11	nápadč pro 3F DALI lišty černá barva	6		SV22	Vanrovní svítidla s rozptýleným světlem, výkon 24W 3000K	17	
SV12	koncovka pro DALI lištu černá barva	6		SV23	Vanrovní spořiční svítidlo 2W 3000K	10	
SV13	3F lišta délka 2m černá barva	7		SV24	Přisazené vanrovní svítidlo 21W	3	
SV14	3F lišta délka 1m černá barva	2		2NP		počty ks	
SV15	spoj přímý pro 3F lištu černá barva	4		SV xx	LED přisazené svítidlo kruhové světelný tok svítidla: 1981 lm, výkon: 22.6 W, 4000K	54	
SV16	spoj rohový hne L pro 3F lištu černá barva	4		SV xx	LED přisazené svítidlo kruhové světelný tok svítidla 1408lm, výkon 15,3W, 4000K	0	
SV17	nápadč pro 3F lištu černá barva	1		SV xx	LED panel bez rámu napáňový světelný tok svítidla 3319lm, výkon 47W, 4000K	15	
SV18	koncovka pro 3F lištu černá barva	1		Svxx	Nouzové osvětlení (tm) Technologie	4	
SV19	Přisazené svítidlo kruhové 24W černá barva	47		Svxx	Vanrovní svítidla s rozptýleným světlem, výkon 24W 3000K	2	
SV20	Nouzové osvětlení (tm) Technologie	16					
SV21	poziční svítidla 1W bílá barva	4					

Stránka 2

Stránka 3

List1

Kusovník svítidel a komponentů pro Jízdárna

1NP

pořadí

popis svítidla

počty ks

SV01	závěsné LED svítidlo 195W, 27096lm, vyzařovací úhel 90st. hromatičnost světla: 4000K, Ovládání svítidla: DALI	15		
HighBay	černá barva	20 60		
SV02	3F LED reflektor 35W, 4058lm, vyzařovací úhel 40st.	12		
Anke	Chromatičnost světla: 4000K, Ovládání svítidla: DALI	18 15		
SV03	3F LED reflektor 35W, 4058lm, vyzařovací úhel 40st.	20		
Anke	Chromatičnost světla: 4000K, Ovládání svítidla: ON/OFF	20		
SV04	3F LED reflektor 35W, 4058lm, vyzařovací úhel 40st.	2		
Anke	Chromatičnost světla: 3000K, Ovládání svítidla: ON/OFF	10		
SV06	Závěsné svítidlo LED	0		
SLV	Chromatičnost 3000K, světelný tok svítidla: 5421 lm, výkon 51.0 W	30		
SV07	LED přisazené svítidlo kruhové	24		
CIRCLE	světelný tok svítidla: 1981 lm, výkon: 22.6 W, 4000K			
SV08	LED přisazené svítidlo kruhové			
CIRCLE	světelný tok svítidla 1408lm, výkon 15,3W, 4000K			
SV09	černá barva			
	3F lišta DALI – (3okruhy + řízení DALI) 2m			
	černá barva			
SV10	spoj přímý k 3F DALI liště			
	černá barva			

Stránka 1

Poznámka: Na základě požadavků AUDIO/VIDEO musí být všechny světla v sále ovládaná systémem DALI.

c

S:	GNS/N005.10	REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ
O:	01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M_21_01	ÚLOŽNÝ MATERIÁ - viz výkresy č. 1 - 3				
Odpočty						Celkem
						-57 904,35
71	72.	"SV 03" - 3F LED reflektor 35W, 4058lm, vyz. úhel 40st., 4000K, ON/OFF, černá barva	ks	-12,00	1 654,41	-19 852,92
72	73.	"SV 04" - 3F LED reflektor 35W, 4058lm, vyz. úhel 40st., 4000K, ON/OFF, černá barva	ks	-3,00	1 654,41	-4 963,23
73	74.	"SV 05" - 3F LED reflektor 35W, 4058lm, vyz. úhel 40st., 4000K, ON/OFF, černá barva	ks	-20,00	1 654,41	-33 088,20
						96 356,96 Kč
Díl:	M_21_01	ÚLOŽNÝ MATERIÁ - viz výkresy č. 1 - 3				
70	71.	"SV 02" - 3F LED reflektor 35W, 4058lm, vyz. úhel 40st., 4000K, DALI, černá barva	ks	35	2 556,10	89 463,50
75	76.	"SV 07" - LED přisazené svítidlo kruhové, 1981 lm, 22.6 W, 4000K, černá barva	ks	6,00000	1 148,91000	6 893,46
CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 035						38 452,61 Kč

Poznámka:	Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle SoD
Žluté položky	Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD
Modré Položky	Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky	Jedná se o individuální jednotkové ceny
