

Evidenční list, návrh změny stavby č. 1/ projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2016/005781

Stavební akce:	Habrmannovo nám. -altán a úpravy parku		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	16TUOIN28		
Dotčená část stavby:	Podhled		
Název / označení změny: ZL č.1	Změna rozsahu truhlářských prací.		
Podklad pro změnu:	Zápis ve stavebním deníku.		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	12.6.2017		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	12.6.2017
Zdůvodnění a popis změny:			
Na základě zpracované dílenské dokumentace a technických listů AI nosné konstrukce podhledu, bude AI nosný rošt zahuštěn. Z důvodu nového konstrukčního řešení bude tl. HPL desek podhledu altánu upravena na 8 mm.			
Vliv změny na termín dodání díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			-18,14 Kč bezDPH
připočty celkem:			155 560,64 Kč bezDPH
odpočty celkem:			-155 578,78 Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní SILBA - Elstav s.r.o. Letkov 155, 326 00 Plzeň			
Za útvar / oddělení / firma:	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SILBA Elstav s.r.o. IČO: 61358844 DIČ: CZ64358844	Ing. Jan Jirka	10.7.2017	
projektant /AD/ -	Arch. Jakub Chvojka	10.7.2017	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	10.7.2017	
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík	10.7.2017	
- cenová kontrola	Iva Baierová	10.7.2017	
Úřad městského obvodu Plzeň 4	Ing. Zdeněk Mádr	10.7.2017	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 216sod

Stavba: Habrmannovo nám.-altán a úpravy parku II - 16TUOIN28

ZL 01 - Stavební část-Kce.truhlářské

Datum: 23.6.2017

Objednatel: Statutární město Plzeň, Odbor investic-MMP

Projektant:

Zhotovitel: SILBA-Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
ZL01	Stavební část-Kce.truhlářské	-18,14	-21,95
ZL 01	Stavební část-Kce.truhlářské-odpočet	-155 578,78	-188 250,32
ZL 01	Stavební část-Kce.truhlářské-přípočet	155 560,64	188 228,37

ROZPOČET

Stavba: Habrmannovo nám.-altán a úpravy parku II - 16TU0IN28

Objekt: VM - ZMĚNOVÉ LISTY

Část: ZL01. - Stavební část-Kce.truhlářské

Úroveň 3: ZL 01 - Stavební část-Kce.truhlářské-přípočet

Místo:

Datum:

23.6.2017

Objednatel: Statutární město Plzeň, Odbor investic-MMP
Zhotovitel: SILBA-Elstav s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

155 560,64

766 - Konstrukce truhlářské

155 560,64

53	K	766423232R00	Obložení podhledů složitých, panely dýh. do 1,5 m2 vč.spoj.materiálu	m2	82,000		
54	K	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů vč.spoj.materiálu	m	430,000		
55	M	553427000	Konstrukce AL nosná podhledu pro HPL desky	m2	82,000		
56	M	60701Rpol	Deska exteriérová HPL laminát tl.8mm, dekor bílý	m2	98,400		
57	K	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	2,079		

ROZPOČET

Stavba: Habrmannovo nám.-altán a úpravy parku II - 16TUOIN28

Objekt: VM - ZMĚNOVÉ LISTY

Část: ZL01. - Stavební část-Kce.truhlářské

Úroveň 3: ZL 01 - Stavební část-Kce.truhlářské-odpočet

Místo:

Datum:

23.6.2017

Objednatel: Statutární město Plzeň, Odbor investic-MMP
Zhotovitel: SILBA-Elstav s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu


-155 578,78

766 - Konstrukce truhlářské

-155 578,78

53	K	766423232R00	Obložení podhledů složitých, panely dýh. do 1,5 m2 vč.spoj.materiálu	m2	-82,000		
54	K	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů vč.spoj.materiálu	m	-203,900		
55	M	553427000	Konstrukce AL nosná podhledu pro HPL desky	m2	-82,000		
56	M	60701Rpol	Deska exteriérová HPL laminát tl.12mm, dekor dřevo	m2	-98,400		
57	K	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	-2,080		

Datum	Denní záznamy stavby
70/6	Počasí 7° - 12°C Přítomni - Štípanka, Pítuch Hrstor, Rostov, Ivanov Cvetana, Kivilov Práce - záruka přechodní výkopu po rozvodech elektro - betonář kapes pro usazení střídel - sochy Montáž altánu
72/6	Počasí 7° - 12°C Přítomni - Štípanka, Pítuch Hrstor, Rostov, Ivanov Cvetana, Kivilov Práce - záruka přechodní výkopu - betonář obrobek na kladci dnu částech armování desky Montáž altánu - konopky 4 montéři Pokládka železobetonu 3 dlaždic
12.6.	ZÁPIS ZHOTOVITELÉ: NA ZÁKLADĚ ZPRACOVANÉ DOP. DOU. AL KCE PRO ROZVED
7	ALTÁNU, BUDE PROVEDENO ZHUŠTĚNÍ NOSNÉHO AL KOSTRBY. PO KONZULTACI SE ZÁSTUPCEM STROJCE MPL DESEK POŘÁDANÝCH PD (VIZ PD) BUDE TL. DESEK 8MM. Václav Šromber PRO INFORMACI ZHOTOVITELÉ A VÝROBCE MPL DESEK AD SOUVISLÁ SE ZMĚNAMI TL. DESEK

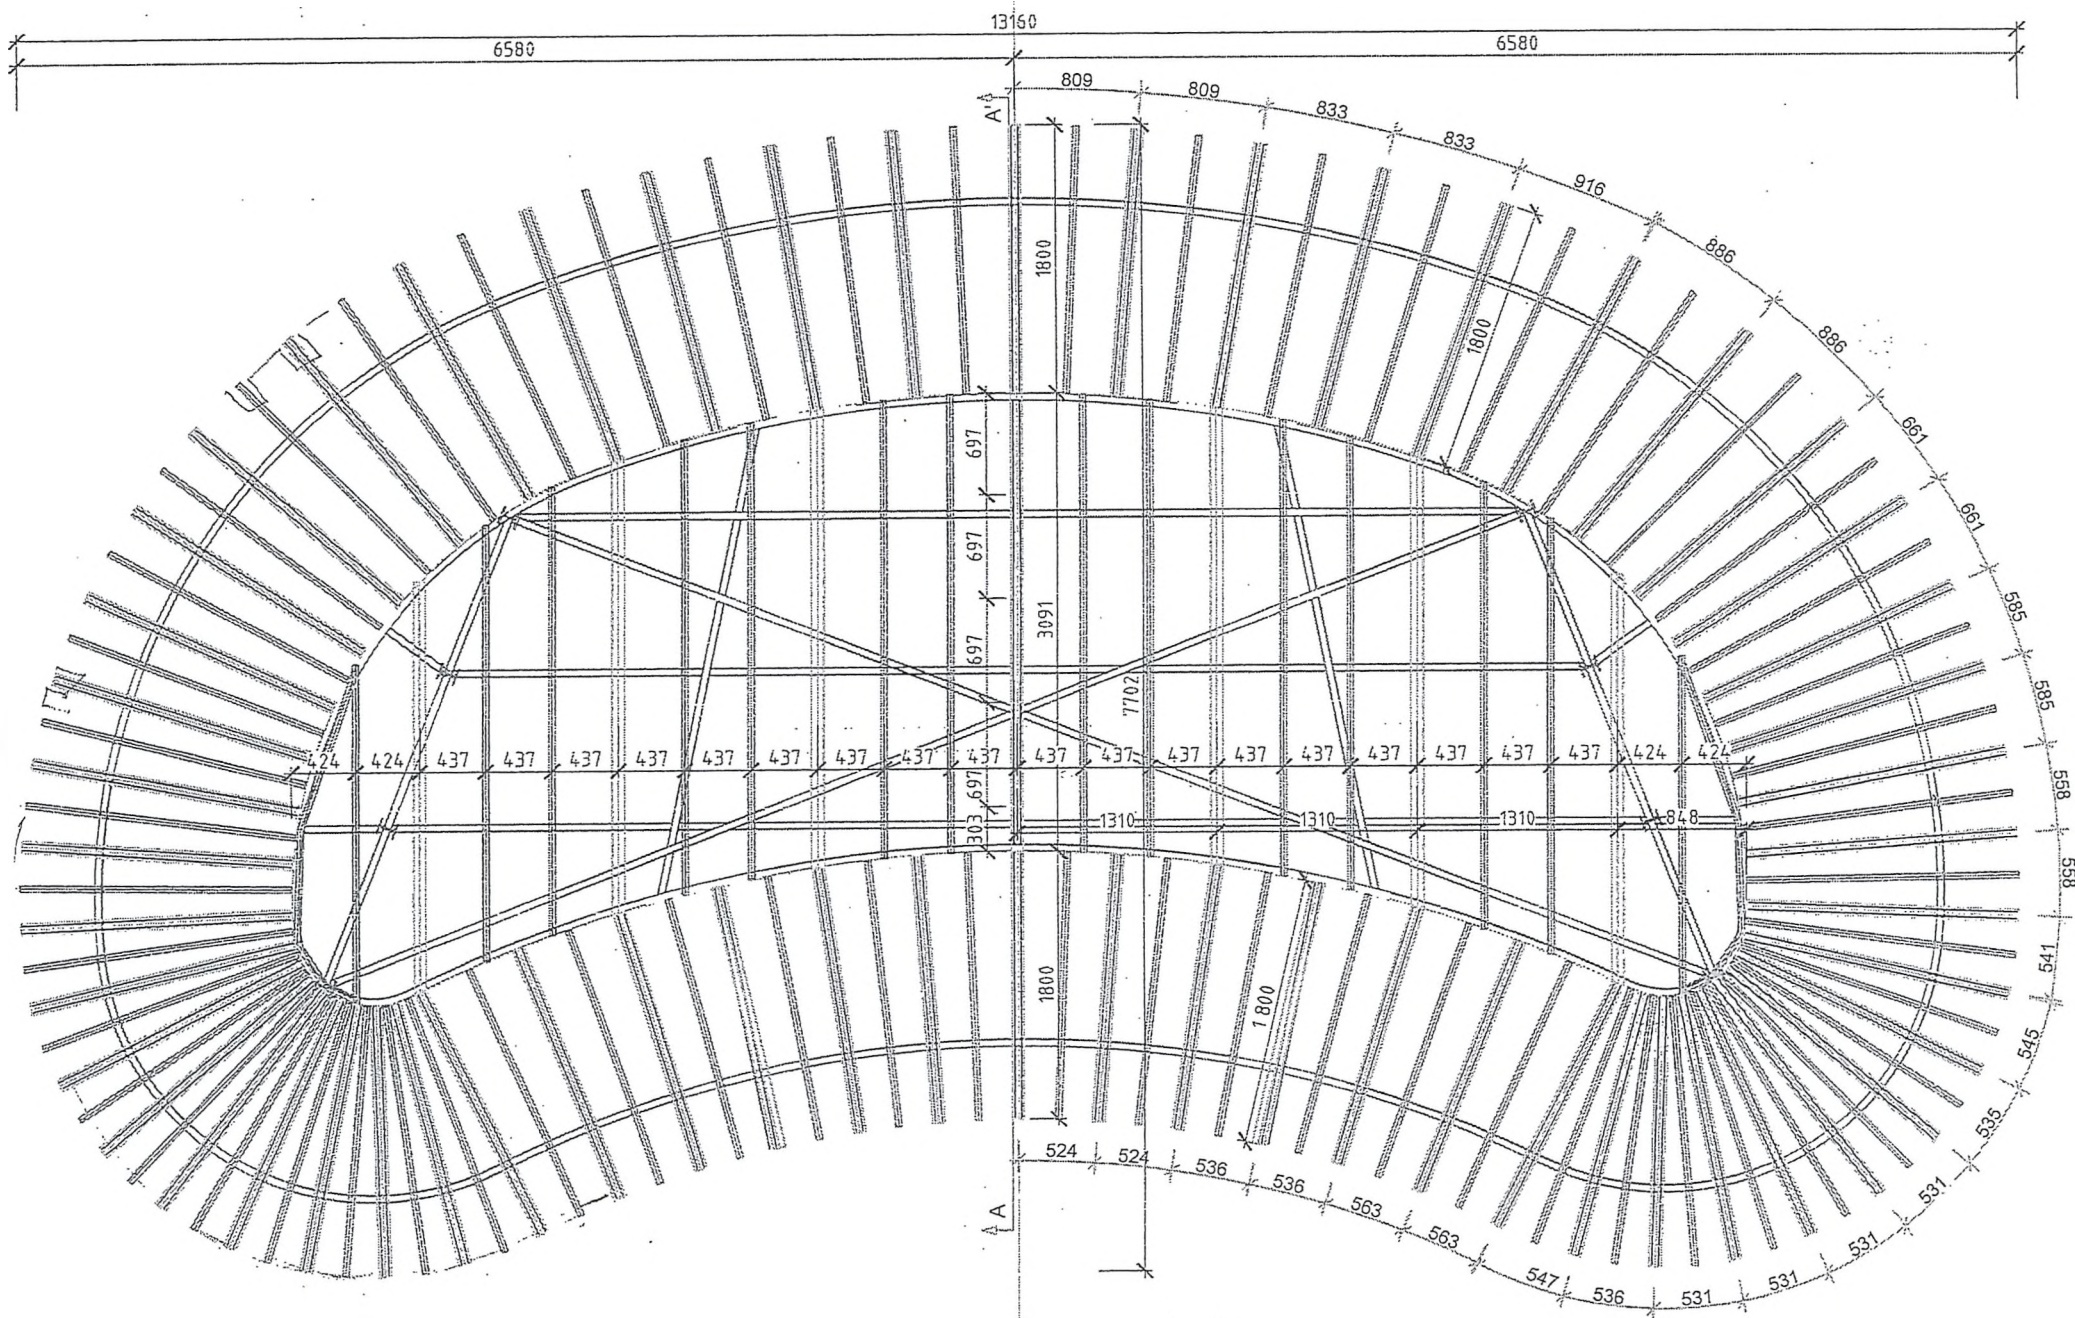

Evidenční list, návrh změny stavby č. 2/ projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2016/005781

Stavební akce:	Habrmannovo nám. -altán a úpravy parku		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	16TUOIN28		
Dotčená část stavby:	Uzemnění VO		
Název / označení změny: ZL č.2	Doplnění zemnění.		
Podklad pro změnu:	Zápis ve stavebním deníku.		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	11.5.2017		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	11.5.2017
Zdůvodnění a popis změny: Na základě dodatečného požadavku budoucí správce a provozovatele nového osvětlení parku a altánu (SVSMP), byl doplněn zemní prvek (zemní drát o $\varnothing$ 8 mm) u venkovního osvětlení, viz zápis ve stavebním deníku.			
Vliv změny na termín dodání díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	Kč bezDPH		
přípočty celkem:	13544,37,- Kč bezDPH		
odpočty celkem:	- Kč bezDPH		
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní SILBA - Elstav s.r.o. Letkov 155, 326 00 Plzeň tel.: 377 459 000 IČO: 64 35 88 44			
Za útvar / oddělení / firma:	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SILBA ELSTAV s.r.o.	Ing. Jan Jirka		
projektant /AD/ -	Arch. Jakub Chvojka		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák		
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík		
- cenová kontrola	Iva Baierová		
Úřad městského obvodu Plzeň 4	Ing. Zdeněk Mádr		

ROZPOČET

Stavba: Habrmannovo nám. -altán a úpravy parku II - 16TUOIN28

Objekt: VM - ZMĚNOVÉ LISTY

Část: ZL 02 - Uzemnění

Místo:

Datum:

23.6.2017

Objednatel: Statutární město Plzeň, Odbor investic-MMP
Zhotovitel: SILBA-Elstav s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady z rozpočtu

13 544,37

D1 - ELEKTROMONTÁŽE C21-M

0,00

M - Práce a dodávky M

13 544,37

1	K	210 220 022	drát FeZn 10	m	210,870		
2	K	210 220 302	svorka přípojovací	ks	10,000		
3	K	210 220 301	svorka drát drát	ks	14,000		
4	K	Pol1	připojení ocelové konstrukce altánu	ks	1,000		
0	K	Pol2	revize	ks	1,000		

Datum	Denní záznamy stavby
11/11	ZAPIS AT:
	V rámci územního KP byl zřízen 4 zkušební
	konstruktivní stávající konstrukce AT
	stavby. Prohlášení územní práce v rámci
	konstruktivní (konstrukce) AT PD. Na půdu historické
	paláce, která byla v roce 1945 zrušena
	v rámci projektu přestavby, kterou AT
	AT Těmto návrhům přetl. Těmto AT
	územní plánem AT 12/5.
	KAPIS APRAVE VO
	NA ZÁKLADĚ TLP 45 A PŘEDLOŽENÝM PODÁNÍM
	NÁZEVU KOVOVÉ ČÁSTI VO PŘEDLOŽENÝM
	F.22u.
	APRAVE AT 12/5
	F.22u.
	KAPIS APRAVE VO
	NA ZÁKLADĚ TLP 45 A PŘEDLOŽENÝM
	NÁZEVU KOVOVÉ ČÁSTI VO PŘEDLOŽENÝM
	F.22u.
	KAPIS APRAVE VO
	NA ZÁKLADĚ TLP 45 A PŘEDLOŽENÝM
	NÁZEVU KOVOVÉ ČÁSTI VO PŘEDLOŽENÝM
	F.22u.
	KAPIS APRAVE VO
	NA ZÁKLADĚ TLP 45 A PŘEDLOŽENÝM
	NÁZEVU KOVOVÉ ČÁSTI VO PŘEDLOŽENÝM
	F.22u.

Evidenční list, návrh změny stavby č. 3/ projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2016/005781

Stavební akce:	Habrmannovo nám. -altán a úpravy parku
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	16TUOIN28
--	-----------

Dotčená část stavby:	Nátěr ocelové konstrukce		
Název / označení změny: ZL č.3	Neprováděné nátěry.		
Podklad pro změnu:	Zápis ve stavebním deníku.		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	20.7.2017		
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	20.7.2017

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě provozních důvodů a požadavku ÚMO Plzeň 4, dále vyjádření AD nebudou prováděny nátěry ocelové konstrukce, a to v části výplně sloupů altánu, viz zápis ve stavebním deníku.

Vliv změny na termín dodání díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			Kč bezDPH
přípočty celkem:			- Kč bezDPH
odpočty celkem:			- 99874,28 Kč bezDPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní

SILBA - Elstav s.r.o.

Letkov 155, 326 00 Plzeň

Za útvar / oddělení / firmu:	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SILBA - Elstav s.r.o. IČO: 64 33 88 44 ⑦ DIČ: CZ64359844	Ing. Jan Jirka	20.7.2017	
projektant /AD/ -	Arch. Jakub Chvojka	20.7.2017	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	20.7.2017	
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík	20.7.2017	
- cenová kontrola	Iva Baierová	20.7.2017	
Úřad městského obvodu Plzeň 4	Ing. Zdeněk Mádr	20.7.2017	

ROZPOČET

Stavba: Habrmannovo nám. -altán a úpravy parku II - 16TUOIN28

Objekt: VM - ZMĚNOVÉ LISTY

Část: ZL 03 - Stavební část-Nátěry

Místo:

Datum:

20.07.2017

Objednatel: Statutární město Plzeň, Odbor investic-MMP

Projektant:

Zhotovitel: SILBA-Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady z rozpočtu

-99 874,28

783 - Nátěry

-99 874,28

1	K	783222120RT2	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x barva, tmavě šedá RAL 7022 (umbra) mat.	m2	-359,260		
2	K	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	-359,260		

Denní záznamy stavby:

List č.

493002

Datum:

Požár 7⁰⁰ - 17⁰⁰ v pláči
Přítomni - Sušanka, Pítek,
Lemby, Popel

19/7

Práce - Přechovávání mláti
úprava žlabů v drnách

Letenář - p. Červený + 3
střelba letenář pro montáž
podhledů

20/7

Požár 7⁰⁰ - 19⁰⁰ v pláči
Přítomni - Sušanka, Pítek,
Lemby

Práce - úprava mláti

Kontrola kódu JOP na stavbě

20.7.17

220 kontrola mláti

220 kontrola mláti

Práce mláti JOP

Práce na mláti

Práce na stavbě

20. VII. 1917

AD KONSTATUJE, ŽE NĚKTERÉ VÝPLNĚ SKUPIN
ALUMINIA NEBUDE PROVĚŘENO. OUEL KČE
BUDE POUŽITO JISTO, KOMPLETNĚ V ŽÁRO-
VĚM ŽINKY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO PROVE-
DĚNÍ KČE A TĚŽKÉ VIZUÁLNÍHO VYRAŽENÍ
PŘESTÁNE Ž PROVOZOVAT PŘÍP. AD:

Evidenční list, návrh změny stavby č. 4/ projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2016/005781

Stavební akce:	Habrmannovo nám. -altán a úpravy parku		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	16TUOIN28		
Dotčená část stavby:	Spárování elektro rozvaděče		
Název / označení změny: ZL č.4	Spárování rozvaděče.		
Podklad pro změnu:	Zápis ve stavebním deníku.		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	20.7.2017		
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	20.7.2017
Zdůvodnění a popis změny:			
Na základě požadavku zástupce ÚMO Plzeň 4 bude provedeno přesparování stávajícího elektro rozvaděče u altánu.			
Vliv změny na termín dodání díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	Kč bezDPH		
přípočty celkem:	2 293,02 Kč bezDPH		
odpočty celkem:	- Kč bezDPH		
Přiložky: soupis méněprací - víceprací			
zápisy ve SD			
zápisy z KD /z projednání, porady/			
ostatní			
SILBA - Elstav s.r.o. Letkov 155, 326 00 Plzeň			
Za útvar / oddělení / firmu:	Jméno	Datum	Podpis
tel.: 377 459 000 IČO: 64 35 88 44 DIČ: CZ64358844 zhotovitel - SILBA - Elstav s.r.o.	Ing. Jan Jirka	20.7.2017	
projektant /AD/ -	Arch. Jakub Chvojka	20.7.2017	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	20.7.2017	
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík	20.7.2017	
- cenová kontrola	Iva Baierová	20.7.2017	
Úřad městského obvodu Plzeň 4	Ing. Zdeněk Mádr	20.7.2017	

ROZPOČET

Stavba: Habrmannovo nám.-altán a úpravy parku II - 16TUOIN28

Objekt: VM - ZMĚNOVÉ LISTY

Část: ZL 04 - Spárování elektropilíře

Místo:

Datum:

20.07.2017

Objednatel: Statutární město Plzeň, Odbor investic-MMP

Projektant:

Zhotovitel: SILBA-Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady z rozpočtu

2 293,02

HSV - Práce a dodávky HSV

2 293,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 293,02

1	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	1,828		
2	K	985142912	Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,828		
3	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	1,828		
4	K	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,828		
5	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl do 12 m/m2	m2	1,828		
6	K	78417111R	Zakrytí dvířek pilíře (přeplepení, folie)	m2	1,000		0

Denní záznamy stavby:

List č.

493003

Datum:

Seznam TDS:

20.7.2012

Na základě požadavku zřetelce UMO
Plat 4 bude st. vozovka a altánu
opraven (nové uypu režného zdiva).
