

**Požadavek zhotovitele na změnu č.1****Projekt: „Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“**

Datum vydání požadavku:

13.1.2025

Adresa objednatele:  
**Město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 04 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**  
**Změna zemních rozvodů**

**Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

V řešeném území jsou k dalšímu provozu ponechána některá stávající svítidla veřejného osvětlení (VO) včetně stožárů přemístěná do nových pozic. Zemní kabely k těmto svítidlům jsou ponechány stávající a doplněny o zemní spojky kabelů (kabely jsou spojovány v zemi). Zemní kabely jsou součástí rozvodů pro VO i mimo tuto stavbu.

V řešeném území jsou navržena rovněž nová svítidla VO s novými stožáry a nové zemní kabelové rozvody k těmto svítidlům, kabely CYKY 5J/6 (Cu žíly, 5 ks x 6mm<sup>2</sup> v kabelu).

**Nové řešení:**

Veškeré původní kabely budou nahrazeny novými (bez zemních spojek) v provedení CYKY J 4x10 (4 měděné žíly o průřezu 10 mm<sup>2</sup>).

Nové kabely k novým svítidlům VO na stožárech budou v provedení CYKY J 4x10.

Uložení kabelů se provede do nových chráničků v celé trase, aby byly eliminovány zemní spojky. V souladu se schváleným generelem VO V2-2020 pro Karlovy Vary se použijí chráničky HDPE 40. Nové řešení je v souladu se schváleným generelem VO V2-2020.

Nové řešení se částečně projeví i v množství zemních prací pro pokládku nových chráničků (SO 01)

**Zdůvodnění změny:**

Projektové řešení je zpracováno ekonomicky pro předmětné území.

Zemní spojky představují riziko vzniku poruch a jejich následné obtížné odstraňování (vyhledání místa poruchy, výkopové práce apod.).

Navržené nové kabely v projektové dokumentaci vyhoví pro řešenou lokalitu. Předmětné území je z hlediska VO průběžným, tzn., že zemní vedení slouží k napájení VO i v jiných částech města, s ohledem na to by mělo být spolehlivě dimenzováno.

Cílem je pořídit spolehlivý systém s nízkými provozními náklady.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Projektová dokumentace bude v části zemních rozvodů upravena (zajišťuje zhotovitel).

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Smluvní termín dokončení díla se nemění.

Kvalita díla: zvýší se spolehlivost technického řešení s předpokladem nulových poruch na zemních rozvodech.

Cena díla se navýší o: 177.023,01 Kč *bez DPH*

**Požadavek zhotovitele na změnu č.1****Projekt: „Karlov Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství “**

---

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

Marek  
Čermák

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:

Ing Přemys  
Krejčířík, Ph



**Vyjádření objednatele a správce veřejného osvětlení:** *souhlasím*

Datum:

*4.3.2025*

Podpis:

*F. Kocure*

## Ocenění ke změně č. 1

Projekt: „Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“

číslo projektu: 2024-00039/ORI,  
SML35-61814/24

ocenění číslo ke změně č./ze dne: č. 1/05.02.2025

Název části stavby (stavební objekt):

SO 04 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
– Změna zemních rozvodů

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 13.01.2025

se odsouhlasuje změna:

| smlouva |              |                                                                                           |      |          |          |               |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------------|
| č.pol.  | kód položky  | popis                                                                                     | m.j. | množství | j.cena   | celkem Kč     |
| 14      | 122207111R00 | Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž. - výkopové práce v rámci elektro(300 mx0,5mx0,5m) | m3   | 38,75    | 500,00   | 19 375,00     |
| 15      | 181101102R00 | Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - v rámci elektro                        | m2   | 77,50    | 48,00    | 3 720,00      |
| 16      |              | kabel CYKY 5J/6 - napojení stávajícího osvětlení ( přesuny lamp V0)                       | m    | -30      | 125,00   | -3 750,00 Kč  |
| 17      |              | kabel CYKY 5J/6 - napojení nových stožáru V0                                              | m    | -120     | 125,00   | -15 000,00 Kč |
| 18      |              | kabel CYKY 3x2,5 - napojení nových zemních svítidel                                       | m    | 9        | 35,00    | 315,00 Kč     |
| 19      |              | ohěbná trubka KOPOFLEX 40mm                                                               | m    | -300     | 35,00    | -10 500,00 Kč |
| 20      |              | kulatina FeZn 10mm                                                                        | m    | 405      | 45,00    | 18 225,00 Kč  |
| 25      |              | zemní kabelová spojka pro CYKY 5J/6                                                       | ks   | -12      | 1 096,00 | -13 152,00 Kč |
| 26      |              | zemní kabelová spojka PAGURO 5695/3                                                       | ks   | -22      | 515,00   | -11 330,00 Kč |
| 27      |              | zemní kabelová spojka PAGURO 5660/4                                                       | ks   | -2       | 1 317,00 | -2 634,00 Kč  |
| 29      |              | výstražná fólie do výkopu                                                                 | m    | 191      | 12,00    | 2 292,00 Kč   |
|         | Nová položka | Položení chráničky z plastových trubek DN přes 35 do 50 mm (Chránička V0)                 | m    | 491      | 32,20    | 15 810,20 Kč  |

ZL 01

|                        |              |                                                                                                                     |     |         |           |               |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|---------------|
|                        | Nová položka | <i>chránička optického kabelu<br/>HDPE jednoplášťová<br/>bezhalogenová D 40/33mm (</i><br><i>Chránička VO HDPE)</i> | m   | 503,275 | 44,40     | 22 345,41 Kč  |
|                        | Nová položka | Montáž kabel Cu plný kulatý<br>žíla 4x10 mm <sup>2</sup> zatažený v<br>trubkách (např. CYKY)                        | m   | 416     | 64,30     | 26 748,80 Kč  |
|                        | Nová položka | <i>kabel instalační jádro Cu plné<br/>izolace PVC plášť PVC<br/>450/750V (CYKY) 4x10mm<sup>2</sup></i>              | m   | 426,4   | 141,00    | 60 122,40 Kč  |
|                        | Nová položka | Montáž kabel Cu plný kulatý<br>žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> zatažený<br>v trubkách (např. CYKY)                  | m   | 159     | 54,30     | 8 633,70 Kč   |
|                        | Nová položka | Montáž drátu nebo lana<br>uzemňovacího průměru do 10<br>mm v městské zástavbě v zemi                                | m   | 555     | 57,30     | 31 801,50 Kč  |
|                        | Nová položka | Dokumentace pro provádění<br>stavby                                                                                 | KPL | 1       | 12 000,00 | 12 000,00 Kč  |
|                        | Nová položka | Geodetické měření skutečného<br>provedení stavby                                                                    | KPL | 1       | 12 000,00 | 12 000,00 Kč  |
| celkem                 |              |                                                                                                                     |     |         |           | 177 023,01 Kč |
| Celkem včetně DPH 21 % |              |                                                                                                                     |     |         |           | 214 197,84 Kč |

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Václav Vlče

Marek  
Čermák

**Požadavek zhotovitele na změnu č.2****Projekt: „Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“**

Datum vydání požadavku:

27.01.2025

Adresa objednatele:  
**Město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 01A Komunikace a zpevněné plochy – kostky**  
**- Kostky -změna**

**Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Původní projektová dokumentace zahrnovala následující specifikace:

- **Pro komunikaci:** kostky řezanoštipané dlažební žuly o rozměru 10 × 10 × 10 cm – BÉŽOVÁ
- **Pro chodníky a jiné plochy:** kostky řezanoštipané dlažební žuly o rozměru 6 × 6 × 6 cm – BÉŽOVÁ

Dále bylo projektováno uložení dlažebních kostek pro komunikaci do maltového lože.

**Nové řešení:**

Bude použita kostka štipaná **šedo-žlutá (melír)**

Kostky budou uloženy do drčeného kameniva, což zajistí lepší stabilitu a dlouhodobou funkčnost povrchu.

**Výjimka:** Dlažba na autobusové zastávce před **Císařskými lázněmi** bude provedena podle původní projektové dokumentace (do maltového lože) a vyspárována speciální zálivkou.

**Zdůvodnění změny:**

Původní projektová dokumentace počítala s použitím řezanoštipané dlažební žuly v následujícím rozsahu:

- **Pro komunikaci:** kostky o rozměru 10 × 10 × 10 cm – BÉŽOVÁ
- **Pro chodníky a další plochy:** kostky o rozměru 6 × 6 × 6 cm – BÉŽOVÁ

Na základě konzultace s **Národním památkovým ústavem, památkovou péčí a Kanceláří města Karlovy Vary** bylo rozhodnuto o sjednocení vzhledu dlážděných prvků s již dokončenými zpevněnými plochami v okolí **Císařských lázní**. Zde byla použita štipaná kostka v barevném provedení **šedo-žlutá (melír) z lomu Mrákotín**. Tato změna má významný vliv na sjednocení celého území v rámci tzv. **Divadelního torza**, čímž bude zajištěna estetická a historická kontinuita dlážděných ploch.

Další úprava se týká způsobu pokládky. Zhotovitel a přizvaný nezávislý projektant **Ing. Tomáš Štembera Petrů** se shodli, že projektované uložení dlažebních kostek pro komunikaci do maltového lože je rizikové. Zkušenosti z jiných realizací ukazují, že při provozním zatížení vozovky dochází k uvolňování jednotlivých kostek, což vede k opakovaným opravám, které však nejsou dlouhodobě účinné. Proto bylo doporučeno provést změnu technologie pokládky a uložit kostky do drčeného kameniva, což zajistí jejich vyšší stabilitu a dlouhodobou funkčnost povrchu.

Výjimku tvoří **dlažba na autobusové zastávce před Císařskými lázněmi**, která bude provedena dle původní projektové dokumentace (uložení do maltového lože) a vyspárována speciální zálivkou.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Projektová dokumentace bude v části zpevněných ploch upravena (zajišťuje zhotovitel).

**Požadavek zhotovitele na změnu č.2****Projekt: „Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“****Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Smluvní termín dokončení díla se nemění.

Kvalita díla: Estetické a historické sjednocení prostoru a Zvýšení stability a dlouhodobé funkčnosti

Cena díla se sníží o: - 1 300 822,57 Kč *bez DPH***Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

**Marek  
Čermák****Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):***a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu**b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla**c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu**d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu**e) k předložené změně nemáme další připomínky.*

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatele :** *souhlasím*Datum: *7.3.2025*

Podpis:

*František Kocourek*

## Ocenění ke změně č. 2

Projekt: „Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“

číslo projektu: 2024-00039/ORI,  
SML35-61814/24

ocenění číslo ke změně č./ze dne: č. 2/27.01.2025

Název části stavby (stavební objekt):

**SO 01A Komunikace a zpevněné plochy –  
kostky ~~Stávající šachty~~ změna**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 27.01.2025

se odsouhlasuje změna:

| smlouva |             |                                                                                                     |      |          |          |                  |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------|
| č.pol.  | kód položky | popis                                                                                               | m.j. | množství | j.cena   | celkem Kč        |
| 39      | 591211111.1 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm                      | m2   | -590,000 | 855,00   | -504 450,00      |
| 39a     | 591411111   | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva                           | m2   | 512,000  | 782,00   | 400 384,00       |
| 39b     | 591411111R  | Kladení dlažby z z kostek drobných (viz. mozaika) pojezdová s úpravou spár cementovou zálivkou BASF | m2   | 78,000   | 1 798,00 | 140 244,00       |
| 40      | 58381015    | kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm - BÉŽOVÁ                                              | m2   | -601,800 | 3 644,00 | -2 192 959,20    |
| 40a     | 58381015R   | kostka štípaná dlažební žula                                                                        | m2   | 601,800  | 2 092,73 | 1 259 404,91     |
| 41      | 591211111.2 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm                      | m2   | -392,500 | 889,00   | -348 932,50      |
| 41aa    | 591412111   | Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva                     | m2   | 392,500  | 959,00   | 376 407,50       |
| 42      | 5838101.R   | kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm - BÉŽOVÁ                                                 | m2   | -400,350 | 2 564,00 | -1 026 497,40    |
| 42a     | 5838101.R1  | kostka štípaná dlažební žula                                                                        | m2   | 400,350  | 1 489,20 | 596 201,22       |
| 83      | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                               | t    | -2,12    | 295,00   | -625,10          |
| Celkem  |             |                                                                                                     |      |          |          | -1 300 822,57 Kč |

Celkem včetně DPH 21 %

-1 573 995 Kč

ZL 02

V Karlových Varech dne:

Projektant: Ing Přemysl  
Krejčířík, Ph.

Objednatel:

František Kocourek

TDI:

Václav Vlč

Zhotovitel:

Marek  
Čermák



**Požadavek zhotovitele na změnu č.3****Projekt: „Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“**

Datum vydání požadavku:

27.01.2025

Adresa objednatele:

**Město Karlovy Vary****Moskevská 21****361 20 Karlovy Vary**Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):**SO 01A Komunikace a zpevněné plochy – kostky  
Doplnění obruby****Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Původní řešení, které počítalo se zakončením dlažbou bez zapření kde navazují mlaty v délce 62,5 m

**Nové řešení:**

Doplnění obrub kamenných žulových 500x200x100 mm v délce 62,5 v místě kde navazují mlatové cesty na chodník z mozaikových kostek.

**Zdůvodnění změny:**

Doplnění obrub do částí, kde mlatové povrchy navazují na zpevněné plochy, bude realizováno z důvodu zajištění stability a dlouhodobé životnosti těchto přechodových úseků. Původní řešení, které počítalo se zakončením dlažbou bez zapření, by mohlo vést k postupnému rozvolňování a degradaci hran mezi jednotlivými povrchy v důsledku mechanického zatížení a povětrnostních vlivů. Implementace obrub eliminuje riziko migrace mlatového materiálu, zajistí pevné ohraničení ploch a přispěje k estetické i funkční kvalitě celého řešení.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Projektová dokumentace bude v části zpevněných ploch upravena (zajišťuje zhotovitel).

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Smluvní termín dokončení díla se nemění.

Kvalita díla: zvýší se spolehlivost technického řešení

Cena díla se navýší o: 78 509,35 Kč *bez DPH***Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

**Marek  
Čermák**

**Požadavek zhotovitele na změnu č.3****Projekt: „Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství “**

---

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):***a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu**b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla**c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu**d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu**e) k předložené změně nemáme další připomínky.*

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatele :** *souhlasím*

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 3

Projekt: „Karlovy Vary , Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“

číslo projektu: 2024-00039/ORI,  
SML35-61814/24

ocenění číslo ke změně č./ze dne: č. 3/27.01.2025


Název části stavby (stavební objekt): SO 01A Komunikace a zpevněné plochy –  
kostky - Doplnění obruby

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 27.01.2025 se odsouhlasuje změna:

| smlouva                |             |                                                                                |      |          |           |              |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|--------------|
| č.pol.                 | kód položky | popis                                                                          | m.j. | množství | j.cena    | celkem Kč    |
| 69                     | 916241213   | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m    | 62,500   | 467,00 Kč | 29 187,50 Kč |
| 73                     | 5838034.R   | obrubník kamenný žulový 500x200x100mm                                          | m    | 65,000   | 733,00 Kč | 47 645,00 Kč |
| 83                     | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                          | t    | 5,684    | 295,00 Kč | 1 676,85 Kč  |
| celkem                 |             |                                                                                |      |          |           | 78 509,35 Kč |
| Celkem včetně DPH 21 % |             |                                                                                |      |          |           | 94 996,31 Kč |

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel: 


Projektant: Ing Přemys  
Krejičíř Ph 

Objednatel: 

TDI: Václav V 

Mar  
Čern

ZL 03

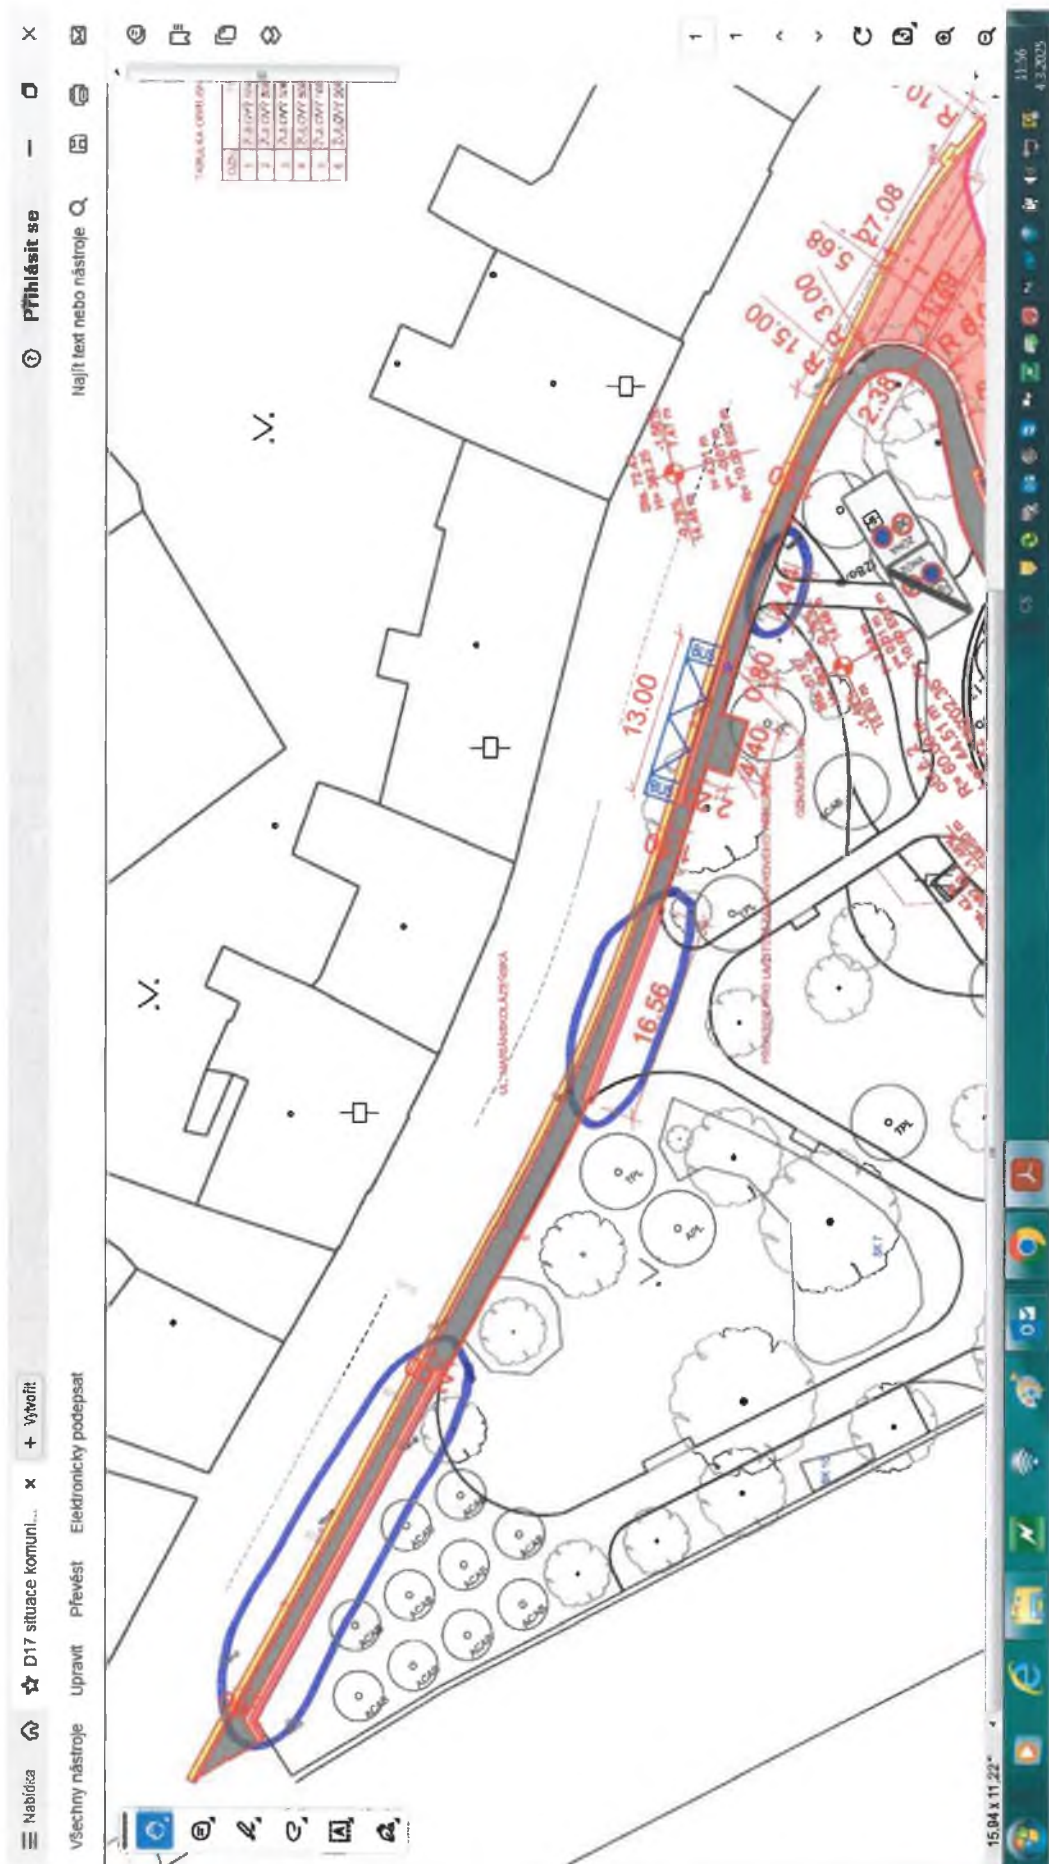

**Požadavek zhotovitele na změnu č.4****Projekt: „Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“**

Datum vydání požadavku:

27.01.2025

Adresa objednatele:  
**Město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 01A Komunikace a zpevněné plochy – kostky**  
**- Stávající šachty**

**Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Původní projektová dokumentace z výběrového řízení nepředpokládala nutnost úpravy těchto prvků, a proto nebyly v rámci původního návrhu zahrnuty odpovídající stavební zásahy. Tato skutečnost byla zjištěna až v průběhu realizace stavby na základě aktuálního stavu odhalených konstrukcí.

**Nové řešení:**

Výšková úprava tří revizních šachet tak, aby odpovídaly požadované niveletě terénu a zajišťovaly bezproblémový odtok a přístup. Oprava jedné revizní šachty z důvodu jejího technického stavu, včetně zajištění její plné funkčnosti a stability. Posun zákrytové desky a poklopu jedné revizní šachty v místě chodníku na ulici Mariánskolázeňská, aby bylo dosaženo optimálního umístění s ohledem na bezpečnost a provozní požadavky. Všechny úpravy budou provedeny v souladu s platnými technickými normami a požadavky na bezpečnost a funkčnost infrastruktury.

**Zdůvodnění změny:**

Při provádění odkopávek a zemních prací došlo k obnažení stávajících revizních šachet, jejichž technický a morální stav neodpovídal požadavkům na jejich další provoz. S ohledem na tyto skutečnosti bylo nezbytné provést jejich výškovou úpravu, opravu, případně přemístění, aby byla zajištěna jejich funkčnost, stabilita a odpovídající provozní parametry v souladu s platnými normami a technickými předpisy.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Projektová dokumentace bude v části zpevněných ploch upravena (zajišťuje zhotovitel).

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Smluvní termín dokončení díla se nemění.

Kvalita díla: zvýší se spolehlivost technického řešení

Cena díla se navýší o: 37 812,00 Kč *bez DPH*

**Požadavek zhotovitele na změnu č.4****Projekt: „Karlovy Vary, Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“****Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

Mar  
Čern**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položky v původním projektu

e) k předložené změně nem

Datum:

Ing Přem  
Krejčířík, P

Podpis:

**Vyjádření objednatele :** souhlasím

Datum: 4.3.2025

Podpis:



ZL 04

## Ocenění ke změně č. 4

Projekt: „Karlovy Vary , Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“

číslo projektu: 2024-00039/ORI,  
SML35-61814/24

ocenění číslo ke změně č./ze dne: č. 4/27.01.2025

Název části stavby (stavební objekt):

**SO 01A Komunikace a zpevněné plochy –  
kostky -Stávající šachty**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 27.01.2025

se odsouhlasuje změna:

| smlouva                |                         |                                 |      |          |              |              |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|----------|--------------|--------------|
| č.pol.                 | kód položky             | popis                           | m.j. | množství | j.cena       | celkem Kč    |
| NP                     | R položka<br>agregovaná | Revizní šachta - výšková úprava | kpl  | 3,000    | 7 709,00 Kč  | 23 127,00 Kč |
| NP                     | R položka<br>agregovaná | Revizní šachta - oprava         | kpl  | 1,000    | 10 563,00 Kč | 10 563,00 Kč |
| NP                     | R položka<br>agregovaná | Revizní šachta - posun          | kpl  | 1,000    | 4 122,00 Kč  | 4 122,00 Kč  |
| celkem                 |                         |                                 |      |          |              | 37 812,00 Kč |
| Celkem včetně DPH 21 % |                         |                                 |      |          |              | 45 752,52 Kč |

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:


Ing Přemysl  
Krejčířík, Ph

Objednatel:

Marek  
Čermák

TDI:

Václav Vlček

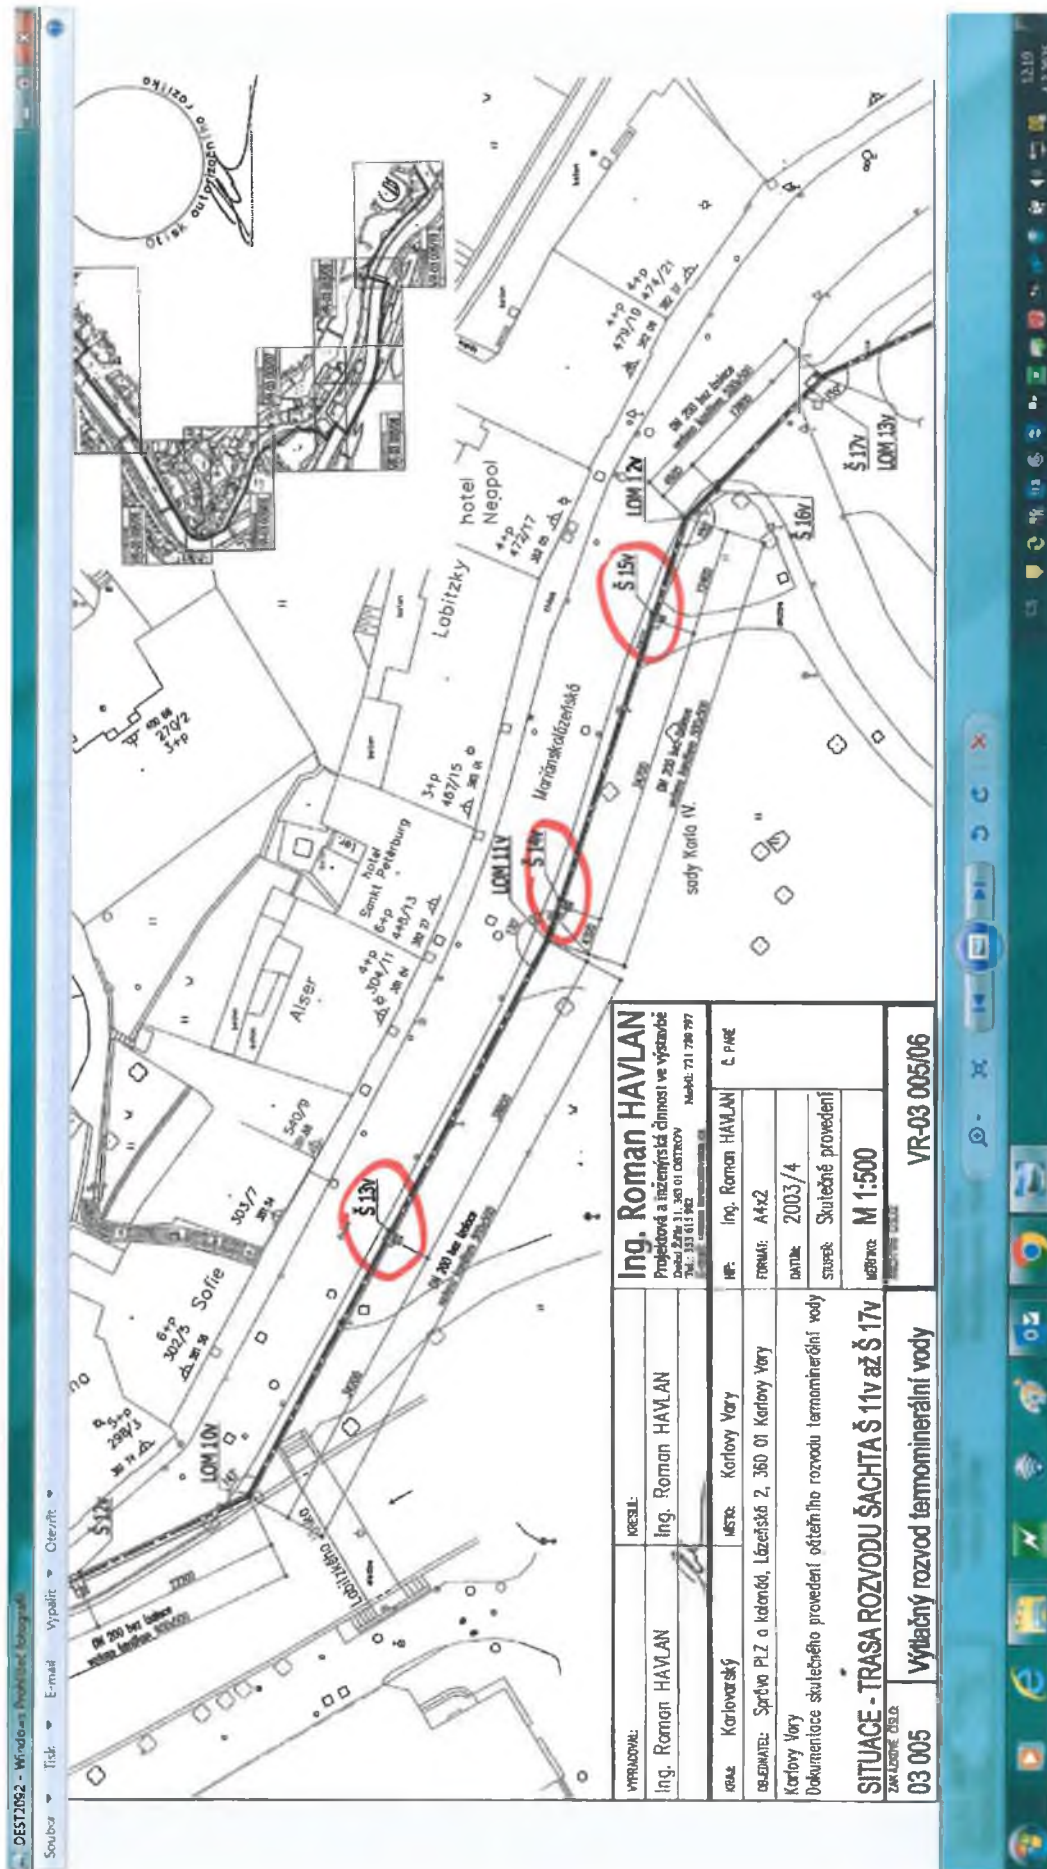

Legenda:   poloha revizní šachty



Karlovy Vary, Sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ (ZL) příkládaných k dodatku č.1 SOD a ROZBOR CENY za provedení díla

Ceny v Kč bez DPH

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ (ZL)

| Číslo ZL | Popis změny                                                                      | Vícepráce    | Neprovedené práce z nabídkového rozpočtu | Součet víceprací a neprovedených prací | Hodnota změny | Poznámka |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|
| 1        | Změna zemních rozvodů veřejného osvětlení (v torn vyvolaná změna mlatových cest) | 233 389,01   | -56 366,00                               | 177 023,01                             | 289 755,01    |          |
| 2        | Dlažební kostky - změna jejich opracování a uložení                              | 2 772 641,63 | -4 073 464,20                            | -1 300 822,57                          | 6 846 105,83  |          |
| 3        | Doplnění obrub mezi dlažďenou plochou chodníku a mlatovou cestou                 | 78 509,35    | 0,00                                     | 78 509,35                              | 78 509,35     |          |
| 4        | Úprava šachet na rozvodu minerální vody                                          | 37 812,00    | 0,00                                     | 37 812,00                              | 37 812,00     |          |
| SOUČTY   |                                                                                  | 3 122 351,99 | -4 129 830,20                            | -1 007 478,21                          | 7 252 182,19  |          |

ROZBOR CENY za provedení díla (v Kč bez DPH)

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cena podle SOD                                                          | 15 813 198,14        |
| Neprovedené práce z nabídkového rozpočtu (méněpráce)                    | -4 129 830,20        |
| Vícepráce dle změnových listů                                           | 3 122 351,99         |
| <b>SOUČET, tj. cena za provedení díla bez DPH podle dodatku č.1 SOD</b> | <b>14 805 719,93</b> |

Kč bez DPH

Snížení ceny díla v Kč bez DPH

-1 007 478,21 Kč bez DPH

Snížení ceny díla v Kč včetně DPH 21%

-1 219 048,63 Kč včetně DPH

**Rekapitulace nákladů projektu:**

Název stavby: Karlovy Vary, Sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostранství

**Předmět ZL**

**Stav provedení**

|                                                       | SOD              |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy - mlat</b>    |                  |
| CELKEM BEZ DPH 21%                                    | 2 840 380,40 Kč  |
| DPH 21%                                               | 596 479,88 Kč    |
| CELKEM S DPH 21%                                      | 3 436 860,28 Kč  |
| <b>SO 01A - Komunikace a zpevněné plochy - kostky</b> |                  |
| ZÁKLAD BEZ DPH 21%                                    | 8 375 942,76 Kč  |
| DPH 21%                                               | 1 758 947,98 Kč  |
| CELKEM S DPH 21%                                      | 10 134 890,74 Kč |
| <b>SO 03 - Mobilizát</b>                              |                  |
| CELKEM BEZ DPH 21%                                    | 1 543 154,50 Kč  |
| DPH 21%                                               | 324 062,45 Kč    |
| CELKEM S DPH 21%                                      | 1 867 216,95 Kč  |
| <b>SO 04 - Veřejné osvětlení</b>                      |                  |
| CELKEM BEZ DPH 21%                                    | 1 966 855,00 Kč  |
| DPH 21%                                               | 413 039,55 Kč    |
| CELKEM S DPH 21%                                      | 2 379 894,55 Kč  |
| <b>SO 05 - Závahový systém</b>                        |                  |
| CELKEM BEZ DPH 21%                                    | 1 086 865,48 Kč  |
| DPH 21%                                               | 228 241,75 Kč    |
| CELKEM S DPH 21%                                      | 1 315 107,23 Kč  |
| CELKEM BEZ DPH                                        | 15 813 198,14 Kč |
| CELKEM S DPH 21%                                      | 19 133 969,75 Kč |

|                   |          |          |                |
|-------------------|----------|----------|----------------|
| Veřejné osvětlení | Dlažby   | Okružby  | Revizní šachty |
| ČISTOPIS          | ČISTOPIS | ČISTOPIS | ČISTOPIS       |

| ZL1        | ZL2           | ZL3       | ZL4       | CELKEM        |
|------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 23 095,00  |               |           |           | 2 863 475,40  |
| 4 849,95   |               |           |           | 601 329,83    |
| 27 944,95  |               |           |           | 3 464 805,23  |
|            | -1 300 822,57 | 78 509,35 | 37 812,00 | 7 191 441,54  |
|            | -273 172,74   | 4 849,95  | 7 940,52  | 1 498 565,71  |
|            | -1 573 995,31 | 27 944,95 | 45 752,52 | 8 634 592,90  |
|            |               |           |           | 1 543 154,50  |
|            |               |           |           | 324 062,45    |
|            |               |           |           | 1 867 216,95  |
|            |               |           |           | 2 120 783,01  |
| 153 928,01 |               |           |           | 445 364,43    |
| 32 324,88  |               |           |           | 2 566 147,44  |
| 186 252,89 |               |           |           |               |
|            |               |           |           | 1 086 865,48  |
|            |               |           |           | 228 241,75    |
|            |               |           |           | 1 315 107,23  |
| 177 023,01 | -1 300 822,57 | 78 509,35 | 37 812,00 | 14 805 719,93 |
| 214 197,85 | -1 573 995,31 | 27 944,95 | 45 752,52 | 17 847 869,76 |

1,12% -8,23% 0,50% 0,24% 93,63%

|                         |                                                                           |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Zakázka</b>          | <b>Karlovy Vary, Sady Karla IV. - revitalizace veřejného prostranství</b> |  |  |  |  |
| <b>Reg. č. projektu</b> |                                                                           |  |  |  |  |

| <b>Dod. č.<br/>ZL č.</b>        | <b>SO - Popis a důvod změny</b>        | <b>Změna závazku<br/>ze smlouvy §<br/>222</b> | <b>Rozšíření</b>        | <b>Zužení</b>    | <b>Hodnota změny</b>   | <b>Hodnota změny<br/>max. 10/15 %<br/>odst. 4.</b> | <b>Cenový nárůst</b>    | <b>Cenový nárůst max<br/>30 %<br/>odst. 9</b> |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Přivodní hodnota závazku</b> |                                        |                                               | <b>15 813 198,14 Kč</b> |                  |                        |                                                    |                         |                                               |
|                                 | <b>Změna závazku dle odst. 4</b>       | <b>4</b>                                      |                         |                  | <b>116 321,35 Kč</b>   | <b>0,74%</b>                                       | <b>116 321,35 Kč</b>    |                                               |
| ZL 03                           | SO 01a - změny na obrubách             |                                               | 78 509,35 Kč            |                  | 78 509,35 Kč           | 0,50%                                              | 78 509,35 Kč            |                                               |
| ZL 04                           | SO 01a - změny na RŠ                   |                                               | 37 812,00 Kč            |                  | 37 812,00 Kč           | 0,24%                                              | 37 812,00 Kč            |                                               |
|                                 | <b>Změna závazku dle odst. 5</b>       | <b>5</b>                                      |                         |                  | <b>289 755,01 Kč</b>   |                                                    | <b>177 023,01 Kč</b>    | <b>1,12%</b>                                  |
| ZL 01                           | SO 04 - změna na VO - doplnění rozvodů |                                               | 233 389,01 Kč           | -56 366,00 Kč    | 289 755,01 Kč          |                                                    | 177 023,01 Kč           | 1,12%                                         |
|                                 |                                        |                                               |                         |                  | 0,00 Kč                |                                                    | 0,00 Kč                 | 0,00%                                         |
|                                 | <b>Změna závazku dle odst. 6</b>       | <b>6</b>                                      |                         |                  | <b>0,00 Kč</b>         |                                                    | <b>0,00 Kč</b>          | <b>0,00%</b>                                  |
|                                 |                                        |                                               |                         |                  | 0,00 Kč                |                                                    | 0,00 Kč                 | 0,00%                                         |
|                                 |                                        |                                               |                         |                  | 0,00 Kč                |                                                    | 0,00 Kč                 | 0,00%                                         |
|                                 | <b>Změna závazku dle odst. 5 a 6</b>   | <b>5 a 6</b>                                  |                         |                  |                        |                                                    | <b>177 023,01 Kč</b>    | <b>1,12%</b>                                  |
|                                 | <b>Změna závazku dle odst. 7</b>       | <b>7</b>                                      |                         |                  | <b>6 846 105,83 Kč</b> |                                                    | <b>-1 300 822,57 Kč</b> |                                               |
| ZL 02                           | SO 01a - změna na kostkách             |                                               | 2 772 641,63 Kč         | -4 073 464,20 Kč | 6 846 105,83 Kč        |                                                    | -1 300 822,57 Kč        |                                               |
| <b>Nová hodnota závazku</b>     |                                        |                                               | <b>14 805 719,93 Kč</b> |                  |                        |                                                    | <b>-1 007 478,21 Kč</b> | <b>-6,37%</b>                                 |
