

Protokol o změně díla

Změnový list č. 26

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A a.s.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o názevový stav, kdy po odbourání původní omítky bylo zjištěno, že u stávajících okenních otvorů do strany ulic Kounicova a Zahradníková nejsou dostatečně či vůbec vyplněné přípojovací spáry. Na žádost objednatele budou tyto spáry vyplněny a budou ze strany exteriéru dodatečně nalepené okenní pásy. Dále bylo zjištěno, že tloušťka pro dodatečnou betonáž pod budoucí parapety je dle výkazu výměr nedostatečná. Vyjádření TDS: Na žádost objednatele budou spáry vyplněny a budou ze strany exteriéru dodatečně nalepené okenní pásy – stav byl zjištěn po provedení otlučení omítek. Dále bylo zjištěno, že tloušťka pro dodatečnou přípravu podkladu pod budoucí parapety je dle výkazu výměr nedostatečná.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	☒	
	dodatek k PD	☐	
	dokumentace skut.provedení	☒	
jiné	☐		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	85 611,14 Kč	0,24%
	Výše DPH sazba: 12%	10 273,34 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	95 884,48 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.2 a ZL č. 25	35 543 637,11 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 26 bez DPH	35 629 248,25 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 26 vč. DPH	39 904 758,04 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	27 023,07 Kč	0,07%
	Vícepráce celkem bez DPH	112 634,21 Kč	0,29%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	139 657,28 Kč	0,36%
termín	Termín realizace změny:	11/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 26		
	Příloha č. 2 - zakres v PD-pasport okenních pásek, fotodokumentace tloušťky dobetonáží parapetů, fotodokumentace špalet po odbourání původní omítky		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/41	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.26 těsnění oken	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	KALAHHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 292,35
PSV			76 318,79
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			85 611,14
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		85 611,14 CZK
Snížená DPH	12 %		10 273,34 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			95 884,48 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002733/4 1	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.26 těsnění oken	85 611,14	0,00	10 273,34	95 884,48	100,00
52	MP	-27 023,07	0,00	-3 242,77	-30 265,84	-31,56
53	VCP	112 634,21	0,00	13 516,11	126 150,32	131,56
Celkem za stavbu		85 611,14	0,00	10 273,34	95 884,48	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-24 877,75	-29,06
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			12 675,24	14,81
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 962,10	19,81
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 080,35	1,26
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 452,41	4,03
713	Izolace tepelné	PSV			12 557,86	14,67
766	Konstrukce truhlářské	PSV			63 760,93	74,48
Cena celkem					85 611,14	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/41	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.26 těsnění oken
C:	52	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 6	Úpravy povrchu, podlahy					-24 877,75	-2,62		0,00	
1	632451021R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	-52,49800	473,88	-24 877,75	0,05	-2,62	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.39

SOD : -52,498

-52,49800

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-2 145,32	0,00		0,00	
2	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	-2,61650	819,92	-2 145,32	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.151

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/41	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.26 těsnění oken
C:	53	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 62		Úpravy povrchů vnější					12 675,24	0,33		0,00
1	602016105R00	Vrstva podkladní PROFI Haftmörtel ručně 3 mm	m2	54,80000	231,30	12 675,24	0,01	0,33	0,00	0,00

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 257,00,-, RTS 24/II -10%, = 231,30,-

Začátek provozního součtu

Pohled z ulice Kounicova :

$1NP : (2, 10 + 2 * 1, 80) * 5$ 28,50000

$2NP : (2, 10+2*2, 80)*7$ 53,90000

$$3NP : (2, 10 + 2 * 1, 80) * 3 \quad 17,10000$$
$$4NP : (2, 10 + 2 * 1, 80) * 3 \quad 17,10000$$
$$5NP : (2, 10 + 2 \cdot 1, 80) \cdot 4 \quad 22,80000$$
$$6NP : (2, 10 + 2 \cdot 1, 80) \cdot 4 \quad 22,80000$$

Pohled z ulice Zahradníkova :

$$1NP : (1.90 + 2 \cdot 1,80) \cdot 4 \quad 22,00000$$
$$2NP : (1,90+2*2,80)*7 \quad 52,50000$$
$$3NP : (1,90+2*1,80)*1 \quad 5,50000$$
$$4NP : (1,90+2*1,80)*1 \quad 5,50000$$
$$5NP : (1,90+2*1,80)*1 \quad 5,50000$$
$$6NP : (1,90+2*1,80)*1 \quad 5,50000$$

Pohled ze sousedního objektu do dvora :

$$3NP : (1,50 + 2 \cdot 1,80) \cdot 1 \quad 5,10000$$
$$4NP : (1,50 + 2 \cdot 1,80) \cdot 1 \quad 5,10000$$
$$5NP : (1,50+2*1,80)*1 \quad 5,10000$$

Konec provozního součtu

274*0,20 54,80000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/41	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.26 těsnění oken
C:	53	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					16 962,10	6,46		0,00	
2	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	52,49800	323,10	16 962,10	0,12	6,46	0,00	0,00

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 359,00,-, RTS 24/II -10%, = 323,10,-

Díl 94	Lešení a stavební výtahy					1 080,35	0,03		0,00	
3	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	30,94667	31,74	982,25	0,00	0,03	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.78

Začátek provozního součtu

WAF :

Pohled z ulice Kounicova :

*1NP : 2,10*1,80*5 18,90000*

*2NP : 2,10*2,80*7 41,16000*

*3NP : 2,10*1,80*3 11,34000*

*4NP : 2,10*1,80*3 11,34000*

*5NP : 2,10*1,80*4 15,12000*

*6NP : 2,10*1,80*4 15,12000*

Pohled z ulice Zahradníková :

*1NP : 1,90*1,80*4 13,68000*

*2NP : 1,90*2,80*7 37,24000*

*3NP : 1,90*1,80*1 3,42000*

*4NP : 1,90*1,80*1 3,42000*

*5NP : 1,90*1,80*1 3,42000*

*6NP : 1,90*1,80*1 3,42000*

Pohled ze sousedního objektu do dvora :

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/41	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.26 těsnění oken
C:	53	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

*3NP : 1,50*1,80*1* 2,70000
*4NP : 1,50*1,80*1* 2,70000
*5NP : 1,50*1,80*1* 2,70000
Konec provozního součtu

5 dnů : 185,68*(5/30) 30,94667

4	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	30,94667	3,17	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	--	----	----------	------	-------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.84

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 30,94667 30,94667

Díl 99	Staveništní přesun hmot					5 597,73	0,00		0,00	
5	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	6,82716	819,92	5 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.151

Díl 713	Izolace tepelné					12 557,86	0,16		0,00	
6	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	35,04000	205,65	7 205,98	0,00	0,11	0,00	0,00

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 228,50,-, RTS 24/II -10%, = 205,65,-

Začátek provozního součtu
Pohled z ulice Kounicova :
*1NP : 2,10*5* 10,50000
*2NP : 2,10*7* 14,70000
*3NP : 2,10*3* 6,30000
*4NP : 2,10*3* 6,30000
*5NP : 2,10*4* 8,40000
*6NP : 2,10*4* 8,40000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/41	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.26 těsnění oken
C:	53	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Pohled z ulice Zahradníková :

1NP : 1,90*4	7,60000
2NP : 1,90*7	13,30000
3NP : 1,90*1	1,90000
4NP : 1,90*1	1,90000
5NP : 1,90*1	1,90000
6NP : 1,90*1	1,90000

Pohled ze sousedního objektu do dvora :

3NP : 1,50*1	1,50000
4NP : 1,50*1	1,50000
5NP : 1,50*1	1,50000

Konec provozního součtu

87,60*0,40 35,04000

7	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	35,04000	26,45	926,81	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------	--	----	----------	-------	--------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO02 č.62

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 35,04000 35,04000

8	28375768.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E	m3	1,92720	2 249,57	4 335,37	0,03	0,05	0,00	0,00
----------	-------------	---	----	---------	----------	----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO02 č.65

Začátek provozního součtu

Pohled z ulice Kounicova :

1NP : 2,10*5	10,50000
2NP : 2,10*7	14,70000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/41	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.26 těsnění oken
C:	53	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

3NP : 2,10*3 6,30000

4NP : 2,10*3 6,30000

5NP : 2,10*4 8,40000

6NP : 2,10*4 8,40000

Pohled z ulice Zahradníková :

1NP : 1,90*4 7,60000

2NP : 1,90*7 13,30000

3NP : 1,90*1 1,90000

4NP : 1,90*1 1,90000

5NP : 1,90*1 1,90000

6NP : 1,90*1 1,90000

Pohled ze sousedního objektu do dvora :

3NP : 1,50*1 1,50000

4NP : 1,50*1 1,50000

5NP : 1,50*1 1,50000

Konec provozního součtu

87,60*0,40*0,05*1,10 1,92720

9	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,15330	585,15	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	--	---	---------	--------	-------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO02 č.66

Díl 766		Konstrukce truhlářské					63 760,93		0,00		0,00	
10	766601213RT1V1	D+M okenní paropropustná páska š. 50 mm	m	361,60000	176,33	63 760,93	0,00	0,00	0,00	0,00		

Vlastní položka

WAF :

Pohled z ulice Kounicova :

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/41	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.26 těsnění oken
C:	53	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

1NP : 2*(2,10+1,80)*5	39,00000
2NP : 2*(2,10+2,80)*7	68,60000
3NP : 2*(2,10+1,80)*3	23,40000
4NP : 2*(2,10+1,80)*3	23,40000
5NP : 2*(2,10+1,80)*4	31,20000
6NP : 2*(2,10+1,80)*4	31,20000

Pohled z ulice Zahradníková :

1NP : 2*(1,90+1,80)*4	29,60000
2NP : 2*(1,90+2,80)*7	65,80000
3NP : 2*(1,90+1,80)*1	7,40000
4NP : 2*(1,90+1,80)*1	7,40000
5NP : 2*(1,90+1,80)*1	7,40000
6NP : 2*(1,90+1,80)*1	7,40000

Pohled ze sousedního objektu do dvora :

3NP : 2*(1,50+1,80)*1	6,60000
4NP : 2*(1,50+1,80)*1	6,60000
5NP : 2*(1,50+1,80)*1	6,60000


POHLED Z ULICE KOUNICOVA

POHLED Z ULICE ZAHRADNÍKOVA

POHLED Z DVORNÍ ČÁSTI

10) KAF
11) KAF
12) KAF
13) KAF
14) KAF
15) KAF
16) -1-
17) -1-
18) -1-
19) -1-
20) -1-
21) -1-
22) -1-
23) KAF
24) -1-

POHLED OD SOUSEDNÍHO OBJEKTU DO DVORA

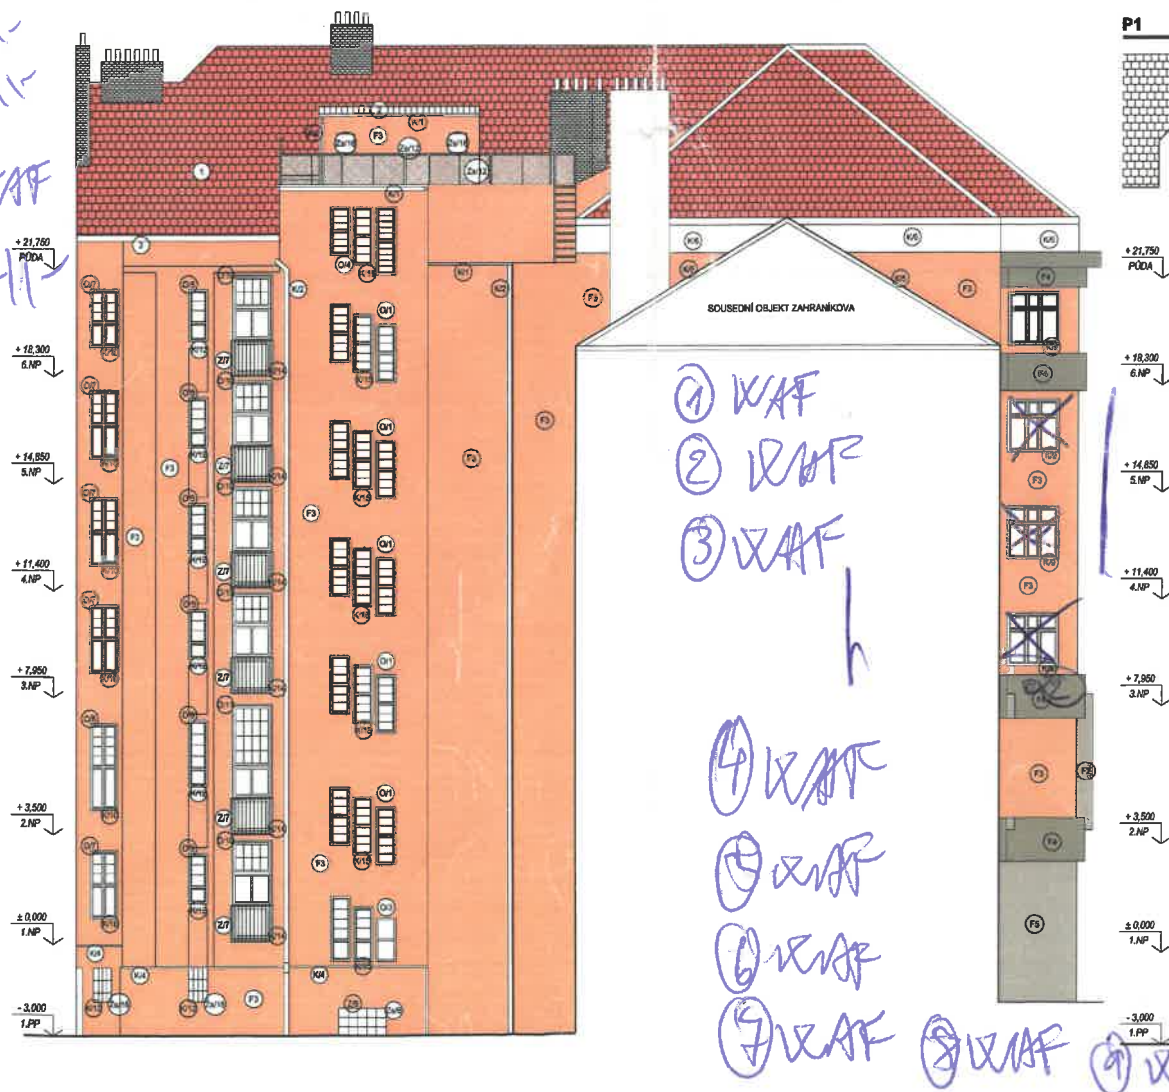

P1

P3

P4

P2

LEGENDA

Příloha č. 2 - zákres v PD-pasport
okenních pásek, fotodokumentace
tloušťky dobetonáží parapetů,
fotodokumentace špalet po odbourání
původní omítky

- F3 - PROBÍRANÉ SOUVISLÉ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + LEPOLO S TŘAVINOU + PROBÍRANÝ ŠTUK) VE SKLADY KONSTRUKCE
- F4 - PROBÍRANÉ SOUVISLÉ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + LEPOLO S TŘAVINOU + PROBÍRANÝ ŠTUK) VE SKLADY KONSTRUKCE
- F5 - TERÁCO V OJETI BOKU - BUDOV ČISTÝCH A ODOMENÍ KURY DOPLNĚNÍ DLE TÝTO SKLADY VE SKLADY KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- POZNÁMKA KONSTRUKCE VE TECHNICKÉ ZPRÁVĚ D.1.5-001
- S OHLEDNEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOŽNO BÝT KÓTY PO DOHODĚ S PROJEKTEM PRŮPOJEKTY SKUTEČNÝM ROZMĚRŮ
- FASÁDA BUDY JE PŘEDNÍ OMÍTKOVÝ SOUVISLÝ DLE STRATEGICKÉHO PRŮJEDU, KTERÝ JE DOLŽEN V DOKLADOVÉ ČÁSTI
- DALE JE POŘADÍ SKLADY V PRŮJEDU D.1.5-002 SKLADY KONSTRUKCE
- SCHEMA BAREV NA VÝKRESU JE POUZE ORIENTAČNÍ, NELZE Z TĚCHTO BAREV ODVOZOVAT BAREVNOST FASÁDY - VZORY BAREV PŘED REALIZACÍ BUDOV ODPOVÍDAJÍ NPÚ-OPH-HP
- NOVÁ SKLADY F3 - V CELÉM ROZSAHU TĚTO NOVÉ SKLADY BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ FASÁDA, SPÁRY STÁVAJÍCÍHO ZDVA BUDOV VYŠKRABÁNY
- NA VŠECH RÁMBÁCH A PARAPETECH BUDE STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ NAKRAJENÉ NOVÝM Z POZBOVÁNEHO PLECHU, KTERÝ BUDE MATĚN - VZORY BAREV PŘED REALIZACÍ BUDOV ODPOVÍDAJÍ NPÚ-OPH-HP (RAL 7046 - BEŽA), VE VÝPISU VÝROBKŮ JSOU UVEDENY BĚŽNÉ METRY OPLECHOVÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÁU PŘOY VČETNĚ OKAPOVÉHO ZLÁBU BUDE NAKRAJENÉ NOVÝM Z POZBOVÁNEHO PLECHU, KTERÝ BUDE MATĚN - VZORY BAREV PŘED REALIZACÍ BUDOV ODPOVÍDAJÍ NPÚ-OPH-HP (RAL 7046 - BEŽA), VE VÝPISU VÝROBKŮ JSOU UVEDENY BĚŽNÉ METRY OPLECHOVÁNÍ
- NA BOKU BUDOVY A 1NP PŘI ULICI BUDE V CELÉ PLOŠE PROVEDEN BEZBÁRYNÝ MÁTER PROTI VANDALISMU (DOCHRANA PROTI SGRATIT)
- BOKU BUDOVY BUDE DOPLNĚN DLE SKLADY FASÁDNÍHO SYSTÉMU ČOV V 60%
- Z FASÁDY BUDOVY ODSTRANĚNÝ VÝROBKŮ OD KRYTOVÝCH PRÍKRYTOVÝCH 100% OTVORY BUDOVY ZADČENÝ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA INTERIERU BUDE DOPLNĚN DLE STÁVAJÍCÍ (ZADČENÝ, PŘEŠTAJENÝ PERKOLU, OMÍTKA, VĚT, V EXTERIERU BUDE PROVEDENA NOVÁ OMÍTKA V CELÉ PLOŠE FASÁDY
- PRŮJEDNŮ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČOV, VYHÁŠEN A ZÁKONNÝ PLATNÝ V DOBĚ VÝKAM STAVĚNÍM POVOLEN
- KONKRETNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OSADENÝ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UJADNÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOŘEM A PROJEKTEM TĚM

Generální projektant: Pw Arch s.r.o. IČ: 2581841, DIČ: CZ2581841 kancelář: Jiráka 21a, 602 00 Brno Tel: +420 775 377 551, +420 775 486 01 E-mail: info@pwarch.cz, info@pwarch.cz		Zpracoval: PAM ARCH Profese: ARCH-STAV Dle: Statutární město Brno Městské části Brno-střed Domovní číslo 2 602 00 Brno	
Zpracoval projektant: Jozef Sivák Vypracoval: Jozef Sivák Spolupracoval: Jozef Sivák		Název: KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU Datum: 12.2017 Formát: A3 Stupeň: DPS Měřítko: 1:100 Číslo výkresu: D.1.1-9	
Stavební objekt: S001 Pohledy - nový stav			



K2

K1

K1



K7

3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7



Jilikon Kg.













