

Změnový list stavby			
Název stavby: Stavební úpravy MVK a TIC Vsetín		SO a IO ve změně	Číslo změny stavby:
Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: 0172/2024 Číslo smlouvy o dílo (SoD) zhotovitele: DZ 24015186		TIC	5
Objednatel: Město Vsetín			
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			
Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4		1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4		2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]		3	Technický dozor
		4	Autorský dozor
Popis a zdůvodnění změny:			
Přeložky přívodu			
Po odbourání podlahy v části TIC byl nalezen přívodní kabel elektro pro TIC. Tento kabel brání osazení dveří O12 do místnosti veřejného WC, následnému provedení hydroizolace proti srážkové vodě a osazení venkovního dešťového žlabu. Přemístěním tohoto kabelu dojde k umožnění osazení vstupních dveří O12 do místnosti 058 a provedení řádného odvodnění prostoru před vstupem do veřejného WC.			
Tato změna je zařazena dle Zákona o zadávání veřejných zakázek dle odst. 6 § 222, zák. č. 134/2016 Sb.			
Dopad do termínu dokončení stavby: má dopad, 28 dní			
Údaje v Kč bez DPH:			
Původní cena z SoD	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných změn celkem (MNP+VCP)
0,00 Kč	0,00 Kč	35 015,65 Kč	35 015,65 Kč
Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:			
Autorský dozor			
Technický dozor			
Ředitelka MVK Vsetín			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.			
Objednatel			
Objednatel			
Zhotovitel			
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

Položkový rozpočet

S:	1	Stavební úpravy MVK a TIC
O:	1C	TIC
R:	ZL 05	Přeložka přívodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D20		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				2 115,75
1	Pol104	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	6,50000	325,50	2 115,75
Díl: D32		TRABKY, LIŠTY, KANÁLY				1 122,90
2	Pol75	D50 TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ - dodávka a montáž	m	19,00000	59,10	1 122,90
Díl: D48		KOORDINACE POSTUPU PRACI				1 860,00
3	Pol110	S ostatnimi profesemi	hod	5,00000	372,00	1 860,00
Díl: D54		CIHELNEM DO PRUMERU 60mm				390,60
4	Pol116	Stena do 300mm	ks	3,00000	130,20	390,60
Díl: D58		CIHELNEM - HLOUBKA 50mm				744,00
5	Pol121	Sire 150 mm	m	5,00000	148,80	744,00
Díl: M21		Elektromontáže				4 884,00
6	210102022R00	Spojka pro 3x70+50mm2 vč montáže	kus	1,00000	4 884,00	4 884,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				4 627,20
7	222300441R00	Ukončení kabelu v rozvaděči	kus	8,00000	578,40	4 627,20
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				19 271,20
8	650041121R00	Montáž svorkovnice ochranné	kus	8,00000	184,00	1 472,00
9	650124521RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 70+50 mm2 pevně včetně dodávky kabelu 1-CYKY 3 x 70 + 50 mm2	m	19,00000	936,80	17 799,20

Fotodokumentace



Fotodokumentace



Změnový list stavby

Název stavby: **Stavební úpravy MVK a TIC Vsetín**

SO a IO ve změně

Číslo změny stavby:

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: 0172/2024

Číslo smlouvy o dílo (SoD) zhotovitele: DZ 24015186

TIC

6

Objednatel: **Město Vsetín**

Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS,
Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění,
dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo
samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

4

Autorský dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Nová vzduchová clona

Z hlediska zajištění tepelné pohody pro zaměstnance a návštěvníky TIC, bylo rozhodnuto o umístění vzduchové clony, na novou hliníkovou vstupní konstrukci O4, O5.

Tato změna je zařazena dle Zákona o zadávání veřejných zakázek dle odst. 4 § 222, zák. č. 134/2016 Sb.

Dopad do termínu dokončení stavby: **má dopad, 78 dní**

Údaje v Kč bez DPH:

Původní cena z SoD	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných změn celkem (MNP+VCP)
0,00 Kč	0,00 Kč	80 274,19 Kč	80 274,19 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Technický dozor

Ředitelka MVK Vsetín

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Objednatel

Zhotovitel

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Položkový rozpočet

S:	1	Stavební úpravy MVK a TIC
O:	1C	TIC
R:	ZL 06	Vzduchová clona

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D20		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				4 464,00
1	Pol108	Montaz-nespecif.položky - elektro dopojení clony	hod	12,00000	372,00	4 464,00
Díl: D70		KOORDINACE POSTUPU PRACI				930,00
2	Pol174	S ostatními profesemi	hod	5,00000	186,00	930,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				74 880,19
3	429128121RZ2	D+M vzduchové clony viz cenová kalkulace položky	kus	1,00000	61 939,00	61 939,00
4	429128121RZ3	D+M regulace vzduchové clony viz cenová kalkulace	kus	1,00000	9 840,00	9 840,00
5	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	754,99600	3,72	2 808,59
6	Pol49	Materiál na závěsy - dodávka	kg	2,00000	146,30	292,60

ZL 06**Kalkulace položky D+M vzduchové clony****Dodávka vzduchové clony****Porovnání jednotkových cen na trhu vzduchové clony**

ke dni 6.1.2025

P.Č.	NÁZEV	FIRMA			PRŮMĚRNÁ CENA NA TRHU	CENA MTS
		Systemair	VENTILATORY NET	CZ VZDUCHOTEC HNIKA		
		JC bez DPH	JC bez DPH	JC bez DPH		
1	Vzduchová clona Pamir 2500, PAF 2515E12, #246828, L= 1,5m, Elektrický ohřev: 12 kW	58 962 Kč	56 014 Kč	58 962 Kč	57 979 Kč	57 979 Kč

Celkem cena dodávky/MJ	57 979,00 Kč
------------------------	--------------

Montáž

Stanoveno dle HZS z RTS

p.č.	kód položky		MJ	počet MJ	cena/MJ	cena celkem	cenová soustava
1.	900.RT3	HZS	Nh	8	495,00	3 960,00	dle SOD

Nh instalatér = 8

Celkem cena montáže/MJ	3 960,00 Kč
------------------------	-------------

Celkem cena za D+M/MJ	61 939,00 Kč
------------------------------	---------------------

<https://www.systemair.com/cs-cz/vyroby/vzduchove-clony/komercni-vzduchove-clony/pamir/pamir-2500?sku=246828>
<https://www.ventilatory.net/paf-2515e12.html?srltid=AfmBOorLxXxmlxKxQA6-vss5XdWT5FoztBTdzT6RHwqOFBHxqiQkuBRc>
<https://www.czvzduchotechnika.cz/frico-paf-2515e12/>

výstřižky z webu provedené k danému dni na listu 2



Pamir 2500 Komerční vzduchové clony

Stylová vzduchová clona s dosahem až 2,5 m

- Doporučená instalační výška **2,5 m**
- Horizontální montáž**
- Provedení: **bez ohřevu, elektrický ohřev** (5 - 16 kW) nebo **vodní ohřev**
- Délky: **1, 1,5 a 2 m**
- Inteligentní řídící systém **FC**
- Dosah proudu vzduchu a vyrovnanost rychlostního profilu měřena dle **ISO EN 2732-2**

Délka (m)

Ohřev

Topný výkon (kW)

PAF 2515E12 #246828
Frekvence: 50/60 Hz

58.962,00 Kč bez DPH

Kontakt na obchodní oddělení

Přihlásit se nebo vytvořit účet pro nákup online

Přidat do Plánovače projektů



417 565 655 info@ventilatory.net

ÚČET KOŠÍK

HLEDAT

VENTILÁTORY DVEŘNÍ CLONY REKUPERAČNÍ JEDNOTKY VZT POTRUBÍ POTRUBNÍ ELEMENTY DISTRIBUČNÍ ELEMENTY ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL POŽÁRNÍ KOMPONENTY

DOMŮ / PAF 2515E12



Dveřní clony PAF SA246828

PAF 2515E12
vzduchová clona

71 344 Kč

Cena s DPH:

67 777 Kč

3-4 TÝDNY



Počet: 1 KOUPIT

Porovnat Přidat do projektu

PAF 2515E12 je vzduchová clona s moderním designem určená pro vstupní prostory kancelářských a obchodních objektů s maximální **instalační výškou 2,5 m**. Vzduchová clona **Pamir** vytváří vzduchovou bariéru, která brání průniku studeného vzduchu do vnitřního prostoru a tím udržuje příjemné klima uvnitř. **Dveřní clona** PAF 2515E12 patří do nové generace clon s vestavěnou energeticky úspornou **inteligentní regulací FC** zajišťující zcela automatický provoz a schopnou přizpůsobit provoz pro jakoukoliv teplotní podmínku a je možno ji snadně ovládat prostřednictvím mobilní aplikace. Jako příslušenství je nutné dokoupit regulační sadu dostupnou ve čtyřech verzích (Building, Direct, Pro, Smart). Může být rovněž ovládána pomocí Modbus RTU prostřednictvím systému BMS s modulem FC BAB. Dveřní clona je vybavena **elektrickým ohřevem**. Clona je určena pro **horizontální montáž** a je možné instalovat více clon vedle sebe. Plášť je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu, čelní a spodní kryt mají bílý práškový nátěr RAL9016 a mřížka a ostatní vnější části jsou opatřeny šedou barvou RAL7046. Na žádost lze dodat i v jiných odstínech RAL.

Průtok [m3/hod]	2200	Proud [A]	0.7
Příkon [W]	155	Napětí	230V
Hlučnost [dB(A)]	69	Min. teplota [°C]	-20
Max. rychlost [m/s]	1.5	Max. tlak [Pa]	1000

CZVzduchotechnika.cz

HLEDAT

Prázdný košík

Ventilátory Teplovzdušné jednotky Vzduchové clony Rekuperační jednotky VZT potrubí Tvarovky Digestoře Potrubní elementy Distribuční elementy Elektrické příslušenství Požární elementy Montážní materiál


Vzduchové clony Frico Pamir 2500 Frico PAF 2515E12

KATEGORIE

- Ventilátory
- Teplovzdušné jednotky
- Vzduchové clony
 - XVent Wind
 - Sonniger Guard
 - Sonniger Guard One
 - Sonniger Guard Pro
 - Vortice AD
 - COR N
 - COR N RF
 - Remak DoorMaster C
 - Remak DoorMaster D
 - Remak DoorMaster P
 - COR S
 - Rosenberg Rund M/G
 - Rosenberg ZEN M/G
 - Frico PA 2200C
 - Frico Pamir 2500**
 - Frico Portier
 - Pler & Palau CAH
 - Digitální

Frico PAF 2515E12 SA246828

☆☆☆☆ Neohodnoceno | Značka: Frico



71 344 Kč

58 962 Kč bez DPH

3-4 týdný

1 Přidat do košíku

Vzduchová dveřní clona **Frico PAF 2515E12 s elektrickým ohřevem** značně **redukuje ztráty tepla / chlazeného vzduchu**, čímž značně snižuje náklady na vytápění či chlazení. Dveřní vzduchová clona **Frico PAF 2515E12** zajišťuje komfortní klima bez nepříjemného průvanu a účinně brání také pronikání hmyzu, prachu, výfukových plynů či jiných emisí do místnosti. **Maximální instalační výška vzduchové clony Frico PAF 2515E12 je 2,5 a je určena pro horizontální montáž.**

- doporučená instalační výška 2,5 m
- šířka vzduchové clony 1,5 m
- horizontální montáž
- clona s **elektrickým ohřevem**

Detailní informace

ZL 06**Kalkulace položky D+M regulace vzduchových clon****Dodávka regulace vzduchové clony****Porovnání jednotkových cen na trhu regulace vzduchové clony**

ke dni 6.1.2025

P.Č.	NÁZEV	FIRMA			PRŮMĚRNÁ CENA NA TRHU	CENA MTS
		Systemair	systectherm de	systectherm pl		
		JC bez DPH	JC bez DPH	JC bez DPH		
1	FC Direct Regulace vzduchových clon, FC DA Direct	8 850 Kč	8 802 Kč	8 802 Kč	8 818 Kč	8 850 Kč

Celkem cena dodávky/MJ	8 850 Kč
------------------------	----------

Montáž

Stanoveno dle HZS z RTS

p.č.	kód položky		MJ	počet MJ	cena/MJ	cena celkem	cenová soustava
1.	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech	Nh	2	495,00	990,00	dle SOD

Celkem cena montáže/MJ	990,00 Kč
------------------------	-----------

Celkem cena za D+M/MJ	9 840,00 Kč
------------------------------	--------------------

[FC Direct Regulace vzduchových clon - Systemair](#)<https://www.systectherm.ch/fileadmin/downloadcenter/de/d-pl-00-preisliste.pdf><https://www.systectherm.ch/fileadmin/downloadcenter/it/i-pl-00-preisliste.pdf>



FC Direct Regulace vzduchových clon

FC Direct - Základní úroveň regulace pro skvělý start

- Dveřní kontakt
- Kalendář
- Časovač pro výměnu filtru
- Vestavěné teplotní čidlo

FC DA Direct #74684

8.850,00 Kč bez DPH

Kontakt na obchodní oddělení

[Přihlásit se](#) nebo [vytvořit účet](#) pro nákup online

[Přidat do Plánovače projektů](#)



FCDF

L-3834904

FC DIRECT (Basispaket)

Automatische Regelung der Lüfterdrehzahl, Kalenderfunktion, integrierter Temperaturfühler, Begrenzung der Austrittstemperatur.

Heizlüfter-Steuersystem FC DIRECT

Bestehend aus: Steuereinheit (FCCF), 5 m Kommunikationskabel (FCBC05).

350.00 /Stk

Scegliere tra quattro diversi pacchetti.



FCDF

L-3834904

FC DIRECT (Pacchetto base)

Regolazione automatica della velocità del ventilatore, funzione calendario, sonda di temperatura integrata, limitazione della temperatura di uscita.

Sistema di controllo per termoventilatori FC DIRECT
Composto da: unità di controllo (FCCF), 5 m di cavo di comunicazione (FCBC05).

350.00 /pz

Změnový list stavby

Název stavby: **Stavební úpravy MVK a TIC Vsetín**

SO a IO ve změně

Číslo změny stavby:

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: 0172/2024

Číslo smlouvy o dílo (SoD) zhotovitele: DZ 24015186

TIC

7

Objednatel: **Město Vsetín**

Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS,
Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění,
dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo
samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

4

Autorský dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Kanalizace 1.PP

Po odbourání podlah bylo zjištěno, že stávající potrubí 2 x DN50 je ucpané a nevyhovuje dimenzi odpadního potrubí. Dojde k výměně potrubí v místnosti 058,057 na vyhovující dimenzi DN110 KG.

Tato změna je zařazena dle Zákona o zadávání veřejných zakázek dle odst. 6 § 222, zák. č. 134/2016 Sb.

Dopad do termínu dokončení stavby: není

Údaje v Kč bez DPH:

Původní cena z SoD	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných změn celkem (MNP+VCP)
0,00 Kč	0,00 Kč	16 765,44 Kč	16 765,44 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Technický dozor

Ředitelka MVK Vsetín

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Objednatel

Zhotovitel

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Položkový rozpočet


S:	1	Stavební úpravy MVK a TIC
O:	1C	TIC
R:	ZL 07	Kanalizace 1PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				933,60
1	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,75000	1 244,80	933,60
		myčka : 0,35		0,35000		
		vpust' : 0,4		0,40000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 227,68
2	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,52000	4 284,00	2 227,68
Díl: 96		Bourání a podchycování konstrukcí				6 770,40
3	974042587R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 25x30 cm	m	6,50000	836,00	5 434,00
		myčka : 3		3,00000		
		vpust' : 3,5		3,50000		
4	974042589R00	Přípl.za dalších 10 cm š.rýhy hl.do 25 cm,	m	6,50000	205,60	1 336,40
		myčka : 3		3,00000		
		vpust' : 3,5		3,50000		
Díl: 997		Přesun sutě				1 732,16
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,43000	123,30	176,32
6	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	28,60000	6,90	197,34
7	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,43000	400,00	572,00
8	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	1,43000	550,00	786,50
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 101,60
9	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm	m	1,50000	620,80	931,20
		myčka : 1,5		1,50000		
10	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	6,50000	641,60	4 170,40
		myčka : 3		3,00000		
		vpust' : 3,5		3,50000		

Fotodokumentace



Fotodokumentace

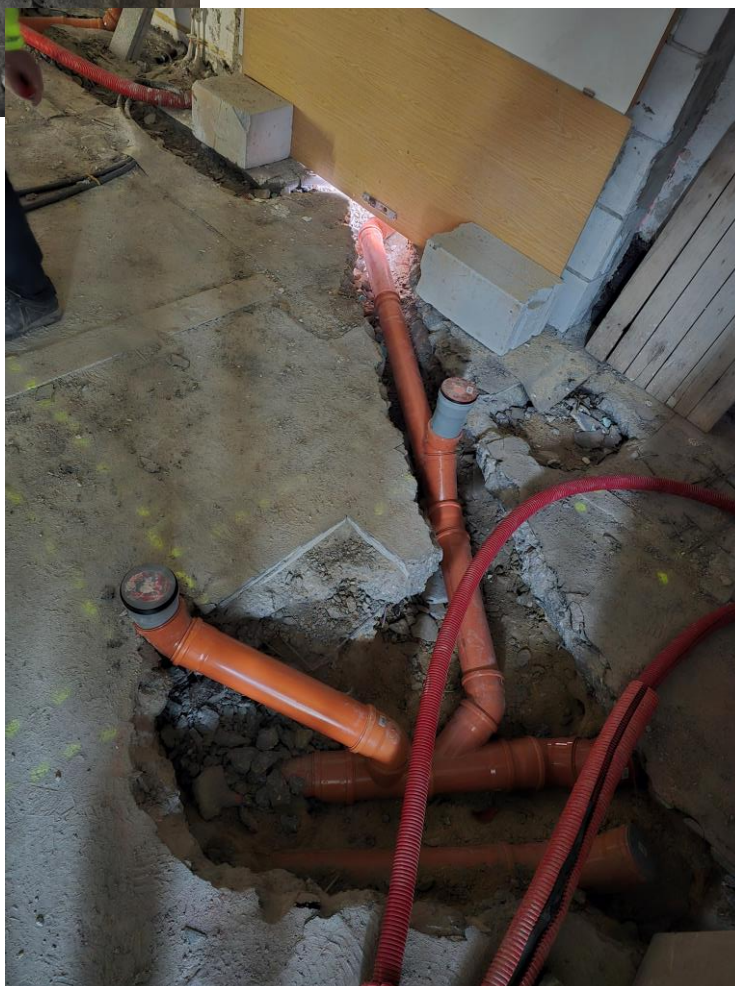

Změnový list stavby

Název stavby: **Stavební úpravy MVK a TIC Vsetín**

SO a IO ve změně

Číslo změny stavby:

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: 0172/2024

Číslo smlouvy o dílo (SoD) zhotovitele: DZ 24015186

TIC

8

Objednatel: **Město Vsetín**

Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS,
Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění,
dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo
samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

4

Autorský dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Dobetonávka podlahy

Po odstranění stávající podlahové krytiny a dřevotřískových desek, bylo vyhodnoceno, že stávající vyrovnávací podlahová konstrukce je zcela nevhodná pro plnění svého účelu. Z tohoto důvodu bylo nutné znova vybudovat vyrovnávací konstrukci pro budoucí skladbu podlahy.

Tato změna je zařazena dle Zákona o zadávání veřejných zakázek dle odst. 6 § 222, zák. č. 134/2016 Sb.

Dopad do termínu dokončení stavby: není

Údaje v Kč bez DPH:

Původní cena z SoD	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných změn celkem (MNP+VCP)
0,00 Kč	0,00 Kč	47 165,58 Kč	47 165,58 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Technický dozor

Ředitelka MVK Vsetín

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Objednatel

Zhotovitel

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Položkový rozpočet

S:	1	Stavební úpravy MVK a TIC
O:	1C	TIC
R:	ZL 08	Dobetonávka podlahy


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 078,13
1	310279842	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3	0,56250	7 250,00	4 078,13
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 767,04
2	631312621RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 z betonu prostého	m3	1,32000	4 216,00	5 565,12
		16,5*0,08		1,32000		
3	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,03636	33 056,00	1 201,92
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 337,20
4	762521812R00	Demontáž podlahové konstrukce z OSB desek	m2	16,80000	88,80	1 491,84
5	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	16,80000	12,80	215,04
6	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	0,40000	3 435,00	1 374,00
7	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	1,34400	1 020,00	1 370,88
8	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	16,80000	42,80	719,04
9	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	8,00000	20,80	166,40
Díl: 997		Přesun sutě				9 159,00
10	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,15500	550,00	2 835,25
11	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,15500	123,30	635,61
12	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	103,10000	6,90	711,39
13	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,65500	4 850,00	3 176,75
14	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,50000	400,00	1 800,00
Díl: 998		Přesun hmot				1 029,70
15	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	4,11879	250,00	1 029,70
Díl: 711		Izolace proti vodě				9 508,43
16	711141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	16,80000	417,60	7 015,68
17	711212000RV2	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty včetně dodávky ARDEX P 51	m2	18,48000	129,20	2 387,62
18	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,09578	1 097,60	105,13
Díl: 713		Izolace tepelné				11 286,08

Položkový rozpočet

S:	1	Stavební úpravy MVK a TIC
O:	1C	TIC
R:	ZL 08	Dobetonávka podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvé materiál ve specifikaci	m2	16,80000	76,32	1 282,18
20	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	16,80000	14,50	243,60
21	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	111,41240	1,30	144,84
22	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	18,48000	13,30	245,78
23	28375856R	Deska izolační EPS 150 , BACHL EXTRAPOR tl. 100 mm	m2	34,60000	270,80	9 369,68

Výstřižek z PD – řešená plocha vyšrafovaná červeně

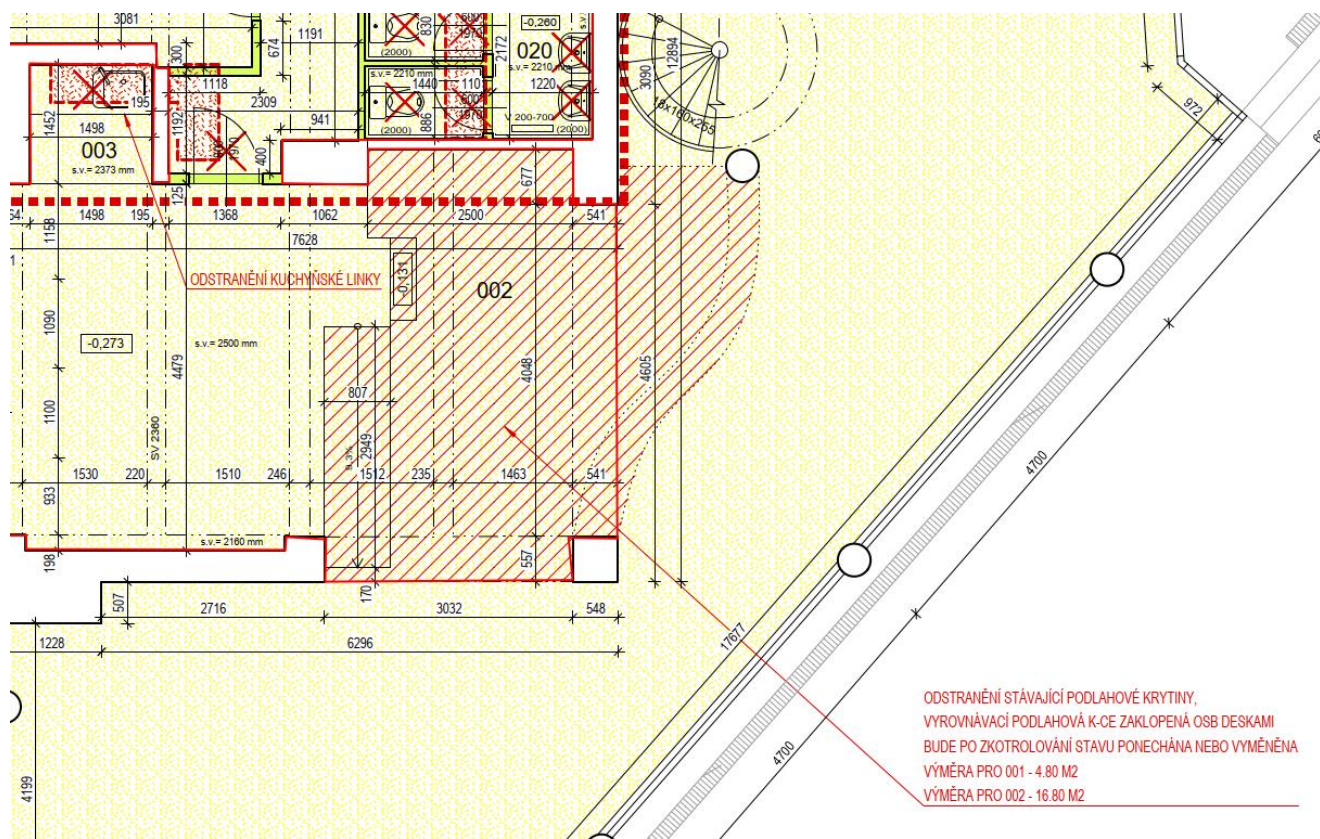

Změnový list stavby			
Název stavby: Stavební úpravy MVK a TIC Vsetín		SO a IO ve změně	Číslo změny stavby:
Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: 0172/2024 Číslo smlouvy o dílo (SoD) zhotovitele: DZ 24015186		TIC	9
Objednatel: Město Vsetín			
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			
Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4		1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4		2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]		3	Technický dozor
		4	Autorský dozor
Popis a zdůvodnění změny:			
Rozšíření profilů dveří			
Pohon stávajících posuvných dveří koliduje s novými úhlovými dveřmi O4 a O5, proto bylo nutné navrhnout rozšíření profilů dveří O4 a O5.			
Tato změna je zařazena dle Zákona o zadávání veřejných zakázek dle odst. 4 § 222, zák. č. 134/2016 Sb.			
Dopad do termínu dokončení stavby: má dopad, 78 dnů			
Údaje v Kč bez DPH:			
Původní cena z SoD	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných změn celkem (MNP+VCP)
0,00 Kč	0,00 Kč	38 381,25 Kč	38 381,25 Kč
Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:			
Autorský dozor			
Technický dozor			
Ředitelka MVK Vsetín			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.			
Objednatel			
Objednatel			
Zhotovitel			
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

Položkový rozpočet

S:	1	Stavební úpravy MVK a TIC
O:	1C	TIC
R:	ZL 09	Rozšíření profilů dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				38 381,25
1	767995101R00V1	Rozšíření profilů O4 a O5 viz příloha	kpl	1,00000	38 381,25	38 381,25

Stanovení ceny

Níže ocenění víceprací dodavatelem předmětných dveří – rozšíření profilů dveří

CENOVÁ NABÍDKA	
--	--

Definice: OSZ REAL s.r.o. se sídlem 130 00 Praha, Husitská 89/41 IČ : 27813509 DIČ: CZ27813509	Adresa: Metrostav a.s., Divize 1 Václavská 121, 619 00 Brno IČ: 00014915
---	--

Cenová nabídka č.: 240613-09-4_MVK_TIC_Vsetin_VÍCEPRÁCE AL POZ.04,05_19.12.2024

Dobrý den,

děkujeme za poptávku a dovoluujeme si předložit informativní cenovou nabídku naší společnosti.

V průběhu vzájemné komunikace uvádějte, prosím, celý kód této cenové nabídky.

Základní konstrukční specifikace:

- konstrukční systém: ALURON AS75 ROZŠIŘOVACÍ PROFIL P2503,P2504
- barva profiláže INTERIÉR/EXTERIÉR (mimo Al práh): Aluron RAL 9006 MAT

AL ROZŠIŘOVACÍ PROFIL 150mm

P2503 13bm (100mm)

14 850,-Kč

P2504 13bm (50mm)

6 725,-Kč

Práce dílna

2 300,-Kč

Práce na stavbě


7 900,-Kč

Doprava

1 600,-Kč

CENA CELKEM BEZ DPH

33 375,-Kč



Výpočet ceny MTS = 1,15 x 33 375 Kč = 38 381,25 Kč

Změnový list stavby

Název stavby: **Stavební úpravy MVK a TIC Vsetín**

SO a IO ve změně

Číslo změny stavby:

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: 0172/2024

Číslo smlouvy o dílo (SoD) zhotovitele: DZ 24015186

TIC

10

Objednatel: **Město Vsetín**

Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS,
Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění,
dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo
samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

4

Autorský dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Skryté táhlo stěny O4 a O5

Navrženou konstrukci sestavy O4 a O5 bylo nutno posílit skrytým táhlem, z důvodu osazení nové vzduchové clony.

Tato změna je zařazena dle Zákona o zadávání veřejných zakázek dle odst. 6 § 222, zák. č. 134/2016 Sb.

Dopad do termínu dokončení stavby: **má dopad, 78 dnů**

Údaje v Kč bez DPH:

Původní cena z SoD	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných změn celkem (MNP+VCP)
0,00 Kč	0,00 Kč	40 802,00 Kč	40 802,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

Technický dozor

Ředitelka MVK Vsetín

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

Objednatel

Zhotovitel

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Položkový rozpočet

S:	1	Stavební úpravy MVK a TIC
O:	1C	TIC
R:	ZL 10	Skryté táhlo pro stěny O4 a O5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				40 802,00
1	767995101R00V2	Skryté táhlo stěny O4 a O5 viz příloha	kpl	1,00000	40 802,00	40 802,00

Stanovení ceny

Níže ocenění víceprací dodavatelem předmětných dveří – skryté táhlo

CENOVÁ NABÍDKA **alupol** **aluron** HLINÍKOVÉ SYSTÉMY

Odesílatel:

OSZ REAL s.r.o.
se sídlem 130 00 Praha, Husitská 89/41

IČ : 27813509
DIČ: CZ27813509

Adresat:

Metrostav a.s., Divize 1

Vídeňská 121, 619 00 Brno
IČ: 00014915

Cenová nabídka č.: 240613-09-4_MVK_TIC_Vsetin_VÍCEPRÁCE Fe POZ.04,05_19.12.2024

Dobrý den,


děkujeme za poptávku a dovoluujeme si předložit informativní cenovou nabídku naší společnosti.

V průběhu vzájemné komunikace uvádějte, prosím, celý kód této cenové nabídky.

Základní konstrukční specifikace:

- konstrukční systém: PODPŮRNÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM
- barva profiláže : RAL 9006 MAT

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	13 500,-Kč
SPOJOVACÍ MATERIÁL	2 750,-Kč
VÝPALKY (spodní,dolní)	3 920,-Kč
KOSTKY FRÉZOVANÉ	1 400,-Kč
SVAŘENÍ(SESTAVENÍ + OBROUŠENÍ)	930,-Kč
MONTÁŽ(včetně ostatních prací)	12 980,-Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	35 480,-Kč



Výpočet ceny MTS = 1,15 x 35 480 Kč = 40 802,00 Kč

ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	KČČSZZŘLP Půlrok 2, 2024 LÚBDKČČ Půlrok 1, 2025 Půlrok 2																
1			Masarykova veřejná knihovna a TIC	432 dny	16.05. 24	21.07. 25																	
2			převzetí staveniště	1 den	16.05. 24	16.05. 24																	
3			zřízení zařízení staveniště	5 dny	17.05. 24	21.05. 24																	
4			Bourací práce	81 dny	22.05. 24	10.08. 24																	
15			SDK konstrukce	373 dny	23.06. 24	30.06. 25																	
55			Podlahy Hrubé	88 dny	23.01. 25	20.04. 25																	
62			Omítky	74 dny	30.07. 24	11.10. 24																	
66			Podlahy - nášlapy	45 dny	19.05. 25	02.07. 25																	
83			Teraco	122 dny	01.03. 25	30.06. 25																	
126			Technika prostředí	380 dny	30.06. 24	14.07. 25																	
161			Vnitřní příčky, Al okna	230 dny	12.10. 24	29.05. 25																	
167			Vnitřní dveře	44 dny	24.05. 25	06.07. 25																	
174			Výtah	256 dny	02.09. 24	15.05. 25																	
241			Venkovní úpravy schodiště	30 dny	16.05. 25	14.06. 25																	
242			Dělicí stěny	10 dny	01.07. 25	10.07. 25																	
243			výmalby	40 dny	04.05. 25	12.06. 25																	
244			Zábradlí	14 dny	26.06. 25	09.07. 25																	
245			úklidy	11 dny	07.07. 25	17.07. 25																	
246			oživení , zprovoznění, zkoušky	7 dny	15.07. 25	21.07. 25																	

Projekt: hmg - Vsetin dodatek č
Datum: 22.01. 25

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 1
