



NABÍDKA

číslo: WRX AMA 2025-075-A-Z1

Výkres: WRX AMA 2025-075-A-Z0

Zákazník	město Opava	Dne	21.03.2025
----------	-------------	-----	------------

Vážené dámy a pánové,

děkujeme vám za vaši poptávku. Váš zájem o naše výrobky nás potěšil. Následně jsme pro vás připravili a zasíláme vám detailní, nezávaznou nabídku s výčtem materiálu, cenou (dodávky, montáže a dopravy), dodací lhůtou a platebními podmínkami. Současně vám zasíláme v příloze půdorys kontejnerů, na jehož základě je naše nabídka vypracována.

V případě, že byste měli na nás dotazy, naši odborní pracovníci jsou vám k dispozici. Platnost naší nabídky je 14 dní.

S pozdravem

Antonín Fryč - jednatel společnosti

I. VÝČET MATERIÁLU

Množství 4

Pos.	Název položky	Jednotka	Množství na 1 ks kont.	Množství na zakázku
------	---------------	----------	------------------------	---------------------

1. KONTEJNEROVÝ RÁM

1.5	Samonosná ocelová konstrukce z válcovaných a svařovaných profilů, stohovatelnost do 3 vrstev (přízemí a 2 patra) se statickým výpočtem. Rohové sloupky šroubované k podlahovému a střešnímu dílu, zatížení sněhem/větreu/úžitné zatížení podlahy: 1,0 kNm-2/0,5 kNm-2/1.NP 3,0 kNm-2, 2.NP a 3.NP 2,5kNm-2, Rozměr cca: 6058x2438x2890	Kus	1	4
1.39	Barva rámu RAL 7035	Kontejner	1	4
1.42	Barva vnějších stěn RAL 7035	Kontejner	1	4

2. PODLAHA - PODLAHOVÁ KRYTINA

2.3	P1 izolace podlahy 60mm WLG 039	m2	15	60
2.21	cetris, tl. 22 mm, formát 1250x2435 mm	m2	15	60
2.40	PVC homogenní Tarkett, R9, barva 189	m2	16,5	66
2.64	Podlahová lišta SANI DÖLKEN HSL6 W222 grey	bm	22	88

3. STĚNY - STROP - STŘECHA

3.4	Izolace stropu: minerální vata (MW) podle EN 13162+A1:2015, třídy A1 podle EN 13501-1, nehořlavá, požární odolnost A1 podle EN 13501-1, certifikace Německým institutem stavebnictví (DIBt) - U = 0,39 W/(m2K), síla izolace 100 mm, tepelná prostupnost U = 0,362 W/m2K	m2	15	60
3.19	Laminátová dřevotříska 12 mm bílá	m2	15	60
3.35	Příčka vnitřní zateplená bez dveří, hranol 50 mm, izolace 60 mm, laminátová dřevotříska 12mm z obou stran	1 bm	2,2	8,8
3.36	Laminátová dřevotříska 12 mm bílá - příčka	m2	5,5	22
3.46	Výměnný panel, Izolace: minerální vata (MW) podle EN 13162+A1:2015, třídy A1 podle EN 13501-1, nehořlavá, požární odolnost A1 podle EN 13501-1, certifikace Německým institutem stavebnictví (DIBt) - U = 0,39 W/(m2K), síla izolace stěna 60mm, tepelná prostupnost U= 0,694 W/m2K. Stěny: 14 ks výměnných panelů (11 ks plných, 2 ks okenních, 1 ks dveřní). Všechny panely šíře 1125 mm, laminátová dřevotříska 12 mm bílá	panel	14	56
3.67	Fasádní plech na panely	kus	14	56
3.87	Otvor v boční stěně pro průchod potrubí, kabelů do prům. 100mm	Kus	1	4

4. DVEŘE

4.66	ZK 1-dveřní element s rohovou zárubní lakované, Hörmann, 875x2000 mm, Levé	Kus	1	4
4.67	ZK 1-dveřní element s rohovou zárubní lakované, Hörmann, 875x2000 mm, Pravé	Kus	1	4
4.95		0	0	2
4.206	Hydraulický zavírač dveří jako brano	Kus	2	8

5.OKNA



NABÍDKA

číslo: WRX AMA 2025-075-A-Z1

Výkres: WRX AMA 2025-075-A-Z0

Zákazník	město Opava	Dne		21.03.2025
5.2	Okno plastové 600x600, Sklopné, s límcem, ornament	Kus	2	8

6. ROLETY

7. ELEKTRO

7.6	ELEKTRO rozvaděč s krytím	Sada	1	4
7.55	Vypínač Berker bílý	Kus	2	8
7.82	Zásuvka Berker 230 V	Kus	2	8
7.106	Zástrčka 400 V	kus	1	4
7.107	Zásuvka 400 V	kus	1	4

8. TOPENÍ

8.8	Konvektor nástěnný 1000 W	Kus	2	8
-----	---------------------------	-----	---	---

9. OSVĚTLENÍ

9.21	MODUS KX 5000, 1210mm, LED, IP54	Kus	2	8
------	----------------------------------	-----	---	---

10. SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

10.4	Rozvod vody a odpadu, včetně reg. vent. a uzávěru	Komplet	1	4
10.13	Podlahová vpust' úhlová s možností napojení na kanalizaci	kus	2	8
10.18	Umyvadlo LYRA 40 cm	Kus	2	8
10.29	Páková vodovodní stojánková umyvadlová baterie k průtokovému ohřívači GL 8901	Kus	2	8
10.42	Zrcadlo 400 x 600 mm	kus	2	8
10.47	WC kabina WAREX, lamino, dveře 600x1970, zámek WC, vyráběné nožky, rozdílná barva zinku pantu	kus	2,5	10
10.53	WC mísa Cersanit	Kus	3	12
10.61	Držák toaletního papíru	kus	3	12
10.65	Pisoár Geberit Felix	Kus	3	12
10.66	Pisoárový tlakový splachovač chrom	Kus	3	12
10.68	Přepážka mezi pisoáry	Kus	2	8
10.72	Věšák háček malý UNIX (UN 13054S-26)	kus	2	8

11. BOJLERY

11.2	Malý ohřívač vody bojler 5 litrů Stiebel Eltron snu 5sli	kus	2	8
------	--	-----	---	---

12. ZAŘÍZENÍ

12.6	demontáž	ks	1	4
12.7	montáž + likvidace	ks	1	4

13. OSTATNÍ

13.7	Mříže pro okno 600 x 600 mm. Žárově zinkované	kus	2	8
13.60	Lapače listů na střeše	bm	5	20

14. SPOJOVACÍ MATERIÁL

14.9	Vyrovňovací ocelové plechy, pozinkované	kontejner	1	4
------	---	-----------	---	---

15. ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ

16. KONTEJNERY ZE SKLADU HOTOVÝCH VÝROBKŮ A MAJETKU SPOLEČ

17. SUBDODÁVKY

18. VÝKONY OBJEDNATELE (NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY)

18.1	Zajištění dostatečného a volného příjezdu na staveniště pro dlouhé nákladních soupravy a možnosti vykládky kontejnerů.
18.2	Jeřáb ke složení kontejnerových modulů, schodiště, podesty, přístřešky, lešení, plošina.
18.3	Příprava staveniště, oplocení staveniště, staveništní WC, silniční uzavírky a další povolení.
18.4	Stavební přípojka elektřiny po dobu montáže včetně nákladů, kontejner na stavební odpad a náklady na jeho likvidaci.
18.5	Stavební povolení a vyřízení všech úředních povolení.
18.6	Zemní a výkopové práce a výstavba základů pro kontejnerové sestavy, základová statika, v případě podepsání SoD bude zhotovitel



NABÍDKA

číslo: WRX AMA 2025-075-A-Z1

Výkres: WRX AMA 2025-075-A-Z0

Zákazník	město Opava	Dne	21.03.2025
18.7	Síťové a veškeré ostatní přípojky inženýrských sítí (elektřina, voda, kanalizace).		
18.8	Stavební průzkum.		
18.9	Výkony projektové přípravy a schválení projektové dokumentace.		
18.10	Vypracování projektu požární ochrany.		
18.11	Vypracování projektu vytápění a zdravotní techniky.		
18.12	Čištění venkovních stěn a fasády kontejnerů od nečistot ze silniční dopravy.		
18.13	Veškeré terénní a úklidové práce v okolí předmětu SoD.		
18.14	Prvotní ošetření podlahových krytin, závěrečný úklid.		
18.15	Mobiliář, telefonní a technická koncová zařízení, kuchyňská a ostatní vybavení.		
18.16	Požární hlásiče, detektory kouře a plynu, hasicí přístroje, hydrant.		
18.17	Slaboproud, EZS		
18.18	Instalace hromosvodu.		
18.19	Elektrická zařízení – uvedení do provozu a vyhotovení revize elektrických rozvodů budovy.		
18.20	Údržba topení, klimatizace a ostatních zařízení.		
18.21	Zaškolení personálu k použití a údržbě různých měřicích a ostatních zařízení (např. měření interiérové vzdušné vlhkosti, promývání a dezinfekce instalací na pitnou vodu, apod.).		

SOUČET ZA ZAKÁZKU	4	285 309 Kč	1 141 237 Kč
Montáž bez jeřábu v místě montáže	Lípová 105/2, Opava		0 Kč
Doprava z Javorníku do	Lípová 105/2, Opava		0 Kč
CELKEM bez DPH			1 141 237 Kč
Dodací lhůta	30.06.2025		
Platební podmínky	Splatnost 30 dní od předání díla		

V souladu s ustanoveními § 2154 až 2156 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, informujeme odběratele, že změní-li se od uzavření Kupní smlouvy, Smlouvy o dílo nebo Potvrzení zakázky (objednávky) do doby dodání ceny některých výrobních nákladů a tím dojde k celkovému navýšení ceny zakázky o více než 5%, bude kupní cena upravena s přihlédnutím k této skutečnosti o daný cenový rozdíl. Prodávající je povinen předložit kupujícímu cenový rozbor s odůvodněním změny kupní ceny.



NABÍDKA

číslo: WRX AMA 2025-075-B-Z1

Výkres: WRX AMA 2025-075-B-Z0

Zákazník	město Opava	Dne	21.03.2025
----------	-------------	-----	------------

Vážené dámy a pánové,

děkujeme vám za vaši poptávku. Váš zájem o naše výrobky nás potěšil. Následně jsme pro vás připravili a zasíláme vám detailní, nezávaznou nabídku s výčtem materiálu, cenou (dodávky, montáže a dopravy), dodací lhůtou a platebními podmínkami. Současně vám zasíláme v příloze půdorys kontejnerů, na jehož základě je naše nabídka vypracována.

V případě, že byste měli na nás dotazy, naši odborní pracovníci jsou vám k dispozici. Platnost naší nabídky je 14 dní.

S pozdravem

Antonín Fryč - jednatel společnosti

I. VÝČET MATERIÁLU		Množství		1
Pos.	Název položky	Jednotka	Množství na 1 ks kont.	Množství na zakázku

1. KONTEJNEROVÝ RÁM

1.5	Samonosná ocelová konstrukce z válcovaných a svařovaných profilů, stohovatelnost do 3 vrstev (přízemí a 2 patra) se statickým výpočtem. Rohové sloupky šroubované k podlahovému a střešnímu dílu, zatížení sněhem/větreu/užitné zatížení podlahy: 1,0 kNm-2/0,5 kNm-2/1.NP 3,0 kNm-2, 2.NP a 3.NP 2,5kNm-2, Rozměr cca: 6058x2438x2890	Kus	1	1
1.32	Vnitřní výška	mm	2500	2500
1.39	Barva rámu RAL 7035	Kontejner	1	1
1.42	Barva vnějších stěn RAL 7035	Kontejner	1	1

2. PODLAHA - PODLAHOVÁ KRYTINA

2.3	Izolace podlahy: minerální vata (MW) podle EN 13162+A1:2015, třídy A1 podle EN 13501-1, nehořlavá, požární odolnost A1 podle EN 13501-1, certifikace Německým institutem stavebnictví (DIBt) - U = 0,39 W/(m2K), síla Izolace podlahy	m2	7,5	7,5
2.21	cetris, tl. 22 mm, formát 1250x2435 mm	m2	7,5	7,5
2.40	PVC homogenní Tarkett, R9, barva 189	m2	8,25	8,25
2.64	Podlahová lišta SANI DÖLKEN HSL6 W222 grey	bm	11	11

3. STĚNY - STROP - STŘECHA

3.4	Izolace stropu: minerální vata (MW) podle EN 13162+A1:2015, třídy A1 podle EN 13501-1, nehořlavá, požární odolnost A1 podle EN 13501-1, certifikace Německým institutem stavebnictví (DIBt) - U = 0,39 W/(m2K), síla izolace 100 mm, tepelná prostupnost U = 0,362 W/m2K	m2	7,5	7,5
3.19	Laminátová dřevotřísková 12 mm bílá	m2	7,5	7,5
3.46	Výměnný panel, Izolace: minerální vata (MW) podle EN 13162+A1:2015, třídy A1 podle EN 13501-1, nehořlavá, požární odolnost A1 podle EN 13501-1, certifikace Německým institutem stavebnictví (DIBt) - U = 0,39 W/(m2K), síla izolace stěna 60mm, tepelná prostupnost U= 0,694 W/m2K. Stěny: 14 ks výměnných panelů (11 ks plných, 2 ks okenních, 1 ks dveřní). Všechny panely šíře 1125 mm, laminátová dřevotřísková 12 mm bílá	panel	10	10
3.67	Fasádní plech na panely	kus	10	10
3.87	Otvor v boční stěně pro průchod potrubí, kabelů do prům. 100mm	Kus	1	1
3.112	Lamino 12 mm předstěna	m2	1,2	1,2
3.114	Parapet na předstěnu	m	1	1

4. DVEŘE

4.68	ZK 1-dveřní element s rohovou zárubní lakované, Hörmann, 1000x2000 mm, Levé	Kus	1	1
4.95		0	0	1
4.206	Hydraulický zavírač dveří jako brano	Kus	1	1



NABÍDKA

číslo: WRX AMA 2025-075-B-Z1

Výkres: WRX AMA 2025-075-B-Z0

Zákazník	město Opava	Dne	21.03.2025
----------	-------------	-----	------------

5.OKNA

5.2	Okno plastové 600x600,Sklopné,s límcem,ornament	Kus	1	1
-----	---	-----	---	---

6.ROLETY

7.ELEKTRO

7.5	ELEKTRO rozvaděč s krytím	Sada	1	1
7.120	Tlačítko SOS systém, propoj na venkovní světlo a sirénu, C-TEC	sada	1	1
7.55	Vypínač Berker bílý	Kus	1	1
7.106	Zástrčka 400 V	kus	1	1
7.107	Zásuvka 400 V	kus	1	1

8.TOPENÍ

8.8	Konvektor nástěnný 1000 W	Kus	1	1
-----	---------------------------	-----	---	---

9.OSVĚTLENÍ

9.21	MODUS KX 5000, 1210mm, LED, IP54	Kus	1	1
------	----------------------------------	-----	---	---

10.SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

10.2	Rozvod vody a odpadu, včetně reg. vent. a uzávěru	Komplet	1	1
10.13	Podlahová vpust' úhlová s možností napojení na kanalizaci	kus	1	1
10.72	Věšák háček malý UNIX (UN 13054S-26)	kus	1	1
10.84	Keramické stojící WC kombi invalidní R bílé, Cersanit ETIUDA	Kus	1	1
10.93	Fixní madlo k WC míse a umývadlu pro tělesně postižené 60 cm, spoj. mat.	sada	1	1
10.94		0	0	1
10.95	Madlo sklopné dvojité U 813mm bílé (301102084) (XH517)	kus	1	1
10.96	Madlo - Podpěrné madlo ve tvaru U, 813 mm, bílé, bez krytky 301102064 HELP	kus	1	1
10.98	Umývadlo, kryt sifonu, baterie - pro tělesně postižené spoj. mat.	sada	1	1
10.99	Umývadlová baterie stojánková pro invalidy	Kus	1	1
10.100	Naklápěcí zrcadlo pro tělesně postižené 60x40 cm	Kus	1	1

11.BOJLERY

11.2	Malý ohřívač vody bojler 5 litrů Stiebel Eltron snu 5sli	kus	1	1
------	--	-----	---	---

12.ZAŘÍZENÍ

13.OSTATNÍ

13.7	Mříže pro okno 600 x 600 mm. Žárově zinkované	kus	1	1
13.60	Lapače listů na střeše	bm	5	5

14.SPOJOVACÍ MATERIÁL

14.9	Vyrovňovací ocelové plechy, pozinkované	kontejner	1	1
------	---	-----------	---	---

15.ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ

16.KONTEJNERY ZE SKLADU HOTOVÝCH VÝROBKŮ A MAJETKU SPOLEČ

17.SUBDODÁVKY

17.1	Nutné zajistit zákazníkem vysokozdvizný vozík na 5 tun	kus	1	1
------	--	-----	---	---

18. VÝKONY OBJEDNATELE (NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY)

18.1	Zajištění dostatečného a volného příjezdu na staveniště pro dlouhé nákladních soupravy a možnosti vykládky kontejnerů.
18.2	Jeřáb ke složení kontejnerových modulů, schodiště, podesty, přístřešky, lešení, plošina.
18.3	Příprava staveniště, oplocení staveniště, staveništní WC, silniční uzavírky a další povolení.
18.4	Stavební přípojka elektřiny po dobu montáže včetně nákladů, kontejner na stavební odpad a náklady na jeho likvidaci.
18.5	Stavební povolení a vyřízení všech úředních povolení.
18.6	Zemní a výkopové práce a výstavba základů pro kontejnerové sestavy, základová statika, v případě podepsání SoD bude zhotovitel
18.7	Síťové a veškeré ostatní přípojky inženýrských sítí (elektřina, voda, kanalizace).
18.8	Stavební průzkum.



NABÍDKA

číslo: WRX AMA 2025-075-B-Z1

Výkres: WRX AMA 2025-075-B-Z0

Zákazník	město Opava	Dne	21.03.2025
18.9	Výkony projektové přípravy a schválení projektové dokumentace.		
18.10	Vypracování projektu požární ochrany.		
18.11	Vypracování projektu vytápění a zdravotní techniky.		
18.12	Čištění venkovních stěn a fasády kontejnerů od nečistot ze silniční dopravy.		
18.13	Veškeré terénní a úklidové práce v okolí předmětu SoD.		
18.14	Prvotní ošetření podlahových krytin, závěrečný úklid.		
18.15	Mobiliář, telefonní a technická koncová zařízení, kuchyňská a ostatní vybavení.		
18.16	Požární hlásiče, detektory kouře a plynu, hasicí přístroje, hydrant.		
18.17	Slaboproud, EZS		
18.18	Instalace hromosvodu.		
18.19	Elektrická zařízení – uvedení do provozu a vyhotovení revize elektrických rozvodů budovy.		
18.20	Údržba topení, klimatizace a ostatních zařízení.		
18.21	Zaškolení personálu k použití a údržbě různých měřicích a ostatních zařízení (např. měření interiérové vzdušné vlhkosti, promývání a dezinfekce instalací na pitnou vodu, apod.).		
SOUČET ZA ZAKÁZKU		1	179 206 Kč
Montáž bez jeřábu v místě montáže		Lípová 105/2, Opava	0 Kč
Doprava z Javorníku do		Lípová 105/2, Opava	0 Kč
CELKEM bez DPH			179 206 Kč
Dodací lhůta		30.06.2025	
Platební podmínky		Splatnost 30 dní od předání díla	

V souladu s ustanoveními § 2154 až 2156 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, informujeme odběratele, že změní-li se od uzavření Kupní smlouvy, Smlouvy o dílo nebo Potvrzení zakázky (objednávky) do doby dodání ceny některých výrobních nákladů a tím dojde k celkovému navýšení ceny zakázky o více než 5%, bude kupní cena upravena s přihlédnutím k této skutečnosti o daný cenový rozdíl. Prodávající je povinen předložit kupujícímu cenový rozbor s odůvodněním změny kupní ceny.



NABÍDKA

číslo: WRX AMA 2025-075-C-Z1

Výkres: WRX AMA 2025-075-C-Z1

Zákazník	město Opava	Dne	21.03.2025
----------	-------------	-----	------------

Vážené dámy a pánové,

děkujeme vám za vaši poptávku. Váš zájem o naše výrobky nás potěšil. Následně jsme pro vás připravili a zasíláme vám detailní, nezávaznou nabídku s výčtem materiálu, cenou (dodávky, montáže a dopravy), dodací lhůtou a platebními podmínkami. Současně vám zasíláme v příloze půdorys kontejnerů, na jehož základě je naše nabídka vypracována.

V případě, že byste měli na nás dotazy, naši odborní pracovníci jsou vám k dispozici. Platnost naší nabídky je 14 dní.

S pozdravem

Antonín Fryč - jednatel společnosti

I. VÝČET MATERIÁLU

Množství

1

Pos.	Název položky	Jednotka	Množství na 1 ks kont.	Množství na zakázku
------	---------------	----------	------------------------	---------------------

1. KONTEJNEROVÝ RÁM

1.39	Barva rámu RAL 7035	Kontejner	1	1
1.42	Barva vnějších stěn RAL 7035	Kontejner	1	1

2. PODLAHA - PODLAHOVÁ KRYTINA

2.3	Izolace podlahy: minerální vata (MW) podle EN 13162+A1:2015, třídy A1 podle EN 13501-1, nehořlavá, požární odolnost A1 podle EN 13501-1, certifikace Německým institutem stavebnictví (DIBt) - U = 0,39 W/(m2K), síla izolace podlahy 100 mm, tepelná prostupnost U = 0,335 W/m2K.	m2	15	15
2.18	OSB 3-3,125 m2, 22/2500x1250	m2	15	15
2.40	PVC homogenní Tarkett, R9, barva 189	m2	16,5	16,5
2.64	Podlahová lišta SANI DÖLKEN HSL6 W222 grey	bm	17	17

3. STĚNY - STROP - STŘECHA

3.4	Izolace stropu: minerální vata (MW) podle EN 13162+A1:2015, třídy A1 podle EN 13501-1, nehořlavá, požární odolnost A1 podle EN 13501-1, certifikace Německým institutem stavebnictví (DIBt) - U = 0,39 W/(m2K), síla izolace 100 mm, tepelná prostupnost U = 0,362 W/m2K	m2	15	15
3.19	Laminátová dřevotříska 12 mm bílá	m2	15	15
3.86	PUR panel 60	panel	14	14

4. DVEŘE

4.66	ZK 1-dveřní element s rohovou zárubní lakované, Hörmann, 875x2000 mm, Levé	Kus	1	1
4.208	Hydraulický zavírač dveří jako brano	Kus	1	1

5. OKNA

5.8	okno plastové 865x1115, pravé OS s línem bez rolety	Kus	3	3
-----	---	-----	---	---

6. ROLETY

7. ELEKTRO

7.3	ELEKTRO rozvaděč	Sada	1	1
7.55	Vypínač Berker bílý	Kus	1	1
7.83	Zásuvka Berker 230 V	Kus	1	1
7.87	Dvojjzásuvka 220 V	Kus	1	1
7.109	Zástrčka 400 V	kus	1	1
7.110	Zásuvka 400 V	kus	1	1

8. TOPENÍ

8.9	Konvektor nástěnný 2000 W	Kus	1	1
-----	---------------------------	-----	---	---

9. OSVĚTLENÍ



NABÍDKA

číslo: WRX AMA 2025-075-C-Z1

Výkres: WRX AMA 2025-075-C-Z1

Zákazník	město Opava	Dne		21.03.2025
9.17	LED panel 1200x30 mm 40 W	Kus	2	2

10.SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

11.BOJLERY

12.ZAŘÍZENÍ

13.OSTATNÍ

13.3	Mříže pro okno 985 x 1115 mm. Lakované	kus	3	3
13.60	Lapače listů na střeše	bm	5	5

14. SPOJOVACÍ MATERIÁL

15.ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ

16.KONTEJNERY ZE SKLADU HOTOVÝCH VÝROBKŮ A MAJETKU SPOLEČ

17.SUBDODÁVKY

18. VÝKONY OBJEDNATELE (NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY)

18.1	Zajištění dostatečného a volného příjezdu na staveniště pro dlouhé nákladních soupravy a možnosti vykládky kontejnerů.
18.2	Jeřáb ke složení kontejnerových modulů, schodiště, podesty, přístřešky, lešení, plošina.
18.3	Příprava staveniště, oplocení staveniště, staveništní WC, silniční uzavírky a další povolení.
18.4	Stavební přípojka elektřiny po dobu montáže včetně nákladů, kontejner na stavební odpad a náklady na jeho likvidaci.
18.5	Stavební povolení a vyřízení všech úředních povolení.
18.6	Zemní a výkopové práce a výstavba základů pro kontejnerové sestavy, základová statika, v případě podepsání SoD bude zhotovitelem
18.7	Síťové a veškeré ostatní přípojky inženýrských sítí (elektřina, voda, kanalizace).
18.8	Stavební průzkum.
18.9	Výkony projektové přípravy a schválení projektové dokumentace.
18.10	Vypracování projektu požární ochrany.
18.11	Vypracování projektu vytápění a zdravotní techniky.
18.12	Čištění venkovních stěn a fasády kontejnerů od nečistot ze silniční dopravy.
18.13	Veškeré terénní a úklidové práce v okolí předmětu SoD.
18.14	Prvotní ošetření podlahových krytin, závěrečný úklid.
18.15	Mobiliář, telefonní a technická koncová zařízení, kuchyňská a ostatní vybavení.
18.16	Požární hlásiče, detektory kouře a plynu, hasící přístroje, hydrant.
18.17	Slaboproud, EZS
18.18	Instalace hromosvodu.
18.19	Elektrická zařízení – uvedení do provozu a vyhotovení revize elektrických rozvodů budovy.
18.20	Údržba topení, klimatizace a ostatních zařízení.
18.21	Zaškolení personálu k použití a údržbě různých měřicích a ostatních zařízení (např. měření interiérové vzdušné vlhkosti, promývání a dezinfekce instalací na pitnou vodu, apod.).

SOUČET ZA ZAKÁZKU	1	140 767 Kč	140 767 Kč
Demontáž, montáž, likvidace, doprava	Lípová 105/2, Opava		77 900 Kč
Doprava z Javorníku do	Lípová 105/2, Opava		0 Kč

CELKEM bez DPH	218 667 Kč		
Dodací lhůta	30.06.2025		
Platební podmínky	Splatnost 30 dní od předání díla		

V souladu s ustanoveními § 2154 až 2156 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, informujeme odběratele, že změní-li se od uzavření Kupní smlouvy, Smlouvy o dílo nebo Potvrzení zakázky (objednávky) do doby dodání ceny některých výrobních nákladů a tím dojde k celkovému navýšení ceny zakázky o více než 5%, bude kupní cena upravena s přihlédnutím k této skutečnosti o daný cenový rozdíl. Prodávající je povinen předložit kupujícímu cenový rozbor s odůvodněním změny kupní ceny.



WAREX
...systém prostoru


NABÍDKA

číslo: WRX AMA 2025-075-C-Z1


Výkres: WRX AMA 2025-075-C-Z1

Zákazník	město Opava	Dne	21.03.2025
----------	-------------	-----	------------


WAREX
...systém prostoru

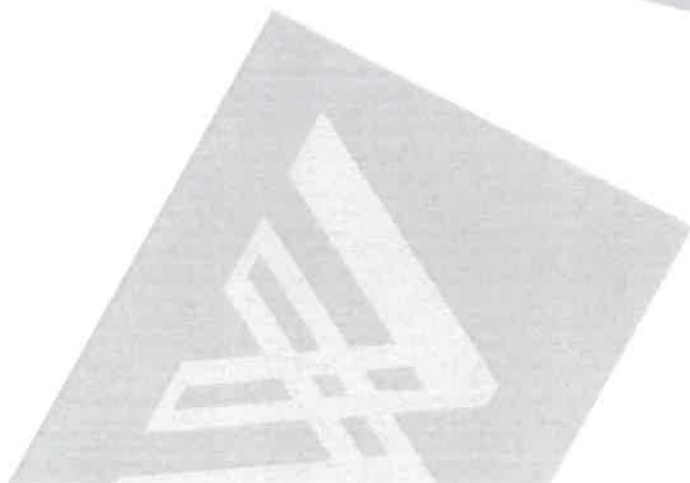

2438
2142
3058
3762
2800
2500
7035

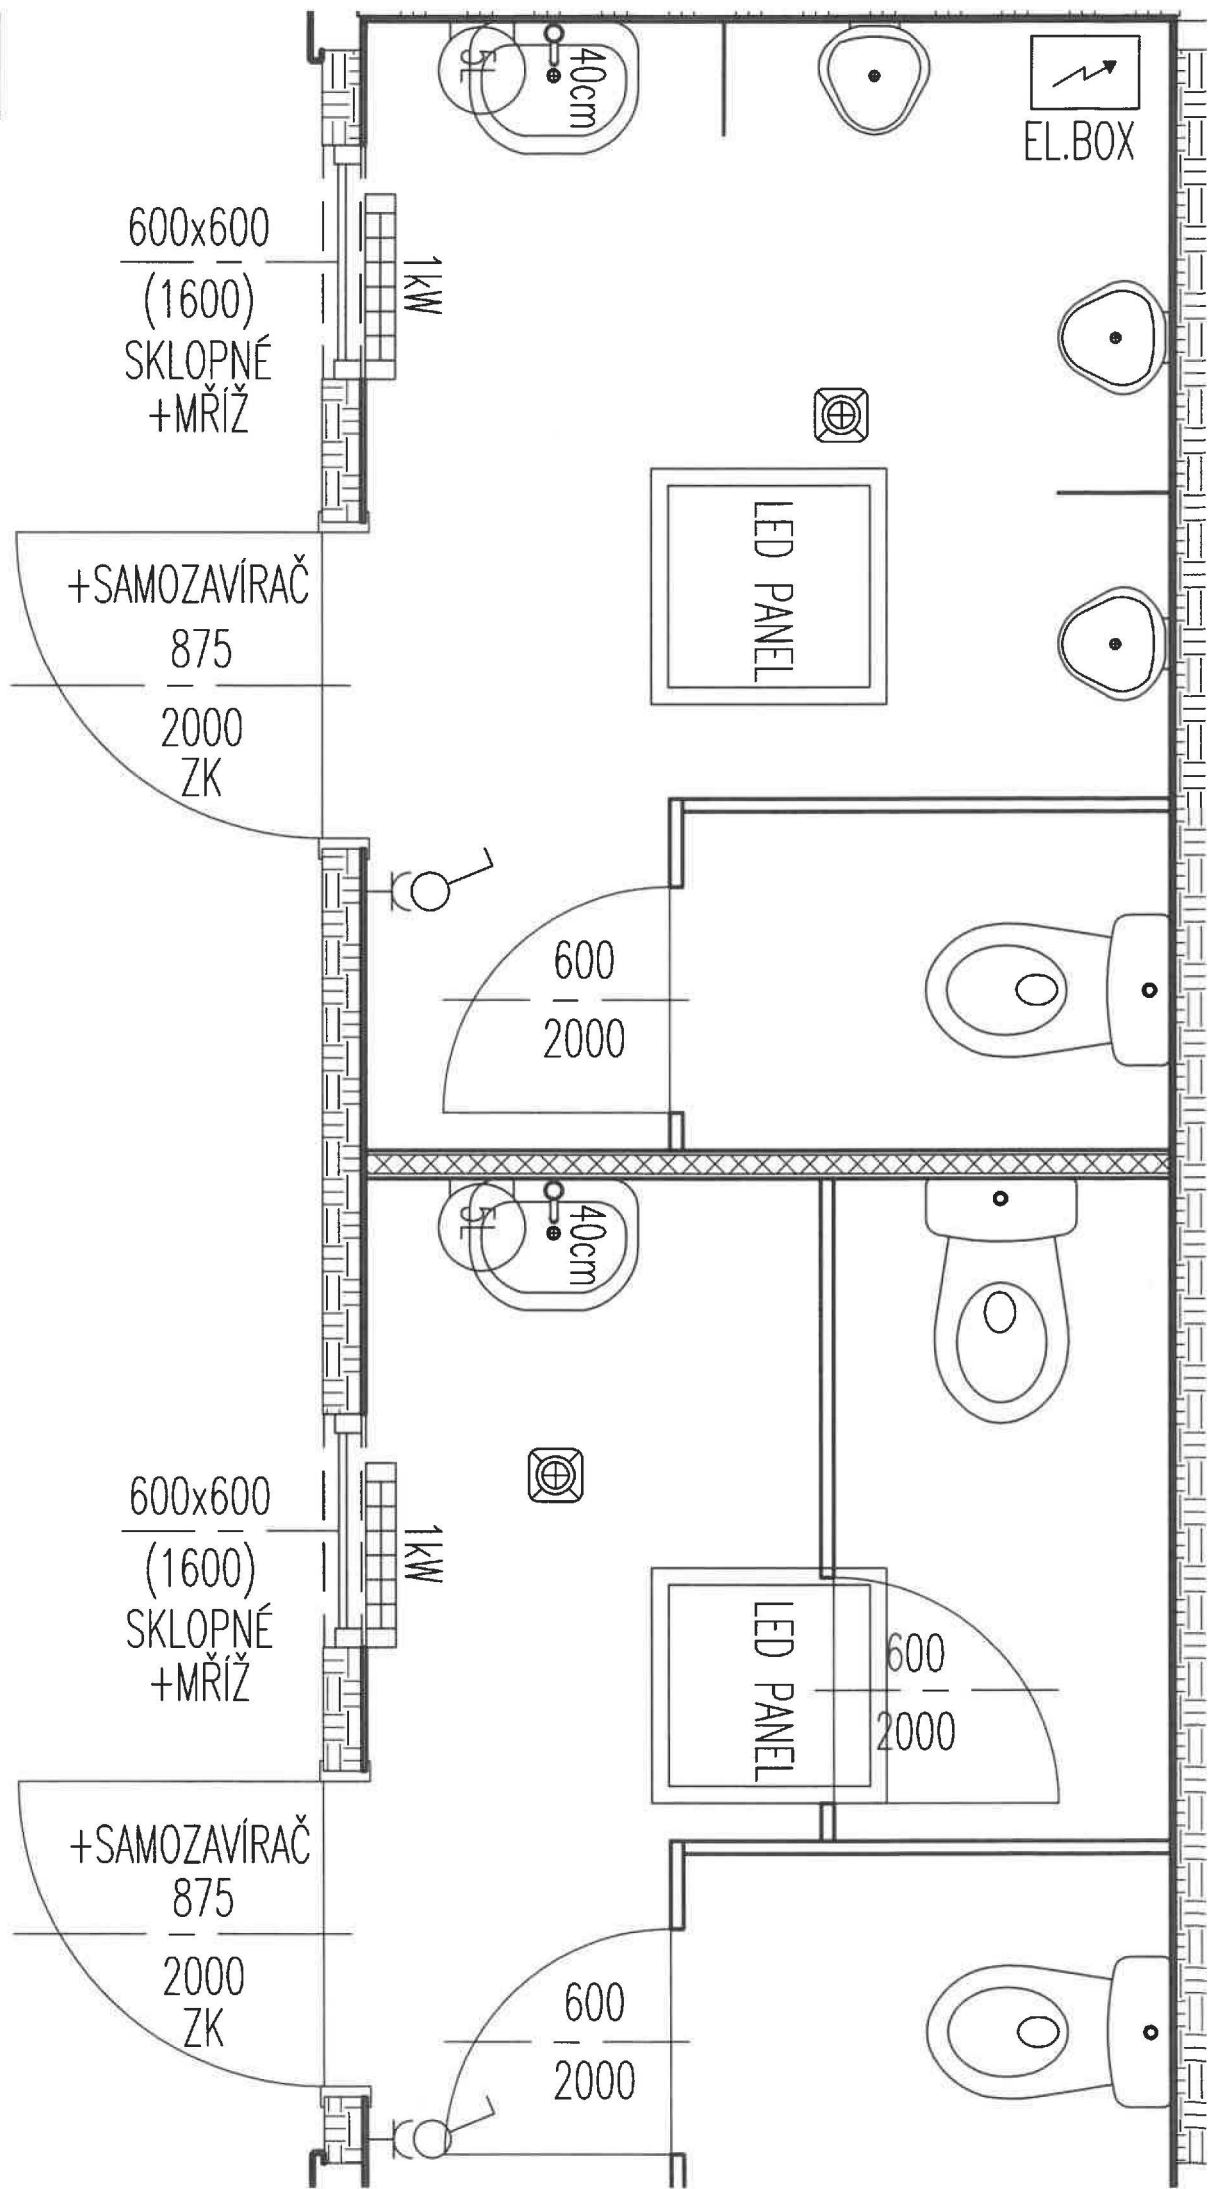

2438
2142
2990
2694
2800
2500
- 7035

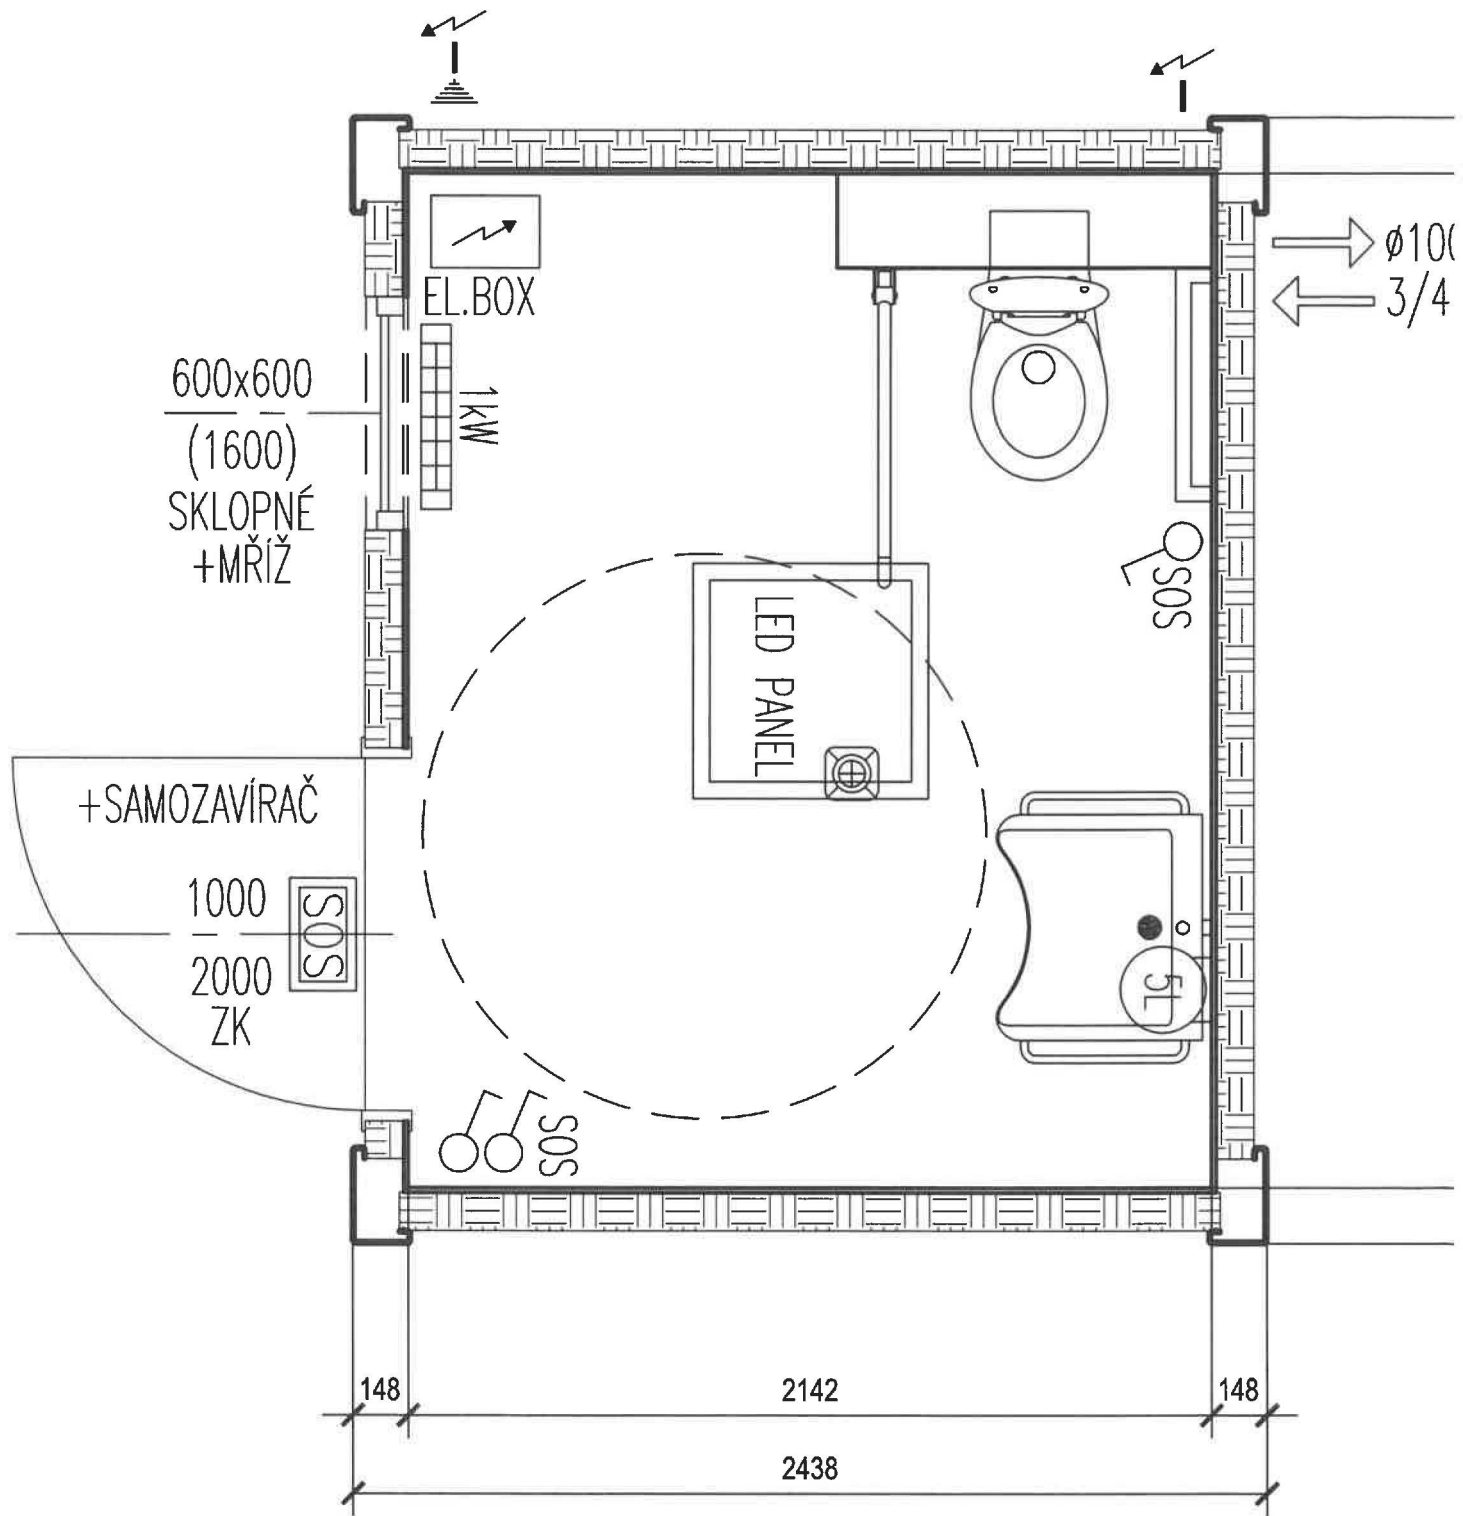

2438
2246
2058
1866
1680
1500
1335

865x1115
(830)
0/S

LED 1200x300-40W

865x1115
(830)
0/S

LED 1200x300-40W

865x1115
(830)
0/S

875
2000
ZK
+SAMOZAV

2kW

EL.BOX
