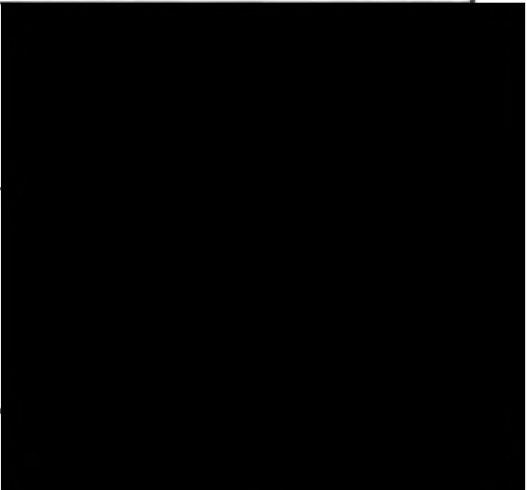


ZMĚNOVÝ LIST		B04
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny:	Z důvodu dočasné změny ve využití místnosti přípravný ve 2. NP objektu SO 01 – přístavba, která byla dočasně upravena na kuchyni, vznikla potřeba doplnění digestoře nad multifunkční pánev a konvektomat. Instalace je nutná k zajištění odsávání par a splnění hygienických požadavků při provozu této dočasné kuchyně.	
Technický popis:	Dodávka a montáž digestoře včetně dodávky a montáže odtahového potrubí vzduchotechniky. Digestoř je umístěna nad multifunkční pánví a konvektomatem a je vybavena vlastním osvětlovacím tělesem a tukovým filtrem.	
Přílohy:	Rozpočet změny	
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		89 376,12
Rozdíl:		89 376,12
Vliv na dopracování PD:	Bez požadavku na doplnění DPS.	
Vliv na termín výstavby:	Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.	
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		

**MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s
výtahem**

ZL č.

B04

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
--------	-----	-------------	------	----------	--------	--------

1. Přípočty

Díl	751	Vzduchotechnika				
1	751122052	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního D přes 100 do 200 mm	kus	1,000		URS
2	RMAT001	CAB 250 B IP44 zvukově izolovaný potrubní ventilátor	kus	1,000		Cena obvyklá
3	1213127	REGULATOR OTACEK POD OMITKU REB-2.5 N E	kus	1,000		URS
4	751122053	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního D přes 200 do 300 mm	kus	1,000		URS
5	751377042	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového závěsného přes 1,5 do 2,5 m2	kus	1,000		URS
6	DIG_1	Závěsná digestoř 2000x1200x450, s jednou řadou tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukových lamelových filtrů, vyústění D 200mm a odtokového žlábků s výpustným ventilem, LED osvětlení	ks	1,000		Cena obvyklá
7	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000		URS
8	42981312	Klapka kruhová regulační Pz D 200mm	kus	1,000		URS
9	751537012	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm	m	8,000		URS
10	42981626	hadice neizolovaná z Al-polyestru vyztužená drátem D 180mm, l=10m	kus	0,960		URS
11	1.112	0,8*1,2 Přepočtené koeficientem množství		0,960		
12	1.121	OSTATNÍ - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	20,000		SoD
13	1.122	OSTATNÍ - Zprovoznění a zkoušky zařízení	hod	6,000		SoD
14	1.123	OSTATNÍ - Vnitrostaveništní přemístění	t	0,200		SoD
15	1.124	OSTATNÍ - Drobné stavební úpravy	hod	2,000		SoD
15	1.124	OSTATNÍ - Prostupy	ks	1,000		SoD

2. VRN

Díl	VN	Vedlejší náklady				
16	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%		SoD
17	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%		SoD
18	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%		SoD
19	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%		SoD
20	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,001%		SoD
21	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
22	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
23	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
24	Pol34	Koordináční činnost	%	4,690%		SoD

Celkem Kč bez DPH

89 376,12

ZMĚNOVÝ LIST		B05
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Po zahájení provozu dočasné kuchyně zřízené v místnosti přípravný ve 2. NP objektu SO 01 – přístavba vznikla potřeba odsávání částí par hromadících se v prostoru podesty hlavního přístupového schodiště. Z tohoto důvodu byl instalován ventilátor pro obnovení hygienicky uspokojivého stavu v prostoru podesty ve 2. np hlavního schodiště.		
Technický popis: Dodávka a montáž ventilátoru včetně dodávky a montáže odtahového potrubí vzduchotechniky.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		14 741,23
Rozdíl:		14 741,23
Vliv na dopracování PD:		
Bez požadavku na doplnění DPS.		
Vliv na termín výstavby:		
Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MS Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MS s výtahem

ZL č.

B05

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
--------	-----	-------------	------	----------	--------	--------

1. Přípočty

Díl	751	Vzduchotechnika				
1	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	1,000		URS
2	10.972.574	Ventilátor HV 150 A IPX4 malý axiální	kus	1,000		Cena obvyklá
3	1.073	PEVNÉ POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK DO 30% - D200	m	1,000		URS
4	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,000		URS
5	ELD.KW810100010	HVG 200	kus	1,000		URS
6	1.112	OSTATNÍ - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	8,000		SoD
		8"závěsy, materiál elektro k napojení a ost...		8,000		
		Součet		8,000		
7	1.121	OSTATNÍ - Zprovoznění a zkoušky zařízení	hod	5,000		SoD
		5"propojení na elektro, zprovoznění...		5,000		
8	1.122	OSTATNÍ - Vnitrostaveništní přemístění	t	0,100		SoD
9	1.123	OSTATNÍ - Drobné stavební úpravy	hod	2,000		SoD

2. VRN

Díl	VN	Vedlejší náklady				
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%		SoD
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%		SoD
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%		SoD
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%		SoD
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,001		SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady				
15	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
16	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
17	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
18	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD

Celkem Kč bez DPH

14 741,23

ZMĚNOVÝ LIST		B06
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny:	Úprava trasy rozvodů vzduchotechniky a chlazení v technické místnosti a na galerii objektu SO 01 – přístavba. Úpravou byl vytvořen nový užitečný prostor zázemí, který je nezbytný pro zajištění provozu mateřské školy po dobu probíhajících stavebních prací na dalších částech objektu.	
Technický popis:	Přetrasování části rozvodů vzduchotechniky a chlazení tak, aby byly uvolněny prostory technické místnosti a galerie. Provedení nezbytných úprav izolací a doplňkových prvků souvisejících s novým vedením rozvodů.	
Přílohy:	Rozpočet změny	
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		71 876,98
Rozdíl:		71 876,98
Vliv na dopracování PD:	Dílní úpravy DPS.	
Vliv na termín výstavby:	Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.	
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne 15.04.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem							ZL č.	B06
Ocenění změny								Jedn. cena dle
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem		
1. Přípočty								
Díl	D.1.4.b	Klimatizace, Chlazení						
1	733163100R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 10 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	12,000				SoD
		12"provedení nové trasy - z B 2.10 do B 2.02a (puda)		12,000				
2	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	12,000				SoD
		12"provedení nové trasy - z B 2.10 do B 2.02a (puda)		12,000				
3	733164101R00	Montáž potrubí měděného D 6 - 12 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů	m	24,000				SoD
4	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	24,000				SoD
5	733-3	Objímky, konzole, šrouby	kg	2,000				SoD
6	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,032				SoD
Díl	D1.4.d	Vzduchotechnika						
7	1.053	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ ZHOTOVENÉ Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU - 200/250	m	6,000				SoD
		200x250						
		6"nové trasy rozvodu 2.NP-Galerie vlivem změny užívání místnosti B 2.02b		6,000				
		Součet		6,000				
8	1.054	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ ZHOTOVENÉ Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU - 200/315	m	4,000				SoD
		200x315						
		4"nové trasy rozvodu 2.NP-Galerie vlivem změny užívání místnosti B 2.02b		4,000				
		Součet		4,000				
9	1.072	PEVNÉ POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK DO 30% - D160	m	12,000				SoD
		d160						
		12"nové trasy rozvodu 2.NP-Galerie vlivem změny užívání místnosti B 2.02b		12,000				
		Součet		12,000				
10	1.073	PEVNÉ POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK DO 30% - D200	m	20,000				SoD
		d200						
		20"nové trasy rozvodu 2.NP-Galerie vlivem změny užívání místnosti B 2.02b		20,000				
		Součet		20,000				
11	1.074	PEVNÉ POTRUBÍ VČETNĚ TVAROVEK DO 30% - D250	m	15,000				SoD
		d250						
		15"nové trasy rozvodu 2.NP-Galerie vlivem změny užívání místnosti B 2.02b		15,000				
		Součet		15,000				
12	1.111	TEPELNÁ IZOLACE NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ - tl. 40mm	m2	4,000				SoD
		tl.40mm						
		4		4,000				
		Součet		4,000				
13	1.112	OSTATNÍ - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	12,000				SoD
		závěsy						
		12		12,000				
		Součet		12,000				
14	1.122	OSTATNÍ - Vnitrostaveništní přemístění	t	0,250				SoD
15	1.123	OSTATNÍ - Drobné stavební úpravy	hod	7,000				SoD
		7"změny provedených rozvodu		7,000				
2. VRN								

Díl	VN	Vedlejší náklady				
16	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%		SoD
17	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%		SoD
18	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%		SoD
19	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%		SoD
20	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,001%		SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady				
21	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
22	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
23	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
24	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD
Celkem Kč bez DPH					71 876,98	

ZMĚNOVÝ LIST		B07
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Provedení prací potřebných pro zajištění nepřerušného provozu mateřské školy během probíhajících stavebních prací a v období přesunu do nového objektu přístavby. Tyto úpravy umožnily dočasné zajištění provozu MŠ v bezpečných a hygienických podmínkách i pro handicapované děti.		
Technický popis: Stavební úpravy přístupových tras, zabezpečení bezpečného pohybu dětí a personálu, doplnění provizorních instalací a úpravy prostor nezbytné pro zajištění hygienického standardu a základního komfortu provozu během stavebních činností a následného přesunu do nového objektu přístavby.		
Přílohy: <i>Rozpočet změny</i>		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		219 472,72
Rozdíl:		219 472,72
Vliv na dopracování PD:		
<i>Bez požadavku na úpravu DPS.</i>		
Vliv na termín výstavby:		
<i>Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.</i>		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MS Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MS s výtahem

ZL č.

B07

Ocenění změny

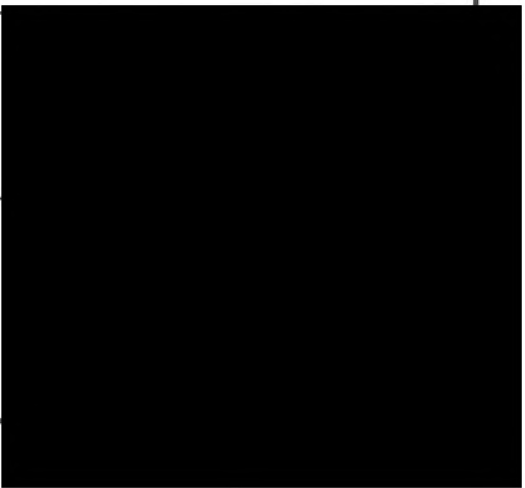
Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	D.1.4.b	Klimatizace, Chlazení					
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně 2*3"Dmž dlaždic vstupu l.etapy	m2	6,000			JRS
				6,000			
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 0,4*0,4*0,8"výkop základu pro stožary stínění plachet 0,3*0,3*0,6*2"výkop pro základy pro sloupka informační nástěnky Součet	m3	0,236			JRS
				0,128			
				0,108			
				0,236			
3	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m 0,128+0,108	m3	0,236			JRS
				0,236			
4	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m (0,128+0,108)*2	m3	0,472			JRS
				0,472			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 0,128+0,108	m3	0,236			JRS
				0,236			
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 0,236*10	m3	2,360			JRS
				2,360			
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 0,236	m3	0,236			JRS
				0,236			
Díl	2	Zakládání					
8	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 0,3*0,3*0,6" 0,4*0,4*0,8"betonáž patek pro stožary stínící plachty	m3	0,128			JRS
				0,054			
				0,128			
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce					
9	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním 2"sloupky pro info vitrýnu	kus	2,000			JRS
				2,000			
10	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	2,000			JRS
11	60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m 2,0*3,0*0,05*1,15"lávka vstupu, přes výkop základu oplocení	m3	0,345			JRS
				0,345			
12	61223264	hranoli konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový 0,1*0,1*4*2"hranoly KVH pro stožary stínící plachty	m3	0,080			JRS
				0,080			
13	60511150	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m 0,12*0,025*4*8"prkna pro ohrádky vstupu SO 01	m3	0,096			JRS
				0,096			
Díl	5	Komunikace					
14	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm 2*2	m2	4,000			JRS
				4,000			
15	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm 4	m2	4,000			JRS
				4,000			
Díl	99	Staveništní přesun hmot					
16	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m.	t	1,244			JRS
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					

17	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	35,000	SoD
		2,5*4" kontejnery komunálního odpadu		10,000	
		25"stěhování šmolikova		25,000	
		Součet		35,000	
18	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	665,000	SoD
		35*19		665,000	
19	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	10,000	URS
		2,5*4		10,000	
Díl	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
20	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	269,000	URS
		269"práce prováděné pro zajištění provozu MŠ v době provádění stavebních prací a v době při přesunu provozu MŠ z objektu vily do objektu přístavby. Součástí je také montáž rákosových rohoží na oplocení pro zajištění prostředí akceptovatelného pro děti s handicapem.		269,000	
		Součet		245,000	
21	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	21,000	URS
		21"stavbyvedoucí - zajištění materiálu, přesunu a ost v souvislosti s pracemi pro školku		21,000	
Díl	783	Dokončovací práce - nátěry			
22	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	1,600	URS
		(0,12*2+0,025*2)*4*8"prkny ohrádku u vstupu SO 01		9,280	
		0,1*4*4"nátěr stožáru stinící plachty dvojnásobnou lazurou		1,600	
Díl	OST	Ostatní			
23	R001	Rohož rákosová pro zakrytí oplocení v. 1,5/ 2,0m	m2	165,000	Cena obvyklá
		(5*1,5)*14"zakrytí uličního oplocení 1		105,000	
		(5*1,5)*8"zakrytí uličního oplocení 2		60,000	
		Součet		165,000	
24	R762851	Spojovací, kotevní a pomocný materiál	soubor	1,000	Cena obvyklá
		1"kotvení stinících plachet, rákosových rohoží oplocení, info nástěnky, lékárničky,hodin, ohrádek u vstupu do SO 01, nástěnek a ost...		1,000	
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
25	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
26	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
27	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
28	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
29	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
30	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
31	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
32	Pol34	Koordináční činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				219 472,72	

ZMĚNOVÝ LIST		B08
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Aleji 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny:	Provedení transparentního bezprašného nátěru betonové konstrukce stropu nad 1. NP objektu SO 01 - přístavba pro zajištění hygienického prostředí provozu MŠ. Odpočet nerealizovaných nátěrů uvedených v soupisu prací s VV.	
Technický popis:	Provedení malířských prací.	
Přílohy:	Rozpočet změny	
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-65 975,34
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		23 163,52
Rozdíl:		-42 811,82
Vliv na dopracování PD:	Bez požadavku na doplnění DPS.	
Vliv na termín výstavby:	Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.	
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 [Redacted Signature]	[Redacted Stamp]
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025 [Redacted Signature]	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem							ZL č.	B08
Ocenění změny							Jedn. cena dle	
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem		
1. Přípočty								
Díl	784	Malby						
1	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	212,900			SoD	
		5,5+11,9+16,1+17,3+1,2+5,7+120,7+3,6+5,1+2,7+5,8+11,1+2,6+3,6"pro nátěr betonových stropu 1.NP		212,900				
		Součet		212,900				
2	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	425,800			URS	
		212,9'2"dvounásobný akrylátový nátěr betonového stropu 1.NP		425,800				
2. Odpočty								
Díl	783	Nátěry						
3	783881260R00	Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace + 2x nátěr akrylátový	m2	-222,888			SoD	
4	783897122R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý vodní přípravek (voda, SiO2), pro exteriér a interié, jednonásobný	m2	-6,810			SoD	
5	783992000R00	Nátěry ostatní bezpečnostními barvami šrafováním	m2	-4,000			SoD	
3. VRN								
Díl	VN	Vedlejší náklady						
6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%			SoD	
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%			SoD	
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%			SoD	
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%			SoD	
Díl	VN	Vedlejší náklady						
10	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%			SoD	
	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%			SoD	
12	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%			SoD	
13	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%			SoD	
Celkem Kč bez DPH						-42 811,82		

ZMĚNOVÝ LIST		B09
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Doplnění v soupisu prací s VV chybějící položky dodávky tepelné izolace podlah, doplnění protiotřesové izolace pod základ VZT jednotky a vyčíslení skutečného množství souvisejících prací.		
Technický popis: Izolačské práce spojené s prováděním podlah objektu SO 01 - přístavba.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-19 927,60
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		127 167,07
Rozdíl:		107 239,47
Vliv na dopracování PD: Bez požadavku na doplnění DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem							ZL č.	B09
Ocenění změny							Jedn. cena dle	
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem		
1. Přípočty								
Díl	2	Zakládání						
1	272391114	Antivibrační rohož základových kleneb z pryže tuhosti přes 0,6 do 1 MPa volně položená	m2	4,708			URS	
		Antivibrační rohož základového bloku pod VZT jednotkou						
		3,02*0,8				2,416		
		3,02*0,3*2				1,812		
		0,8*0,3*2				0,480		
		Součet				4,708		
2	278381541	Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I	m3	0,701			URS	
		základový blok pod VZT jednotku						
		3,02*0,8*0,29				0,701		
Díl	99	Staveništní přesun hmot						
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1,848			SoD	
Díl	713	Izolace tepelné						
4	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	121,420			SoD	
		Množství dle VV						
		-74,5				-74,500		
		Provedené množství - 2.NP						
		3,2*1,725+11,6+22,7+17,3+1,9+1,3+112,3+2,4*1,5+10,6+9,1				195,920		
		Součet				121,420		
5	1415202330	Tepelná izolace Dekperimeter SD 150 180 mm (1,5 m2/bal.)	m3	42,758			URS	
		5,5+11,9+16,1+17,3+1,2+5,7+120,7+3,6+5,1+2,7+5,8+11,1+2,6+3,6				212,900		
		1,24*2+1,43*0,8+1,67*1,1"rozšíření pod SCH rameny				5,461		
		-3,015*0,8"odpočet pod VZT jednotkou				-2,412		
		Mezisoučet				215,949		
		215,95*0,09*2*1,1"přepočet na m3 vč. ztrátého				42,758		
6	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	3,649			SoD	
		-212,3"množství dle VV				-212,300		
		Provedené množství						
		5,5+11,9+16,1+17,3+1,2+5,7+120,7+3,6+5,1+2,7+5,8+11,1+2,6+3,6				212,900		
		1,24*2+1,43*0,8+1,67*1,1"rozšíření pod SCH rameny				5,461		
		-3,015*0,8"odpočet pod VZT jednotkou				-2,412		
		Součet				3,649		
7	998713192R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m	t	1,198			SoD	
8	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	1,198			SoD	
Díl	736	Podlahové vytápění						
9	736322111R00	Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém systémová deska, celková tloušťka desky 50 mm, rozteč ukládání potrubí násobky 50 mm, pro potrubí D 14-17 mm, včetně dodávky materiálu	m2	15,613			SoD	
		dle VV						
		-399,40				-399,400		
		Skutečně provedeno						
		5,5+11,9+16,1+17,3+1,2+5,7+120,7+3,6+5,1+2,7+5,8+11,1+2,6+3,6*1.NP				212,900		
		3,2*1,075+11,6+22,7+17,3+1,9+1,3+112,3+14,3+10,6+2,4*1,51*2.NP				199,064		
		1,24*2+1,43*0,8+1,67*1,1"rozšíření pod SCH rameny				5,461		
		-3,015*0,8"odpočet pod VZT jednotkou				-2,412		
		Součet				15,613		

10	998736102R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 12 m	t	0,027	SoD
2. Odpočty					
Díl	783	Nátěry			
11	59760179.AR	profil dilatační PVC	m	-350,000	SoD
12	713121118R00	izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	-350,000	SoD
13	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	-192,500	SoD
3. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
14	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
15	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
16	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
17	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
18	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
19	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
20	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
21	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
22	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				107 239,47	

ZMĚNOVÝ LIST		B10
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny:	Doplnění v soupisu prací s VV chybějících položek samonivelační stěrky pro prostor galerie a technické místnosti, sjednocení podlah ve 2. np objektu SO 01 - přístavba a vyčíslení skutečného množství souvisejících prací.	
Technický popis:	Podlahářské práce v objektu SO 01 - přístavba.	
Přílohy:	Rozpočet změny	
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-61 529,43
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		136 502,57
Rozdíl:		74 973,14
Vliv na dopracování PD:	Doplnění DPS pro objekt SO 01 - přístavba.	
Vliv na termín výstavby:	Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.	
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

B10

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol. kód Specifikace m.j. množství j.cena Celkem

1. Přípočty

Díl	776	Podlahy povlakové				
1	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	18,315		SoD
		Množství dle VV				
		-319,288			-319,288	
		Provedené množství				
		120,7+1,24*2+3,6*1.NP-herna, prostor pod schodištěm, únikové sch.		126,780		
		112,3+14,3+10,6*2.NP - herna, schodiště, kancelář		137,200		
		6,75*5,45-3,14*1*1*2.NP-galerie		33,648		
		9,3*4,55+0,3*0,9-(0,6+2,3+1,45)*0,6*2.NP-půda		39,975		
		Součet		18,315		
2	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	22,615		SoD
		Množství dle VV				
		-319,288			-319,288	
		Provedené množství				
		120,7+1,24*2+3,6*1.NP		126,780		
		(0,16+0,29)*2,4*1*1*sch stupně		11,880		
		112,3+2,4*1,3+2,4*1,5+10,6*2.NP		129,620		
		6,75*5,45-3,14*1*1*2.NP-galerie		33,648		
		9,3*4,55+0,3*0,9-(0,6+2,3+1,45)*0,6*2.NP-půda		39,975		
		Součet		22,615		
3	776141113	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnění podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	73,623		URS
		Samonivelační stěrka s výztužným vláknem na suché podlaže 2.NP Galerie, tl. stěrky cca 5-6mm pro správnou funkci armovacích vláken				
		6,75*5,45-3,14*1*1*2.NP-galerie		33,648		
		9,3*4,55+0,3*0,9-(0,6+2,3+1,45)*0,6*2.NP-půda		39,975		
		Součet		73,623		
4	776220110R00	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž	m	0,880		SoD
		Množství dle VV				
		-25,52			-25,520	
		Provedené množství				
		(1,24+1,16)*11		26,400		
		Součet		0,880		
5	776220200R00	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž	m	0,960		SoD
		Množství dle VV				
		-27,84			-27,840	
		Provedené množství				
		(1,24+1,16)*12		28,800		
		Součet		0,960		
6	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž	m2	10,735		SoD
		Množství dle VV				
		-319,288			-319,288	
		Provedené množství				
		120,7+1,24*2+3,6*1.NP		126,780		
		112,3+2,4*1,3+2,4*1,5+10,6*2.NP		129,620		
		6,75*5,45-3,14*1*1*2.NP-galerie		33,648		
		9,3*4,55+0,3*0,9-(0,6+2,3+1,45)*0,6*2.NP-půda		39,975		
		Součet		10,735		
7	28410102R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 34, 42; protiskluzné	m2	59,786		SoD
		Množství dle VV				
		-349,288			-349,288	
		Provedené množství				
		120,7+1,24*2+3,6*1.NP		126,780		
		112,3+2,4*1,3+2,4*1,5+10,6*2.NP		129,620		
		6,75*5,45-3,14*1*1*2.NP-galerie		33,648		

		9,3*4,55+0,3*0,9-(0,6+2,3+1,45)*0,6*2.NP-puda		39,975	
		0,29*(1,24+1,16)*9"stupně		6,264	
		0,16*(1,24+1,16)*12"podstupnice		4,608	
		0,2*(126,78+129,62+33,648+39,975+6,264+4,608)*ztratiné dle nových spárořezu		68,179	
		Součet		59,786	
8	28410102R_1	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 34, 42; protiskluzné - PAPAYA ORANGE na sch stupně	m2	10,000	
		10"materiál pro sch stupně - odlišení prvního / posledního sch stupně		10,000	
		JC = 720Kč /m2 (6200+1000)/10			
		Součet		10,000	
9	776981102R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily montáž přechodové a podlahové lišty, , upevnění vruty s hmoždinkami, ,	m	8,900	SoD
		Množství dle VV			
		-6,6		-6,600	
		Provedené množství			
		6,75+5+3,75"ukončovací lišty okolo fr. oken 1.NP		15,500	
		Součet		8,900	
10	5537009223R.	O24,O25,O26- Lišta dilatační podlahových krytin	m	11,925	SoD
		Množství dle VV			
		-9		-9,000	
		Provedeno			
		6,75+5+3,75"ukončovací lišty okolo fr. oken 1.NP		15,500	
		0,35*15,5		5,425	
		Součet		11,925	
11	776141221	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl do 3 mm	m2	7,656	URS
		stupně a podsupně únikového schodiště			
		0,29*(1,24+1,16)*11		7,656	
		Součet		7,656	
12	776143131	Tmelení schodišťových podstupnic povlakových podlah stěrkou tl do 3 mm	m2	4,608	URS
		podsupně únikového schodiště			
		0,16*(1,24+1,16)*12		4,608	
13	776431211	Montáž schodišťových hran šroubovaných	m	55,200	URS
		1,24*(12+11)+1,16*(12+11)"montáž schodových hran (hrany, kout)		55,200	
14	RMAT0001	schodová lišta hliníková pro montáž povlakové podlahy tl do 3mm, barevnost - imitace nerez	m	31,944	Cena obvyklá
		1,24*11+1,16*11		26,400	
		26,4*0,1"ztratiné		2,640	
		Součet		29,040	
		29,04*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		31,944	
15	RMAT0002	schodová lišta vnitřní hliníková pro montáž povlakové podlahy tl do 3mm, barevnost - imitace nerez	m	34,848	Cena obvyklá
		12*1,24+12*1,16		28,800	
		28,8*0,1"ztratiné		2,880	
		Součet		31,680	
		31,68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		34,848	
16	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	1,154	SoD
17	998776192R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,154	SoD
2. Odpočty					
Díl	776-	Podlahy povlakové			
18	776101115R00.	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	-62,888	SoD
		Množství dle VV			
		-319,288		-319,288	
		Provedené množství			
		120,7+1,24*2+3,6*1.NP		126,780	
		112,3+2,4*1,3+2,4*1,5+10,6*2.NP		129,620	
		Součet		-62,888	
19	283424531R.	Lišta soklová	m	-57,480	SoD
		-47,9*1,2		-57,480	

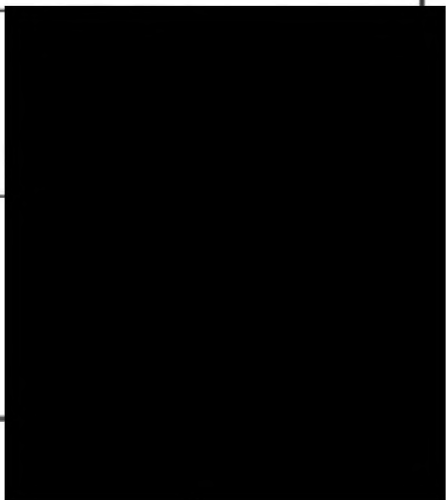
		Součet		-57,480	
20	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	-47,900	SoD
		množství dle VV			
		-181		-181,000	
		Provedené množství			
		116,9"podlahy		116,900	
		(0,16+0,29)*12*3"schodiště		16,200	
		Součet		-47,900	
21	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	-0,039	SoD
22	998776192R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,039	SoD
Díl	775	Podlahy vlysové a parketové			
23	5537028221R	lišta náběhová; pro podlahy o nestejně výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 35,0 mm; l = 2 700 mm; vrtaná; stříbro	kus	-10,000	SoD
24	611513706R	dílec podlahový 1-lamela; š = 187,0 mm; l = 2 420,0 mm; tl. 15,0 mm; dub; typ hampshire; třída country; spoj zámkový; nášlap dřevo; tl. 3,60 mm; povrch. úprava lak; mat; pokládka plovoucí způsob	m2	-11,600	SoD
25	775541400R00	Položení podlah lamelových plovoucích montáž (položení) lamel	m2	-10,600	SoD
26	775541600R00	Položení podlah lamelových plovoucích přírážka k ceně za plošné lepení k podkladu	m2	-10,600	SoD
27	775981102R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily montáž přechodové a podlahové lišty, , upevnění vruty s hmoždinkami, ,	m	-22,000	SoD
		-22		-22,000	
		Součet		-22,000	
28	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	-0,112	SoD
3. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
29	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
30	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
31	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
32	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
33	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
34	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
35	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
36	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
37	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				74 973,14	

ZMĚNOVÝ LIST		B11
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: V rámci zajištění provozu mateřské školy po dobu rekonstrukce objektu vily bylo nezbytné doplnit vnitřní vybavení objektu přístavby. Úprava reaguje na potřebu vytvoření dodatečných úložných prostor a současně na specifické požadavky provozu MŠ, včetně zajištění podmínek pro přechodnou předškolní výuku dětí s handicapem v prostoru přístavby.		
Technický popis: Dodávka a montáž vnitřního vybavení objektu SO 01 - přístavba formou vestavných skříní, úložných systémů a dalších nábytkových prvků, které rozšiřují úložné kapacity a zohledňují potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		513 180,31
Rozdíl:		513 180,31
Vliv na dopracování PD:		
Dílčí doplnění DPS.		
Vliv na termín výstavby:		
Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem						ZL č.	B11
Ocenění změny							Jedn. cena dle
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	766	Konstrukce truhlářské					
1	76602	Policová skříň T2, Specifikace dle PD - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - DOPLNĚNÍ 09/2024 - dodávka a montáž	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		policová skříň otevřená 870x3000x170					
		Výškově nastavitelné police 11ks					
		Materiál dle T1-26 , deska tl. 18mm + HPL - barva bílá					
		hrany ABS					
		záda plná LTD barva bílá					
		Součet		1,000			
2	76603	Policová skříň do WC kabinky T3 , Specifikace dle PD - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - DOPLNĚNÍ 09/2024 - dodávka a montáž	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		Policová skříň 1000x2350x250mm - 1/2 otevřená, 1/2 s dvířky					
		výškově stavitelné police 8ks, dvířka, záda plná					
		Materiál březová překližka					
		Povrchová úprava - olejování					
		Součet		1,000			
3	76604	Policová skříň do úklidové místnosti T4, Specifikace dle PD - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - DOPLNĚNÍ 09/2024 - dodávka a montáž	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		policová skříň otevřená 1200x3000x250					
		Výškově nastavitelné police 11ks					
		Záda plná					
		Materiál dle T1-26 , deska tl. 18mm + HPL - barva bílá					
		hrany ABS					
		Záda plná LTD - barva bílá					
		Součet		1,000			
4	76605	Kontejner pod pracovní stůl T5, Specifikace dle PD - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - DOPLNĚNÍ 09/2024 - dodávka a montáž	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		podstolový kontejner na kolečkách 400+560x800					
		výsuvné zásuvky 6ks					
		mat. březová překližka povrchová úprava olejování					
		Součet		1,000			
5	76606	Sklopný přísedový stůlek k pracovnímu stolu T6, Specifikace dle PD - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - DOPLNĚNÍ 09/2024 - dodávka a montáž	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		půlkruhový stůlek sklopný r=400mm					
		materiál březová překližka					
		povrchová úprava olejování					
		sklopná kovová konzola					
		Součet		1,000			
6	76608	Otevřená police T8, Specifikace dle PD - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - DOPLNĚNÍ 09/2024 - dodávka a montáž	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		otevřená police 3920x750x400					
		výškově stavitelné police 2 řady					
		plná záda					
		materiál březová překližka					
		povrchová úprava olejování					
		Součet		1,000			
7	76609	Výdejní pult vysoký T9, Specifikace dle PD - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - DOPLNĚNÍ 09/2024 - dodávka a montáž	ks	1,000			Cena obvyklá
		1		1,000			
		výdejní pult 800x900x500mm					
		plná záda					

		vyklapná část s vestavným košem			
		materiál březová překližka			
		povrchová úprava olejování			
		Součet			1,000
8	76610	Výdejní stolek T10, Specifikace dle PD - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - DOPLNĚNÍ 09/2024 - dodávka a montáž	ks	1,000	Cena obvyklá
		1			1,000
		výdejní stolek na kolečkách 900x500x500mm			
		police s možností výsuvu			
		materiál březová překližka			
		povrchová úprava olejování			
		Součet			1,000
9	76611	Policová skříň T11, Specifikace dle PD - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - DOPLNĚNÍ 09/2024 - dodávka a montáž	ks	1,000	Cena obvyklá
		1			1,000
		policová skříň s dvířky 1450x750x600			
		výškově stavitelné police 2 řady			
		materiál březová překližka			
		povrchová úprava olejování			
		Součet			1,000
10	76612	Pracovní stůl T12, Specifikace dle PD - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - DOPLNĚNÍ 09/2024 - dodávka a montáž	ks	1,000	Cena obvyklá
		1			1,000
		Stůl pracovní 1560x750x800mm			
		materiál březová překližka			
		povrchová úprava olejování			
		Ocelová podkonstrukce			
		Součet			1,000
11	76613	Kontejner pod pracovní stůl T13, Specifikace dle PD - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - DOPLNĚNÍ 09/2024 - dodávka a montáž	ks	1,000	Cena obvyklá
		1			1,000
		tejner na kolečkách 350x690x750mm			
		výsuvné zásuvky			
		materiál březová překližka			
		povrchová úprava olejování			
		Součet			1,000
12	76614	Kuchyňská linka T14, Specifikace dle PD - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - DOPLNĚNÍ 09/2024 - dodávka a montáž	ks	1,000	Cena obvyklá
		1			1,000
		kuchyňská linka dl 3335mm			
		spodní skříňky s výškově stavitelnými policemi, zásuvkami, dvířky			
		odpadkově koše plastové 3ks			
		výsuvná ledvina 2ks			
		nerezový dřez s odkapovou plochou 800mm			
		materiál březová překližka - korpus a dvířka			
		povrchová úprava olejování			
		pracovní deska a svislý obklad za deskou kompaktní HPL laminát tl 12mm			
		Součet			1,000
13	76615	Policová skříň T15, Specifikace dle PD - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - DOPLNĚNÍ 09/2024 - dodávka a montáž	ks	1,000	Cena obvyklá
		1			1,000
		policová skříň s dvířky 330x1350x600			
		výškově stavitelné police 2ks			
		materiál březová překližka			
		povrchová úprava olejování			
		Součet			1,000
14	76616	Policová skříň T15, Specifikace dle PD - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - DOPLNĚNÍ 09/2024 - dodávka a montáž	ks	1,000	Cena obvyklá
		1			1,000
		policová skříň s dvířky 1040x1616x575			
		výškově stavitelné police 3ks			
		materiál březová překližka			
		povrchová úprava olejování			
		Součet			1,000

15	76617	Věšák na kabáty T17, Specifikace dle PD - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - DOPLNĚNÍ 09/2024 - dodávka a montáž	ks	1,000	Cena obvyklá
		1		1,000	
		věšák na kabáty 700 + 700x100			
		háčky na kabáty 7ks			
		materiál březová překližka			
		povrchová úprava olejováním			
16	76618_	Doplňující obklad SDK stupně Galerie 2.NP - m.č. 2.02-půda, provedení v rozsahu dle požadavků investora, mat. březová překližka tl. 21mm, PŮ olejováním, lepeno k podkladu	kpl	1,000	Cena obvyklá
		1		1,000	
		materiál březová překližka			
		povrchová úprava olejováním			
17	76619_	Zakrytí stoupačky kanalizace nad pracovní deskou dodatečně dodávané kuchyňské linky 2.NP-Galerie, zákryt kombinace HPL laminátu a překližky tl. 12mm - D+M	ks	1,000	Cena obvyklá
		1		1,000	
		zákryt tvaru U 312 x 117mm, materiál HPL - pro svislou část			
		Zákryt tvaru J 312 x 117, materiál - březová překližka tl. 12mm, povrchová úprava voskováním - pro šikmou část			
18	76620_	Dveře skříně T1-1b na 1.NP, mat. březová překližka tl. 18mm - D+M	kpl	1,000	Cena obvyklá
		1		1,000	
		dvoukřídle dveře skříně 1077 x 1210mm			
		březová překližka tl. 18mm, povrchová úprava - tvrdý voskový olej			
		dvířka se zámkem - jeden zámek, který zamyká obě křídla (zámek vlevo, klepečka na křídle vpravo)			
		vyfrézované úchyty pro otevírání			
		závesy dvírek vložené			
19	76621_	Dveře skříně T2-1b na 2.NP, mat. březová překližka tl. 18mm - D+M	kpl	1,000	Cena obvyklá
		1		1,000	
		dvoukřídle dveře skříně 1016 x 1100mm			
		březová překližka tl. 18mm, povrchová úprava - tvrdý voskový olej			
		dvířka se zámkem - jeden zámek, který zamyká obě křídla (zámek vlevo, klepečka na křídle vpravo)			
		vyfrézované úchyty pro otevírání			
		závesy pravých dvírek s nulovým přesahem			
		závesy levých dvírek vložené			
20	76622_	D+M sklopné kovové podpěry výdejevého stolku T10	ks	1,000	Cena obvyklá
		1		1,000	
		sklopná kovová podpera stolku T10 proti převrácení			
		montáž ze spodní strany výsuvného pultu			
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
21	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
22	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
23	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
24	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
25	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
26	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
27	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
28	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
29	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				513 180,31	

ZMĚNOVÝ LIST		B12
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny:	S ohledem na aktuální potřeby provozu mateřské školy a s ohledem na skutečnost, že zadání pro zpracování DPS bylo specifikováno již v průběhu roku 2021, bylo přistoupeno k optimalizaci dodávky a montáže interiérového vybavení objektu.	
Technický popis:	Úprava rozsahu a specifikace dodávky a montáže interiérového vybavení budovy tak, aby odpovídala skutečnému způsobu využívání prostor a aktuálním provozním požadavkům mateřské školy.	
Přílohy:	Rozpočet změny	
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-471 225,04
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		43 904,00
Rozdíl:		-427 321,04
Vliv na dopracování PD:	Doplnění DPS pro objekt SO 01 - přístavba.	
Vliv na termín výstavby:	Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.	
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

B12

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
--------	-----	-------------	------	----------	--------	--------

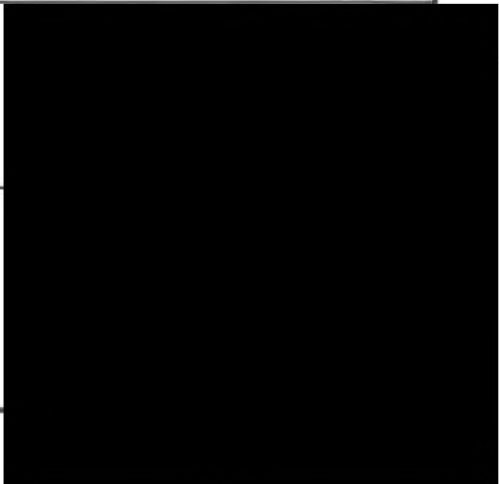
1. Přípočty

Díl	766	Konstrukce truhlářské				
1	76619_	SO 01 - Přístravba - Skříňka s dvířky u myčky nádobí 1.NP, specifikace dle zadání investora	ks	1,000		Cena obvyklá
		1		1,000		
		policová skříň s dvířky 400x1200x350 - u myčky nádobí 1.NP				
		2x dvířka se zámkem				
		materiál březová překližka				
		povrchová úprava olejování				
		Součet		1,000		
Díl	M99	Ostatní práce "M"				
2	M9917_	Nerezový stůl s dřezem O2-12 - dle zaměření a specifikace investora	ks	1,000		Cena obvyklá
		Nerezový stůl s dřezem O2-12,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž				
		1		1,000		
		1800x600x850				
		lem - zadní strana, boční strany stolu				
		spodní police				
		dřezová baterie, sifon				

2. Odpočty

Díl	766	Konstrukce truhlářské				
3	76628	Parapet T1-28 , specifikace podle tabulky truhlářských výrobků PI - dodávka a montáž	ks	-1,000		SoD
		Parapet T1-28 , specifikace podle tabulky truhlářských výrobků PI - dodávka a montáž				
4	76668	Parapet T 2-36, specifikace podle tabulky truhlářských výrobků PI - dodávka a montáž	ks	-1,000		SoD
		Parapet T 2-36, specifikace podle tabulky truhlářských výrobků PI - dodávka a montáž				
5	76671	Parapet T 2-39, specifikace podle tabulky truhlářských výrobků PI - dodávka a montáž	ks	-1,000		SoD
		Parapet T 2-39, specifikace podle tabulky truhlářských výrobků PI - dodávka a montáž				
Díl	M99	Ostatní práce "M"				
6	M9901	Dotyková televize O1-1+O2-1+O3-1,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž	ks	-3,000		SoD
		Dotyková televize O1-1+O2-1+O3-1,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž				
		-3		-3,000		
7	M9902	Piano se stoličkou O1-2 + O2-2,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž	ks	-2,000		SoD
		Piano se stoličkou O1-2 + O2-2,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž				
		-2		-2,000		
		Součet		-2,000		
8	M9912	Dětské umyvadlo, zrcadlo O1-9,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž	ks	-2,000		SoD
		Dětské umyvadlo, zrcadlo O1-9,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž				
		-2"odpočet nedodaných zrcadel u interiérových prvků O1-9, O2-10		-2,000		
9	M9915	Kolejničky se závěsem O1-11,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž	ks	-1,000		SoD
		Kolejničky se závěsem O1-11,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž				
		-1"odpočet nedodaných závěsů na dodaný závěsný systém (kolejničku)		-1,000		
10	M9916	Policový regál O2-11,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž	ks	-2,000		SoD
		Policový regál O2-11,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž				
		-2		-2,000		

11	M9917	Nerezový stůl s dřezem O2-12,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž	ks	-1,000	SoD
		Nerezový stůl s dřezem O2-12,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž			
		-1		-1,000	
12	M9921	Kolejnice se závěsem O2-16,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž	ks	-1,000	SoD
		Kolejnice se závěsem O2-16,specifikace podle tabulky ostatních prvků PI - dodávka a montáž			
		-1"odpocel nedodaných závěsu na dodaný závesný systém (kolejnicku)		-1,000	
3. VRN					
DII	VN	Vedlejší náklady			
13	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
14	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
15	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
16	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
17	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
DII	VN	Vedlejší náklady			
18	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
19	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
20	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
21	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				-427 321,04	

ZMĚNOVÝ LIST		B13
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny:	Z důvodu rozšířeného využívání prostoru galerie pro potřeby předškolní výuky v průběhu provádění stavebních prací bylo nezbytné dodatečné doplnění rozvodů zdravotně-technických instalací (ZTI) v podkroví objektu. Úprava umožnila zajištění odpovídajících provozních podmínek pro předškolní výuku dětí.	
Technický popis:	Realizace dodatečných rozvodů ZTI v podkroví objektu, zahrnující napojení na stávající rozvody vody, kanalizace a provedení souvisejících stavebních úprav.	
Přílohy:	<i>Rozpočet změny</i>	
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		64 826,90
Rozdíl:		64 826,90
Vliv na dopracování PD:	<i>Doplnění DPS pro objekt SO 01 - přístavba.</i>	
Vliv na termín výstavby:	<i>Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.</i>	
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

B13

Ocenění změny

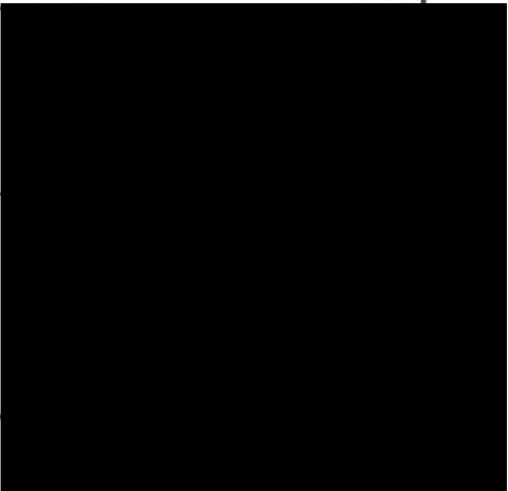
Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem
--------	-----	-------------	------	----------	--------	--------

1. Přípočty

Díl	721	Vnitřní kanalizace				
1	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	6,000		SoD
		6		6,000		
		Součet		6,000		
2	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	6,000		SoD
		6		6,000		
		Součet		6,000		
3	900 RT3.	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	12,000		SoD
		12		12,000		
		Drobné stavební úpravy, napojení na stávající rozvody, ztížené pracovní podmínky				
		Součet		12,000		
4	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,003		SoD
5	998721192R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,003		SoD
Díl	722	Vnitřní vodovod				
6	283771092R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	69,000		SoD
		69"tepelná izolace rozvodu vc. cirkulace TUV		69,000		
		Součet		69,000		
7	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	135,000		SoD
		135		135,000		
8	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	3,000		SoD
		3		3,000		
9	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	69,000		SoD
		69"tepelná izolace rozvodu vc. cirkulace TUV		69,000		
		Součet		69,000		
10	733178115R00	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylén-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	69,000		SoD
		69"rozvody vody vc. cirkulace TUV		69,000		
		Součet		69,000		
11	733-1	Fitinky	kg	2,500		SoD
		2,5		2,500		
12	722202432R00	Kohout kulový rozebíratelný, spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,000		SoD
		2		2,000		
13	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	69,000		SoD
		69		69,000		
		Součet		69,000		
14	900 RT3.	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	44,000		SoD
		44		44,000		
		napojení na stávající rozvody, drobné stavební úpravy, ztížené pracovní podmínky ...				
		Součet		44,000		
15	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,047		SoD
16	998722192R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,047		SoD
Díl	725	Zařizovací předměty				
17	55110062R	hadice sanitární PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F F 1/2"; l = 500 mm	kus	2,000		SoD

		2		2,000	
		Součet		2,000	
18	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	2,000	SoD
		2		2,000	
		Součet		2,000	
19	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	SoD
		1		1,000	
		Součet		1,000	
20	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,003	SoD
21	998725192R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,003	SoD
2. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
22	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
23	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
24	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
25	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
26	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
27	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
28	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
29	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
30	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				64 826,90	

ZMĚNOVÝ LIST		B14
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Změna provedení zákrytu jednotky chlazení objektu SO 01 - přístavba. Změna spočívá zejména v doplnění otevírání tak, aby mohla být jednotka chlazení plnohodnotně revidovatelná a servisovatelná. Zákryt tahokovem je z důvodu bezpečnosti dětí nahrazen opláštěním z prken sibiřského modřínu.		
Technický popis: Změna provedení zámečnického prvku Z7 objektu SO 01 - přístavba tak, aby mohla být jednotka chlazení, kterou tento zámečnický prvek zakrývá plnohodnotně revidovatelná a servisovatelná s tím, že původně navržené opláštění tahokovem bylo změněno na dřevěný obklad.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-64 200,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		95 483,92
Rozdíl:		31 283,92
Vliv na dopracování PD: Revize dokumentace zámečnického prvku Z7 v DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne 15.04.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

B14

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem
--------	-----	-------------	------	----------	--------	--------

1. Přípočty

Díl	767_X	Konstrukce zámečnické				
1	767-7_X	Z7 - Zakrytí venkovní klimatizační jednotky, podle požadavku na změnu konstrukce a materiálu opláštění	kus	1,000		Cena obvyklá
		1" zákryt jednotky chlazení v provedení:		1,000		
		- rámová čtyřstranná ocelová konstrukce 1490 x 1320 x 2000mm s 3x otevíratelnými křídly pro přístup k servisu a čištění				
		- rám z ocelových jeřlu 40x40mm				
		- 3x otevíratelné křídlo z ocelových jeřlu 40x40mm; pianové panty				
		- hl. křídlo zajištění jazýčky+čtyřhran, bocní křídla zajištění na zástrce				
		- výztuhy pro kotvení dřevěného opláštění				
		- povrchová úprava OK - žárové zinkování + vrchní náter RAL 7048 mat				
		- opláštění zákrytu z dřevěných hoblovaných latí 30x30mm, sibirský modrín				
		- povrchová úprava dřevěného opláštění: REMMERS Induline GW-310, odstín FT 37911				
				0,000		
		Součet		1,000		

2. Odpočty

Díl	767	Konstrukce zámečnické				
2	767-7	Zakrytí venkovní klimatizační jednotky, podle tabulky zámečnických výrobků - Z7	kus	-1,000		SoD
		1" Z7 dle zařazení PD		-1,000		
		- třístranné provedení 1490 x 1050x 2280				
		- ocelové profily L50/5				
		- opláštění - tahokov 30x15x3mm, tl.2mm				
		- 1x otevíratelné dveře				
		- povrchová úprava žárový pozink + vrchní náter RAL 9010,				
		Součet		-1,000		

3. VRN

Díl	VN	Vedlejší náklady				
3	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%		SoD
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%		
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%		
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%		
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,081%		
Díl	VN	Vedlejší náklady				
8	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%		SoD
9	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%		SoD
10	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%		SoD
11	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%		SoD

Celkem Kč bez DPH

31 283,92

ZMĚNOVÝ LIST		B15
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Změny reflektující skutečné provedení klempířských konstrukcí střechy objektu SO 01 vyplývající z doporučení výrobce střešního systému PREFALZ a také ze změny řešení oken lomených sestav a změny střešních oken.		
Technický popis: Úpravy klempířských konstrukcí v souladu s doporučením výrobce střešního systému PREFALZ a také úpravy detailů u změněných oken lomených sestav a změny střešních oken.		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-119 868,42
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		282 698,99
Rozdíl:		162 830,56
Vliv na dopracování PD: Díličí doplnění DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem						ZL č.	B15
Ocenění změny							Jedn. cena dle
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	4	Vodorovné konstrukce					
1	611409855R01	O 36 -Výlez střešní termoizolační 66 x 78cm - příplatek za barevnost RAL 7048	kus	2,000			Cena obvyklá
		2" příplatek za nestandardní barvu RAL 7048		2,000			
		Součet		2,000			
Díl	764	Konstrukce klempířské					
2	764211406	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Pz plechu rš 500 mm	m	49,220			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764211406					
		Podkladní zatahovací plech hřebene pro montáž AL plechu bez kotevení šrouby		49,220			
		24,61*2					
3	764212435	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 400 mm	m	32,820			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212435					
		Zatahovací plech pro ukončení střešní krytiny v místě žlabu / ukončení vikýře do SO 03		32,820			
		1,68+1,875+2,375+2,750+1,68+5,375+2,68+2,75+2,75+0,97+4,47+3,465		32,820			
		Součet		32,820			
4	764218405	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm	m	28,350			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764218405					
		Zatahovací plech pro oplechování římsy K12		28,350			
		1,68+1,875+2,375+2,750+1,68+5,375+2,68+2,75+2,75+0,97+3,465		28,350			
		Součet		28,350			
5	764222404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm	m	34,910			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764222404					
		7,195*4*šlifty		28,780			
		3,065*2"napojení na SO 03 - Koridor		6,130			
		Součet		34,910			
6	764222435	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 400 mm	m	28,350			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764222435					
		Okapnice z AL plechu v místě střešních žlabů		28,350			
		1,68+1,875+2,375+2,750+1,68+5,375+2,68+2,75+2,75+0,97+3,465		28,350			
7	764304154	Montáž lemování sloupků komínových lávek s krytinou skládanou, plechovou rš 330 x 500 mm	kus	4,000			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764304154					
		1*4"prostoupky komínové lávky		4,000			
	PFA.30102	svítkový plech pro falcování PREFALZ 0,7 x 1000 mm, hladký, standardní barva	m2	0,759			URS
		0,33*0,5*4*1,15		0,759			
8	764321403	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 250 mm	m	5,720			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764321403					
		(1,165+1,695)*2"lemování sten vikýře k SO 03 - Koridor		5,720			
9	764523406	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Al plechu rš 500 mm	m	16,375			URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764523406					
		0,875*3+1,25+2,2*2+3,75*2" odvodňovací žlaby nad šikmými okny ve střeše		16,375			
10	764R001	Montáž zachytávačů ledu - klempíř odborný	hod	34,000			URS
11	55344663	rozrazeč ledu sněhového zachytávače Al	kus	200,000			URS
		200		200,000			
12	764775323R00	Lemování komínů osazených v ploše, z lakovaného hliníkového plechu tl. 0,7 mm, , dodávka a montáž	m2	19,137			SoD
		množství dle VV					
		-15		-15,000			

		Provedené množství - opracování plechové krytiny okolo střešních oken - lomená okna z AL profilů, okna Velux, vyústění VZT			
		(2,5+3,75+1,25)*1,35+0,66*0,78+1,14*1,6*3"okna východ		16,112	
		(0,875*3+2,5+3,75)*1,35+0,66*0,78"okna západ		12,496	
		0,66*0,78*2+3,5+1"lemování střešních výlezu, vyústění VZT - komínek, prostup		5,530	
		Součet		19,137	
13	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,532	SoD
		<i>Poznámka k položce: 50 m vodorovně</i>			
14	998764192R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,532	SoD
		<i>Poznámka k položce: 50 m vodorovně</i>			
2. Odpočty					
	764x	Konstrukce klempířské			
15	764774522R00	Krytina falcovaná ze svitků šířky 650 mm na objektech výšky do 20 m, z hliníkového lakovaného plechu tl. 0,7 mm, sklon střechy od 30° do 45°, dodávka a montáž	m2	-21,868	SoD
		<i>Poznámka k položce: s úpravou krytiny u okapu, prostupu a výčnů</i>			
		množství dle VV			
		-354,13790		-354,138	
		Provedené množství			
		74,62498+86,84698+165,0877"fakturované provedené množství		326,560	
		5,71"Dodatek 1, ZL č.15		5,710	
		Součet		-21,868	
16	764393391R00	Montáž hřebene střechy Al - větrací mřížky K19 a K20 z děrovaného plechu tl.2mm	m	-12,960	SoD
		dle VV			
		-95,1		-95,100	
		Skutečně provedeno			
		34,39+47,75		82,140	
		Součet		-12,960	
17	764331330R00	Lemování z Al plechu nad lomeným oknem K21	m	-16,500	SoD
		-16,5		-16,500	
		Součet		-16,500	
18	19421165R	Plech Al 2,00x1000x2000 mm děrovaný + K19 a K20	kg	-37,490	SoD
		množství dle VV			
		-117,33		-117,330	
		provedené množství			
		33,42708+46,413		79,840	
		Součet		-37,490	
19	764775307R00	Ostatní prvky ke střechám ochranná mřížka proti plákům šířky 125 mm, , , dodávka a montáž	m	-107,380	SoD
		-107,38		-107,380	
		Součet		-107,380	
20	764778304R00	PREFA, oplechování římsy, PREFALZ, RŠ 370 mm	m	-28,450	SoD
		množství dle VV			
		-57		-57,000	
		Provedené množství			
		28,55		28,550	
		Součet		-28,450	
21	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	-0,199	SoD
		<i>Poznámka k položce: 50 m vodorovně</i>			
22	998764192R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,199	SoD
		<i>Poznámka k položce: 50 m vodorovně</i>			

3. VRN					
Díl	VN	Vedlejší náklady			
23	004111010R	Průzkumné práce	%	0,009%	SoD
24	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	%	0,028%	SoD
25	005211030R	Dočasná dopravní opatření	%	0,047%	SoD
26	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	0,095%	SoD
27	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,114%	SoD
28	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	%	0,001	SoD
Díl	VN	Vedlejší náklady			
29	Pol31	Provoz zařízení staveniště	%	0,616%	SoD
30	Pol32	Provozní vlivy	%	0,095%	SoD
31	Pol33	Územní vlivy	%	0,095%	SoD
32	Pol34	Koordinační činnost	%	4,690%	SoD
Celkem Kč bez DPH				162 830,56	

ZMĚNOVÝ LIST		B16
ZHOTOVITEL	KONSIT a.s.	
OBJEDNATEL	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6 zastoupená SNEO a.s. Nad Alejí 1876/2, 16200 Praha 6	
STAVBA	MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem	
MÍSTO	Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Důvod změny: Tento ZL postihuje skutečnost provádění keramických obkladů a dlažeb, která zahrnuje požadavky objednatele v průběhu provádění díla, vyplývající z konzultací nad funkční i estetickou stránkou stavebního díla konzultovanou s AD a uživatelem.		
Technický popis: ---		
Přílohy: Rozpočet změny		
Vliv na smluvní cenu:		
		Kč bez DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:		-182 066,94
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:		185 124,48
Rozdíl:		3 057,54
Vliv na dopracování PD: Dílčí doplnění DPS.		
Vliv na termín výstavby: Tento změnový list nemá vliv na smluvní termíny provádění díla dle SoD.		
Vydal:	Za zhotovitele, dne 15.04.2025 	
Podpis:		
Schválil:	Za objednatele, dne : 15.04.2025 	
Podpis:		

MŠ Libocká - celková rekonstrukce, vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

ZL č.

B16

Ocenění změny

Jedn.
cena dle

č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	
1. Přípočty							
Díl	711	Izolace proti vodě					
1	711212002RW1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě Podlahy : Rozsah dle VV -83,69625 Provedené množství 5,5+11,9+16,1+17,3+1,2+5,7+5,1+2,7+5,8+11,1+2,6+3,6*1.N P - m.č. 1.01+1.02+1.03+1.04+1.05+1.06+1.09+1.10+1.11+1.12+1.13 +1.14 3,2*1,75+11,6+22,7+17,3+1,9+1,3+9,1*2.NP - m.č. 2.01+2.02+2.03+2.04+2.05+2.06+2.10 94,614*0,06*sokl 1.-2.NP Součet	m2	80,081			SoD
		Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna 1NP - 1.04+1.05+1.06+1.09+1.10+1.02+1.13 : 5,375*2+3,37*2+0,905*2+1,515*2+2,3*2+2,48*2+1,685*2+3,0 15*2+1,429*2+2,025*2+3,005*2+3,7*2+1,2*2+2,29*2 2NP - B2.10, B 2.05, B 2.06, B 2.04, B 2.02 : 3,77*2+2,47*2+1,05*2+1,95*2+1,075*2+1,405*2+1,075*2+5,3 75*2+3,37*2+3,7*2+3,2*2 množství dle VV: -125,468 provedené množství 3,2*2+1,725*2+3,7*2+3,05*2+5,375*2+3*2+5,375*2+3,37*2+ 1,5*2+0,9*2+2,48*2+2,3*2*1.NP-m.c. 1.01+1.02+1.03+1.04+1.05+1.06 3,02*2+1,6*2+2,03*2+1,45*2+3,255*2+2,155*2+(6,32*2+1,75 5*2+1,2*2+0,8*2)+2,3*2+1*2+3,02*2+1,2*2* 1.NP- m.c.1.09+1.10+1.11+1.12+1.13+1.14 1*(0,9*3+0,7+0,9*2+0,9*3+1+0,9*2+1+0,6+0,9+1,8+0,7+0,9+ 0,9*2+0,9+0,9*3+1,8)*dvěře 1.NP 3,2+1,725*2+3,7*2+3,2*2+7,7*2+3*2+1*3+5,375*2+3,37*2+1, 95*2+1,08*2+1,4*2+1,8*2+3,77*2+2,47*2+1*2*2.NP - m.c. 2.01+2.02+2.03+2.04+2.05+2.06+2.10 1*(0,9*3+0,9*2+0,8*2+0,9*2+1,0+0,6+0,7+0,9+1,0+0,7+0,6+0 8)*dvěře 1.NP Součet	m	59,972			SoD
		Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Rozsah dle VV -81,600 Provedené množství Podlahy: 5,5+11,9+16,1+17,3+1,2+5,7+5,1+2,7+5,8+11,1+2,6+3,6*1.N P - m.c. 1.01+1.02+1.03+1.04+1.05+1.06+1.09+1.10+1.11+1.12+1.13 +1.14 3,2*1,75+11,6+22,7+17,3+1,9+1,3+9,1*2.NP - m.c. 2.01+2.02+2.03+2.04+2.05+2.06+2.10 94,614*0,06*sokl 1.-2.NP Stěny: 1.NP (3,7*2+3,2*2)*2,4-1,25*2,4-0,9*2,1*2-0,9*2,1*2-1,25*2,4 (5,372*2+3,37*2)*2,4-4*1,2-(0,6+0,9*2+1)*2,1 (0,905*2+1,12*2)*2,4-0,6*2,1 (2,45*2+2,48*2)*2,4-1,5*1,2-0,9*2,1 (2,025*2+1,4*2)*2,4-0,7*2,1 (1,2+2,45*2)*2,4-0,875*1,2 2.NP (3,2*2+3,7+0,2+0,115)*2,4+3,5*1,8-0,9*2,1*2-1,25*1,2 (3,37*2+5,375)*2,4+5,375*2,2-4*1-(0,6+0,7+0,9+1,0)*2,1 (1,95*2+1,075)*2,4+1,075*1,2-0,7*2,1	m2	279,483			SoD
3	711212000RW2						

		(1,075*2+1,405*2)*2,4-0,6*2,1		10,644	
		(1+3,77)*1,5		7,155	
		Ostění, parapety			
		24,875*0,2		4,975	
		Součet		279,483	
4	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m	t	0,376	SoD
		<i>Poznámka k položce</i> 50 m vodorovně měreno od těžiště pudorysné plochy skládky do těžiště pudorysné plochy objektu			
5	998711192R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,376	SoD
		<i>Poznámka k položce</i> 50 m vodorovně měreno od těžiště pudorysné plochy skládky do těžiště pudorysné plochy objektu			
Díl	771	Podlahy z dlaždic a obklady			
6	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	5,192	SoD
		1NP b ez zádveři SO 03 :			
		5,5+11,9+16,1+17,3+1,2+5,7+5,1+2,7+5,8+11,1+2,6+3,6			
		2NP schodiště B 2.01-podesta : 1,725*3,2			
		2NP - B2.09,B2.03 : 10,6+22,7			
		2NP - B2.10, B 2.05,B 2.06, B 2.04, B 2.02 :			
		9,1+1,9+1,3+17,3+11,6			
		Množství dle VV:			
		-168,620		-168,620	
		Provedené množství:			
		5,5+11,9+16,1+17,3+1,2+5,7+5,1+2,7+5,8+11,1+2,6+3,6*1.N			
		P - m.č.		88,600	
		1.01+1.02+1.03+1.04+1.05+1.06+1.09+1.10+1.11+1.12+1.13			
		+1.14			
		3,2*1,75+11,6+22,7+17,3+1,9+1,3+9,1*2.NP - m.č.		69,500	
		2.01+2.02+2.03+2.04+2.05+2.06+2.10			
		3,2*(3,41+1,5)*schodiště		15,712	
		Součet		5,192	
7	771575118RW1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	85,540	SoD
		Množství dle VV:			
		-76,420		-76,420	
		Provedené množství			
		5,5+11,9+16,1+17,3+1,2+5,7+5,1+2,7+5,8+(4*1,755+1,45*0,			
		8+1,65*1,2)+2,6+3,6*1.NP - m.c.		87,660	
		1.01+1.02+1.03+1.04+1.05+1.06+1.09+1.10+1.11+1.12+1.13			
		+1.14			
		3,2*1,75+11,6+22,7+17,3+1,9+1,3+9,1*2.NP - m.č.		69,500	
		2.01+2.02+2.03+2.04+2.05+2.06+2.10			
		3,2*1,5*mezipodesta		4,800	
		Součet		85,540	
8	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,800	SoD
		Množství dle VV			
		-13,300		-13,300	
		Provedené množství			
		1,2*2,7*2,6+3,6*1.NP - 1.05, 1.10, 1.13, 1.14		10,100	
		1,9+1,3*2.NP - 2.05, 2.06		3,200	
		3,2*1,5*mezipodesta		4,800	
		Součet		4,800	
9	771578014RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=10 mm a silikonem	m	28,492	SoD
		1NP - 1.04+1.05+1.06+1.09+1.10+1.11+1.13 :			
		5,375*2+3,37*2+0,905*2+1,515*2+2,3*2+2,48*2+1,685*2+3,0			
		15*2+1,429*2+2,025*2+2,155*2+3,255*2+1,2*2+2,29*2			
		1.12,1.14,1.03,1.01,1.02, :			
		6,315*2+1,755*2+1,2*2+3,015*2+3*2+5,375*2+3,2*2+1,725*			
		2+3,2*2+3,7*2+1,16*2			
		2NP - B2.10, B 2.05,B 2.06, B 2.04, B 2.02 :			
		3,77*2+2,47*2+1,95*2+1,075*2+1,405*2+1,075*2+5,375*2+3,			
		37*2+3,7*2+3,2*2			
		2NP - B2.03 : 7,68*2+3*2+1*2			
		Množství dle VV:			
		-211,428		-211,428	
		Provedené množství:			

		3,2*2+1,725*2+3,7*2+3,05*2+5,375*2+3*2+5,375*2+3,37*2+1,5*2+0,9*2+2,48*2+2,3*2*1.NP-m.c. 1.01+1.02+1.03+1.04+1.05+1.06		71,950	
		3,02*2+1,6*2+2,03*2+1,45*2+3,255*2+2,155*2+(6,32*2+1,755*2+1,2*2+0,8*2)+2,3*2+1*2+3,02*2+1,2*2" 1.NP-m.c.1.09+1.10+1.11+1.12+1.13+1.14		62,210	
		1*(0,9*3+0,7+0,9*2+0,9*3+1+0,9*2+1+0,6+0,9+1,8+0,7+0,9+0,9*2+0,9+0,9*3+1,8)*dvěre 1.NP		-23,800	
		3,2+1,725*2+3,7*2+3,2*2+7,7*2+3*2+1*3+5,375*2+3,37*2+1,95*2+1,08*2+1,4*2+1,8*2+3,77*2+2,47*2+1*2*2.NP - m.c. 2.01+2.02+2.03+2.04+2.05+2.06+2.10		89,280	
		1*(0,9*3+0,9*2+0,8*2+0,9*2+1,0+0,6+0,7+0,9+1,0+0,7+0,6+0,8)*dvěre 1.NP		-14,200	
		1,55*24"schodišť. stupně		37,200	
		(0,16+0,32)*12*3"sokl schodiště		17,280	
		Součet		28,492	
10	771475034R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	7,930	SoD
		Množství dle VV:			
		-15,91		-15,910	
		Provedené množství			
		0,16*12*3+0,36*11*3+1,5*2+3,2*hlavní schodiště		23,840	
		Součet		7,930	
11	771591483	Montáž spádového profilu	kus	3,000	URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_771591483			
		2+1"sprchové kouty 1.-2.NP		3,000	
12	SPNRZK10120 PC	Spádový profil Havos pravá nerez 120 cm	kus	3,000	URS
		SPNRZK10120PC			
13	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,992	SoD
		Poznámka k položce: 50 m vodorovně			
14	998771192R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,992	SoD
		Poznámka k položce: 50 m vodorovně			
Díl	781	Obklady keramické			
15	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	40,000	SoD
		množství dle VV			
		-20		-20,000	
		provedené množství			
		14+2+4+2+2+8" pro vodovodní baterie 1.NP		32,000	
		14+2+2+2+8" pro vodovodní baterie 2.NP		28,000	
		Součet		40,000	
16	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	7,000	SoD
		množství dle VV			
		-30		-30,000	
		provedené množství			
		4+9+1+2+2+2" pro vodovodní baterie 1.NP		20,000	
		4+9+2+1+1" pro vodovodní baterie 2.NP		17,000	
		Součet		7,000	
17	NRZO8250	Lišta Havos ukončovací nerez 250 cm	kus	46,000	URS
		90,55/2,5*1,25		45,275	
		46"zaokrouhleno		46,000	
18	781111131R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem	m	33,645	SoD
		Množství dle VV:			
		-110		-110,000	
		Provedené množství			
		2,4*8+2,4*4+4+1,2+2,4*4+1,2+0,8+2,4*4+1,6+1,2+2,4*4+1,4+2,02+2,4*4+0,875+1,2*2" 1.NP		83,895	
		2,4*8+1,25+2,4*2+2,1*2+4+1,2+2,4*4+1,2+2,4*4+1,2*2+0,8+1,5		59,750	
		Součet		33,645	
19	23153051R	tmel acetátový silikon; spárovací, těsnicí; š. spáry 10 až 25 mm; l = 6 až 18 mm; pro interiér i exteriér; sanitární; barva transparentní; přilnavost k materiálům dřevo, plastické hmoty, sklo, smalt, keram. obklady, elox. hliník, dlažby; tepelná odolnost	kus	26,000	SoD

		Množství dle VV			
		-20			-20,000
		provedené množství			
		26			26,000
20	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm	m	10,875	SoD
		Poznámka k položce: nadpraží z obkladaček pórovinných, keramických, hutných i neobhutných do tmele			
		-24			-24,000
		2,4*2+4+1,2+1,5+1,2+0,9+1,4+2,05+1,2+1,2*2+0,85*1.NP - 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.10, 1.13			21,500
		1,2*2+1,25+4+1,2+1,075*2+0,875+0,75*2*2.NP - 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.10			13,375
21	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,026	SoD
22	998781192R00	Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,026	SoD
2. Odpočty					
Díl	711y	Izolace proti vodě			
23	711212611RW1	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	-28,500	SoD
		množství dle VV:			
		-194,7			-194,700
		provedené množství			
		2,4*10+2,4*5+1,2*2+1,2*2+4+2,4*6+0,65*2+2,4*6+1,5+2,4*4 +1,45*2+2+1,8*3+1,2*2*1.NP - m.č.			98,700
		1.02+1.04+1.05+1.06+1.10+1.13			
		2,4*11+2,4*5+1,2*2+4+2,4*4+1*2+2,4*4+0,75*2*2.NP - m.č.			67,500
		2.02+2.04+2.05+2.06+2.10			
		Součet			-28,500
24	711212621RW1	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnící manžetou	kus	-15,000	SoD
		-15			-15,000
25	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	-15,432	SoD
		množství dle VV			
		-212,739			-212,739
		Provedené množství			
		1.NP			
		(3,7*2+3,2*2)*2,4-1,25*2,4-0,9*2,1*2-0,9*2,1*2-1,25*2,4			19,560
		(5,372*2+3,37*2)*2,4-4*1,2-(0,6+0,9*2+1)*2,1			30,022
		(0,905*2+1,12*2)*2,4-0,6*2,1			8,460
		(2,45*2+2,48*2)*2,4-1,5*1,2-0,9*2,1			19,974
		(2,025*2+1,4*2)*2,4-0,7*2,1			14,970
		(1,2+2,45*2)*2,4-0,875*1,2			13,590
		2.NP			
		(3,2*2+3,7+0,2+0,115)*2,4+3,5*1,8-0,9*2,1*2-1,25*1,2			26,016
		(3,37*2+5,375)*2,4+5,375*2,4-4*1-(0,6+0,7+0,9+1,0)*2,1			30,181
		(1,95*2+1,075)*2,4+1,075*1,2-0,7*2,1			11,760
		(1,075*2+1,405*2)*2,4-0,6*2,1			10,644
		(1+3,77)*1,5			7,155
		Ostění, parapety			
		24,875*0,2			4,975
		Součet			-15,432
26	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	-0,070	SoD
		Poznámka k položce: 50 m vodorovně měřeno od těžiště pudorysne plochy skládky do těžiště pudorysne plochy objektu			
27	998711192R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,070	SoD
		Poznámka k položce: 50 m vodorovně měřeno od těžiště pudorysne plochy skládky do těžiště pudorysne plochy objektu			
Díl	771y	Podlahy z dlaždic a obklady			
28	771576118RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do epoxidového tmele	m2	-81,600	SoD
