

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/174 Březnice, most ev.č. 174-006

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně inženýrská opatření

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 181/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **Stavební firma HOBST a.s.**
Soběšínská 2702, 190 16 Praha 9
IČ:48033251

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	256 271,84	256 271,84

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	256 271,84	256 271,84

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/174 Březnice, most ev.č. 174-006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 181/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 2.3
--	--	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo SMLD-0253/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.03.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Stavební firma HOBST a.s., Soběšinská 2702, 190 16 Praha 9

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 51 počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: DIO v ulici 9.května

Změna DIO vznikla na základě požadavku třetí strany. Na 1. kontrolním dnu stavby vzneslo město požadavek viz bod.5 zápisu z KD "Město Březnice požaduje zajistit bezpečný koridor pro chodce na obchůzně trase na mostě v ulici 9. května a fyzicky oddělit od jízdních pruhů z důvodů že se jedná o jedinou přístupovou cestu ke školám." (viz doklad č. 10)

PDPS nepředpokládala použití mostu v ulici 9. května jako objízdné trasy viz bod 4.1 "Protože nedošlo k dohodě mezi investorem KSÚS a městem Březnice ohledně použití místní komunikace (ulice 9. května), jsou na žádost investora a správce mostu objízdné trasy vedeny po silnicích I., II. a III. třídy. (viz doklad č. 11)

Předmětem změny je uspořádání DIO na mostě v ulici 9.května, kde je nově požadováno umožnění pohybu chodců po obou stranách komunikace, prostor pro pěší je oddělen svodidly "city block". Tím dojde ke zúžení volné šířky na mostě, kam se tím pádem vejde už jen jeden jízdní pruh, proto musí být doplněn semafor a provoz je puoštěn kyvadlově. Na toto nové uspořádání DIO nad rámec PDPS byla zhotovitel DIO zpracována doplňující cenová nabídka (doklad č. 12), která bylo proužita pro individuální kalkulaci změny.

Cena navrhovaných změn kladných je + 256 271,84 Kč bez DPH
Celková hodnota této Změny je + 256 271,84 Kč bez DPH

Změna vyvolá novou položku č. 201 (02720.N) Jednotková cena stanovena na základě individuální kalkulace.
Kalkulace obsahuje vyčíslení nákladů na DIO na mostě na místní komunikaci 9.května.

Výše uvedné skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí předvídané, jelikož se jedná o skutečnosti, jejichž nutnost provedení vznikla na základě požadavku třetí strany , v tomto případě na základě požadavku města Březnice.

Jedná se o Změny předvídané, které jsou podle článku 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu předvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	256 271,84	256 271,84	256 271,84

Technická pomoc Objednatele jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ondřej Cikhart	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. David Dvořáček	podpis	
Stavební dozor:	jméno	Daniel Balla DiS.	podpis	
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	podpis	xxx
Zástupce objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Lucie Jandíková	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ondřej Cikhart	podpis	

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: II/174 Březnice, most ev.č. 174-006
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 181/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
460 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	460 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	256 271,84	256 271,84	55,71%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	716 271,84	256 271,84	55,71%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/174 Březnice, most ev.č. 174-006 Číslo a název SO/PS: SO 181 Dopravně inženýrská opatření Číslo a název rozpočtu: SO 181 Dopravně inženýrská opatření								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								181					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky - JC dle individuální kalkulace											
201	02720.N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,000	1,000	1,000	256 271,84	0,00	0,00	256 271,84	256 271,84	256 271,84	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	256 271,84	256 271,84	256 271,84	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Dominik Cikhart, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Daniel Balla DiS., (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/174 Březnice, most ev.č. 174-006

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	18 999 999,99
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	22 584 723,67
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	27 327 515,64
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	118,87%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(20/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 584 723,68
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	18,87%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 700 000,00

12=(1)*0,15	Limit	2 850 000,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/174 Březnice, most ev.č. 174-006	- 1 195 654,20	4 780 377,88	3 584 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 195 654,20	4 780 377,88	3 584 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1	SO 201 MOST - PDPS vs. RDS, výkopy, nekont. odpady, sanace rubu NK	- 1 195 654,20	4 524 106,04	3 328 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 195 654,20	4 524 106,04	3 328 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	2	SO 181 Dopravně inženýrská opatření - DIO v ulici 9.května	0,00	256 271,84	256 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 271,84	256 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	II/174 Březnice, most ev.č. 174-006
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 181 Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	181/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení Zhotovitele o vzniku změny z 23.7.2024	1
09 09 Pokyn pověřené osoby Objednatele ze 17.8.202	2
10 Zápis ze vstupního KD z 2.4.2024	3
11 PDPS - D-1 SO-182 DIO	34
12 Kalkulace položky 02720.N	6
13 Fotodokumentace	2
14 Vyjádření AD z 13.9.2024	2
15 Vyjádření TDS z 2.10.2024	1
Počet listů celkem	52

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/174 Březnice, most ev.č. 174-006 Číslo a název SO/PS: SO 181 Dopravně inženýrská opatření Číslo a název rozpočtu: SO 181 Dopravně inženýrská opatření								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02710R	PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS	KPL	1,000			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		pasportizace technického stavu komunikací objízdných trasách											
		pasportizace dopravního značení na objízdných trasách											
		Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B]											
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
		Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B]											
		Nové položky - JC dle individuální kalkulace											
201	02720.N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,000	1,000	1,000	256 271,84	0,00	0,00	256 271,84	256 271,84	256 271,84	100,00%
	ZBV2	jedná se o náklady nad rámec PDPS vycházející z požadavku města Březnice JC dle individuální kalkulace výběrem ze 3 cenových nabídek: 1. CN 3K značky s.r.o. = 232 974,40 Kč + 10% 2. CN Proznak Praha, s.r.o. = 248 218,00 Kč 3. CN SEDOZ DZ s.r.o. = 262 948,00 Kč doklad č.12 Celkem 256 271,84 Kč											
		Celkem						460 000,00	0,00	256 271,84	716 271,84	256 271,84	55,71%

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

V Praze dne 23.07.2024

Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny na stavbě „II/174 Březnice, most ev.č. 174-006“ s dopadem na cenu Díla.

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel díla „II/174 Březnice, most ev.č. 174-006“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. Smlouvy objednatele SMLD-0253/00066001/2024 Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených okolností, které povedou ke změně ceny Díla.

- 1) Během provádění projekčních prací v rámci tvorby realizační dokumentace stavby došlo ke změnám technického řešení a upřesnění množství jednotlivých položek soupisu prací.
- 2) Během výkopových prací na předpolí opěry 01 byla provedena kontrola vytěženého materiálu, bylo zjištěno, že se nejedná o nekontaminovanou zeminu, ale o nekontaminovanou cihelnou suť. Během odstranění izolací bylo zjištěno, že odstraněná izolace neobsahuje nebezpečné látky. V rámci ZBV bude změněno zatřídění dotčených odpadů.
- 3) Po odstranění izolace na klenbách byl zjištěn nevyhovující stav podkladu pro provedení nového izolačního souvrství. Část povrchu rubu kleneb je nutné reprofilovat sanační maltou.
- 4) Na předpolí opěry OP01 byla po odstranění vozovkového souvrství zastižena cihelná suť, která je nevyhovující z hlediska mechanicko-fyzikálních vlastností, tuto suť je nutné ve vrstvě tl. 1,0 m před provedením nového vozovkového souvrství vytěžit a nahradit vyhovujícím materiálem – štěrkodrtí (odhad 260 m3)
- 5) Na základě požadavku Města Březnice a PČR bylo dodatečně upraveno DIO na objízdné trase a trase pro pěší v ulici 9.května.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Žádáme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme zvýšení ceny Díla o cca 2 500 000 Kč bez DPH. Změny nebudou mít dopad na termín dokončení Díla. Změny budou specifikovány v souvisejících ZBV.

S pozdravem

Ing. Dominik Cikhart
Stavební firma HOBST a.s.
Tel:
Email:

Naše značka: 09.2/07/Bre/2024/Ba
Vaše značka: Oznámení Zhotovitele o
vzniku Změny
Vyřizuje: Daniel Balla DiS
Datum: 15.08.2024

HOBST a.s.
Ing. Dominik Cikhart
Soběšinská 2702
190 16 Praha 9

Stavba: „II/174 Březnice, most ev.č. 174-006“

Věc: Pokyn pověřené osoby Objednatele

Vážený pane,
Objednateli stavby „**II/174 Březnice, most ev.č. 174-006**“ (dále jen „Stavba“) byl dne 23.07.2024, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 15.03.2024, č. smlouvy SMLD-0253/00066001/2024, mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - Objednatel a HOBST a.s. - Zhotovitel, (dále jen „Smlouva“), doručen elektronicky dopis bez uvedení čísla jednacího, označený jako

Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny na stavbě „II/174 Březnice, most ev.č. 174-006“ s dopadem na cenu Díla

ve kterém Zhotovitel oznamuje, že došlo ke vzniku/zjištění níže uvedených okolností:

- 1) Během provádění projekčních prací v rámci tvorby realizační dokumentace stavby došlo ke změnám technického řešení a upřesnění množství jednotlivých položek soupisu prací.
- 2) Během výkopových prací na předpolí opěry 01 byla provedena kontrola vytěženého materiálu, bylo zjištěno, že se nejedná o nekontaminovanou zeminu, ale o nekontaminovanou cihelnou suť. Během odstranění izolací bylo zjištěno, že odstraněná izolace neobsahuje nebezpečné látky. V rámci ZBV bude změněno zařazení dotčených odpadů.
- 3) Po odstranění izolace na klenbách byl zjištěn nevyhovující stav podkladu pro provedení nového izolačního souvrství. Část povrchu rubu kleneb je nutné reprofilovat sanační maltou.
- 4) Na předpolí opěry OP01 byla po odstranění vozovkového souvrství zastižena cihelná suť, která je nevyhovující z hlediska mechanicko-fyzikálních vlastností, tuto suť je nutné ve vrstvě tl. 1,0 m před provedením nového vozovkového souvrství vytěžit a nahradit vyhovujícím materiálem – štěrkoktrtí (odhad 260 m3)
- 5) Na základě požadavku Města Březnice a PČR bylo dodatečně upraveno DIO na objízdné trase a trase pro pěší v ulici 9.května.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Žádáme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme zvýšení ceny Díla o cca 2 500 000 Kč bez DPH. Změny nebudou mít dopad na termín dokončení Díla. Změny budou specifikovány v souvisejících ZBV.

Předpokládaný cenový dopad změny je
Změny kladné : + 2 500 000 Kč bez DPH
Změny záporné: - 0 Kč bez DPH

Zástupce Objednatele k výše uvedenému dodává, že předané Oznámení bere na vědomí a na základě vyjádření AD a TDS souhlasí s uvedenou Změnou rozsahu díla.

Zástupce Objednatele tímto vydává Pokyn ke změně rozsahu díla v rozsahu uvedeného Zhotovitelem a v souladu s Pod-čl. 5.1 Smlouvy vyzívá Zhotovitele o předložení Změny rozsahu Díla dle Pod-čl. 6.7 Smlouvy

Zástupce objednatelů ale uvádí, že neodsouhlasuje cenový dopad změny z důvodu neudržení kalkulace změny.

Pro ocenění Změny bude postupováno dle Pod-čl. 6.7 Smlouvy o dílo.

Změna z důvodu změny POV bude v SO 201.

Zástupce Objednatele předběžně zařazuje Změnu do Skupiny 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů. Jedná se o Změny nepodstatnou splňující podmínky stanovené v § 222 odst.6 ZZVZ. Změny administrujte pro každý objekt zvlášť dle Smlouvy, zákona o ZVZ a Směrnice Objednatele

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Objednatel uvádí, že tento Požadavek k předložení změny sám o sobě, není uznáním nároku a nezakládá právo na jakoukoliv platbu či prodloužení lhůty, které již bylo Zhotovitelem uplatněno nebo teprve uplatněno bude.

S pozdravem

Lucie Jandíková
zástupce Objednatele

Přílohy: Oznámení Zhotovitele
Vyjádření AD
Vyjádření TDI

Zápis ze vstupního Kontrolního dne stavby „II/174 Březnice, most ev.č. 174-006 Březnice“

Údaje dle Smlouvy o dílo	
Objednatel	Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje p.o. zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D, MBA, ředitelem. Zodpovědná osoba za realizaci Lucie Jandíková, mostní technik oblast Benešov, tel.: , email:
Zhotovitel	Stavební firma HOBST a.s. zastoupená Ondřejem Cikhartem , zodpovědná osoba ve věcech technických Ing. Dominik Cikhart, Zodpovědná osoba ve věcech ekonomických a finančních Ing. Marek Požár,
TDI	CS road construction s.r.o Bělehradská 858/23, 120 00 Praha Vinohrady Zastoupený Daniel Balla DiS – odpovědný TDI KBOZP Ing. Ondřej Snapka,

Kontrolní den			
číslo	1	konaný dne	2.4.2024
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 - Prezenční listina			

Program kontrolního dne	
1. Jedná se o vstupní kontrolní den stavby pro informování všech stran ohledně předpokládaného postupu výstavby. Stanoveny body projednáváné na kontrolních dnech	
2. Kontrola úkolů a prací	
3. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a) plnění věcného harmonogramu	
b) popis provedených prací	
c) finanční plnění	
d) fotodokumentace	
4. Kontrola kvality	
4. Stav BOZP a PO	
5. Různé	
6. Nové úkoly	

1. Kontrola úkolů a prací			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
1.	Předložení dokumentace	Zhotovitel předloží koncept RDS do konce května 2024.	
2	Předložení HMG	Zhotovitel předloží HMG k předání staveniště	
3	Zahájení prací	Bude upřesněno. Předpoklad červen 2024	
4	Organigram	TDS zpracuje Rukověť stavby s organigramem stavby	
5	Předání staveniště	Bude upřesněno. Předpoklad červen 2024	
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby			
		bude předkládána jednou měsíčně společně s fakturací za uplynulé období.	
a) plnění věcného harmonogramu		bude vyhodnocován vždy na KD	
b) popis provedených prací		bude součástí KD a zprávy Zhotovitele, plán prací bude Zhotovitel předkládat vždy ve čtvrtek do 14h a zasílat TDI a zástupci Objednatele	

c) finanční plnění	Zhotovitel předloží finanční HMG k předání staveniště
d) fotodokumentace	bude prováděna průběžně

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Zhotovitel předloží plán jakosti před zahájení staveniště
b) odsouhlasené materiály Tepř a KZP	Zhotovitel zašle žádost společně s doklady prokazující kvalitu.

4. Stav BOZP

KBOZP bude provádět průběžné kontroly
Zhotovitel předloží Rizika stavby a předá KBOZP

5. Různé

Zástupce Objednatele Ing. Jandíková seznámil přítomné s aktuálním stavem a situací před zahájením stavby
Město Březnice požaduje zajistit bezpečný koridor pro chodce na obchůzní trase na mostě v ulici 9. května a fyzicky oddělit od jízdních pruhů z důvodů že se jedná o jedinou přístupovou cestu ke školám.
Objednatel žádá Zhotovitele o předložení předběžného návrhu změny pro splnění požadavků města.
Zástupce NPÚ prověří možné deponování soch z mostu, které budou demontovány a bezpečně uloženy.

6. Nové úkoly

Úkol č.íslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1.	OIP	KBOZP zpracuje oznámení na OIP	KBOZP	8 dní před zahájením prací
2.	Rukovět stavby	TDI zpracuje rukovět stavby	TDI	Před předáním staveniště
3	HMG	Zhotovitel zpracuje a předloží věcný a finanční HMG stavby	Zhotovitel	Před zahájením prací
4	RDS	Zhotovitel předloží koncept RDS k odsouhlasení, před vydáním konceptu svolá výrobní výbor	Zhotovitel	Před zahájením prací
5	Kvalita	Zhotovitel předloží plán kvality	Zhotovitel	Před zahájením prací
6	Kvalifikované osoby	Zhotovitel oznámí a předloží potřebné kvalifikační doklady pro odpovědného geodeta, geotechnika, odpovědného technika bezpečnosti práce a odpovědného projektanta	Zhotovitel	Před zahájením prací
7	Rizika stavby	Zhotovitel předá KBOZP rizika stavby	Zhotovitel	Před zahájením prací
8	Předání staveniště	TDI zajistí protokol pro zřízení práva a přístupu na staveniště	TDI	Před zahájením prací
9	DIO	Zhotovitel předloží schválené Stanovení místní úpravy provozu	Zhotovitel	Před zahájením prací

7. Závěr

Datum konání příštího KD	Bude upřesněno na předání staveniště
--------------------------	--------------------------------------



Zapsal

Daniel Balla

TDI

 Podpis

Akce:

II/174 BŘEZNICE, MOST EV.Č. 174-006 – PD

Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE**
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5



Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ČÁST D

Číslo zakázky:	18 429 00	HIP:	Ing. David DVOŘÁČEK	
			+420 720 951 172	
Schválil:	Ing. Věclav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Kamil PEJCHAL	
	+420 226 206 171		+420 602 619 785	
Tech. kontrola:	Ing. Lukáš PROCHÁZKA	Vypracoval:	Ondřej GABRIEL	
	+420 702 033 396			

Objednatel:	KSÚS	Obec:	Březnice	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/174 BŘEZNICE, MOST EV.Č. 174-006 – PD			Datum	Stupeň
Objekt:	SO 182 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ			10/2022	PDPS
Příloha:				Souprava	Č. přílohy
					D.1

Akce: **II/174 Březnice, most ev. č. 174-006 - PD**

Stupeň: **PDPS**

Část: **D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH
A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ**

Objekt: **D.1 - SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ
OPATŘENÍ**

Č.	Příloha
1	TECHNICKÁ ZPRÁVA
2	OBJÍZDNÁ TRASA - SITUACE
3	OBJÍZDNÁ TRASA - SITUACE - DETAIL
4	OBJÍZDNÁ TRASA - SCHÉMA KŘÍŽENÍ

Akce:

II/174 BŘEZNICE, MOST EV.Č. 174-006 – PD

Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE**
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5



Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ČÁST D1

Číslo zakázky:	18 429 00	HIP:	Ing. David DVOŘÁČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
			+420 720 951 172	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Kamil PEJCHAL	
	+420 226 206 171		+420 602 619 785	
Tech. kontrola:	Ing. Lukáš PROCHÁZKA	Vypracoval:	Ondřej GABRIEL	
	+420 702 033 396			

Objednatel:	KSÚS	Obec:	Březnice	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/174 BŘEZNICE, MOST EV.Č. 174-006 – PD			Datum	Stupeň
Objekt:	SO 182 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ			10/2022	PDPS
Příloha:	TECHNICKÁ ZPRÁVA			Souprava	Č. přílohy
					1

Technická zpráva

Obsah:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
2. OBSAH OBJEKTU A JEHO UMÍSTĚNÍ	2
3. PODKLADY A PŘEDPISY	2
3.1. Podklady	2
3.2. Předpisy	2
4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	3
4.1. Navržená dopravní opatření	3
4.2. Technické provedení	4

1. Identifikační údaje

Stavba:	II/174 Březnice, most ev. č. 174-006
Objekt:	SO 182 Dopravně inženýrská opatření
Obec:	Březnice
Katastrální území:	Březnice
Kraj:	Kraj Středočeský
Stavebník/objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského Kraje Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Správce mostu:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského Kraje Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Projektant:	PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 IČ: 40763439, DIČ: CZ40763439 ZP: Ing. Kamil Pejchal

2. Obsah objektu a jeho umístění

Most převádí silnici II/174 přes řeku Skalice v obci Březnice. Silnice je kategorie MO 8/50.

Na základě závěrů prohlídek mostu bylo přistoupeno k opravě mostu. Předmětem opravy je sanace spodní stavby a nosné konstrukce, obnova izolace, vozovky a chodníků. Též navazující rovnoběžná opěrná zeď ve směru na náměstí bude rozebrána a postavená znovu. Součástí stavby je přeložka vodovodu na mostě ve stávající trase. Stávající neprovozovaný metalický sdělovací kabel f. CETIN bude před a za mostem přerušen a na mostě odstraněn.

Oprava mostu bude probíhat za vyloučeného provozu, který zasáhne komunikace II/174, III/00416 a Sadovou ulicí.

Obsahem stavebního objektu SO 182 je opatření pro zajištění dopravy během realizace této stavby. Jedná se zejména o vedení a vyznačení objízdné trasy.

3. Podklady a předpisy

3.1. Podklady

- Dostupné mapové podklady (online)
- Místní šetření a fotodokumentace

3.2. Předpisy

- Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb.
- Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

4. Technické řešení

4.1. Navržená dopravní opatření

Po dobu opravy mostu bude silnice II/174 v místě stavby uzavřena a doprava bude vedena po objízdnych trasách. Vzhledem ke křižovatkám v místě opravy mostu se uzavření dotkne i komunikace III/00416 (ulice Ludvíka Kuby) a místní komunikace (ulice Sadová).

Aby se zkrátila celková uzavírka komunikací, bude po dobu provádění sanací spodní stavby uzavřena pouze místní komunikace v ulici Sadová a provoz na mostě zůstane zachován. Teprve před zahájením prací na nosné konstrukci bude zcela uzavřen provoz na mostě.

Protože nedošlo k dohodě mezi investorem KSÚS a městem Březnice ohledně použití místní komunikace (ulice 9. května), jsou na žádost investora a správce mostu objízdny trasy vedeny po silnicích I., II. a III. třídy.

Z důvodu malé volné výšky pod železničním mostem ev. č. 19-021 (3.10m) je objízdna trasa pro vyšší vozidla vedena ulicí Na Spořilově, což odpovídá i stávajícímu dopravní situaci.

Objízdna trasa pro komunikaci II/174 (ulice Tochovecká):

Objízdna trasa je vedena po komunikaci II/174 směrem na Milín, kde pokračuje po komunikaci I/66 do Příbrami. V Příbrami se trasa napojí na komunikaci I/18 ve směru na Rožmitál pod Třemšínem, kde se trasa po komunikaci I/19 vrátí do Březnice.

Tato objízdna trasa je určena pouze vozidlům celkové výšky nepřesahující 3,1 m (výška limitována podjezdem ev. č. 174-005 viz příloha „Objízdna trasa – Situace“).

Délka objízdny trasy je 42.5 km.

Objízdna trasa pro komunikaci III/00416 (ulice Ludvíka Kuby):

Objízdna trasa je vedena po komunikaci III/00416 do místa křížení s místní komunikací – ulice Na Spořilově, odkud pokračuje po místní komunikaci Na Spořilově do křížení s komunikací II/174. Dále objízdna trasa vede po komunikaci II/174 směrem na Milín a pokračuje po výše uvedené objízdny trase.

Tato objízdna trasa je určena i vozidlům celkové výšky přesahující 3,1 m.

Celková délka objízdny trasy je 42.6 km.

Místní komunikace (ulice Sadová):

Do ulice Sadová bude po dobu stavby uzavřen vjezd od mostu a bude přístupná pouze ve směru od Městského zdravotního zařízení. Předpokládá se, že objízdna trasa bude využívána jen pro místní dopravu a povede ulicí Rožmitálskou a ulicí Obránců míru.

Objízdny trasy a uzavření komunikací u mostu jsou graficky znázorněny v přílohách „Objízdna trasa – Situace“ a „Objízdna trasa – Situace – detail“. Dočasné značení bude provedeno dle zásad a schémat v TP 65 a v TP 66.

Protože pracovní prostor zasahuje až k napojení komunikace II/174 na komunikaci I/19 ve směru do centra Březnice, bude nutné na komunikaci I/19 provést dopravní opatření ve smyslu TP 66 schéma B/3 na úkor odbočovacího pruhu, který nebude pro dopravu využíván.

Součástí stavebního objektu je osazení, údržba, případně doplnění a demontáž dopravního značení pro objízdné trasy.

4.2. Technické provedení

Pro přechodné dopravní značení budou použity celolisované přenosné dopravní značky z hliníkových nebo ocelových pozinkovaných plechů s dvojitým ohybem (i v rozích) základní velikosti s retroreflexní folií třídy min. RA2. Značky budou upevněny pomocí speciální úchytky na sloupky hliníkové příp. ocelové s pozinkováním zasazené do jedné příp. dvou podkladních desek. Značky musí být umístěny mimo průjezdný profil komunikace min. 1,20 m (spodní hrana značky nebo dodatkové tabulky) nad přilehlou vozovkou. Provedení značek musí odpovídat platné příloze vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a vzorovým listům staveb pozemních komunikací, část VL 6.1 „Svislé dopravní značky“.

Pro zabránění vjezdu na staveniště budou osazeny dopravní zařízení Z2 v sestavě s trojicí světel typu 1 (současné blikání všech světel) a dopravními značkami B1 a E13. Napájení světel se předpokládá z baterií.


Dočasné zneplatnění stávajících dopravních značek bude provedeno demontáží, zakrytím nebo přeškrtnutím oranžovo – černou páskou š. 50 mm.

V Praze, říjen 2022

Ondřej Gabriel

Přílohy:

- SO 182 – Dopravně inženýrská opatření – Objízdná trasa – situace
- SO 182 – Dopravně inženýrská opatření – Objízdná trasa – situace – detail
- SO 182 – Dopravně inženýrská opatření – Objízdná trasa – schéma křížení

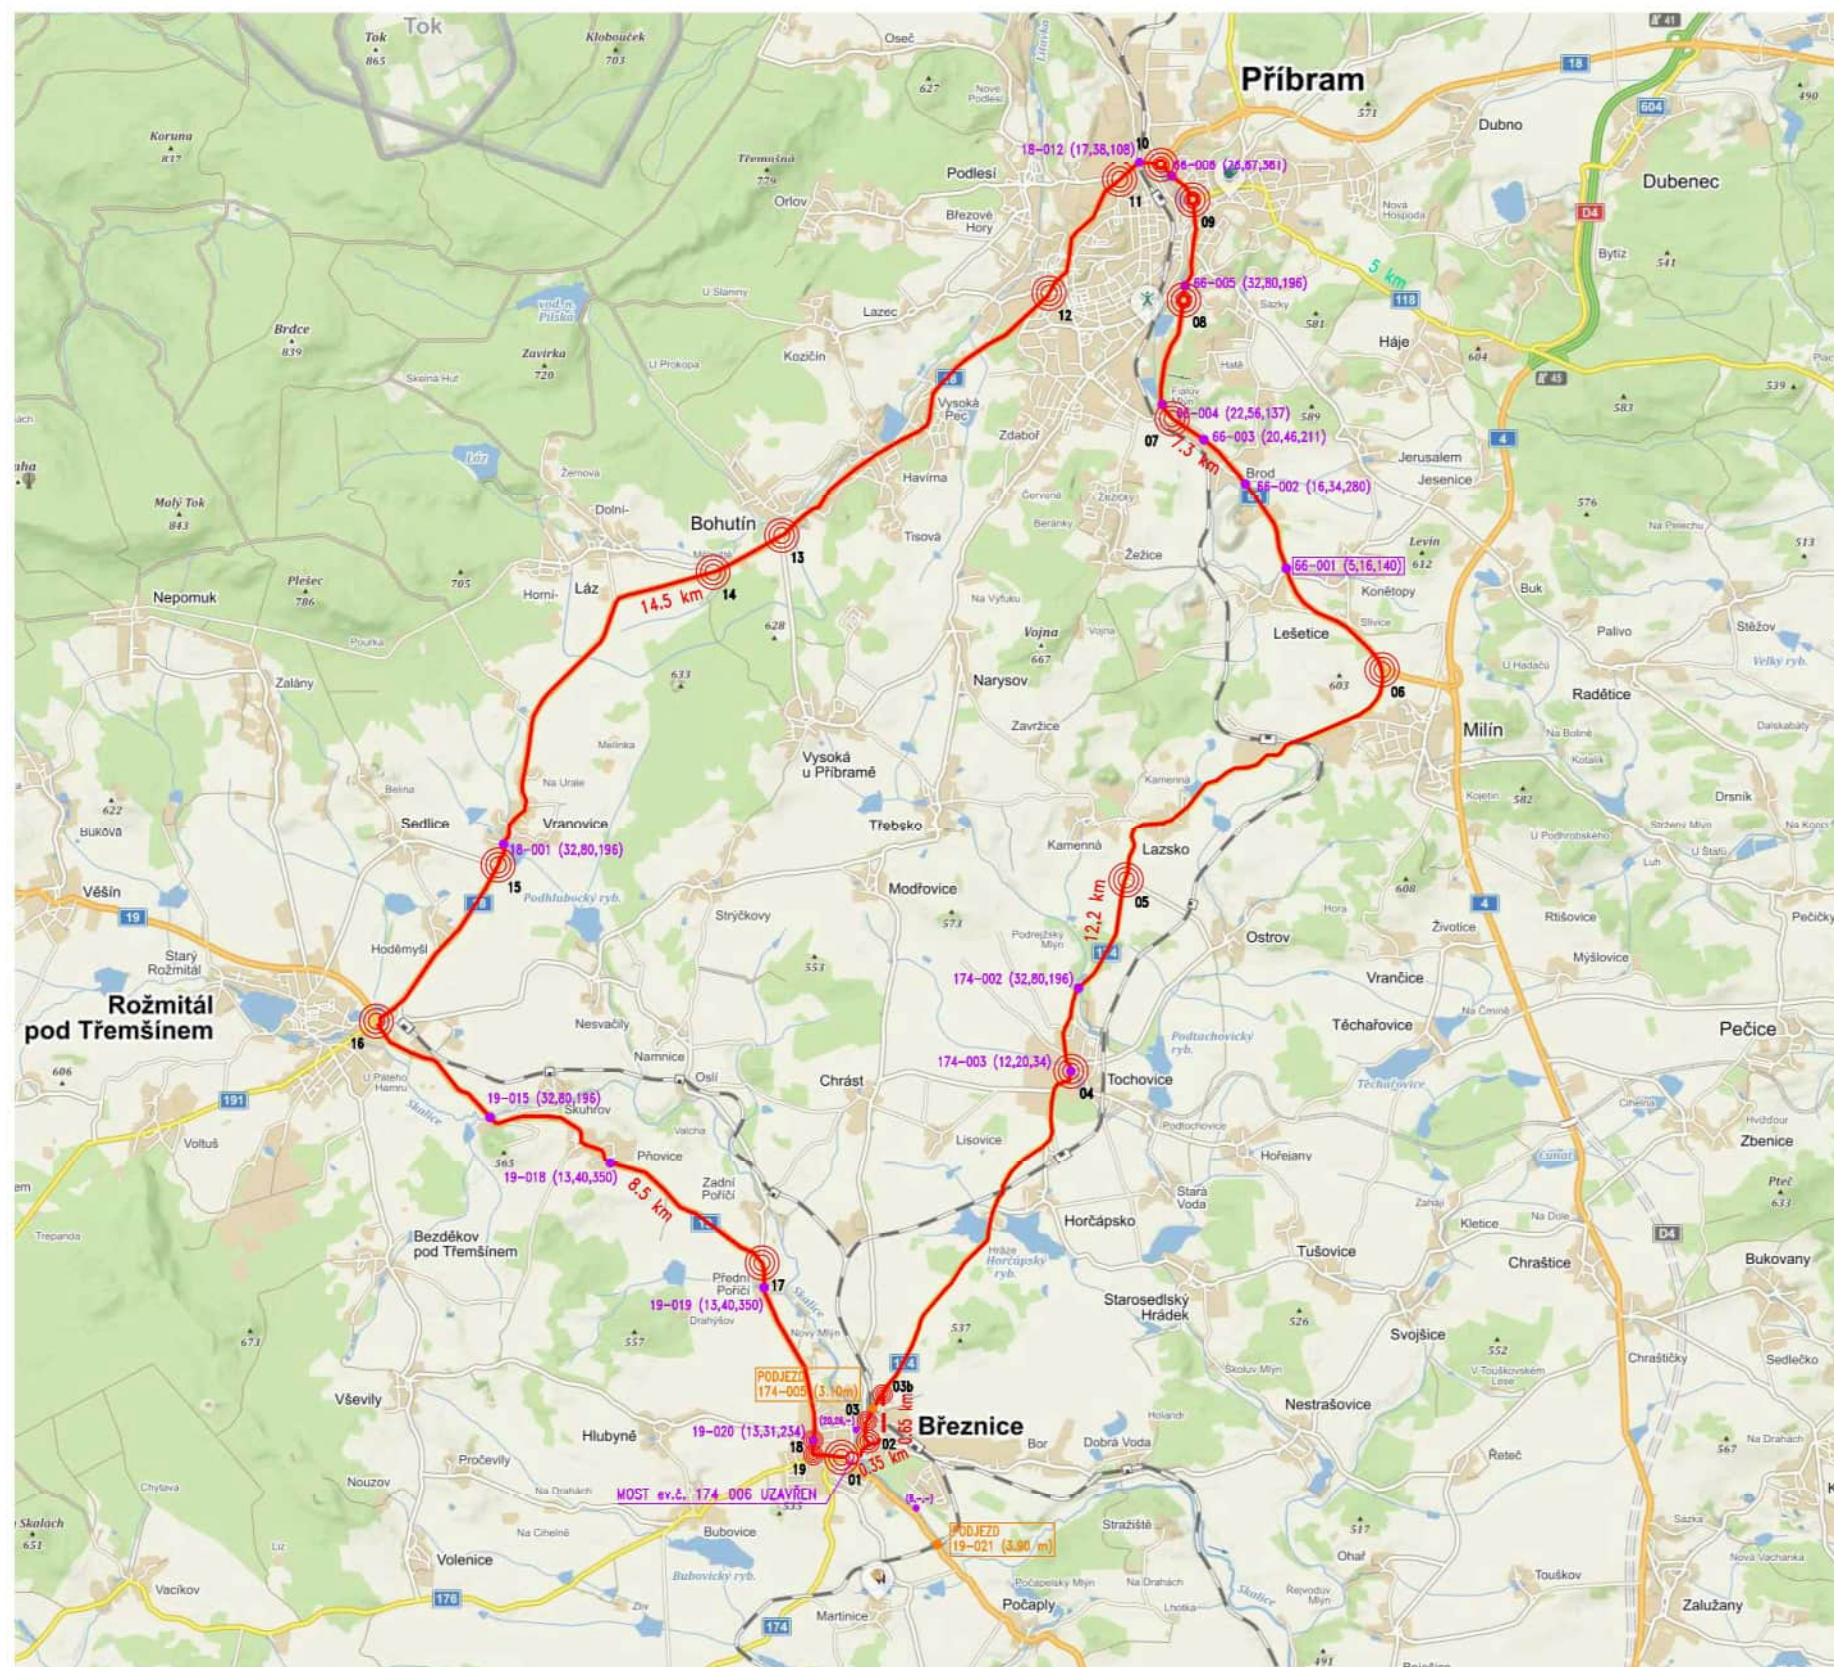


PARAMETRY OBJÍZDNÉ TRASY PRO II/174 (ULICE TOCHOVICKÁ):

ČÁST:	KOMUNIKACE:	DĚLKA [km]
1	II/174	12.200 km
2	I/66	7.300 km
3	I/18	14.500 km
4	I/19	8.500 km
5	II/174	0.000 km
		42.500 km

PARAMETRY OBJÍZDNÉ TRASY PRO III/00416 (ULICE NA SPORILOVĚ):

ČÁST:	KOMUNIKACE:	DĚLKA [km]
1	III/00416	0.350 km
2	MK	0.650 km
3	II/174	11.300 km
4	I/66	7.300 km
5	I/18	14.500 km
6	I/19	8.500 km
7	II/174	0.000 km
		42.600 km

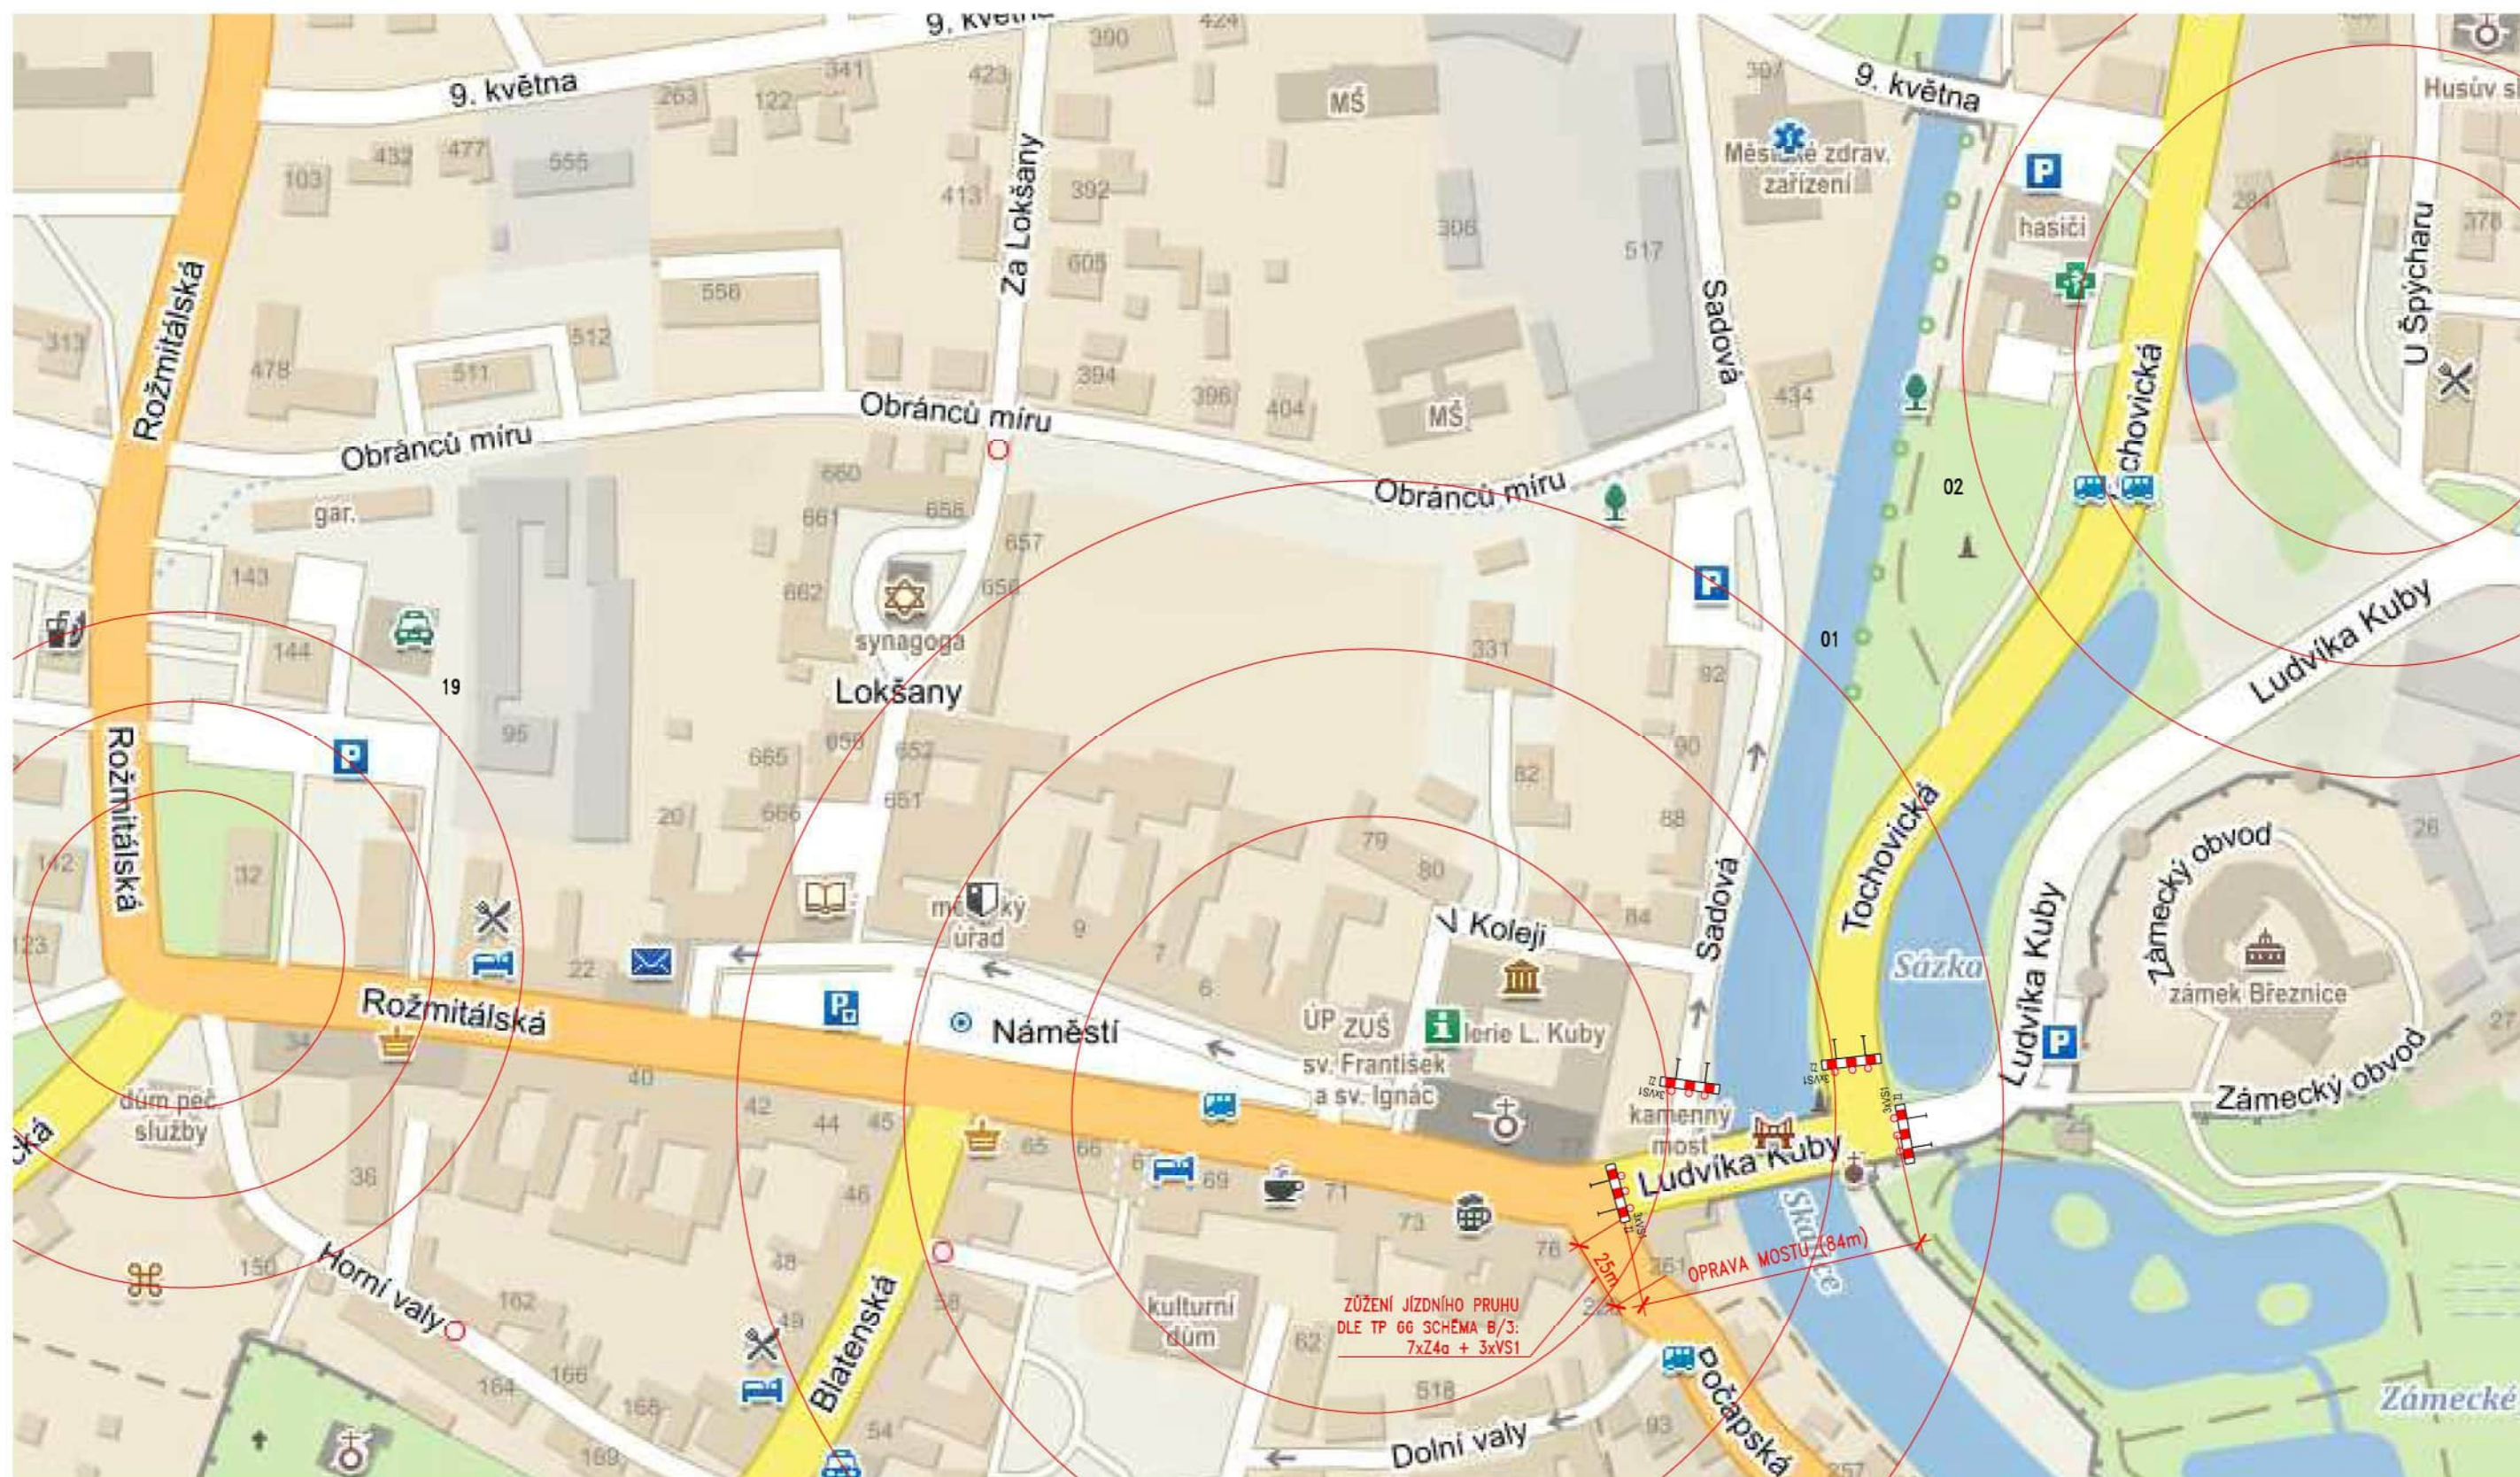

PARAMETRY OBJÍZDNÉ TRASY PRO ULICI SADOVÁ:

ČÁST:	ULICE:	DĚLKA [km]
1	ROŽMITÁLSKÁ	0.700 km
2	OBŘÁNCŮ MÍRU	0.400 km
3	SADOVÁ	0.350 km
		1.450 km

Č. přílohy

3

Akce:

II/174 Březnice, most ev. č. 174-006 - PD

Objekt:

SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Příloha:

OBJÍZDNÁ TRASA - SITUACE - DETAIL

PONTEX S.R.O.

Akce:

II/174 BŘEZNICE, MOST EV.Č. 174-006 – PD

Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE**
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5




Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv


ČÁST D1

Číslo zakázky:	18 429 00	HIP:	Ing. David DVOŘÁČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
			+420 720 951 172	
Schválil:	Ing. Věclav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Kamil PEJCHAL	
	+420 226 206 171		+420 602 619 785	
Tech. kontrola:	Ing. Lukáš PROCHÁZKA	Vypracoval:	Ondřej GABRIEL	
	+420 702 033 396			

Objednatel:	KSÚS	Obec:	Březnice	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/174 BŘEZNICE, MOST EV.Č. 174-006 – PD			Datum	Stupeň
Objekt:	SO 182 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ			10/2022	PDPS
Příloha:	OBJÍZDNÁ TRASA – SCHÉMA KŘÍŽENÍ			Souprava	Č. přílohy
					4

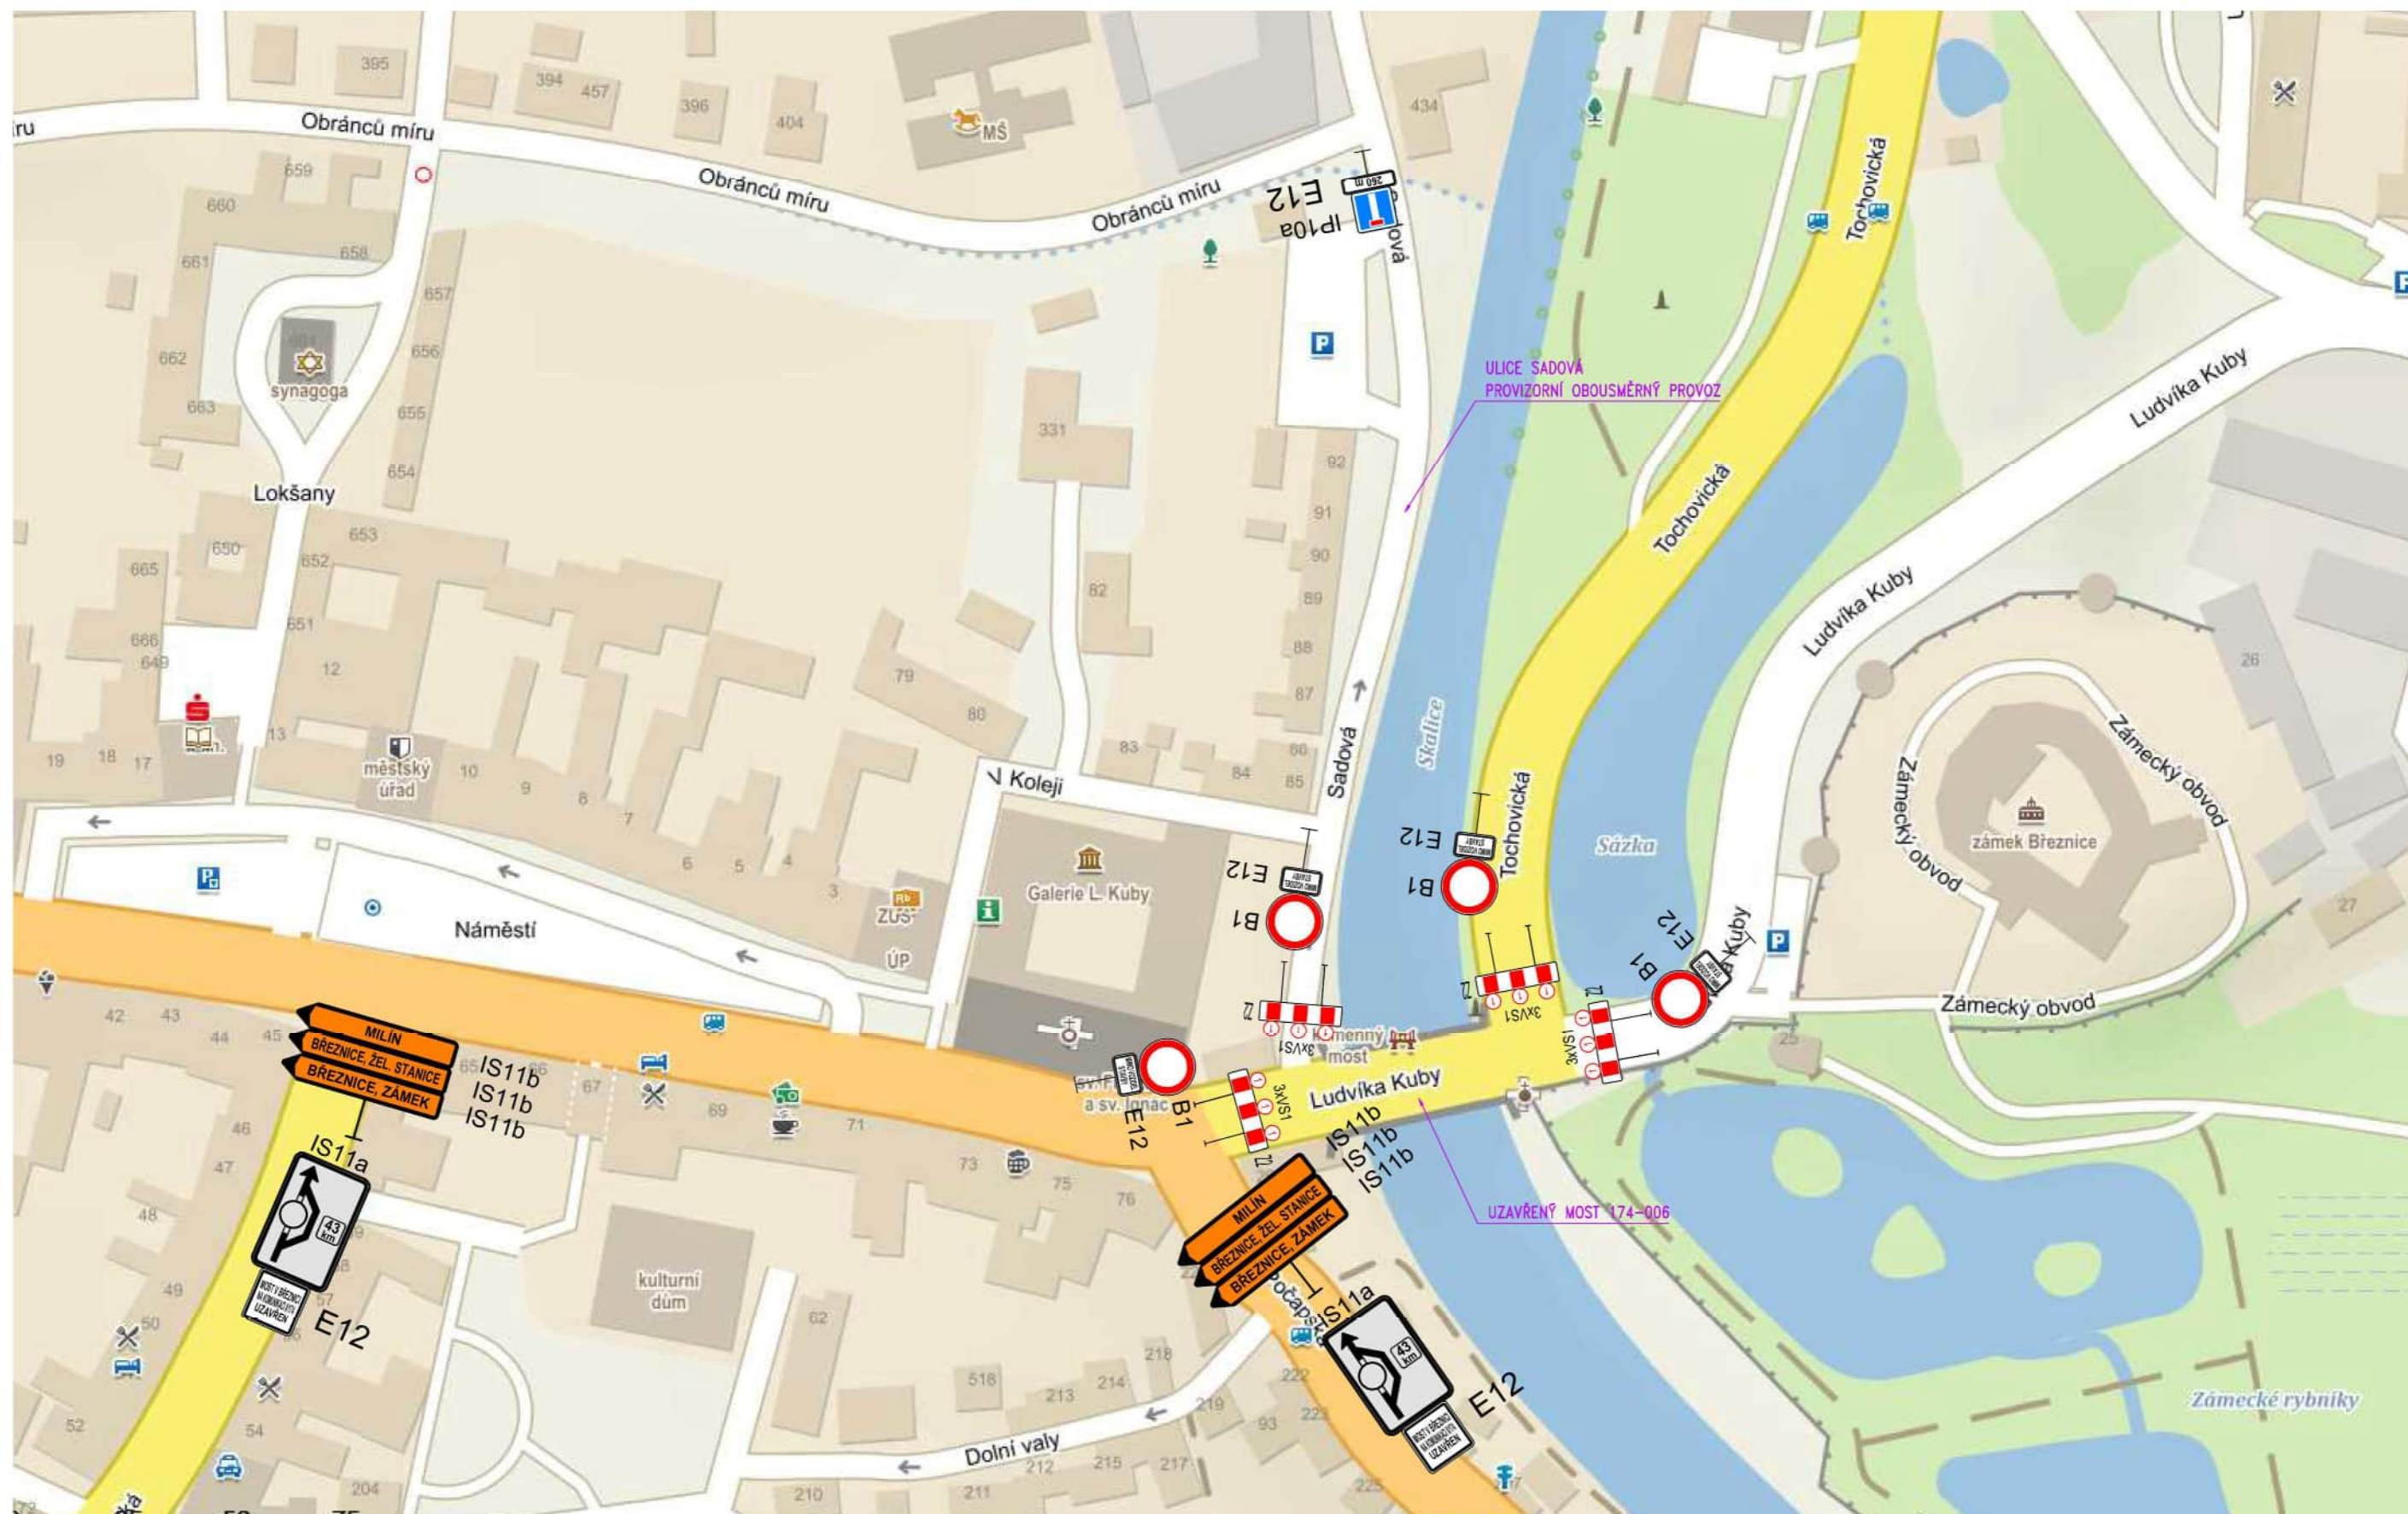

Č. přílohy 1	Akce: II/174 Breznice, most ev. č. 174-006 - PD Objekt: SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ Příloha: OBJÍZDNÁ TRASA - SCHÉMA KŘÍŽENÍ Č.1	PONTEx S.R.O.®
----------------------------	---	-----------------------





Č. přílohy

3

Akce:

II/174 Breznice, most ev. č. 174-006 - PD

Objekt:

SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Příloha:

OBJÍZDNÁ TRASA - SCHÉMA KŘÍŽENÍ Č.3

PONTEX^{S.R.O.}



Č. přílohy

4

Akce:

II/174 Březnice, most ev. č. 174-006 - PD

Objekt:

SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Příloha:

OBJÍZDNÁ TRASA - SCHÉMA KŘÍŽENÍ Č.4

PONTEX^{S.R.O.}



Č. přílohy

5

Akce:

II/174 Březnice, most ev. č. 174-006 - PD

Objekt:

SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Příloha:

OBJÍZDNÁ TRASA - SCHÉMA KŘÍŽENÍ Č.5

PONTEX^{S.R.O.}



Č. přílohy


6

Akce: II/174 Březnice, most ev. č. 174-006 - PD

Objekt: SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Příloha: OBJÍZDNÁ TRASA - SCHÉMA KŘÍŽENÍ Č.6

PONTEX^{S.R.O.}

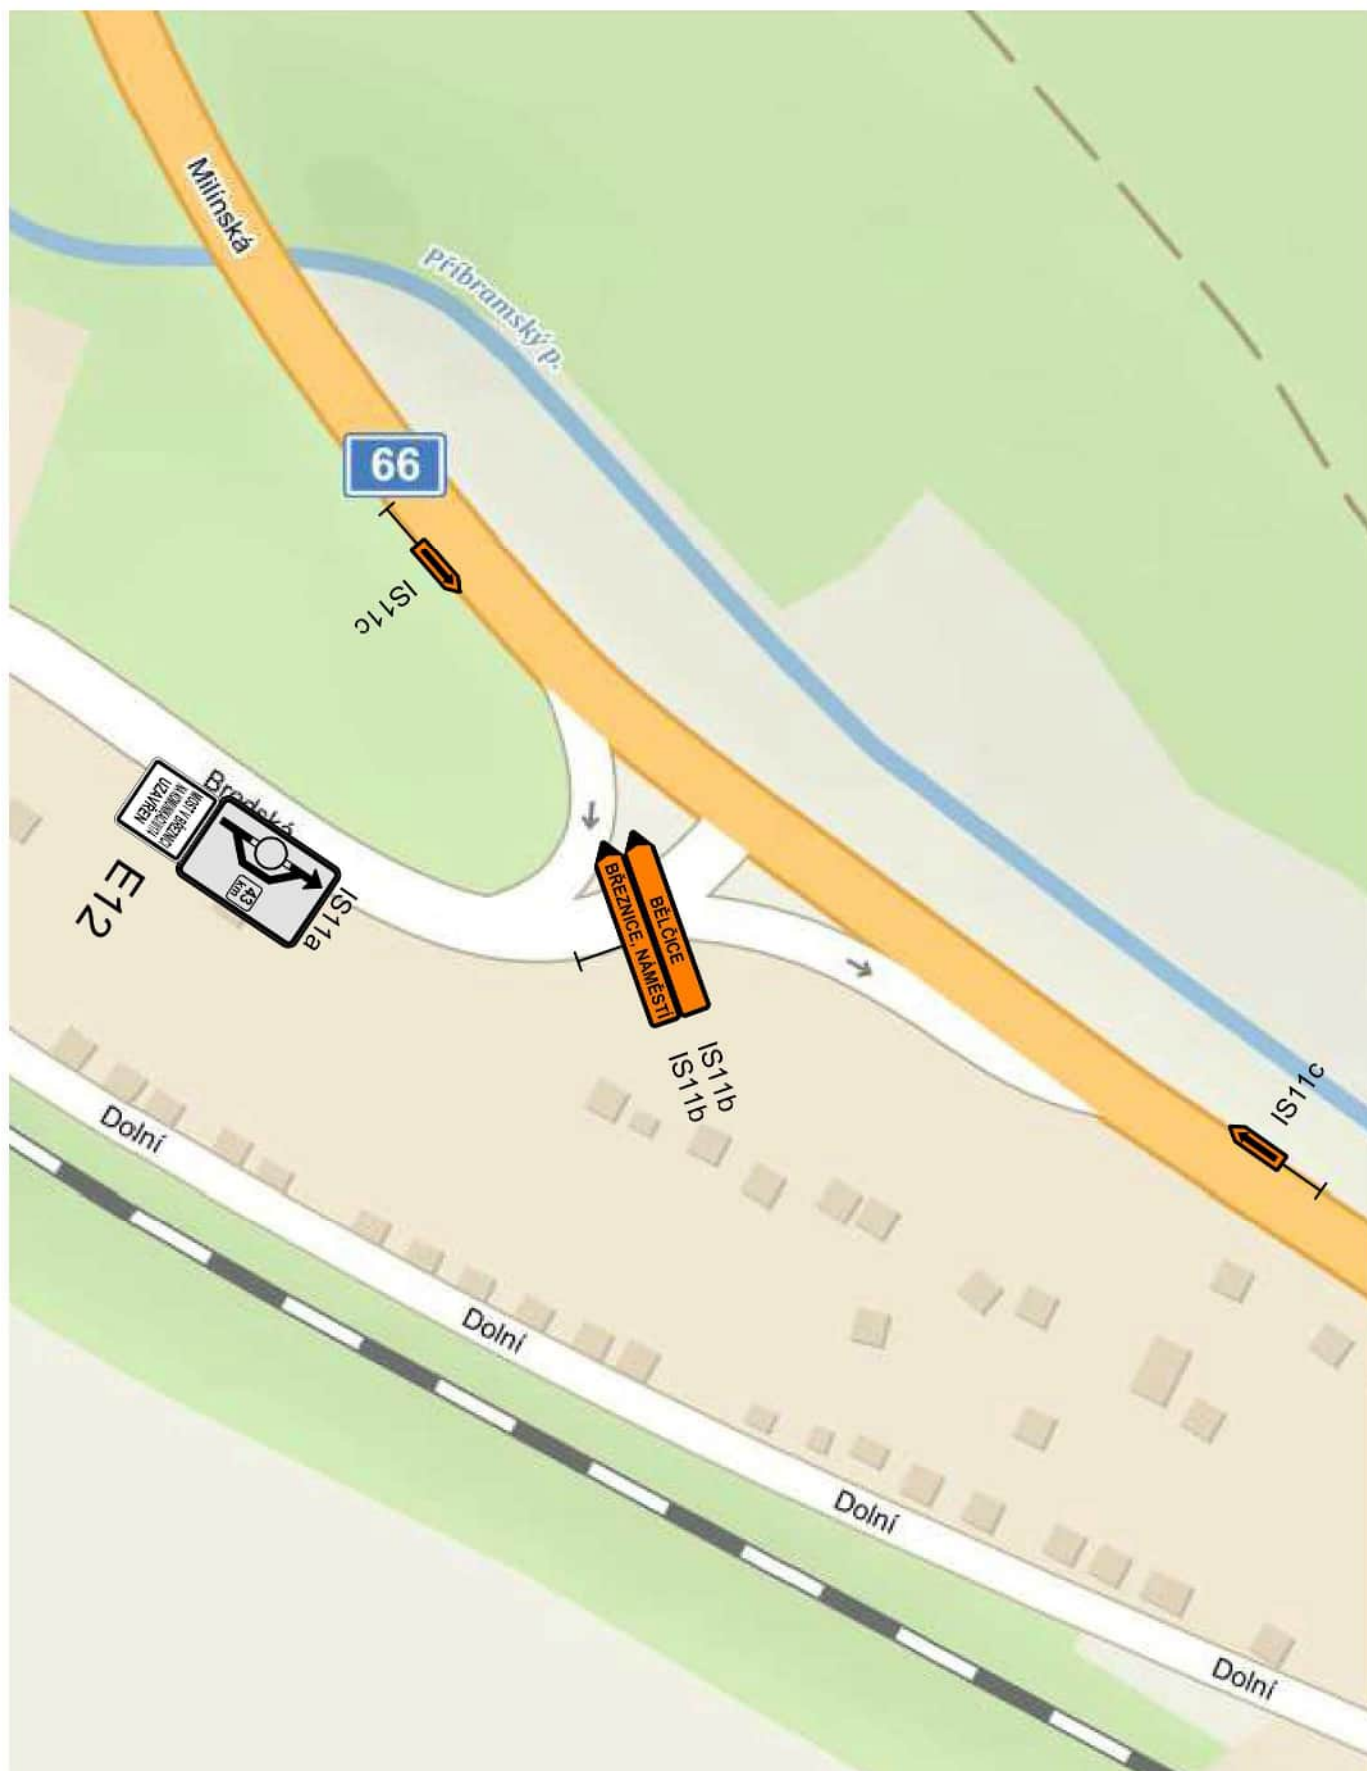

Č. přílohy

7

Akce:

II/174 Březnice, most ev. č. 174-006 - PD


Objekt:

SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Příloha:

OBJÍZDNÁ TRASA - SCHÉMA KŘÍŽENÍ Č.7

PONTEX^{S.R.O.}

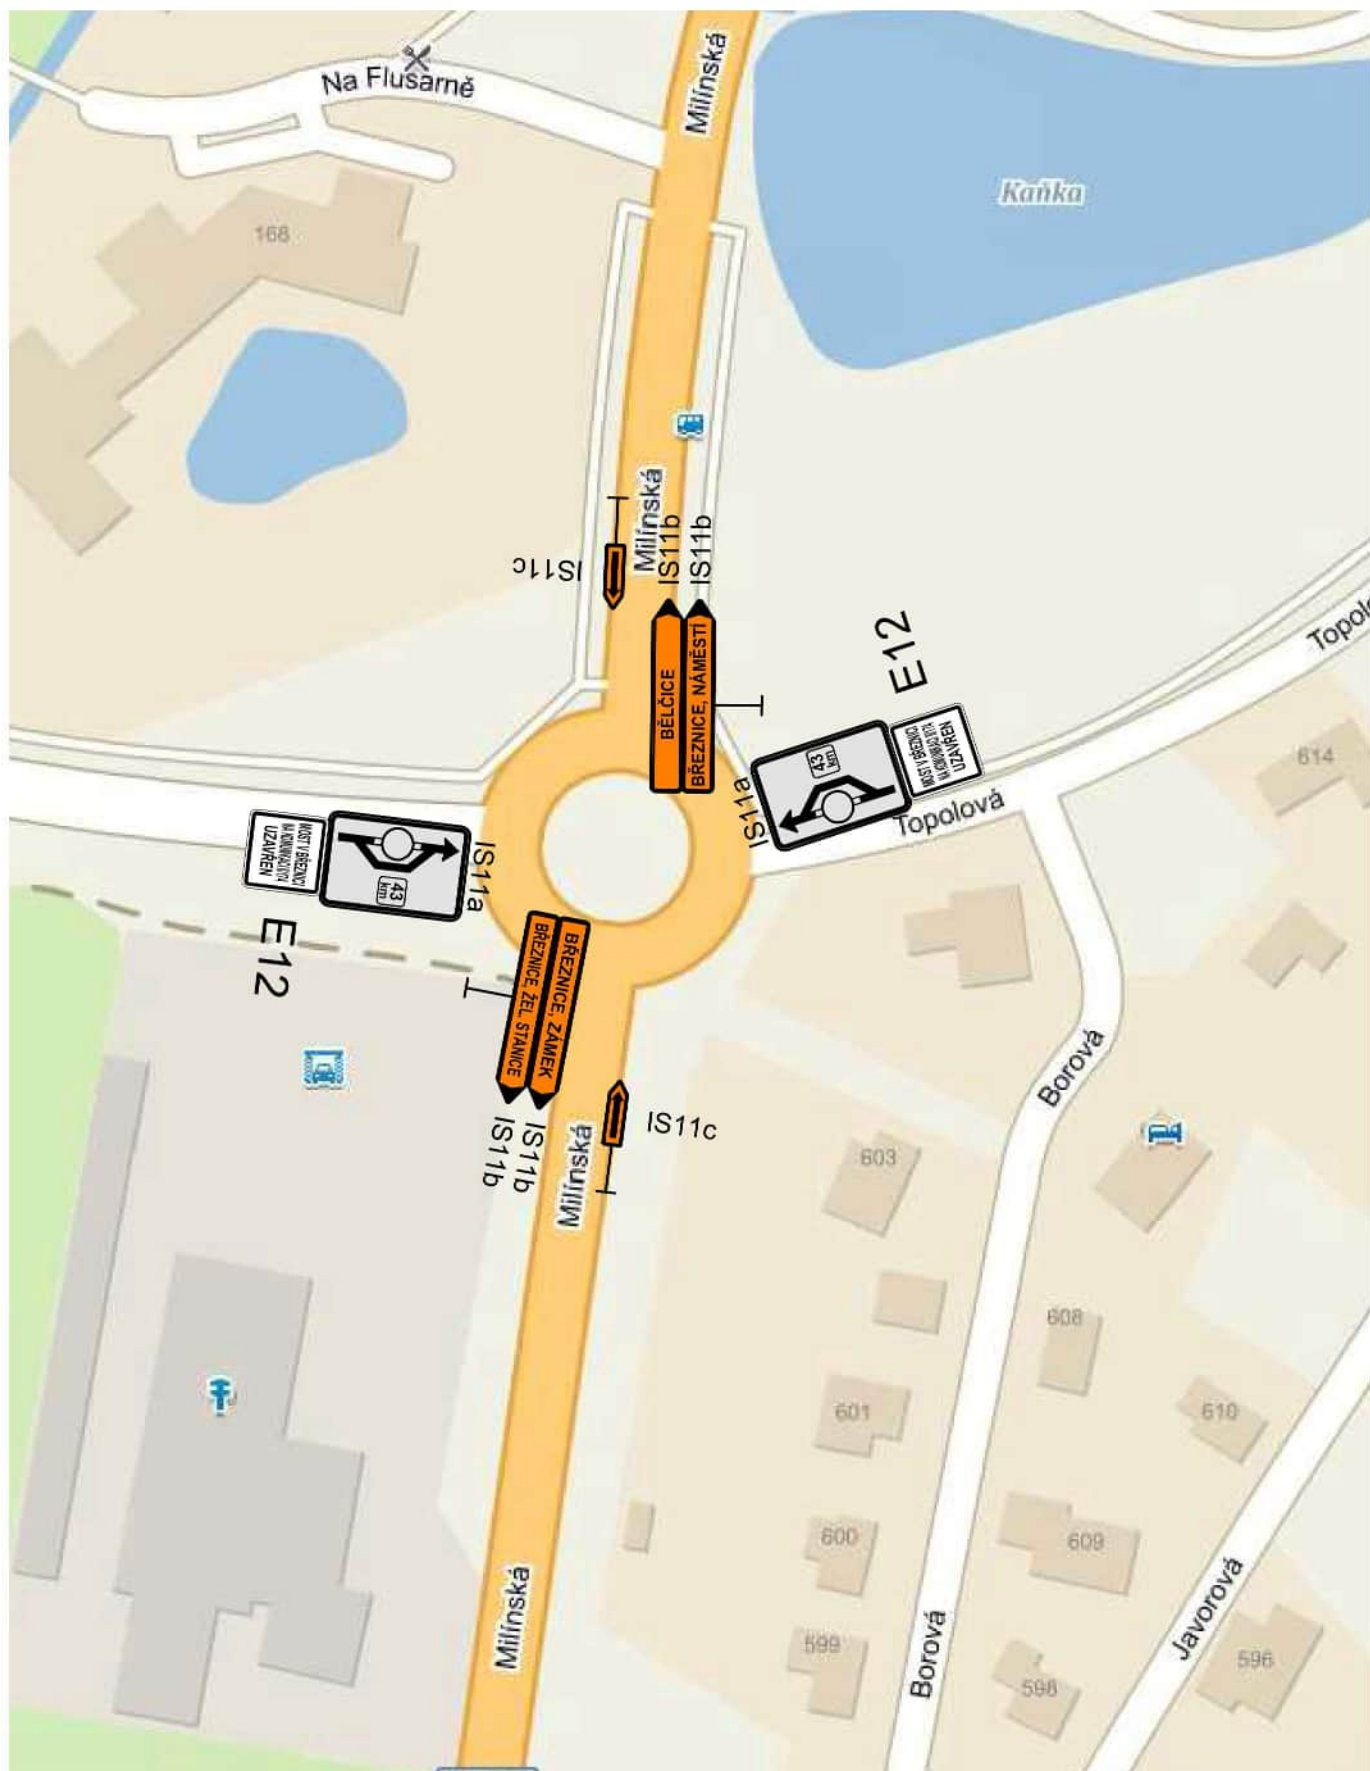

Č. přílohy

8

Akce: II/174 Breznice, most ev. č. 174-006 - PD

Objekt: SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Příloha: OBJÍZDNÁ TRASA - SCHÉMA KŘÍŽENÍ Č.8

PONTEX^{S.R.O.}



Č. přílohy

9

Akce:

II/174 Březnice, most ev. č. 174-006 – PD


Objekt:

SO 182 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Příloha:

OBJÍZDNÁ TRASA – SCHÉMA KŘÍŽENÍ Č.9

PONTEX^{S.R.O.}





Č. přílohy

11

Akce:

II/174 Březnice, most ev. č. 174-006 - PD


Objekt:

SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Příloha:

OBJÍZDNÁ TRASA - SCHÉMA KŘÍŽENÍ Č.11

PONTEX^{S.R.O.}

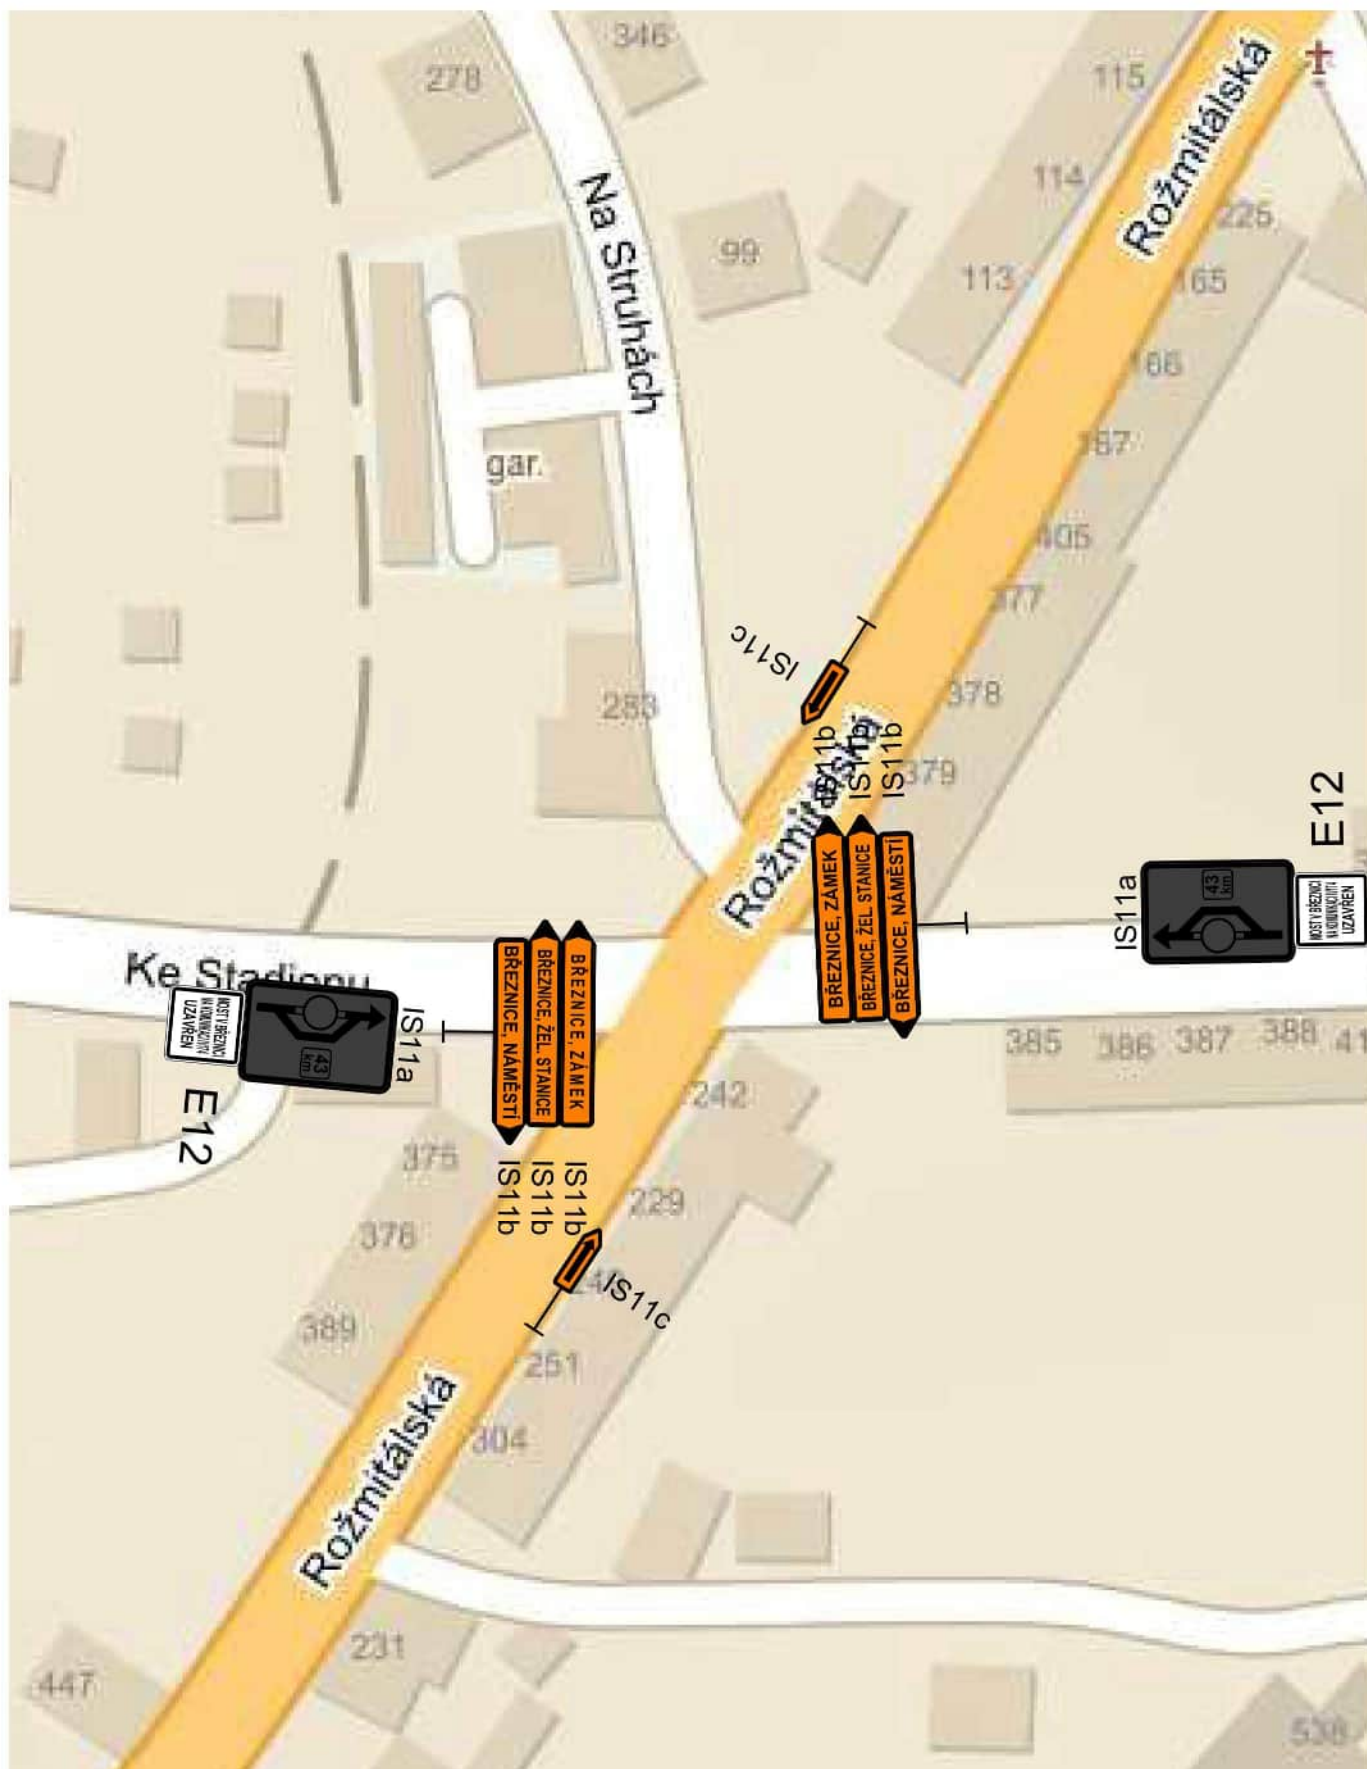

Č. přílohy

12

Akce:

II/174 Březnice, most ev. č. 174-006 - PD

Objekt:

SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Příloha:

OBJÍZDNÁ TRASA - SCHÉMA KŘÍŽENÍ Č.12

PONTEX^{S.R.O.}



Č. přílohy

13

Akce: II/174 Breznice, most ev. č. 174-006 - PD

Objekt: SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Příloha: OBJÍZDNÁ TRASA - SCHÉMA KŘÍŽENÍ Č.13

PONTEX^{S.R.O.}



Č. přílohy

14

Akce:

II/174 Breznice, most ev. č. 174-006 - PD

Objekt:

SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Příloha:

OBJÍZDNÁ TRASA - SCHÉMA KŘÍŽENÍ Č.14

PONTEX^{S.R.O.}



Č. přílohy


15

Akce: II/174 Breznice, most ev. č. 174-006 - PD

Objekt: SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Příloha: OBJÍZDNÁ TRASA - SCHÉMA KŘÍŽENÍ Č.15

PONTEX^{S.R.O.}





Č. přílohy

17

Akce:

II/174 Březnice, most ev. č. 174-006 - PD


Objekt:

SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Příloha:

OBJÍZDNÁ TRASA - SCHÉMA KŘÍŽENÍ Č.17

PONTEX[®] S.R.O.

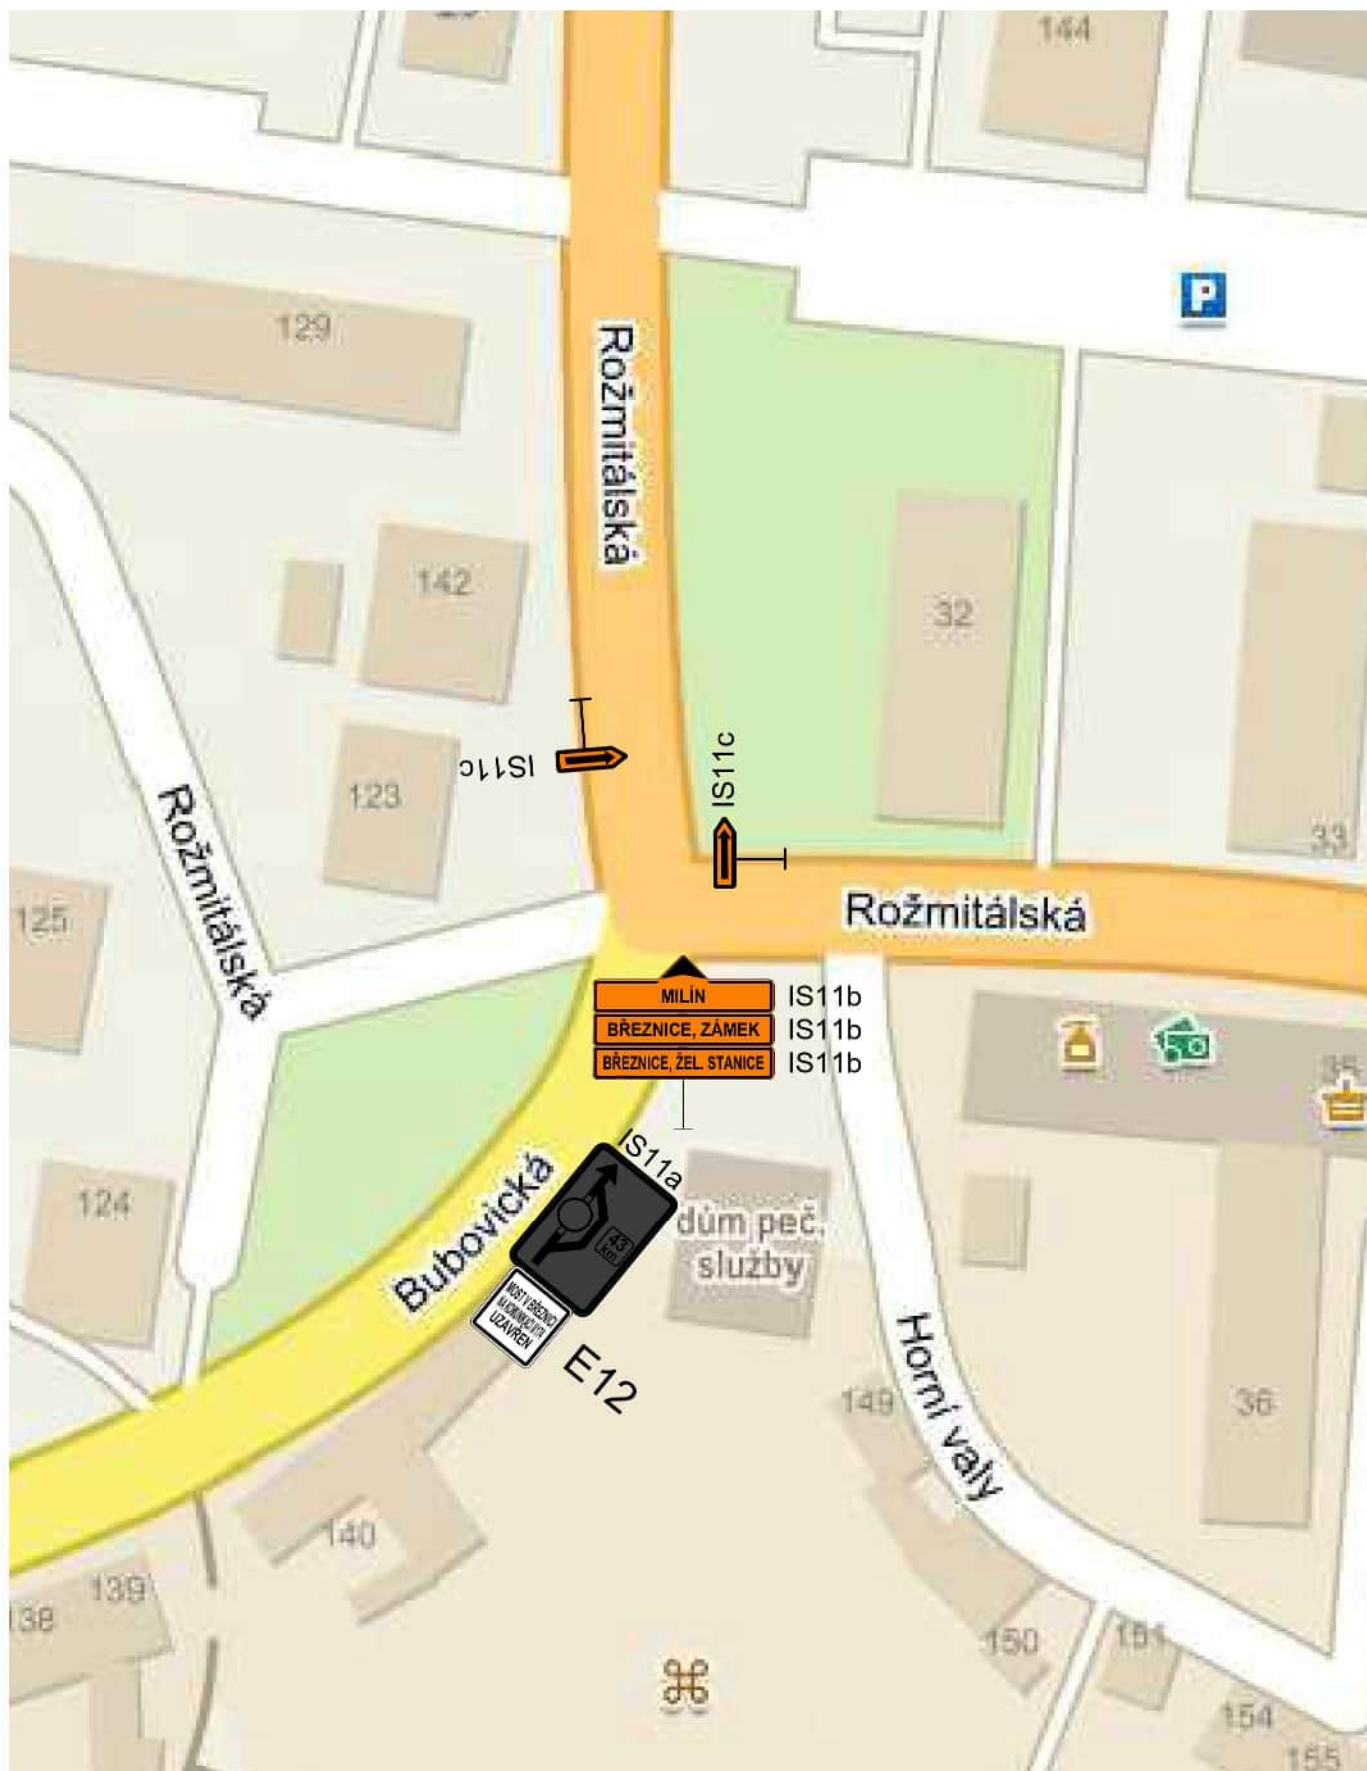

Č. přílohy

19

Akce:

II/174 Březnice, most ev. č. 174-006 - PD

Objekt:

SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Příloha:

OBJÍZDNÁ TRASA - SCHÉMA KŘÍŽENÍ Č.19

PONTEX^{S.R.O.}



Č. přílohy

20

Akce: II/174 Březnice, most ev. č. 174-006 - PD

Objekt: SO 182 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Příloha: OBJÍZDNÁ TRASA - SCHÉMA KŘÍŽENÍ Č.3b

PONTEx S.R.O.®

II/174 Březnice, most ev.č. 174-006

Cenová kalkulace položky

Stavební objekt: **SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**

p.č.	č. pol. v rozpočtu	popis položky		měrná jednotka	množství	
101	02720.N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY		KPL	1,000	
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena pol. v Kč celkem v soupisu prací	256 271,84	Jednotková cena pol. v Kč	256 271,84	
způsob ocenění:		Cena položky stanovena kalkulací přiměřených nákladů položky spolu s přírážkou přiměřeného zisku, výrobní režie a správní režie.				
Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací a jiných cenových položek						
p.č.	číslo položky	Název položky	MJ položky	množství/MJ agreg. Položky	cena v Kč/MJ	celkem v Kč
		Materiál				
		Materiál celkem				0,00
		Mzdy				
		Mzdy celkem				0,00
		Doprava				
		Doprava celkem				0,00
		Mechanizace				
		Mechanizace celkem				0,00
		Ostatní				
		CN 3K Značky s.r.o. - DIO most v ul. 9.května	kpl	1,000	232 974,40	232 974,40
		Ostatní celkem				232 974,40
		Přímé náklady celkem				232 974,40
		Režie				
		Výrobní režie	%	0,00		0,00
		Správní režie	%	5,00		11 648,72
		Režie celkem				11 648,72
		Přímé náklady + režie celkem				244 623,12
		Zisk	%	5,00		11 648,72
		Cena celkem na jednotku množství :				256 271,84



Jiráskova 1519
251 01 Říčany u Prahy
Telefon: +420 323 601 237
IČO: 25056271, DIČ: CZ25056271
www.3kznacky.cz

Společnost zapsána u Městského soudu Praha oddíl C, vložka
45840

Firma: **Stavební firma Hobst a.s**
Adresa sídla: Soběšinská 2702, 190 16 Praha 9
Kontakt: Ing. Michal Maryško
mobil:
e-mail:

Cenová nabídka č. 194/2024

Název akce: **CN 194 2024 HOBST BŘEZNICE MOST DIO**

Název	M.J.	KS	J.C.	Cena celkem
Realizace DIO po dobu 22-týdnů - dle soupisu prací	KPL	1	152 835,20	152 835,20 Kč
Vedlejší náklady (projekt + vyřízení DIR) - dle soupisu prací	KPL	1	21 514,80	21 514,80 Kč
Celková cena bez DPH				174 350,00 Kč

Doplňující CN	M.J.	KS	J.C.	Cena celkem
Doplnění DIO - most v ulici 9. května - dle soupisu prací	KPL	1	232 974,40	232 974,40 Kč
Celková cena bez DPH				232 974,40 Kč

PRO ZAČÁTEK REALIZACE A PRACÍ JE NUTNÉ ZASLAT OFICIÁLNÍ OBJEDNÁVKU NA EMAIL turon@3kznacky.cz

BEZ ŘÁDNÉ OBJEDNÁVKY NEMOHOU ZAČÍT UVEDENÉ PRÁCE.

Ceny jsou platné po dobu 30 dní.

Cena uvedena bez 21% DPH.

Fakturováno bude dle skutečnosti na základě potvrzeného soupisu prací.

Přehled viz příloha.

Cenovou nabídku zpracoval:

Patrik Turoň

email:

Tel:

Více informací dle obchodních podmínek 3k značky s.r.o. na www.3kznacky.cz

V Říčanech, dne

12.09.2024

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

CENOVÁ NABÍDKA - CN_194_2024_HOBST_BŘEZNICE MOST DIO

ZAKÁZKA: BŘEZNICE MOST DIO - doplnění DIO na mostě v ul. 9. května

Místo:

45471

Objednatel: Stavební firma HOBST a.s.

Zhotovitel: 3K značky, s.r.o.

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-------------	-------	----	----------	--------	-------------

Náklady z rozpočtu

232 974,40

232 974,40

		Počet dní výstavby - (přepočet pro pronájmy a servis 22 týdnů)	dní	154,000		
--	--	--	-----	---------	--	--

č.pol	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	J.cena	Celková cena
1		MONTÁŽ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	kpł	1,000	4 900,00	4 900,00
2		SERVIS A KONTROLA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A BATERII - 1x za 7 dní Servis vč. kontroly světelných zařízení z původního zadání	ks	22,000	1 000,00	22 000,00
3		SVĚTELNÁ SIGNALIZACE (SEMAFOR) - NÁJEM	ks	1,000	450,00	69 300,00
3		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ - NÁJEM	ks	51,000	3,60	28 274,40
4		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ - NÁJEM	ks	1,000	4,00	616,00
5		SMĚROVÉ DESKY Z4a - NÁJEM	ks	15,000	4,00	9 240,00
6		Montáž svodidel	bm	48,000	630,00	30 240,00
7		Demontáž svodidel	bm	48,000	630,00	30 240,00
8		Pronájem svodidel	bm	48,000	4,50	33 264,00
9		DEMONTÁŽ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	kpł	1,000	4 900,00	4 900,00



PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4

www.proznak.cz, e-mail: proznak@proznak.cz

tel., fax: 2 444 66 444; 2 44 46 47 48



Stavební firma HOBST
p. Maryško
Mstětická 533
250 91 Praha 8

Váš dopis značky / ze dne
z

Naše značka
k CN230109

Vyřizuje /telefon
ing. Liška/

Místo odeslání / dne
4.4.2024

V ě c : Cenová nabídka – Březnice most - DIO

V příloze posílám cenovou nabídku na výše uvedenou akci

S pozdravem

Ing. Stanislav Liška

Představitel managementu, vedoucí obchodu

Držitel certifikátu systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2016

IČO : 27166392

DIČ : CZ27166392

č. účtu: 5050019781/5500

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101345

CENOVÁ NABÍDKA - CN_HOBST_BŘEZNICE MOST DIO**ZAKÁZKA: BŘEZNICE MOST DIO - doplnění DIO na mostě v ul. 9. května**

Místo:

Objednatel: Stavební firma HOBST a.s.

Zhotovitel: Proznak Praha s.r.o.

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu						248 218,00
						248 218,00

Počet dní výstavby - (přepočet pro pronájmy a servis 22 týdnů)

dní

154,000

č. pol	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	J.cena	Celková cena
1		MONTÁŽ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
2		SERVIS A KONTROLA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A BATERIÍ - 1x za 7 dní Servis vč. kontroly světelných zařízení z původního zadání	ks	22,000	1 300,00	28 600,00
3		SVĚTELNÁ SIGNALIZACE (SEMAFOR) - NÁJEM	ks	1,000	520,00	80 080,00
3		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ - NÁJEM	ks	51,000	3,00	23 562,00
4		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ - NÁJEM	ks	1,000	3,50	539,00
5		SMĚROVÉ DESKY Z4a - NÁJEM	ks	15,000	3,50	8 085,00
6		Montáž svodidel	bm	48,000	500,00	24 000,00
7		Demontáž svodidel	bm	48,000	500,00	24 000,00
8		Pronájem svodidel	bm	48,000	6,00	44 352,00
9		DEMONTÁŽ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00



1) Krycí list rozpočtu

2) Rekapitulace rozpočtu

3) Rozpočet

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

CENOVÁ NABÍDKA - CN_HOBST_BŘEZNICE MOST DIO**ZAKÁZKA: BŘEZNICE MOST DIO - doplnění DIO na mostě v ul. 9. května**

Místo:

Objednatel: Stavební firma HOBST a.s.

Zhotovitel: SEDOZ DŽ s.r.o.

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu						262 948,00
						262 948,00

*Počet dní výstavby (přepočet pro pronájem a servis 22 týdnů)**dní***154,000**

č.pol	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	J.cena	Celková cena
1		MONTÁŽ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	kpl	1,000	6 990,00	6 990,00
2		SERVIS A KONTROLA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A BATERIÍ - 1x za 7 dní Servis vč. kontroly světelných zařízení z původního zadání	ks	22,000	1 500,00	33 000,00
3		SVĚTELNÁ SIGNALIZACE (SEMAFOR) - NÁJEM	ks	1,000	500,00	77 000,00
3		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ - NÁJEM	ks	51,000	4,00	31 416,00
4		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ - NÁJEM	ks	1,000	5,00	770,00
5		SMĚROVÉ DESKY Z4a - NÁJEM	ks	15,000	5,00	11 550,00
6		Montáž svodidel	bm	48,000	530,00	25 440,00
7		Demontáž svodidel	bm	48,000	530,00	25 440,00
8		Pronájem svodidel	bm	48,000	6,00	44 352,00
9		DEMONTÁŽ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	kpl	1,000	6 990,00	6 990,00



Stavební firma
HOBST



Držitel CERTIFIKACE č. 383/2001 dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14 001

FOTODOKUMENTACE

-

DIO na místní komunikaci 9. května

Stavba:

II/174 Březnice, most ev.č. 174-006



Foto 1



Foto 2

KSÚS Středočeského kraje
Lucie Jandíková
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 5580/2024/DDv

Datum: 13. 9. 2024

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.:

e-mail:

II/174 Březnice, most ev. č. 174-006

Vyjádření autorského dozoru č. 4 - stanovisko k ZBV č. 2

Obdrželi jsme ZBV č. 2 řešící změny SO 201. Provedli jsme její kontrolu a sdělujeme následující:

- Předmětem ZBV jsou tyto činnosti:
 - Doplnění DIO dle požadavku zástupců obce a Policie ČR. Jedná se o řešení pěších na obchozí trase.
- V ZBV jsou záporné a kladné změny obsaženy takto:
 - záporné změny: 0
 - kladné změny: + 259 271.84 Kč,
 - celkem v součtu: + 259 271.84 Kč.
- Se **ZBV č. 2 za AD** souhlasíme a nemáme k ní připomínky.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Lucie Jandíková,
2. TDI, CS road construction s. r. o., Daniel Balla,
3. Zhotovitel, HOBST a. s., Jakub Synek,

Naše značka: 04.3/09/Bre/2024/Ba
Vaše značka:
Vyřizuje: Daniel Balla DiS
Datum: 25.09.2024

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5
K rukám: Ing. Lucie Jandíková

Stavba: „II/174 Březnice, most ev.č. 174-006“

Věc: Vyjádření TDI k předloženému ZBV č. 2 – SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Dobrý den,

Dne 30.9.2024 zaslal Zhotovitel ZBV č. 2, týkající se SO 181 Dopravně inženýrské opatření, po zapracování připomínek od TDS

- Předmětem ZBV jsou tyto činnosti:
 - Doplnění DIO dle požadavku zástupců obce a Policie ČR. Jedná se o řešení pěších na obchozí trase.
- V ZBV jsou záporné a kladné změny obsaženy takto:
 - záporné změny: 0
 - kladné změny: + 256 271.84 Kč,
 - celková hodnota změny je: + 256 271.84 Kč.

Změna vznikla z důvodu požadavku města Březnice na úpravu dopravního značení.

Po doplnění nemá TDS k ZBV připomínky a doporučuje Objednateli k administraci.

S pozdravem
