



Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 81

SO 07.08 – Revitalizace nivy v prostoru Červeného kopce a řeky v km
39,200-39,760

- Mokřad – těsnící jádro



Brněnské komunikace



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
Geotechnik – vyjádření	3
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	NEOBSAZENO
Stavební deník	8
Fotodokumentace	9


"Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

**Důvodová zpráva – změnový list č. 81
Mokřad – těsnící jádro**

Při provádění SO 07.08 Revitalizace nivy (mokřad), byla zjištěna nevhodná geologie podloží. V místě plánovaného výkopu pro jílové těsnící jádro výhonu se nachází písky a štěrky, které nejsou stabilní a únosné i přes ohrázování prostoru mokřadu štětovnicovou stěnou a čerpání vody.

Jako náhrada zemního těsnění bude provedeno zaberanění štětovnicové stěny v ose původního jádra. Stěna bude zavázána do svahu levého břehu. Délka štětovnicové stěny bude celkem 96,5 m, délka použitých štětovnic je navržena 2 m. Štětovnice budou překryty původní navrženou skladbou výhonu, tj proštěrkovaný kamenný zához tl. 0,5 m s urovnáním líce, dále překrytý vrstvou 0,2 m říčních oblázků.

V Brně dne :



Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 13
Brno

Váš dopis

Naše značka

Vyřizuje

Brno
07.08.2024

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA – ETAPY VII A VIII“

Stanovisko projektanta ke změně „Mokřad – těsnící jádro“

Vážení,

Během provádění stavby Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII, SO 07.08 Revitalizace nivy (mokřad), byla zjištěna nevhodná geologie podloží. V místě plánovaného výkopu pro jílové těsnící jádro výhonu se nachází písky a štěrky, které nejsou stabilní a únosné. I přes ohrázování prostoru mokřadu štětovnicovou stěnou a čerpání vody z jímky není možné provést výkop těsnícího jádra v požadovaném tvaru. Hladina podzemní vody se aktuálně nachází cca 30 cm pod upraveným terénem, dochází k rychlému zaplavení výkopu a sesouvání stěn výkopu.

Na základě této nové skutečnosti konstatujeme následující:

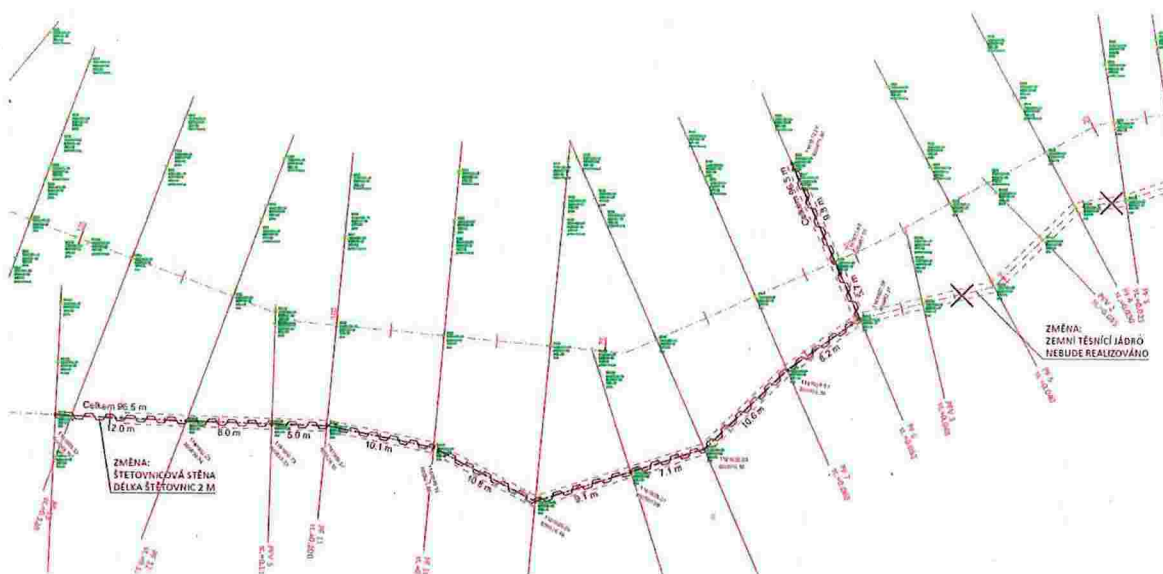
- Po diskuzi se zástupcem TDI a zhotovitele stavby ohledně dalšího postupu a prohlídce situace v terénu byla navržena změna technologie, která nahradí původní navržené těsnící jádro z nepropustné zeminy a nebude mít vliv na termín realizace
- Jako náhrada zemního těsnění bude provedeno zaberanění štětovnicové stěny v ose původního jádra. Stěna bude zavázána do svahu levého břehu. Délka štětovnicové stěny bude celkem 96,5 m, délka použitých štětovnic je navržena 2 m. Použité štětovnice typ GU 18N (128,1 kg/m²). Štětovnice budou překryty původní navrženou skladbou výhonu, tj proštěrkovaný kamenný zához tl. 0,5 m s urovnáním líce, dále překrytý vrstvou 0,2 m říčních oblázků.
- Dále bylo dohodnuto, že pro tuto změnu není nutná úprava výkresů dokumentace. Jako podklad pro realizaci bude sloužit situace s vytyčením polohy štětovnicové stěny, změna bude zapsána do stavebního deníku a zakreslena v rámci skutečného provedení.

Předpokládaný rozsah úpravy dokumentace:

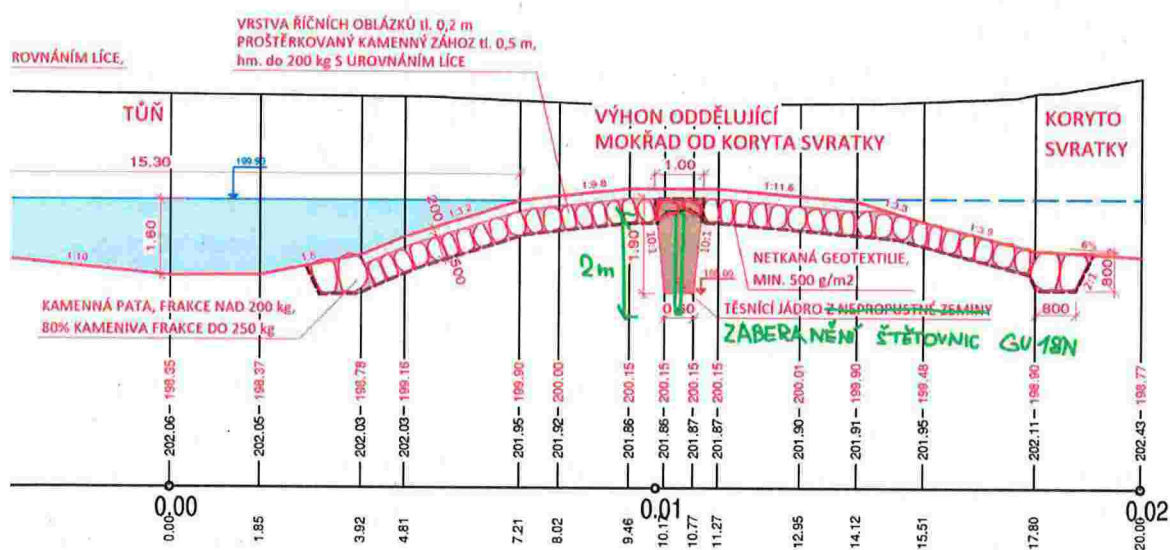
- Úprava vytyčovacích bodů osy štětovnicové stěny
- Rozdílový výkaz výměr

Přílohy:

- Úprava vytyčovacíh bodů osy štetovnicové stěny (pdf+dwg)



- Náčes změny řešení



Nábřeží řeky Svatky – revitalizace tůň mokřadu

Vyjádření k možnosti realizace těsnícího zámku


Na žádost pana z OHLA ŽS, a.s. se vyjadřuji k požadavku projektu a to v rámci revitalizace tůň mokřadu zřídit ve vzdálenosti cca 7 m od koryta řeky těsnící zámek do hloubky cca 2 m bez dalšího doporučení jak tento zámek v propustném podloží se sklony stěn výkopu 10:1 v bezprostřední blízkosti koryta řeky provést. **Stavba začala rýhu hloubit dle projektu, ale následně se ukázalo jak je navržené řešení nedomyšlené.** Již v hloubce cca 50 cm pod úroveň terénu se do rýhy filtrovala voda z řeky, způsobila sesouvání stěny a rozšiřování výkopu. Čerpání vody z výkopu je neřešitelné, protože by se musela čerpat celá řeka. Z těchto důvodů není možné projektem navržené řešení realizovat a je třeba aby to projektant dořešil nejlépe ve spolupráci s hydrologem.

Nejsem v této problematice odborník, já jen mohu předložit svůj názor a napadají mě tyto možné způsoby řešení.

- Těsnící zámek nahradit Larsenovou stěnou, anebo pomocí Larsenové stěny alespoň utěsnit stěnu výkopu od řeky tak, aby bylo možno zámek provést. Hloubka založení Larsenové stěny závisí na charakteru podloží, rozhodně musí být hlubší než dno výkopu zámku. Touto stěnou bude patrně na straně od řeky prosakovat voda, ale to se dá již řešit pomocí čerpací jímky.
- Místo výkopu zámku zřídit jílocementovou těsnící stěnu. S touto technologií nemám zkušenosti, ale vím, že byla s úspěchem použita při výstavbě VD Nové Mlýny
- Další možností je injektáž ze strany od řeky- ale také nemám další zkušenosti – nutno konzultovat s odbornými firmami kupř. Geotest.

V Brně 5.8.2024

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)	Změnový list č. 81
ÚSEK: D 02 - Revitalizace	
OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.:	
SO 07.08 – Revitalizace nivy v prostoru Červeného kopce a řeky v km 39,200-39,760 - Mokřad – těsnící jádro	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náhrada zemního těsnění zabíraním štětovnicové stěny v ose původního jádra. Stěna bude zavázána do svahu levého břehu, délka štětovnicové stěny bude celkem 96,5 m. DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.08 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 81 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.81 vícepráce, ZL č.81 méněpráce, ZL č.81 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Při provádění SO 07.08 Revitalizace nivy (mokřad), byla zjištěna nevhodná geologie podloží. V místě plánovaného výkopu pro jílové těsnící jádro výhonu se nachází písky a šterky, které nejsou stabilní a únosné i přes ohrázování prostoru mokřadu štětovnicovou stěnou a čerpání vody. Jako náhrada zemního těsnění bude provedeno zabíraní štětovnicové stěny v ose původního jádra. Stěna bude zavázána do svahu levého břehu. Délka štětovnicové stěny bude celkem 96,5 m, délka použitých štětovnic je navržena 2 m. Štětovnice budou překryty původní navrženou skladbou výhonu, tj proštěrkovaný kamenný zához tl. 0,5 m s urovnáním líce, dále překrytý vrstvou 0,2 m říčních oblázků.	
NAVRHL: 	
PŘÍKAZ VYDAL:  DATUM: _____	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM,  BKOM, 	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)	81
ÚSEK: D 02 – Revitalizace	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:
SO 07.08 – Revitalizace nivy v prostoru Červeného kopce a řeky v km 39,200-39,760	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
- Mokřad – těsnící jádro	

KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
	FAX:	OSOBNĚ:
	Mail	

PŘEDMĚT ZMĚNY: Náhrada zemního těsnění zabíraním štětovnicové stěny v ose původního jádra. Stěna bude zavázána do svahu levého břehu, délka štětovnicové stěny bude celkem 96,5 m.

DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.08

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 81

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.81 vícepráce, ZL č.81 méněpráce, ZL č.81 rozdílový“

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	758 432,50 Kč	159 270,83 Kč	917 703,33 Kč
Méněpráce:	- 300 644,73 Kč	- 63 135,39 Kč	- 363 780,12 Kč
Rozdíl:	457 787,77 Kč	96 135,43 Kč	553 923,20 Kč


PODPIS NAVRHOVATELE: 

VYJÁDŘENÍ:

OD:  **PODPIS:**  **DATUM:** _____

SCHVÁLIL: _____ **PODPIS:** _____ **DATUM:** _____

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

BKOM, 
BKOM, 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

Magistrát města Brna OI, 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085c1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

ZL 81 - změna těsnícího jádra

KSO:
Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:
Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:
DIČ:

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH			457 787,77
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	457 787,77	96 135,43
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			553 923,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085c1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

ZL 81 - změna těsnícího jádra

Místo: Nábřeží Svatky

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		457 787,77	553 923,20
D_02	Revitalizace	457 787,77	553 923,20
04a	SO 07.08 Revitalizace nivy v prostoru Červeného kopce a řeky v km 39,200 - 39,760, změna těs jádra	457 787,77	553 923,20
	ZL 81 - změna těsnícího jádra - MÉNĚPRÁCE	-300 644,73	-363 780,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: D_02 - Revitalizace

Soupis:

04a - SO 07.08 Revitalizace nivy v prostoru Červeného kopce a řeky v km 39,200 - 39,760, změna těs jádra

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum: 28. 9. 2020
Projektant: A PLUS a.s.
Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
Náklady soupisu celkem							457 787,77				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				457 787,77				
D	1		Zemní práce				500 876,20				
1	K	131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 5000 m3 strojně	m3	-163,000	203,20	-33 121,60	0,00000	-282,73250	0,00000	0,00000
	VV		-163		-163,000						
2	K	153111114	Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu	kus	175,000	319,80	55 965,00	0,00020	-282,73250	0,00000	0,00000
	VV		105/0,6" délka štětovnic přepočítaná na kusy		175,000				0,03500	0,00000	0,00000
	VV		cena SO 07.07, řezání štětovnic na 2m délku								
3	K	153112111	Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	210,000	300,10	63 021,00	0,00015	-282,73250	0,00000	0,00000
	VV		těsnící jádro						0,03150	0,00000	0,00000
	VV		105"2		210,000						
	VV		cena rozpočet D03								
4	K	153112121	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	210,000	1 400,00	294 000,00	0,00000	-282,73250	0,00000	0,00000
	VV		těsnící jádro						0,00000	0,00000	0,00000
	VV		105"2		210,000						
	VV		cena rozpočet URS 2024/II								
5	M	159202200	Štětovnice S240GP	t	26,901	12 841,40	345 446,50	1,00000	-282,73250	0,00000	0,00000
	VV		Viz PD D.03-01-001-701						26,90100	0,00000	0,00000
	VV		Štětová stěna (pl * m) (m = 128,1 kg/m2)								
	VV		SO 08.02								
	VV		210"128,1/1000		26,901						
	VV		Součet		26,901						
6	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-163,000	63,50	-10 350,50	0,00000	26,90100	0,00000	0,00000
	VV		-163		-163,000				0,00000	0,00000	0,00000
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-163,000	260,40	-42 445,20	0,00000	-163,000	0,00000	0,00000
	VV		-163		-163,000				0,00000	0,00000	0,00000
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 630,000	6,40	-10 432,00	0,00000	-163,000	0,00000	0,00000
	VV		10 příplateků		-1 630,000				0,00000	0,00000	0,00000
	VV		-10"163		-1 630,000				0,00000	0,00000	0,00000
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-163,000	50,80	-8 280,40	0,00000	-163,000	0,00000	0,00000
	VV		-163		-163,000				0,00000	0,00000	0,00000
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-293,400	200,00	-58 680,00	0,00000	-293,400	0,00000	0,00000
	VV		-163"1,8		-293,400				0,00000	0,00000	0,00000
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-163,000	10,20	-1 662,60	0,00000	-163,000	0,00000	0,00000
	VV		-163		-163,000				0,00000	0,00000	0,00000
12	K	172153103	Zřízení těsnícího jádra nebo vrstvy š přes 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 zhuštěných do 100 % PS C	m3	-163,000	138,60	-22 591,80	0,00000	-163,000	0,00000	0,00000
13	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	-309,700	226,00	-69 992,20	1,00000	-309,70000	0,00000	0,00000
D	998		Přesun hmot				-43 088,43		0,00000		0,00000
14	K	998332111	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	-282,733	152,40	-43 088,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_02 - Revitalizace

Soupis:

04a - SO 07.08 Revitalizace nivy v prostoru Červeného kopce a řeky v km 39,200 - 39,760, změna těs jádra

ZL 81 - Změna těsníciho jádra - VÍCEPRÁCE

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum:

28. 9. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Zhotovitel:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
Náklady soupisu celkem							758 432,50				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				758 432,50				
D	1		Zemní práce				758 432,50				
2	K	153111114	Příčné řezání ocelových zabíraných štětovnic z terénu	kus	175,000	319,80	55 965,00	0,00020	0,03500	0,00000	0,00000
	W		105/0,6" délka štětovnic přepočítaná na kusy		175,000						
	W		cena SO 07.07, řezání štětovnic na 2m délku								
	W										
3	K	153112111	Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	210,000	300,10	63 021,00	0,00015	0,03150	0,00000	0,00000
	W		těsnící jádro								
	W		105*2		210,000						
	W		cena rozpočet D03								
4	K	153112121	Zabíraní ocelových štětovnic na dl do 4 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	210,000	1 400,00	294 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	W		těsnící jádro								
	W		105*2		210,000						
	W		cena rozpočet URS 2024/II								
5	M	159202200	Štětovnice S240GP	t	26,901	12 841,40	345 446,50	1,00000	26,90100	0,00000	0,00000
	W		Viz PD D.03-01-001-701								
	W		Štětová stěna (pl * m) (m = 128,1 kg/m2)								
	W		SO 08.02								
	W		210*128,1/1000		26,901						
	W		Součet		26,901						

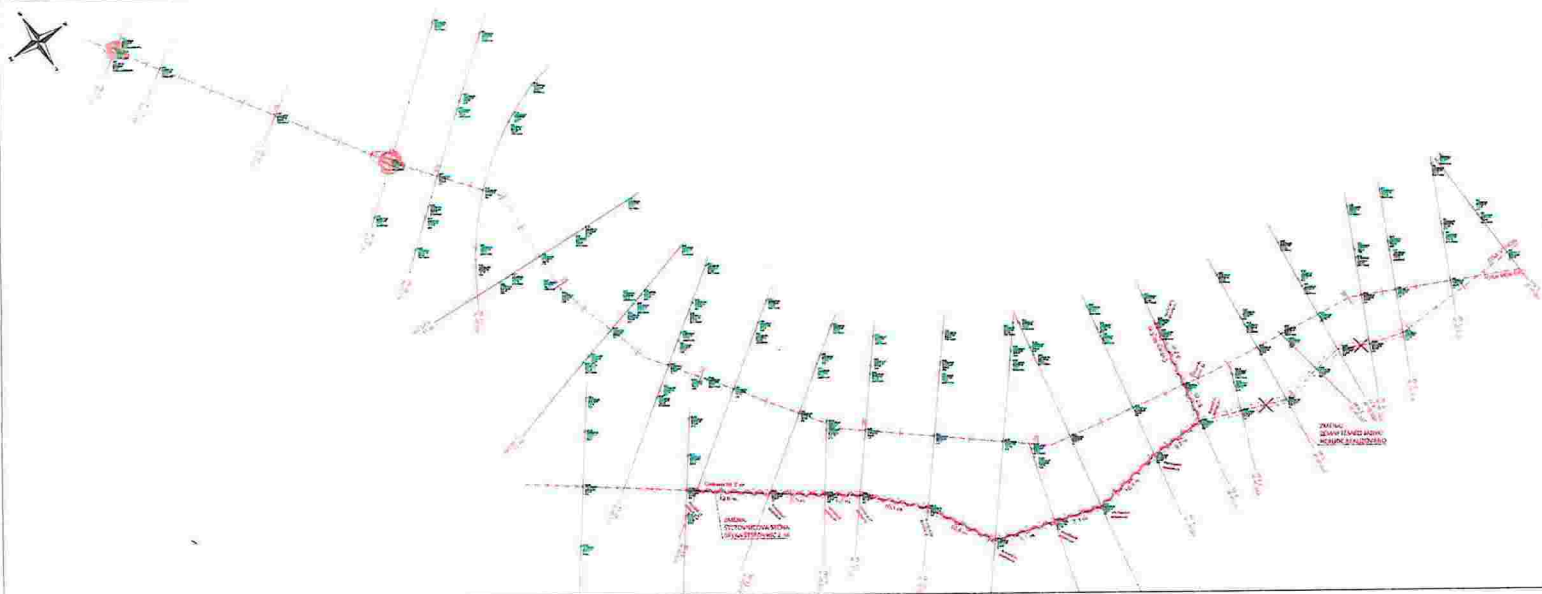
SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII
 Objekt: D_02 - Revitalizace
 Soupis: 04a - SO 07.08 Revitalizace nivy v prostoru Červeného kopce a řeky v km 39,200 - 39,760, změna těs jádra
 ZL 81 - Změna těsníciho jádra - MĚNĚPRÁCE
 Místo: Nábřeží Svratky
 Zadavatel: Statutární město Brno
 Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum: 28. 9. 2020
 Projektant: A PLUS a.s.
 Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem							-300 644,73				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-300 644,73				
D	1		Zemní práce				-257 556,30				
1	K	131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 5000 m3 strojně	m3	-163,000	203,20	-33 121,60	0,00000	-282,73250	0,00000	0,00000
	W		-163		-163,000						
6	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-163,000	63,50	-10 350,50	0,00000	-282,73250	0,00000	0,00000
	W		-163		-163,000						
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-163,000	260,40	-42 445,20	0,00000	-282,73250	0,00000	0,00000
	W		-163		-163,000						
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 630,000	6,40	-10 432,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	W		10 příplateků		-1 630,000						
	W		-10*163								
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-163,000	50,80	-8 280,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	W		-163		-163,000						
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-293,400	200,00	-58 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	W		-163*1,8		-293,400						
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-163,000	10,20	-1 662,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	W		-163		-163,000						
12	K	172153103	Zřízení těsníciho jádra nebo vrstvy š přes 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C	m3	-163,000	138,60	-22 591,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	-309,700	226,00	-69 992,20	1,00000	-309,70000	0,00000	0,00000
D	998		Přesun hmot				-43 088,43		0,00000		0,00000
14	K	998332111	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-282,733	152,40	-43 088,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

M 1250



YABULKA VYTÝČOVACÍCH BODŮ V S-JTSM

TABULKA VÝTVORČNÝCH BOJÍ 5-3TKB					TABULKA VÝTVORČNÝCH BOJŮ V 5-3TKB				
	První 1/2	Druhý 1/2	První 2/2	Závěr		Druhý 1/2	Druhý 2/2	První 2/2	Závěr
W1	17:00-17:30	17:30-17:45	17:45-18:00	První kolo - vítězství	W17	17:00-17:15	17:15-17:30	17:30-17:45	První kolo - vítězství
W2	17:30-17:45	17:45-18:00	18:00-18:15	První kolo - vítězství	W18	17:15-17:30	17:30-17:45	17:45-18:00	První kolo - vítězství
W3	17:45-18:00	18:00-18:15	18:15-18:30	První kolo - vítězství	W19	17:30-17:45	17:45-18:00	18:00-18:15	První kolo - vítězství
W4	18:00-18:15	18:15-18:30	18:30-18:45	První kolo - vítězství	W20	17:45-18:00	18:00-18:15	18:15-18:30	První kolo - vítězství
W5	18:15-18:30	18:30-18:45	18:45-19:00	První kolo - vítězství	W21	18:00-18:15	18:15-18:30	18:30-18:45	První kolo - vítězství
W6	18:30-18:45	18:45-19:00	19:00-19:15	První kolo - vítězství	W22	18:15-18:30	18:30-18:45	18:45-19:00	První kolo - vítězství
W7	18:45-19:00	19:00-19:15	19:15-19:30	První kolo - vítězství	W23	18:30-18:45	18:45-19:00	19:00-19:15	První kolo - vítězství
W8	19:00-19:15	19:15-19:30	19:30-19:45	První kolo - vítězství	W24	18:45-19:00	19:00-19:15	19:15-19:30	První kolo - vítězství
W9	19:15-19:30	19:30-19:45	19:45-20:00	První kolo - vítězství	W25	19:00-19:15	19:15-19:30	19:30-19:45	První kolo - vítězství
W10	19:30-19:45	19:45-20:00	20:00-20:15	První kolo - vítězství	W26	19:15-19:30	19:30-19:45	19:45-20:00	První kolo - vítězství
W11	19:45-20:00	20:00-20:15	20:15-20:30	První kolo - vítězství	W27	19:30-19:45	19:45-20:00	20:00-20:15	První kolo - vítězství
W12	20:00-20:15	20:15-20:30	20:30-20:45	První kolo - vítězství	W28	19:45-20:00	20:00-20:15	20:15-20:30	První kolo - vítězství
W13	20:15-20:30	20:30-20:45	20:45-21:00	První kolo - vítězství	W29	20:00-20:15	20:15-20:30	20:30-20:45	První kolo - vítězství
W14	20:30-20:45	20:45-21:00	21:00-21:15	První kolo - vítězství	W30	20:15-20:30	20:30-20:45	20:45-21:00	První kolo - vítězství
W15	20:45-21:00	21:00-21:15	21:15-21:30	První kolo - vítězství	W31	20:30-20:45	20:45-21:00	21:00-21:15	První kolo - vítězství
W16	21:00-21:15	21:15-21:30	21:30-21:45	První kolo - vítězství	W32	20:45-21:00	21:00-21:15	21:15-21:30	První kolo - vítězství
W17	21:15-21:30	21:30-21:45	21:45-22:00	První kolo - vítězství	W33	21:00-21:15	21:15-21:30	21:30-21:45	První kolo - vítězství
W18	21:30-21:45	21:45-22:00	22:00-22:15	První kolo - vítězství	W34	21:15-21:30	21:30-21:45	21:45-22:00	První kolo - vítězství
W19	21:45-22:00	22:00-22:15	22:15-22:30	První kolo - vítězství	W35	21:30-21:45	21:45-22:00	22:00-22:15	První kolo - vítězství
W20	22:00-22:15	22:15-22:30	22:30-22:45	První kolo - vítězství	W36	21:45-22:00	22:00-22:15	22:15-22:30	První kolo - vítězství
W21	22:15-22:30	22:30-22:45	22:45-23:00	První kolo - vítězství	W37	22:00-22:15	22:15-22:30	22:30-22:45	První kolo - vítězství
W22	22:30-22:45	22:45-23:00	23:00-23:15	První kolo - vítězství	W38	22:15-22:30	22:30-22:45	22:45-23:00	První kolo - vítězství
W23	22:45-23:00	23:00-23:15	23:15-23:30	První kolo - vítězství	W39	22:30-22:45	22:45-23:00	23:00-23:15	První kolo - vítězství
W24	23:00-23:15	23:15-23:30	23:30-23:45	První kolo - vítězství	W40	22:45-23:00	23:00-23:15	23:15-23:30	První kolo - vítězství
W25	23:15-23:30	23:30-23:45	23:45-24:00	První kolo - vítězství	W41	23:00-23:15	23:15-23:30	23:30-23:45	První kolo - vítězství
W26	23:30-23:45	23:45-24:00			W42	23:15-23:30	23:30-23:45		

ZÁZNAM ZE DNE: ST 31.07.2024

AUTOR

NÁZEV DODAVATELE OHLA ŽS, a.s.

Dnešního dne byla při provádění výkopů rýhy pro těsnící jádro zjištěna nevhodná geologie podloží. Z tohoto důvodu není možné provést rozsah prací dle PD.

Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb).

Podpisy:

FIRST

STAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII

 bulldary.online

DENÍK: SO 07.08 - REVITALIZACE NIVY V PROSTORU ČERVENÉHO
KOPCE A ŘEKY KM 39,200 - 39,760

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	 Polojasno	14,0°C	0,0 mm/h	18:00	 Jasno	31,8°C	0,0 mm/h
12:00	 Jasno	27,8°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENISTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Elitbau	3
7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)	

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Pasové rypadlo	Elitbau	2	Nákladní auto	Elitbau	3

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-odtěžení břehů, odvoz materiálu na skládku -výkop pro založení kamenné paty -založení kamenné paty -natažení geotextilie -násyp drenážní vrstvy z DK 32-63 -kamenný zához -výkop rýhy pro těsnící jádro	Elitbau		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

NÁZEV DODAVATELE OHLA ŽS, a.s.

Dnešního dne byla při provádění výkopů rýhy pro těsnící jádro zjištěna nevhodná geologie podloží. Z tohoto důvodu není možné provést rozsah prací dle PD.

Podpisy:

FIRST

STAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII

 buildary.online

DENÍK: SO 07.08 - REVITALIZACE NIVY V PROSTORU ČERVENÉHO
KOPCE A ŘEKY KM 39,200 - 39,760

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	 Zamračeno	19,9°C	0,0 mm/h	18:00	 Déšt	19,9°C	0,1 mm/h
12:00	 Polojasno	26,9°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Elitbau	3

7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)


MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Pasové rypadlo	Elitbau	2	Nákladní auto	Elitbau	3

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-odtěžení břehů, odvoz materiálu na skládku -výkop pro založení kamenné paty -založení kamenné paty -natažení geotextilie -nášyp drenážní vrstvy z DK 32-63 -kamenný zához	Elitbau		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	NÁZEV DODAVATELE
	
Dnes zaslal AD návrh technického řešení změny provádění těsnícího jádra. Na základě tohoto žádáme o odsouhlasení řešení a pokyn k zahájení realizace.	

PŘÍLOHY



240807_Mokrad_tesn...ko_
AD.pdf

AUTOR	NÁZEV DODAVATELE
Souhlasím 	

Podpisy:

FIRSTSTAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII buildary.onlineDENÍK: SO 07.08 - REVITALIZACE NIVY V PROSTORU ČERVENÉHO
KOPCE A ŘEKY KM 39,200 - 39,760

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	 Polojasno	15,5°C	0,0 mm/h	18:00	 Polojasno	26,0°C	0,0 mm/h
12:00	 Polojasno	23,8°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Elitbau	3

7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)


MECHANIZMY:


NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Pasové rypadlo	Elitbau	2	Nákladní auto	Elitbau	3

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-odtěžení břehů, odvoz materiálu na skládku -výkop pro založení kamenné paty -založení kamenné paty -natažení geotextilie -násyp drenážní vrstvy z DK 32-63 -kamenný zához	Elitbau		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	NÁZEV DODAVATELE
	ŠINDLAR s. r. o.

Reakce na zápis  ze dne 8.8.2024:
Doplněna situace vytyčení stěny.

PŘÍLOHY

240808_MOKRAD_vyty...vní
ce.dwg240808_MOKRAD_vyty...vn
ice.pdf

Podpisy:



STAVBA: NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII



DENÍK: SO 07.08 - REVITALIZACE NIVY V PROSTORU ČERVENÉHO
KOPCE A ŘEKY KM 39,200 - 39,760

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	Jasno	16,9°C	0,0 mm/h	18:00	Polojasno	28,8°C	0,0 mm/h
12:00	Polojasno	26,9°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Elitbau	3	Aarsleff CZ s.r.o.	2		

7:00 - 17:00 (oběd 11:00 - 12:00)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.	NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POČ.
Pasové rypadlo	Aarsleff CZ s.r.o.	1	Nákladní auto	Elitbau	3
Pasové rypadlo	Elitbau	2			

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-odtěžení břehů, odvoz materiálu na skládku	Elitbau		
-výkop pro založení kamenné paty			
-založení kamenné paty			
-natažení geotextilie			
-násyp drenážní vrstvy z DK 32-63			
-kamenný zához			
Zarážení štetovnic pro tvorbu těsnícího jádra	Aarsleff CZ s.r.o.		

Podpisy:

