



Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 82

D_06 Vstupní objekt a kolonáda

SO 07.09 Kolonáda

ZM 089 - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko AD	2
Souhlas KAM	3
Stanovisko KAM	4
příloha č. 7	5
příloha č. 8	NEOBSAZENO
příloha č. 9	6
Rozpočet	7
Výkresová část	NEOBSAZENO
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	NEOBSAZENO


**"Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna –
etapy VII a VIII"**

**Důvodová zpráva – změnový list č. 82
ZM 089 - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě**

Zástupci KAM informovali, že s ohledem na měnící se klimatické podmínky v posledních letech se jeví navržený prokořenitelný prostor pro stromy na kolonádě jako nedostatečný. AD ve spolupráci s KAM zpracoval revizi DPS, která byla na jednáních 22. 5. a 28.5. 2024 konzultována s TDI a se zhotovitelem.

Zástupce OI MMB informoval, že proběhne pouze záměna substrátu a kotvení uvnitř květníků a s drenážemi. Rýha pod dnem bude vyplněna kamenivem a nepřesahuje prostor květníku.

V Brně dne :



[REDACTED]

Od:

Odesláno:

pátek 16. srpna 2024 15:05

Komu:

Kopie:

Předmět:

RE: výměna substrátu květináče

Přílohy:


rozpočet výměna substrátu květináče.xlsx; úprava řezu - doplnění substrátu.pdf

Dobrý den,

s návrhem souhlasíme. V této variantě prosíme pouze zrušit úplně geotextilii a prodloužit drenážní trubku až na dno.

Děkuji a s pozdravem

[REDACTED]
Městská infrastruktura – vedoucí týmu protipovodňových opatření



Kancelář
architekta
město Brno

Náš projekt? Brno!

Lidé, územní plán, veřejný prostor.

From: [REDACTED]

Sent: Friday, August 16, 2024 2:10 PM

To: [REDACTED]

Subject: výměna substrátu květináče

Dobrý den,

Posílám ocenění výměny substrátu a připojuji návrh drobné změny, která usnadní realizaci. Jedná se o zvětšení prokořenitelného prostoru a výplň substrátem A v celé ploše květináče

S pozdravem



Vedoucí projektu

OHLA ŽS, a.s.
Divize Východ, oblast Jihovýchod
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno

www.ohla-zs.cz

Upozornění:

Tento e-mail a všechny k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a určeny pouze jeho adresátům. Jeho obsah je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Šíření, zpřístupnění jeho obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázáno. Pokud nejste adresátem tohoto e-mailu, nešířte ani jinak s ním a jeho přílohami nenakládejte, okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste tento e-mail obdrželi, a odstraňte jej a jeho přílohy ze svého systému.

Odesílatel e-mailu, resp. společnost OHLA ŽS, a.s. (dále jen „OHLA“), informuje adresáta, že (i) tento e-mail nepředstavuje závaznou nabídku a je pouze informativní povahy, ledaže by z něho výslovně vyplývalo jinak, (ii) k platnému uzavření smlouvy (rozuměno tím i jakékoliv její změny) dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran po výslovném dosažení shody na všech náležitostech smlouvy a do té doby si OHLA vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, kdykoliv jednání o uzavření smlouvy ukončit, a to i bez spravedlivého důvodu, a nemá v úmyslu z toho být nijak vázána. Adresát e-mailu tak nemůže důvodně očekávat uzavření smlouvy, považovat jakékoliv úkony či jednání odesílatele za příslib uzavření smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy, (iii) nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ani uzavření smlouvy odkazující na obchodní podmínky, které si vzájemně odporují, (iv) vylučuje použití § 1757 občanského zákoníku a obchodních zvyklostí při jednání o smlouvě, a (v) při uzavírání smlouvy postupuje v souladu se svými vnitřními předpisy a stanovami s tím, že smlouva musí být za OHLA odsouhlasena nebo schválena příslušnými vedoucími zaměstnanci, případně také orgány OHLA či jinými osobami, a proto se může stát i v případě, kdy si zástupci stran vzájemně vyjednávají obsahové náležitosti smlouvy, že kompetentní osoby OHLA navržené znění smlouvy neodsouhlasí a OHLA v takovém případě ukončí z tohoto spravedlivého důvodu jednání o uzavření smlouvy.


Odesílatel e-mailu informuje, že není za OHLA oprávněn uzavírat jakékoliv smlouvy, s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen ze strany OHLA a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi e-mailu nebo osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známa.

Upozornění:

Tento e-mail a všechny k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a určeny pouze jeho adresátům. Jeho obsah je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Šíření, zpřístupnění jeho obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázáno. Pokud nejste adresátem tohoto e-mailu, nešířte ani jinak s ním a jeho přílohami nenakládejte, okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste tento e-mail obdrželi, a odstraňte jej a jeho přílohy ze svého systému.

Odesílatel e-mailu, resp. společnost OHLA ŽS, a.s. (dále jen „OHLA“), informuje adresáta, že (i) tento e-mail nepředstavuje závaznou nabídku a je pouze informativní povahy, ledaže by z něho výslovně vyplývalo jinak, (ii) k platnému uzavření smlouvy (rozuměno tím i jakékoliv její změny) dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran po výslovném dosažení shody na všech náležitostech smlouvy a do té doby si OHLA vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, kdykoliv jednání o uzavření smlouvy ukončit, a to i bez spravedlivého důvodu, a nemá v úmyslu z toho být nijak vázána. Adresát e-mailu tak nemůže důvodně očekávat uzavření smlouvy, považovat jakékoliv úkony či jednání odesílatele za příslib uzavření smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy, (iii) nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ani uzavření smlouvy odkazující na obchodní podmínky, které si vzájemně odporují, (iv) vylučuje použití § 1757 občanského zákoníku a obchodních zvyklostí při jednání o smlouvě, a (v) při uzavírání smlouvy postupuje v souladu se svými vnitřními předpisy a stanovami s tím, že smlouva musí být za OHLA odsouhlasena nebo schválena příslušnými vedoucími zaměstnanci, případně také orgány OHLA či jinými osobami, a proto se může stát i v případě, kdy si zástupci stran vzájemně vyjednávají obsahové náležitosti smlouvy, že kompetentní osoby OHLA navržené znění smlouvy neodsouhlasí a OHLA v takovém případě ukončí z tohoto spravedlivého důvodu jednání o uzavření smlouvy.

Odesílatel e-mailu informuje, že není za OHLA oprávněn uzavírat jakékoliv smlouvy, s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen ze strany OHLA a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi e-mailu nebo osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známa.



Kancelář
architekta
města Brna

V Brně dne: 21. 6. 2024

Vyřizuje:

e-mail:

telefon:

Magistrát města Brna

Odbor investiční

Kounicova 67a

601 67 Brno


„Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ – ZM 089 Zlepšení podmínek pro stromy na kolonádě

Vážení,

předáváme Vám změnovou dokumentaci DPS č. 089, vyhotovenou generálním projektantem stavby firmou A PLUS a.s. ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna, p.o. Týká se 17 stromů, které mají být vysazeny do betonových květináčů v prostoru schodiště na kolonádě. Principem řešení změny PD je zajištění většího a dostatečně kvalitního prokořenitelného prostoru doplněním kořenové cesty a strukturního substrátu; a dále zlepšení vláhových podmínek stanoviště, v souladu s principy modrozelené infrastruktury, doplněním žlabu s nátoky do jednotlivých květináčů a drenážní trubky pro odvedení přebytečné vody a zabránění dlouhodobého zaplavení prokořenitelného prostoru.

Tato změna byla zpracována jako reakce na postupující klimatickou změnu a za účelem přiblížení se aktuálním standardům výsadby na takto exponovaných lokalitách ve městě Brně. Byla kladně projednána s Veřejnou zelení města Brna, p.o. a budoucím správcem Městskou částí Brno-střed. Obdobná technologie byla v poslední době použita při rekonstrukci Mendlova náměstí nebo veřejného prostranství Kounicova/Šumavská.

Zhotovitel byl seznámen s návrhem změnové dokumentace dne 5. 6. 2024 a odpověděl 7. 6. 2024 datovou zprávou, že v případě realizace navrhovaných změn předpokládá prodloužení stavby o 5 až 6 týdnů. V rámci diskuse k pracovnímu harmonogramu SO 07.09 Kolonáda, který jsme obdrželi od Zhotovitele stavby 13. 6. 2024 bychom rádi požádali o spolupráci při projednání koordinace prací se Zhotovitelem tak, aby se minimalizoval dopad do termínu dokončení díla. V případě akceptace navrhované změny je předjednáno vyhotovení stanoviska ke statickému posouzení návrhu. Rozpočet související se změnou byl konzultován se zástupcem Brněnských komunikací, a.s.



Kancelář
architekta
města Brna

V případě nemožnosti realizace souvislé kořenové cesty, doporučujeme alespoň zlepšení výsadbového substrátu /doplnění strukturního substrátu/ do jednotlivých květináčů. Toto by nemělo mít do termínu dokončení díla negativní dopad, resp. všechny připomínky Zhotovitele se týkaly průběžné kořenové cesty, žádná se netýkala obsahu květináčů. Změnovou projektovou dokumentaci pro doplnění strukturního substrátu do květináčů připravujeme.

S pozdravem

[Redacted signature]


Vedoucí oddělení Městské infrastruktury

Přílohy:


Stanovisko zpracovatele změny DPS

Projektová dokumentace

Oznámení zhotovitele č. 57



Náš projekt? Brno! Lidé, územní plán, veřejný prostor.



Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 331/13
602 00 Brno
Czech Republic

Datum: 26. červen 2024


Věc: **ZMĚNA 089 – Zlepšení podmínek pro stromy na kolonádě – varianta 4**

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Změna vegetačních úprav na kolonádě spočívá v úpravě prokořenitelné vrstvy. Nově varianta uvažuje úpravy v rámci konstrukce květináče. Tato změna slouží k dosažení optimálního a dlouhodobě udržitelného cílového stavu stromořadí bez nutnosti zásahu do okolních konstrukcí.

Květináč bude vyplněn podkladním strukturním substrátem A o mocnosti cca 1200mm. Nad touto vrstvou bude proveden pěstební strukturní substrát B. Od rostlého nebo nasypaného terénu bude substrát oddělen separační geotextilií. Pro revizi nasyceného stavu substrátu bude do květináče umístěna drenážní trubka DN 160 s víčkem. Řez navrženou konstrukcí viz strana 2.

Tato změna nemá vliv na povolení stavby a řeší úpravy v rozšíření prokořenitelné vrstvy vysazovaných stromů.

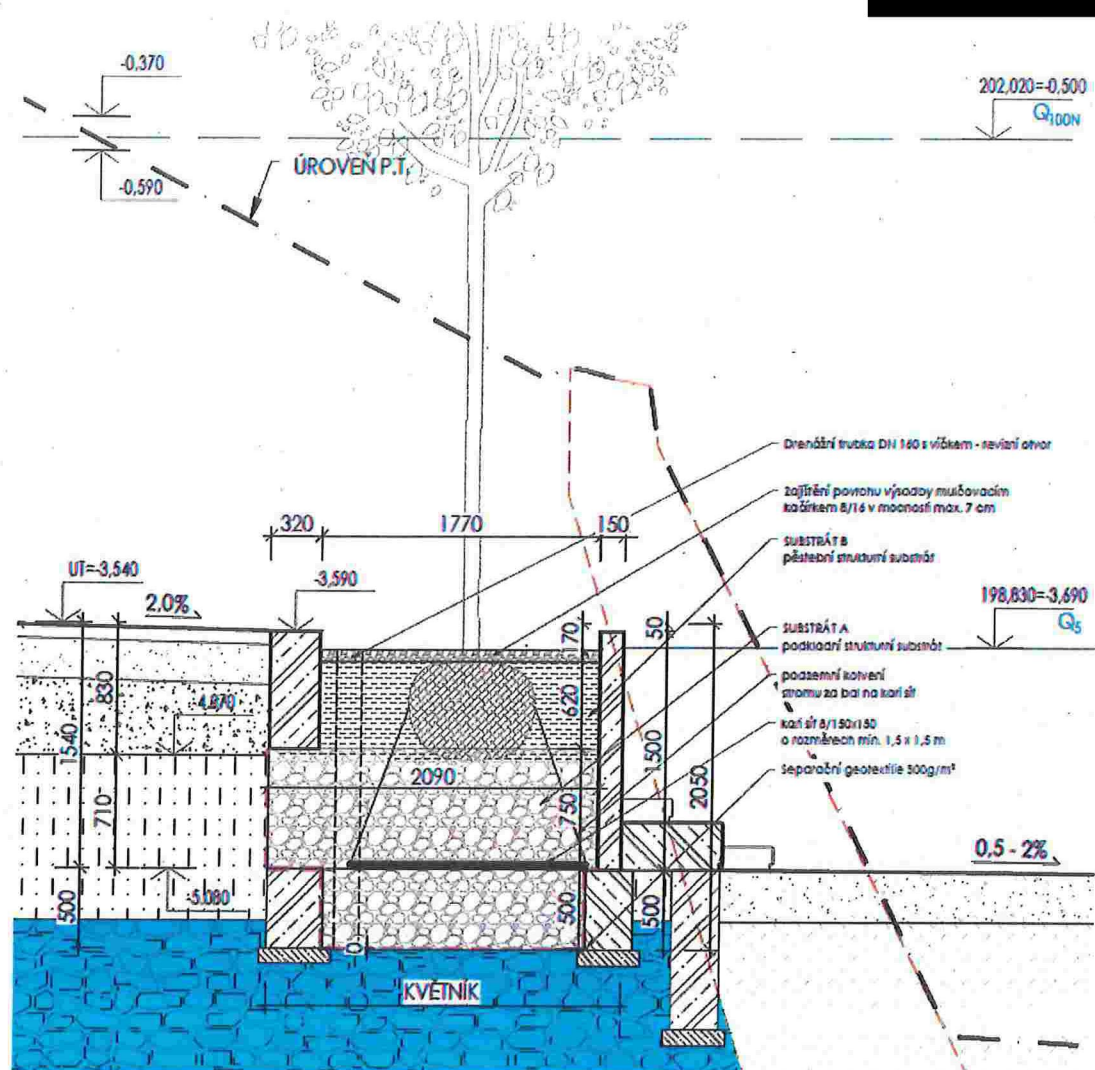

Odhadované množství materiálu:

– Substrát A (strukturální)	69,998 m ³
– Substrát B (výsadbový)	32,80 m ³
– Drenážní trubka (revizní)	34 m
– Víčko na drenážní trubku	17 ks
– Mulčovací kačírky 8/16	4,403 m ³
– Kari síť 8/150x150 o rozměru 1,5x1,5 m	17 ks

Vyhotovil:



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 06 – Vstupní objekt a kolonáda	Změnový list č. 82
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: SO 07.09 Kolonáda ZM 089 - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě - výměna substrátu v květináčích, zvětšení prokořenitelného prostoru DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.09 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s.- ZM 089 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.82 vícepráce, ZL č.82 méněpráce, ZL č.82 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Provedení záměny substrátu a kotvení uvnitř květníků + rýha pod dnem nepřesahující prostor květníku vyplněná kamenivem 	
POKYN VYDAL:	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, 	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 06 – Vstupní objekt a kolonáda	82																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09 Kolonáda ZM 089 - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě - výměna substrátu v květináčích, zvětšení prokořenitelného prostoru DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.09 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZM 089 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.82 vícepráce, ZL č.82 méněpráce, ZL č.82 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">627 498,35 Kč</td><td style="text-align: right;">131 774,65 Kč</td><td style="text-align: right;">759 273,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 3 279,69 Kč</td><td style="text-align: right;">- 688,73 Kč</td><td style="text-align: right;">- 3 968,42 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">624 218,66 Kč</td><td style="text-align: right;">131 085,92 Kč</td><td style="text-align: right;">755 304,58 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature]			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	627 498,35 Kč	131 774,65 Kč	759 273,00 Kč	Méněpráce:	- 3 279,69 Kč	- 688,73 Kč	- 3 968,42 Kč	Rozdíl:	624 218,66 Kč	131 085,92 Kč	755 304,58 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	627 498,35 Kč	131 774,65 Kč	759 273,00 Kč														
Méněpráce:	- 3 279,69 Kč	- 688,73 Kč	- 3 968,42 Kč														
Rozdíl:	624 218,66 Kč	131 085,92 Kč	755 304,58 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: [Redacted] PODPIS: [Redacted Signature] DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, [Redacted] BKOM, [Redacted]																	
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [Redacted]																	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:20MT085c1

Stavba:Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

ZM 089 - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě - výměna substrátu v květináčích, zvětšení prokořenitelného prostoru

KSO:Místo:Nábřeží Svatky

CC-CZ:Datum:

Zadavatel:Statutární město Brno

IČ:449 92 785

DIČ:CZ44992785

Zhotovitel:SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:

DIČ:

Projektant:A PLUS a.s.

IČ:262 36 419

DIČ:CZ26236419

Zpracovatel:STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:253 33 046

DIČ:CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH			624 218,66
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	624 218,66	131 085,92
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			755 304,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:20MT085c1

Stavba:Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

ZM 089 - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě, výměna substrátu v květináčích, zvětšení prokořenitelného prostoru

Místo:Nábřeží Svatky

Datum:

Zadavatel:Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Zhotovitel:SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		624 218,66	755 304,58
D_06	Vstupní objekt a kolonáda	624 218,66	755 304,58
	výměna substrátu v květináčích, zvětšení prokořenitelného prostoru-MÉNĚPRÁCE	-3 279,69	-3 968,42
	výměna substrátu v květináčích, zvětšení prokořenitelného prostoru-VÍCEPRÁCE	627 498,35	759 273,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

Soupis:

ZM 089 - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě - výměna substrátu v květináčích, zvětšení prokořenitelného prostoru

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:

DIČ:

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH

624 218,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	624 218,66	21,00%	131 085,92
snížená	0,00	12,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

755 304,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: D_06 Vstupní objekt a kolonáda

Soupis: **ZM 089 - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě - výměna substrátu v květináčích, zvětšení prokořenitelného prostoru**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant: A PLUS a.s.
Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

624 218,66

HSV - Práce a dodávky HSV

624 218,66

1 - Zemní práce

483 146,83

8 - Trubní vedení

32 793,85

998 - Přesun hmot

108 277,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: D_06 Vstupní objekt a kolonáda

Soupis: **ZM 089 - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě - výměna substrátu v květináčích, zvětšení prokořenitelného prostoru**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant: A PLUS a.s.

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							624 218,66	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					624 218,66	
D	1	Zemní práce					483 146,83	
1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	25,245	254,50	6 424,85	SO 07.09
	VV		SO 07.09					
	VV		prohloubení pro zvětšení prokořenitelného prostoru					
	VV		17*1,8*1,65*0,5		25,245			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-50,490	60,60	-3 059,69	SO 07.09
	VV		odvoz výkopku					
	VV		SO 07.09					
	VV		prohloubení pro zvětšení prokořenitelného prostoru					
	VV		17*1,8*1,65*0,5		25,245			
	VV		odpočet původního zásypu					
	VV		-17*1,8*1,65*1,5		-75,735			
	VV		Součet		-50,490			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	102,798	254,50	26 162,09	SO 07.09
	VV		dovoz substrátů, SO 07.09					
	VV		69,998"substrát A		69,998			
	VV		32,8"substrát B		32,800			
	VV		Součet		102,798			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 009,800	6,10	6 159,78	SO 07.09
	VV		odvoz výkopku					
	VV		SO 07.09					
	VV		prohloubení pro zvětšení prokořenitelného prostoru, dalších 10 km					
	VV		17*1,8*1,65*0,5*10		252,450			
	VV		původně uvažovaný zásyp vytěženým materiálem, nyní odvoz na skládku					
	VV		17*1,8*1,65*1,5*10		757,350			
	VV		Součet		1 009,800			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	102,798	72,40	7 442,58	.SO 07.18a
	VV		substrát, cena SOD, SO 08.21a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		102,798		102,798			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	100,980	48,50	4 897,53	SO 07.09
	VV		SO 07.09					
	VV		prohloubení pro zvětšení prokořenitelného prostoru					
	VV		17*1,8*1,65*0,5		25,245			
	VV		původně uvažovaný zásyp vytěženým materiálem, nyní odvoz na skládku					
	VV		17*1,8*1,65*1,5		75,735			
	VV		Součet		100,980			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	181,764	300,00	54 529,20	SO 07.09
	VV		SO 07.09					
	VV		prohloubení pro zvětšení prokořenitelného prostoru					
	VV		17*1,8*1,65*0,5*1,8		45,441			
	VV		původně uvažovaný zásyp vytěženým materiálem, nyní odvoz na skládku					
	VV		17*1,8*1,65*1,5*1,8		136,323			
	VV		Součet		181,764			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25,245	9,70	244,88	SO 07.09
	VV		SO 07.09					
	VV		prohloubení pro zvětšení prokořenitelného prostoru					
	VV		17*1,8*1,65*0,5		25,245			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-3,240	67,90	-220,00	SO 07.09
	VV		SO 07.09					
	VV		25,245+47,25"substrát A		72,495			
	VV		odpočet původního zásypu					
	VV		-17*1,8*1,65*1,5		-75,735			
	VV		Součet		-3,240			
10	K	181311107	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	50,490	548,00	27 668,52	ÚRS 2024/2
	VV		substrát B, cena URS 224/2					
	VV		17*1,8*1,65		50,490			
11	K	184215211	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	17,000	2 177,20	37 012,40	_SO 08.19.1
	VV		položka z rozpočtu SO 19.01					
	VV		17		17,000			
12	M	31316007	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 8mm	m2	38,250	151,00	5 775,75	ÚRS 2024/2
	VV		1,5*1,5*17		38,250			
13	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 10 do 100 m3	m3	102,798	221,00	22 718,36	ÚRS 2024/2
	VV		cena URS 2024/2					
	VV		44,753" substrát A - květník		44,753			
	VV		25,245" substrát A -prohloubení		25,245			
	VV		32,8" substrát B		32,800			
	VV		Součet		102,798			
14	M	103715001a	Strukturální substrát A	m3	69,998	2 530,00	177 094,94	
	VV		cena dle nabídky dodavatele					
	VV		17*1,8*1,65*0,5		25,245			
	VV		17*1,8*1,95*0,75		44,753			
	VV		Součet		69,998			
15	M	103715001b	Strukturální substrát B	m3	32,800	2 880,00	94 464,00	
	VV		cena dle nabídky dodavatele					
	VV		32,8		32,800			
16	M	103715001c	Symbivit	kg	20,000	290,00	5 800,00	
17	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	50,490	96,90	4 892,48	ÚRS 2024/2
	VV		cena URS 2024/2					
	VV		1,8*1,65*17		50,490			
18	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	7,069	727,00	5 139,16	ÚRS 2024/2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		cena URS 2024/2					
	VV		1,8*1,65*17*0,07*2		7,069			
	D	8	Trubní vedení				32 793,85	
19	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	34,000	171,00	5 814,00	ÚRS 2024/2
	VV		drenážní revizní trubka					
	VV		17*2 "cena URS 2024/2		34,000			
20	M	18615200	trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 150	m	34,510	605,00	20 878,55	ÚRS 2024/2
	VV		34		34,000			
	VV		34*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		34,510			
21	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	17,000	281,00	4 777,00	ÚRS 2024/2
	VV		"cena URS 2024/2					
	VV		17		17,000			
22	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	17,000	77,90	1 324,30	ÚRS 2024/2
	VV		cena URS 2027/2					
	VV		17		17,000			
	D	998	Přesun hmot				108 277,98	
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	171,979	155,60	26 759,93	_SO 08.19.1
24	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	171,979	474,00	81 518,05	ÚRS 2024/2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_06 Vstupní objekt a kolonáda

Soupis:

ZM 089 - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě - výměna substrátu v květináčích, zvětšení prokořenitelného prostoru - MÉNĚPRÁCE

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Zhotovitel:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:

DIČ:

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 279,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 279,69	21,00%	-688,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 968,42

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_06 Vstupní objekt a kolonáda

Soupis:

ZM 089 - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě - výměna substrátu v květináčích, zvětšení prokořenitelného prostoru - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-3 279,69
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 279,69
1 - Zemní práce	-3 279,69
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII			Datum:	
Objekt:	D_06 Vstupní objekt a kolonáda			Projektant:	A PLUS a.s.
Soupis:	ZM 089 - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě - výměna substrátu v květináčích, zvětšení prokořenitelného prostoru - MÉNĚPRÁCE			Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.
Místo:					
Zadavatel:	Statutární město Brno				
Zhotovitel:	SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem			-3 279,69				
D	HSV	Práce a dodávky HSV		-3 279,69			
D	1	Zemní práce		-3 279,69			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-50,490	60,60	-3 059,69
	VV	odvoz výkopku					
	VV	SO 07.09					
	VV	prohloubení pro zvětšení prokořenitelného prostoru					
	VV	17*1,8*1,65*0,5			25,245		
	VV	odpočet původního zásypu					
	VV	-17*1,8*1,65*1,5			-75,735		
	VV	Součet			-50,490		
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-3,240	67,90	-220,00
	VV	SO 07.09					
	VV	25,245+47,25"substrát A			72,495		
	VV	odpočet původního zásypu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			-17*1,8*1,65*1,5			-75,735	
VV			Součet			-3,240	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:
D_06 Vstupní objekt a kolonáda

Soupis:
ZM 089 - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě - výměna substrátu v květináčích, zvětšení prokořenitelného prostoru - VÍCEPRÁCE

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ: 449 92 785
Statutární město Brno	DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	IČ:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO	DIČ:
Projektant:	IČ: 262 36 419
A PLUS a.s.	DIČ: CZ26236419
Zpracovatel:	IČ: 253 33 046
STAGA stavební agentura s.r.o.	DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH			627 498,35
DPH základní snížená zákl. přenesená sníž. přenesená nulová	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	627 498,35	21,00%	131 774,65
	0,00	12,00%	0,00
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	12,00%	0,00
	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			759 273,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: _____	Razítko _____
Datum a podpis: _____	Razítko _____
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: _____	Razítko _____
Datum a podpis: _____	Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_06 Vstupní objekt a kolonáda

Soupis:

ZM 089 - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě - výměna substrátu v květináčích, zvětšení prokořenitelného prostoru - VÍCEPRÁCE

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		627 498,35
HSV - Práce a dodávky HSV		627 498,35
1 - Zemní práce		486 426,52
8 - Trubní vedení		32 793,85
998 - Přesun hmot		108 277,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII		Datum:	
Objekt:		D_06 Vstupní objekt a kolonáda		Projektant:	
Soupis:		ZM 089 - Zlepšení podmínek pro stromy na Kolonádě - výměna substrátu v květináčích, zvětšení prokořenitelného prostoru - VÍCEPRÁCE		Zpracovatel:	
Místo:				A PLUS a.s.	
Zadavatel:		Statutární město Brno		STAGA stavební	
Zhotovitel:		SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO		agentura s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				627 498,35
D		1	Zemní práce				486 426,52
6	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	25,245	254,50	6 424,85
	VV		SO 07.09				
	VV		prohloubení pro zvětšení prokořenitelného prostoru				
	VV		17*1,8*1,65*0,5		25,245		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	102,798	254,50	26 162,09
	VV		dovoz substrátů, SO 07.09				
	VV		69,998"substrát A		69,998		
	VV		32,8"substrát B		32,800		
	VV		Součet		102,798		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 009,800	6,10	6 159,78
	VV		odvoz výkopku				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		SO 07.09				
	VV		prohloubení pro zvětšení prokořenitelného prostoru, dalších 10 km				
	VV		17*1,8*1,65*0,5*10		252,450		
	VV		původnně uvažovaný zásyp vytěženým materiálem, nyní odvoz na skládku				
	VV		17*1,8*1,65*1,5*10		757,350		
	VV		Součet		1 009,800		
18	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	102,798	72,40	7 442,58
	VV		substrát, cena SOD, SO 08.21a				
	VV		102,798		102,798		
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	100,980	48,50	4 897,53
	VV		SO 07.09				
	VV		prohloubení pro zvětšení prokořenitelného prostoru				
	VV		17*1,8*1,65*0,5		25,245		
	VV		původnně uvažovaný zásyp vytěženým materiálem, nyní odvoz na skládku				
	VV		17*1,8*1,65*1,5		75,735		
	VV		Součet		100,980		
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	181,764	300,00	54 529,20
	VV		SO 07.09				
	VV		prohloubení pro zvětšení prokořenitelného prostoru				
	VV		17*1,8*1,65*0,5*1,8		45,441		
	VV		původnně uvažovaný zásyp vytěženým materiálem, nyní odvoz na skládku				
	VV		17*1,8*1,65*1,5*1,8		136,323		
	VV		Součet		181,764		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25,245	9,70	244,88
	VV		SO 07.09				
	VV		prohloubení pro zvětšení prokořenitelného prostoru				
	VV		17*1,8*1,65*0,5		25,245		
10	K	181311107	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	50,490	548,00	27 668,52
	VV		substrát B, cena URS 224/2				
	VV		17*1,8*1,65		50,490		
49	K	184215211	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	17,000	2 177,20	37 012,40
	VV		položka z rozpočtu SO 19.01				
	VV		17		17,000		
12	M	31316007	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 8mm	m2	38,250	151,00	5 775,75
	VV		1,5*1,5*17		38,250		
13	K	184854113	Michání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 10 do 100 m3	m3	102,798	221,00	22 718,36
	VV		cena URS 2024/2				
	VV		44,753" substrát A - květník		44,753		
	VV		25,245" substrát A -prohloubení		25,245		
	VV		32,8" substrát B		32,800		
	VV		Součet		102,798		
14	M	103715001a	Strukturální substrát A	m3	69,998	2 530,00	177 094,94
	VV		cena dle nabídky dodavatele				
	VV		17*1,8*1,65*0,5		25,245		
	VV		17*1,8*1,95*0,75		44,753		
	VV		Součet		69,998		
15	M	103715001b	Strukturální substrát B	m3	32,800	2 880,00	94 464,00
	VV		cena dle nabídky dodavatele				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		32,8		32,800		
16	M	103715001c	Symbivit	kg	20,000	290,00	5 800,00
17	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkiem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	50,490	96,90	4 892,48
	VV		cena URS 2024/2				
	VV		1,8*1,65*17		50,490		
18	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	7,069	727,00	5 139,16
	VV		cena URS 2024/2				
	VV		1,8*1,65*17*0,07*2		7,069		
D	8		Trubní vedení				32 793,85
19	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	34,000	171,00	5 814,00
	VV		drenážní revizní trubka				
	VV		17*2 "cena URS 2024/2		34,000		
20	M	18615200	trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 150	m	34,510	605,00	20 878,55
	VV		34		34,000		
	VV		34*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		34,510		
21	K	877310310	Montáž tvarovek na kanal.plast.potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěného-kolen, víček nebo hrnkových uzávěrů DN 160	kus	17,000	281,00	4 777,00
	VV		"cena URS 2024/2				
	VV		17		17,000		
22	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	17,000	77,90	1 324,30
	VV		cena URS 2027/2				
	VV		17		17,000		
D	998		Přesun hmot				108 277,98
48	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	171,979	155,60	26 759,93
24	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	171,979	474,00	81 518,05

25.6.2024 Zástupce KAM vysvětlil průběh předávání dokumentace k opravě a informoval, že AD opraví chybné rozpisky výkresů. AD dopracoval detaily dokumentace. Zástupce zhotovitele požádal o doplnění rovnaniny do betonu do VV. Dokumentace byla zaslána k vyjádření zástupcům CTP. V příštím týdnu proběhne schůzka k dořešení vlivu ZM046 na ZM088. Následně bude vyhotovena kompletní změnová dokumentace a předána zhotoviteli a TDI. Info na příštím KD.

9.7.2024 Zástupci CTP zaslali své vyjádření k předložené dokumentaci dne 4.7.2024 :

- Kamenná rovnanina v bet. loži, tvořící přechod mezi kamennou zdí a kamenným záhozem je ve skutečnosti zapuštěná více do břehu oproti dostavbě kamenné zdi (viz přiložené foto). Toto bude tvořit nárazovou hranu pro průtok vody. Aby byly eliminovány nežádoucí důsledky nárazu vody do dostavby kamenné zdi, bylo by vhodné v tomto místě zbudovat zavazovací křídlo.
- Kamenná rovnanina do betonu svým provedením neodpovídá předložené PD a zhoršuje estetickou hodnotu daného místa.

Dle vyjádření autorského dozoru není zavazovací křídlo nutné. Navržená oprava je funkční, pokud bude provedena dle dokumentace. Zhotovitel provede opravu rovnaniny do betonového lože v místě.

Info na příštím KD.

AD přislíbil kompletaci změnové dokumentace a předání v tištěné podobě včetně VV.

23.7.2024 AD zaslal elektronickou verzi dokumentace včetně VV dne 22.7.2024. AD přislíbil předání tištěné verze dokumentace na technickém dni 30.7.2024, zástupce VRV požádal o předání tištěné verze do 26.7.2024. Zhotovitel vyzvorkuje část úseku až po předání dokumentace v tištěné podobě. Proběhne domluva mezi TDI, zhotovitel a KAM ohledně schůzky na místě samém na základě výzvy zhotovitele. Další info k této schůzce na technickém dni.

6.8.2024 Na dnešním KD bylo domluveno, že zhotovitel ubourá dozděnou část v plném rozsahu. Zástupce TDI požádal o vyzvorkování kamene, který bude použitý na dozdění, které bude provedeno podle předaného technického řešení a příslušných norem. Zhotovitel vyzve ke kontrole vzorku kameniva a svolá jednání se zhotovitelem, který bude provádět okamenování. Účastníci jednání: zástupce TDI, AD a KAM. Info na příštím KD.

20.8.2024 Jednání ke kontrole kameniva zatím neproběhlo. Info k termínu jednání zašle zhotovitel, před odesláním finální verze zápisu. **Zodpovídá zhotovitel**

3. Zlepšení podmínek pro stromy na kolonádě ZM089

28.5.2024 Zástupci KAM informovali, že s ohledem na měnící se klimatické podmínky v posledních letech se jeví navržený prokořenitelný prostor pro stromy na kolonádě jako nedostatečný. AD ve spolupráci s KAM zpracoval revizi DPS, která byla na jednáních 22. 5. a 28.5. 2024 konzultována s TDI a se zhotovitelem. AD ve spolupráci s KAM zapracuje připomínky, zhotovitel se následně vyjádří k dopadu do harmonogramu prací a do termínu. Termín do : 11.6.2024

Podle vyjádření TDI má tato varianta dopad do celkového termínu dokončení stavby a vyvolává značné vícenáklady. TDI žádá zástupce KAM a AD o navržení jiného řešení, které nebude mít takový dopad do termínu dokončení stavby a do případných vícenákladů. **Zodpovídá AD a KAM**

11.6.2024 Zhotovitel zaslal objednateli datovou zprávu, podle které má tato změna dopad do celkového termínu dokončení stavby 5-6 týdnů. Zatím není zpracovaný VV, dopad do ceny není znám. Přítomný zástupce TDI dopad do termínu nerozporuje, stanovisko k této změně zašle emailem objednateli. O dalším postupu rozhodne objednatel. Info na příštím KD.

25.6.2024 Zástupce OI MMB informoval, že kořenové cesty realizovány nebudou. Bylo domluveno, že proběhne pouze záměna substrátu a kotvení uvnitř květníků. Tato změna nemá dopad do termínu dokončení stavby. KAM zašle záměnu substrátu a kotvení zástupcům zhotovitele i TDI k seznámení. **Zodpovídá KAM**

9.7.2024 AD zaslal stanovisko s popisem záměny substrátu a drenážemi a požádal zástupce zhotovitele o vyjádření ke stanovisku. VV zpracuje KAM a AD. **Zodpovídá KAM a AD**

23.7.2024 Po konání minulého KD bylo domluveno, že VV zpracuje zhotovitel. Na dnešním KD zástupce KAMu zhotoviteli odpověděl na dotaz, týkající se rýhy v květníku. Rýha pod dnem bude vyplněna kamenivem a nepřesahuje prostor květníku. **Za zpracování VV zodpovídá zhotovitel**

6.8.2024 Zhotovitel předloží kompletní ZL do 20.8.2024. **Zodpovídá zhotovitel**

20.8.2024 Zhotovitel upravil VV dle připomínek zástupců KAM a zaslal jej kontrole rozpočtáři TDI. **Za kontrolu zodpovídá TDI**

4.Svratecký náhon – SO 05 cesta

9.7.2024 Zástupce TDI na dnešním KD informoval, že obdržel pokyn od zástupce OI MMB k zařazení objektu SO 05 do PPO. Rozdílový VV zpracuje rozpočtář Bkom.
