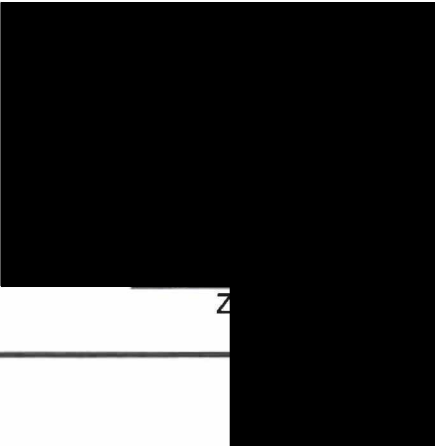


Protokol o změně díla

Změnový list č. 11

Předmět díla	"Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B" v areálu Nemocnice Znojmo		
Objekt	objekt B		
Objednatel	Nemocnice Znojmo, p.o.		
Zhotovitel	Renov CZ,s.r.o.		
	Dolní Česká 300/6		
	669 02 Znojmo		
TDI	[REDACTED]		
Projektant	PEND a.s.,Vojanova č.1, 615 00 Brno;		
Popis změny:	V soc.zařízení chybí v rozpočtu symonivelační beton I.-III.etapa		
Odůvodnění změny:	Chybějící položky v projektu či rozpočtu stavby		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla	
		úprava předmětu díla	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona:(zatrhnout)	§ 222 odst.4	
		§ 222 odst.5	
		§ 222 odst.6	x
		§ 222 odst.7	
	Způsob projekčního řešení změny:(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skutečného provedení			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů /víceprací)		57 632,30 Kč
	celkem v Kč bez DPH		57 632,30 Kč
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Renov CZ,s.r.o.
	náklady na změnu bez DPH		57 632,30 Kč
	výše DPH	sazba: 21%	12 102,78 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		69 735,08 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil		
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 11 - položkový rozpočet, kalkulace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo	
Objekt:	SO 03	Změny,vícepráce	
Rozpočet:	11	Lité betony v soc.zařízeních - I.- III.etapa	
Objednatel:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 2675/11 66902 Znojmo-Znojmo		IČO: 00092584 DIČ: CZ00092584
Zhotovitel:	Renov CZ, s.r.o. Dolní Česká 300/6 66902 Znojmo		IČO: 27712478 DIČ: CZ27712478
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			57 632,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			57 632,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		57 632,30 CZK
Základní DPH	21 %		12 102,78 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			69 735,08 CZK
 Zhotovitel  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			52 484,51	91,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 147,79	8,9
Cena celkem					57 632,30	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 03	Změny,vícepráce
R:	11	Lité betony v soc.zařízeních - I.- III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				52 484,51
1	632443221	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm	m2	93,89000	559,00	52 484,51
všechny soc.zařízení : 86,35+7,54				93,89000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 147,79
2	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,43118	493,50	5 147,79

