

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

Číslo stavby: **ID 24-0-1984**

Pořadové číslo změnového listu:

20

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: VON	Číslo objektu:	Název: Vedlejší a ostatní náklady
Popis změny:		
Změna spočívá v navýšení počtu nájezdů mobilního jeřábu pro demolici monolitické části desky etapy 2c.		
Zdůvodnění změny:		
<p>V rámci dopracování PDPS do podoby RDS a na základě vyhodnocení diagnostického průzkumu skutečného stavu monolitické desky (příloha č. 2), bylo následně odpovědným statikem pro danou část stavby dopřesněn technologický postup pro demolici monolitické desky. Samotná demolice byla rozfázována do více etap. Z tohoto důvodu došlo k navýšení počtu nájezdů mechnizace oproti původnímu předpokladu v PDPS (příloha č. 3).</p> <p>Upřesnění technologického postupu bylo možné až po vyhodnocení diagnostického průzkumu, které bylo možné realizovat po kompletním odkrytí monolitické desky ve 2c. a 3a. etapě. V předchozím stupni dokumentace PDPS nebylo možné ověřit skutečný stav monolitické desky z důvodu nepřístupnosti samotné monolitické desky.</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> <p>METROPROJEKT Praha a.s. Hlavní inženýr projektu</p> </div> <div style="width: 25%; background-color: black; height: 40px;"></div> </div>		

Stavba: Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C	Číslo smlouvy: 10120021	SO	Změnový list č: 20
--	-------------------------	----	--------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: Ano
 Do časového plánu stavby: Ne
 Do ceny stavby: Ano zvýšení o: **598 000,00 Kč**

NAVRHOVATEL ZMĚNY:

"Společnosti Metrostav DIZ - [redacted] ní desky metra Florenc"

[redacted] Pod
 zástupce vedoucího projektu

OSOBY S PŘÍKAZNÍKOVÝMI PŮSOBNOSTI TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Sou [redacted] Příkazník: [redacted]
 Pod [redacted] P
 zástupce vedoucího projektu INFRAM a.s.
 technický dozor objednatele

OSOBY S PŘÍKAZNÍKOVÝMI PŮSOBNOSTI FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Sou [redacted] Příkazník: [redacted]
 Pod [redacted] P
 zástupce vedoucího projektu INFRAM a.s.
 technický dozor objednatele

[redacted] P
 zástupce ředitele závodu 8

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Příkazníka: [redacted]
 INFRAM a.s.
 technický dozor objednatele

Za Objednatele: [redacted]
 Dopravní podnik hl.
 vedoucí odboru Inv

Za Objednatele: [redacted]
 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 projektový manažer

Za Objednatele: [redacted]
 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 technický ředitel - I

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet	1 x A4
Příloha č. 2	Zdůvodnění změny technologie postupu demolice monolitické části stropní desky + RDS pro řezání a postupné bourání	8 x A4
Příloha č. 3	HMG víkendových výluk pro demolici 2c. Desky - monolitická část	1 x A4
Příloha č. 4	PDPS - nářezový plán	1 x A4
Příloha č. 5	Vyhodnocení cenových nabídek + cenové nabídky	5 x A4


	Celkem počet stran návrhu změny stavby	16 x A4
--	---	----------------


VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - dokumentace provádění stavby


Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C


Změnový list č. 20


SO/PS	VON	Vedlejší a ostatní náklady												
Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.			Cena			Cena celkem			poznámka	výpočet
				PDPS	RDS	rozdíl	Jedn.	PDPS	RDS	rozdíl				
Položky, které jsou obsahem zadávací dokumentace														
		Mezisoučet								0,00	0,00	0,00		
Položky vyvolané zpracováním RDS														
		Nájezd mobilního jeřábu - 2c etapa								0,00	598 000,00	598 000,00		
1	N_60_01	přistavení jeřábu LTM 1500 a nastrojení	soub.							0,00	153 500,00	153 500,00	j.c nevhodnější CN č. 1 + 13% koordinace	
2	N_60_02	denní sazba jeřábnických prací	soub.							0,00	291 000,00	291 000,00	j.c nevhodnější CN č. 1 + 13% koordinace	
3	N_60_03	složení a odjezd jeřábu LTM 1500	soub.							0,00	153 500,00	153 500,00	j.c nevhodnější CN č. 1 + 13% koordinace	
		Nové položky mezisoučet								0,00	598 000,00	598 000,00		
Objekt celkem										0,00	598 000,00	598 000,00		



















2

3



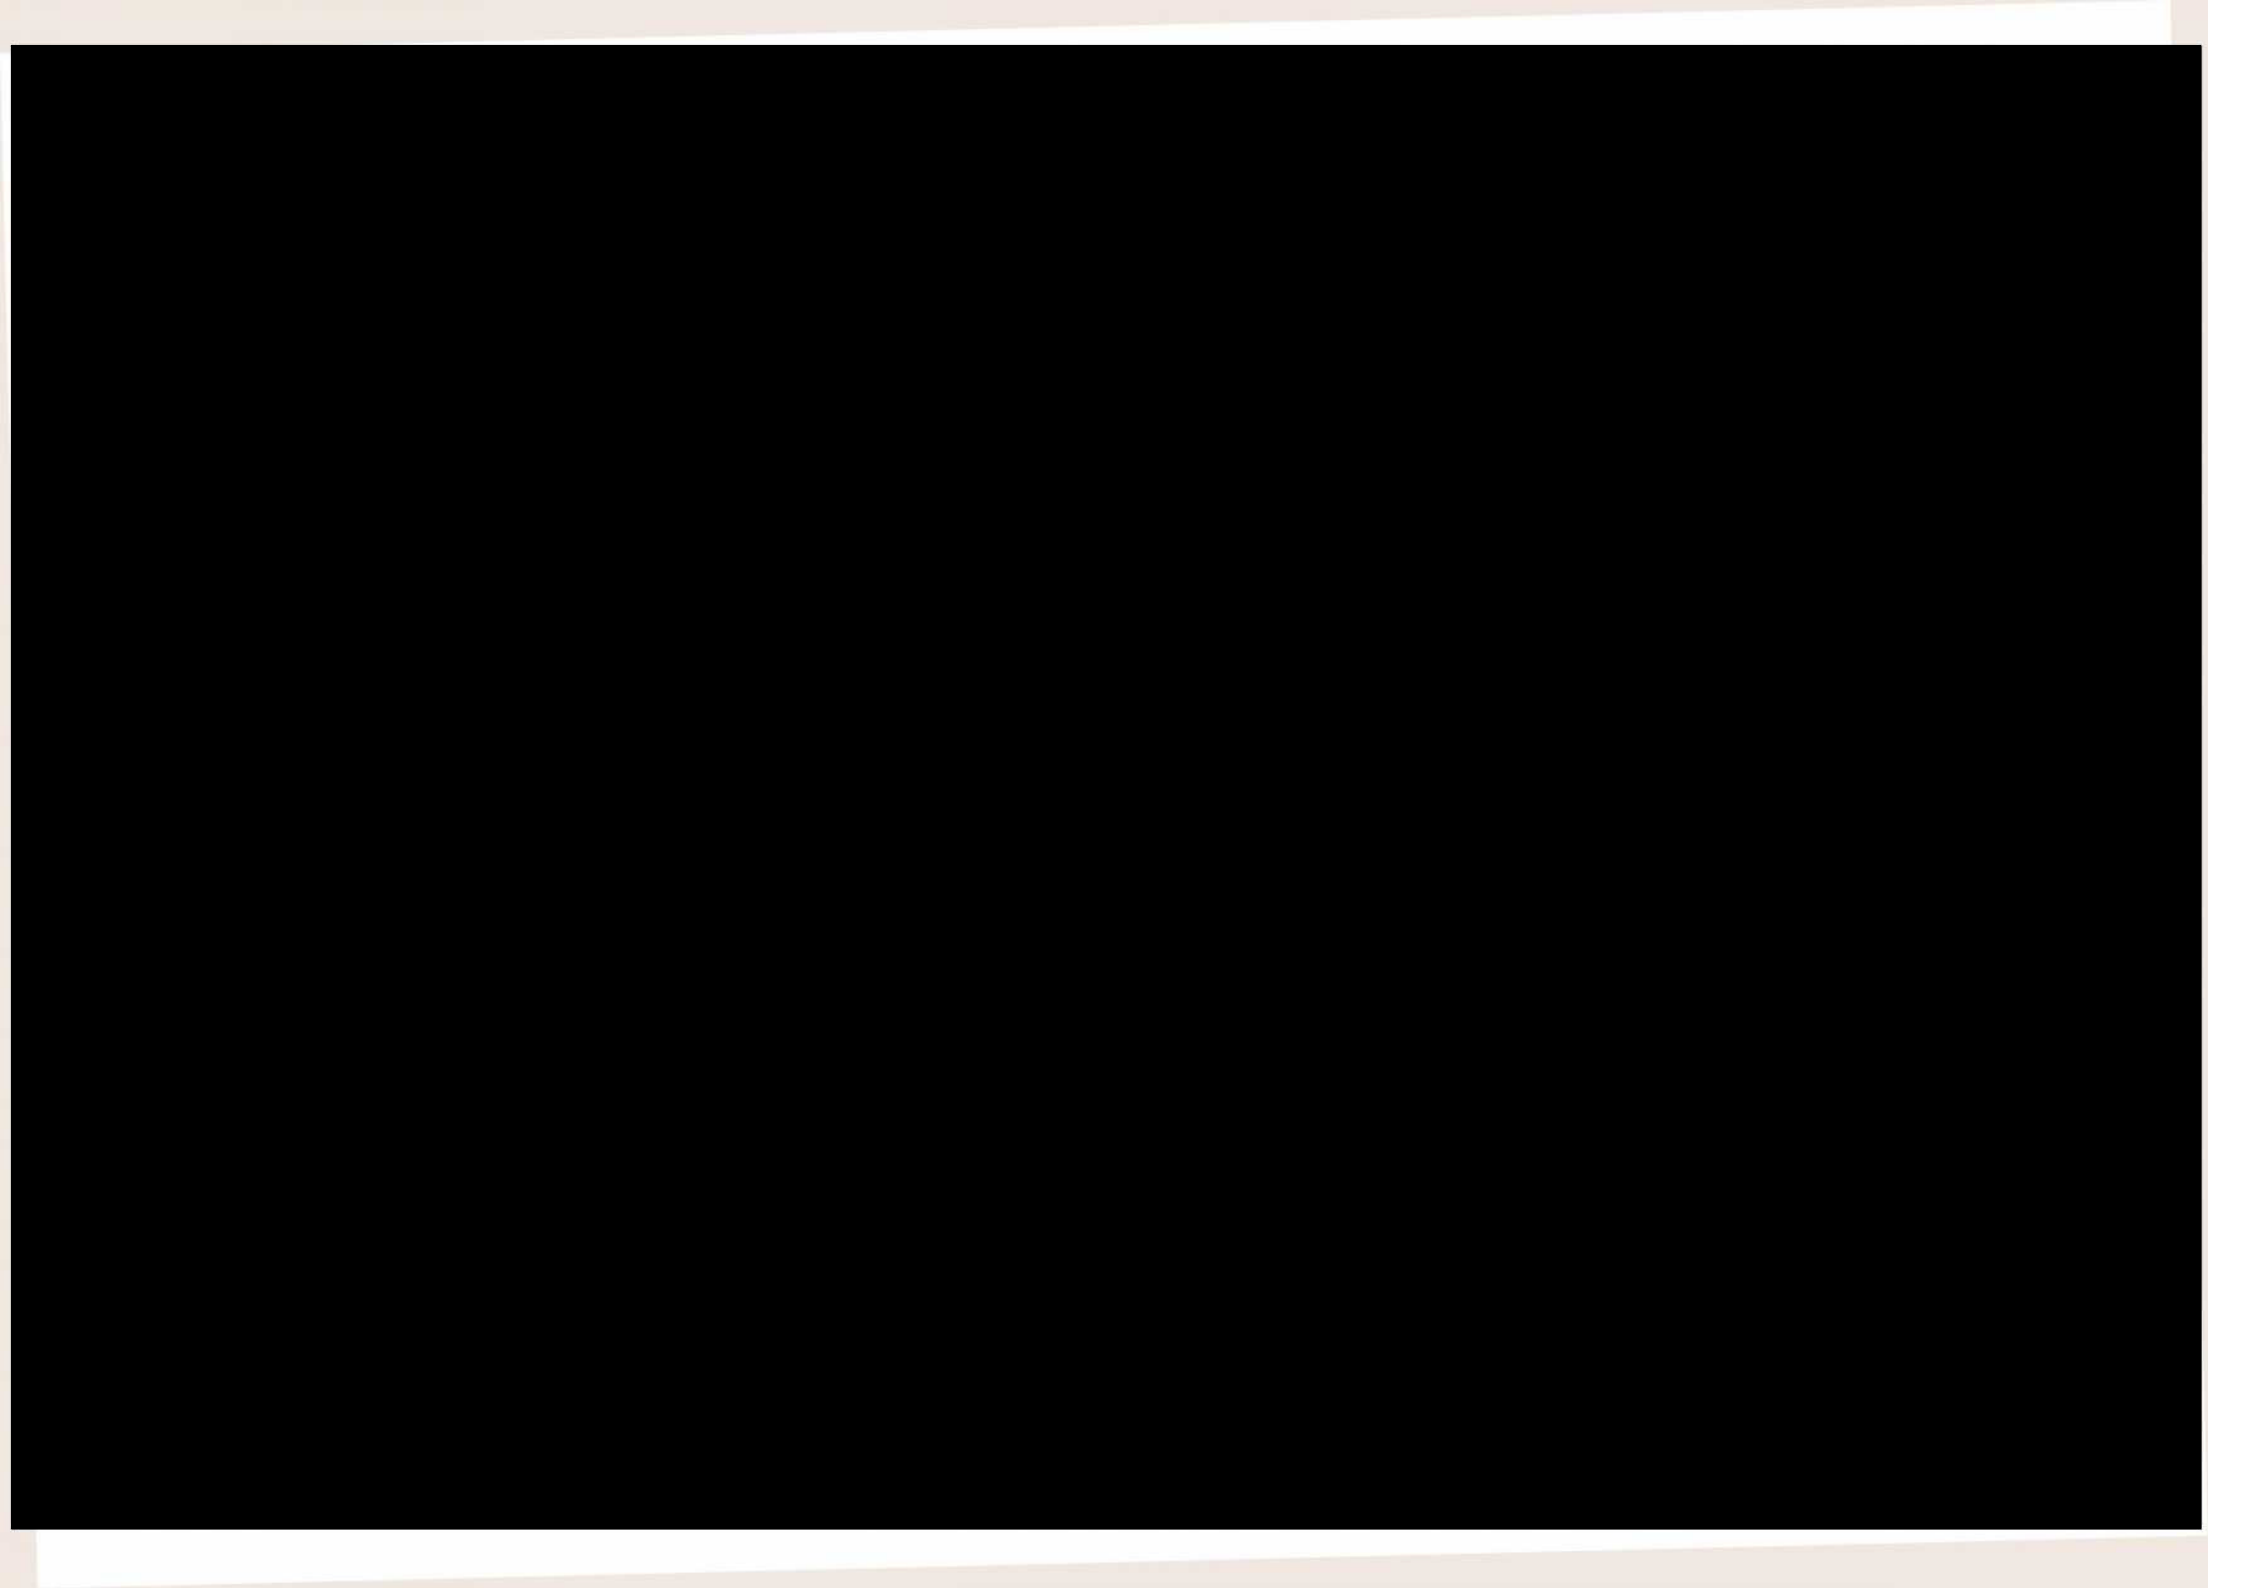



Vyhodnocení cenové nabídky

Stavba: Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C

ZL č.	20
-------	----

							Vyhodnocení cenových nabídek					
SO/PS	VON	Vedlejší a ostatní náklady					Cenová nabídka č. 1		Cenová nabídka č. 2		Cenová nabídka č. 3	
Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	množ.	množ.	množ.	Cena	Cena celkem	Cena	Cena celkem	Cena	Cena celkem
				PDPS	RDS	rozdíl	Jedn.	rozdíl	Jedn.	rozdíl	Jedn.	rozdíl
		Nájezd mobilního jeřábu - 2c etapa										
1		přístavení jeřábu LTM 1500 a nastrojení	soub.					135 840,71		170 000,00		0,00
2		denní sazba jeřábnických prací	soub.					257 522,12		299 120,00		0,00
3		složení a odjezd jeřábu LTM 1500	soub.					135 840,71		170 000,00		0,00
								529 203,54		639 120,00		0,00

CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel:

Firma: Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o.
IČ: 27243460
DIČ: CZ699003438
Adresa: Počernická 425, Radonice

Odběratel:

Firma: Metrostav DIZ, s.r.o.
IČ: 25021915
DIČ:
Adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Zpracovatel nabídky:

Jméno:
E-mail:
Telefon:

Kontaktní osoba:

Jméno:
E-mail:
Telefon:

Datum poptávky: 15. 11. 2023 **Předmět nabídky:** Pronájem jeřábu LTM 1500
Datum prohlídky: 10. 10. 2023 **Místo realizace:** Praha Florenc
Datum nabídky: 15. 11. 2023 **Název nabídky:** Metrostav DIZ, LTM 1500, Florenc, 15.11.2023, V1, MK
Termín realizace: 02/2024 **Počet stran:** 2

Vážená paní / Vážený pane,

velice Vám děkujeme za poptávku a dovoluujeme si Vám zaslat naší cenovou nabídku.

Cenové podmínky:

LTM 1500 – přistavení + Mo	67 921 Kč
LTM 1500 – denní směna 0-10 hodin	128 760 Kč
LTM 1500 – De + odjezd	67 921 Kč
LTM 1500 – každá další hodina nad rámec směny	9 200 Kč

Provozní podmínky:


- postavení je znázorněno v příložené situaci
- uvažujeme hmotnost 28t na vyložení 40m
- stavba nám musí umožnit přejezd nové stropní desky (hmotnost jeřábu 96t = 8x 12t na nápravu)
- cena za přistavení je platná pouze při využití jeřábu na 1 měsíc
-


Ostatní podmínky:

- Ceny jsou uvedeny bez DPH, výše DPH se účtuje dle zákona podle druhu prováděných prací.
- Veškerá práva a povinnosti se řídí obchodními podmínkami č. 2021/1 společnosti Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o. ze dne 21.06.2021 (dále jen „obchodní podmínky“). Zasláním objednávky dle této cenové nabídky prohlašujete, že jste se s obchodními podmínkami seznámil/a a akceptujete je - veškeré potřebné dokumenty včetně obchodních podmínek naleznete na našich stránkách <https://www.hanys.cz/o-nas/dokumenty.html>
- Splatnost faktury je 45 dní
- Platnost cenové nabídky je 3 měsíce

Těšíme se na budoucí spolupráci

S pozdravem a přáním hezkého dne





LiveTransport s.r.o.

Dobrovského 1076/36
170 00 Praha 7
IČO: 06874002
DIČ CZ06874002

ODBĚRATEL:
Metrostav DIZ s.r.o. - Geostan Group a.s.

Metrostav DIZ s.r.o.
Zavod 8, Koželuhova 2450
18000 Praha 8

Cenová nabídka na jeřábnické práce

Akce: Rekonstrukce stropní desky Florenc

č.	popis		m.j.	j. cena	Cena DPH	celkem	bez
1	Nájezd mobilního jeřábu				Kč	85 000,00	
2	Denní nájem mobilního jeřábu	SO + NE			Kč	299 120,00	
3	Složení a odjezd mobilního jeřábu				Kč	85 000,00	

Součástí cenové nabídky je:

Jeřáb pro nosnot 30t závaží dle pozic poskytnutých objednatelem pro tvorbu cenové nabídky

Veškeré práce spojené s přistavením, provozem, odjezdem jeřábu

Pracovní doba za denní nájem je 10 hod

Každá započatá hodina práce mobilního jeřábu bude účtována nad rámec dohodnuté ceny za denní nájem

Zajištění platného povolení pro vjezd do města nadrozměrného nákladu, a to včetně všech správních poplatků Měsíční fakturace dle skutečnosti s e splatností faktury 30 dní

Součástí cenové nabídky NEJÍ

Příjezdové komunikace a zpevněné plochy

Zařízení stavemště a ostrahu

Elektrickou energii a vodu

Silniční uzávěry

Dne: 08.11.2023
