

Harmonogram stavby "Rekonstr.sport.areálu Rokycany_rev2"

[illegible]

963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	2 189,95	9,600
966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	28 154,86	331,000
966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových přes 2,5 m odřezáním	kus	993,60	10,000
966073R01	Demontáž fotbalových branek vč.odvozu a uložení	kpl	1 933,20	1,000
966073R02	Demontáž basketbalových košů vč.odvozu a uložení	kpl	1 933,20	1,000
966073R03	Demontáž ochranných sítí vč.odvozu a likvidace	kpl	1 933,15	1,000
966073R04	Vybourání pískového doskočiště vč.odvozu a likvidace	kpl	3 866,40	2,000
966073R05	Demontáž sloupů osvětlení vč.odvozu a likvidace	kpl	11 599,20	6,000
966073R06	Demontáž fotbalových střídaček vč.odvozu a uložení	kpl	1 933,20	2,000
997	Doprava sutě a vybouraných hmot		2 152 282,81	0,000
997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se	t	336 128,00	3 477,426
997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	176 792,34	13 909,704
997013631	Poplatek za uložení na skládce (sklárkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	13 332,42	11,789
997013813	Poplatek za uložení na skládce (sklárkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1 029 338,34	380,311
997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sklárkovně) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	71 879,99	186,842
997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sklárkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	377 922,98	2 172,096
997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (sklárkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	146 888,74	727,100
PSV	Práce a dodávky PSV		13 918,80	0,000
767	Konstrukce zámečnické		13 918,80	0,000
767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do sutě	m	13 918,80	120,000
SO.01	Fotbalové hřiště		15 554 351,37	0,000
01.01	Hřiště s umělým povrchem		8 458 935,98	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV		8 458 935,98	0,000
1	Zemní práce		1 174 550,86	0,000
171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	1 055 940,34	1 206,720
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	118 610,52	5 028,000
2	Zakládání		205 203,46	0,000
213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	177 935,89	5 028,000
275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 XC3	m3	4 086,24	1,152

[illegible]

[illegible]

894812352	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s teleskopickým adaptérem	kus	14 400,00	3,000
899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	4 617,00	256,500
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		906 757,60	0,000
935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm do betonového lože	m	906 757,60	532,000
998	Přesun hmot		191 428,93	0,000
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	191 428,93	1 018,239
01.03	akumulační nádrž		340 449,48	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV		333 343,66	0,000
1	Zemní práce		86 977,22	0,000
131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	17 383,28	61,425
132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	14 212,44	34,920
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	8 205,82	7,936
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3 492,00	29,100
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 153,40	29,100
151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	3 720,00	40,000
151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	1 280,00	40,000
151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	3 877,17	70,494
151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	916,42	70,494
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6 071,01	36,794
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11 901,78	66,121
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	521,68	29,810
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7 288,60	67,487
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4 965,62	5,238
181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	988,00	39,520
3	Svislé a kompletní konstrukce		146 822,00	0,000
382122122	Montáž dna ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t délky přes 3 do 5 m	kus	111 822,00	2,000
382122312	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží délky přes 3 do 5 m	kus	35 000,00	2,000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	490,00	19,600
2	Zakládání		60 488,38	0,000
275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 XC3	m3	35 079,48	9,720
275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	16 329,60	43,200
275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	3 240,00	43,200
275353123	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl přes 1 do 2 m	kus	4 880,00	8,000
278311152	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 20/25 obj přes 0,02 do 0,10 m3	m3	959,30	0,181
3	Svislé a kompletní konstrukce		89 056,00	0,000
338171R01	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2,6 m se zalitím MC	kus	53 200,00	18,000
348401R04	Montáž ochranné sítě napnuté mezi sloupky pomocí nerezových lanek	m2	35 856,00	96,000
998	Přesun hmot		11 114,21	0,000
998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v přes 3 do 10 m	t	11 114,21	25,847
PSV	Práce a dodávky PSV		6 525,82	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry		6 525,82	0,000
783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	999,17	15,612
783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 967,11	15,612
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3 559,54	31,224
01.06	osvětlení		2 235 222,00	0,000
1.	Elektromontáže/materiály		1 777 222,00	0,000
1	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 uvnitř stožáru	m	15 042,00	276,000
2	Na pojení kabelu ze stávající základové patky do nové	m	30 000,00	30,000
3	Ukon.kabelu do 4x10 mm2	ks	3 360,00	8,000
4	LED světlomet AAA-LUX typ WS200 1550W	ks	244 000,00	4,000
5	LED světlomet AAA-LUX typ WS250 1550W	ks	488 000,00	8,000
6	Clona LED světlometu	ks	31 680,00	96,000
7	Stožár sklápěcí HL330 20m, žár.zink	ks	860 000,00	4,000
8	Výložník SB3 pro 3 světlomety	ks	23 400,00	4,000
9	Kotvící šrouby a vymezovací šablony	kpl	30 000,00	4,000
10	Jišťení do stožáru se zásuvkou	kpl	19 800,00	4,000
11	Demontáž svítidel, odpojení	ks	5 400,00	12,000
12	Demontáž výložníků	ks	900,00	6,000
13	Demontáž kabelů ve stožárech	m	2 040,00	204,000

14	Demontáž předřadníků ve stožárech/ skříňích	ks	5 400,00	12,000
15	Demontáž výzbrojí ve stožáru	ks	1 200,00	6,000
16	Přesun, obecná reže, doprava dodávek	kpl	14 500,00	1,000
17	Přirážka na podružný materiál	kpl	2 500,00	1,000
2.	Rozvaděče		89 000,00	0,000
18	Nový rozvaděč ovládání	kpl	29 500,00	1,000
19	InControl, řídicí a ovládací systém osvětlení, ovládání přes aplikaci mobilního telefonu	kpl	59 500,00	1,000
3.	Hodinové zúčtovací sazby		29 000,00	0,000
20	Vysokozdvížná plošina na montáže a demontáže	hod	20 000,00	16,000
21	Revize elektro	hod	6 600,00	12,000
22	Spolupráce s revizním technikem	hod	2 400,00	3,000
4.	Zemní práce a výkopy		340 000,00	0,000
23	Jáma pro stož.VO do 2 m3 tř. zem. 3, strojně	m3	36 000,00	30,000
24	Betonový základ vč. ocelové výztuže a montáž mimo osu kabelu 2,5x2,5x1,2m	ks	304 000,00	4,000
01.07	přípojka elektro		69 503,95	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV		16 583,00	0,000
741	Elektroinstalace - silnoproud		16 583,00	0,000
741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	1 039,40	10,000
741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	7 824,60	81,000
741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	936,00	10,000
741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	78,00	3,000
741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	905,00	1,000
741999R01	Stavební přípomoc	kpl	5 800,00	1,000
M	Práce a dodávky M		41 920,95	0,000
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích		41 920,95	0,000
460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	3 500,00	0,080
460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	6 160,00	80,000
460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	11 200,00	80,000
460662112	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn bez zakrytí š pře 35 do 50 cm	m	13 680,00	80,000
460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	1 440,00	80,000
460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	5 940,95	81,000

[illegible]

[illegible]

278311152	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 20/25 obj přes 0,02 do 0,10 m3	m3	1 918,60	0,362
3	Svislé a kompletní konstrukce		186 910,76	0,000
338171R01	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2,6 m se zalitím MC	kus	109 850,00	39,000
348401R04	Montáž ochranné sítě napnuté mezi sloupky pomocí nerezových lanek	m2	77 060,76	228,000
998	Přesun hmot		22 220,68	0,000
998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v přes 3 do 10 m	t	22 220,68	51,676
PSV	Práce a dodávky PSV		13 553,23	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry		13 553,23	0,000
783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2 075,14	32,424
783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4 085,42	32,424
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7 392,67	64,848
SO.04	Multifunkční hřiště 2		1 868 696,83	0,000
04.01	Hřiště 2		1 484 951,44	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV		1 484 951,44	0,000
1	Zemní práce		119 758,78	0,000
171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	99 922,80	107,908
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	19 835,98	793,439
5	Komunikace pozemní		1 276 638,40	0,000
564720011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-16 mm plochy přes 100 m2 tl 80	m2	52 731,96	793,439
564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150	m2	125 863,23	793,439
576136121	Asfaltový koberec otevřený AKOJ 8 (AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	169 867,36	793,439
576146321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	203 937,63	793,439
579221261	Strojně litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt přes 300 m2	m2	698 226,32	793,439
579291111	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	26 011,90	285,845
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		62 000,00	0,000
916230R02	Sada pro volejbal/nohejbal (zemní pouzdra, sloupky do pouzder + síť), žárový pozink	kpl	10 000,00	1,000
916230R03	Sada pro basketbal - (2x basketbalový koš včetně ocel.konstrukce), žárový pozink	kus	52 000,00	1,000
998	Přesun hmot		26 554,26	0,000
998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	26 554,26	227,426

[illegible]

162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	982,74	5,956
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 929,78	10,721
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	104,23	5,956
181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	875,88	35,035
2	Zakládání		1 009,26	0,000
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 009,26	28,035
4	Vodorovné konstrukce		9 968,71	0,000
452313151	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	6 785,95	1,684
452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3 182,76	8,420
5	Komunikace pozemní		27 081,01	0,000
564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	5 563,91	35,035
564730R01	Pískoviště z křemičitého písku frakce 0,4-1,4 mm	m3	16 129,90	7,013
579291111	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	5 387,20	59,200
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		135 812,75	0,000
916271R01	Chodníkový obrubník z recyklované pryže červený kladený svisle do betonového lože	m	13 500,00	22,500
916299R01	Dodávka a montáž lapače písku	m	107 355,00	21,050
916299R02	Dodávka a montáž odrazového břevna vč.základového rámu	ks	10 550,00	1,000
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4 407,75	1,125
998	Přesun hmot		2 621,72	0,000
998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	2 621,72	28,497
SO.06	Doskočiště - skok do dálky		221 604,93	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV		221 604,93	0,000
1	Zemní práce		5 441,19	0,000
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1 548,56	5,956
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	982,74	5,956
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 929,78	10,721
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	104,23	5,956
181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	875,88	35,035
2	Zakládání		1 009,26	0,000

213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 009,26	28,035
4	Vodorovné konstrukce		9 968,71	0,000
452313151	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	6 785,95	1,684
452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3 182,76	8,420
5	Komunikace pozemní		27 081,01	0,000
564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	5 563,91	35,035
564730R01	Pískoviště z křemičitého písku frakce 0,4-1,4 mm	m3	16 129,90	7,013
579291111	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	5 387,20	59,200
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		175 483,04	0,000
916271R01	Chodníkový obrubník z recyklované pryže červený kladený svisle do betonového lože	m	13 500,00	22,500
916299R01	Dodávka a montáž lapače písku	m	107 355,00	21,050
916299R02	Dodávka a montáž odrazového břevna vč.základového rámu	ks	10 550,00	1,000
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	44 078,04	1,125
998	Přesun hmot		2 621,72	0,000
998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	2 621,72	28,497
SO.07	Skok do výšky		60 000,00	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV		60 000,00	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		60 000,00	0,000
916999R01	Mobilní konstrukce pro skok do výšky vč.krytu a mobilních sloupků (specifikace dle PD)	kpl	60 000,00	1,000
SO.08	Zpevněné plochy		1 349 482,04	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV		1 226 845,93	0,000
1	Zemní práce		113 762,29	0,000
122151403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	2 319,00	37,500
132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3 862,72	6,400
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 304,38	37,500
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	919,68	6,400
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 444,88	37,500
171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	64 569,21	80,063

171201231	Poplatek za uložení zemin a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 805,99	11,520
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky	m3	97,54	6,400
181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	6 422,50	250,000
181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	3 332,50	250,000
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5 345,69	250,000
181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	12 816,00	588,700
181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	3 920,00	250,000
182112121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	515,47	4,800
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	882,50	250,000
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	120,00	250,000
183552431	Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	314,23	0,250
184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	555,00	250,000
185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 215,00	500,000
2	Zakládání		43 788,87	0,000
274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC3	m3	8 046,52	2,560
274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5 267,36	16,000
274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	1 212,32	16,000
275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 XC3	m3	21 323,27	6,784
275313R01	Osazení PVC pouzdra pro sloupky ochranných sítí a zábradlí	m	7 939,40	21,200
4	Vodorovné konstrukce		49 880,03	0,000
430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	5 111,40	1,133
430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	1 494,52	0,052
431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3 979,78	5,712
431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	686,53	5,712
451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	38 607,80	545,000
5	Komunikace pozemní		438 357,86	0,000
564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100	m2	55 862,50	545,000
564750002	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2	8 732,13	43,700
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50	m2	373 763,23	582,300

[illegible]

[illegible]

576146321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	159 200,64	648,000
579221221	Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva s impregnací na asphalt přes 300 m2	m2	545 058,72	648,000
589811111	Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport š 5 cm	m	13 718,49	157,720
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		60 916,94	0,000
916230R01	Sada pro tenis (zemní pouzdra, sloupky do pouzder + síť), žárový pozink	kpl	11 470,01	1,000
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	30 266,78	108,000
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruzy z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	19 180,15	5,400
998	Přesun hmot		22 198,52	0,000
998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	22 198,52	252,428
09.02	odvodnění		151 715,05	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV		151 715,05	0,000
1	Zemní práce		55 974,95	0,000
132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	27 164,50	60,500
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6 550,50	39,700
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12 862,80	71,460
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	694,75	39,700
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 246,40	20,800
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4 531,00	5,750
181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	1 925,00	77,000
2	Zakládání		70 490,00	0,000
212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	70 490,00	190,000
4	Vodorovné konstrukce		2 494,00	0,000
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2 494,00	2,000
8	Vedení trubicí dálková a přípojná		12 565,00	0,000
871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	6 475,00	25,000
877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2 670,00	10,000
877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	2 970,00	5,000

[illegible]

[illegible]


338171R01	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2,6 m se zalitím MC	kus	215 650,00	79,000
348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	15 348,28	2,000
348401R04	Montáž ochranné sítě napnuté mezi sloupky pomocí nerezových lanek	m2	140 641,44	432,000
998	Přesun hmot		30 745,77	0,000
998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v přes 3 do 10 m	t	30 745,77	93,169
PSV	Práce a dodávky PSV		26 514,99	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry		26 514,99	0,000
783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4 059,71	63,433
783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7 992,56	63,433
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14 462,72	126,866
SO.10	Tenis.kurt s odrazovou stěnou		929 870,01	0,000
10.01	tenis.kurt		711 392,76	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV		672 857,42	0,000
1	Zemní práce		68 187,23	0,000
132212122	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	810,80	1,920
132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	14 125,31	29,740
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 312,18	14,900
171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	36 070,03	41,416
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4 540,36	26,820
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 540,99	93,620
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 702,31	16,760
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	6 282,34	267,220
182112121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	802,91	6,924
2	Zakládání		67 529,67	0,000
274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XC4	m3	48 865,29	12,980
274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	14 468,65	51,280
274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4 195,73	51,280
3	Svislé a kompletní konstrukce		105 587,12	0,000
311113154	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 XC4	m2	74 478,29	44,100


311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	31 108,83	0,630
4	Vodorovné konstrukce		11 941,54	0,000
430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	6 104,40	1,253
430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	2 327,75	0,075
431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2 993,09	3,978
431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	516,30	3,978
5	Komunikace pozemní		379 774,21	0,000
564720011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-16 mm plochy přes 100 m2 tl 80	m2	15 752,52	252,000
564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150	m2	37 595,88	252,000
576136121	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	50 740,20	252,000
576146321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	60 918,48	252,000
579221221	Strojně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva s impregnací na asphalt přes 300 m2	m2	208 565,28	252,000
589811111	Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport š 5 cm	m	6 201,85	72,460
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		25 702,02	0,000
916230R01	Sada pro tenis (zemní pouzdra, sloupky do pouzder + síť), žárový pozink	kpl	11 286,09	1,000
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	8 824,06	32,000
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5 591,87	1,600
998	Přesun hmot		14 135,63	0,000
998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	14 135,63	163,361
PSV	Práce a dodávky PSV		38 535,34	0,000
767	Konstrukce zámečnické		6 681,09	0,000
767163R01	D+M zábradlí v.1100 mm, kotvené do betonu, ocel.trubka prům.60 mm, povrch.úprava pozink	m	661,84	2,270
998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	6 019,25	20,000
771	Podlahy z dlaždic		31 854,25	0,000
771274125	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 350 do 400 mm	m	21 343,32	6,100
771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m	3 321,33	6,100
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	1 170,35	12,200
998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	6 019,25	20,000
10.02	ochranné sítě		218 477,25	0,000


[illegible]


[illegible]


[illegible]

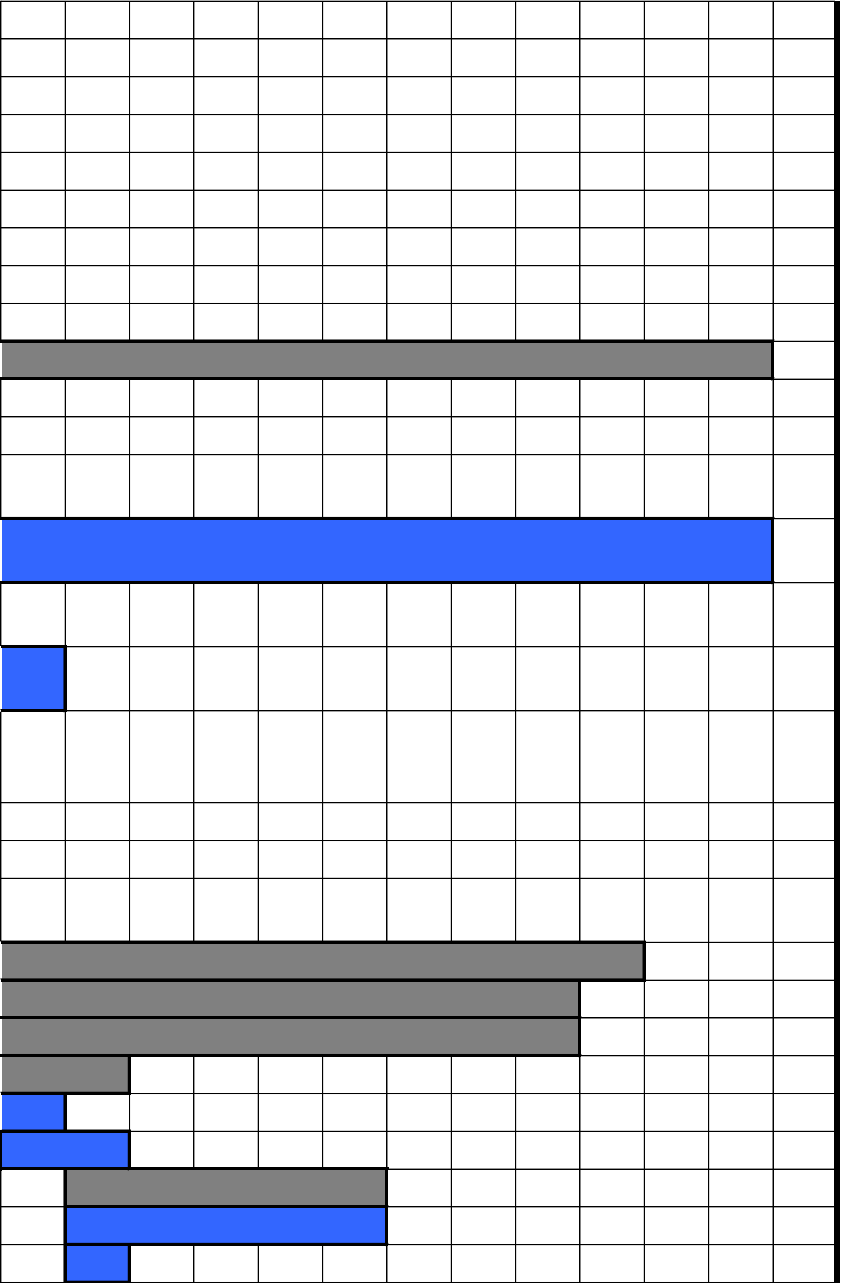


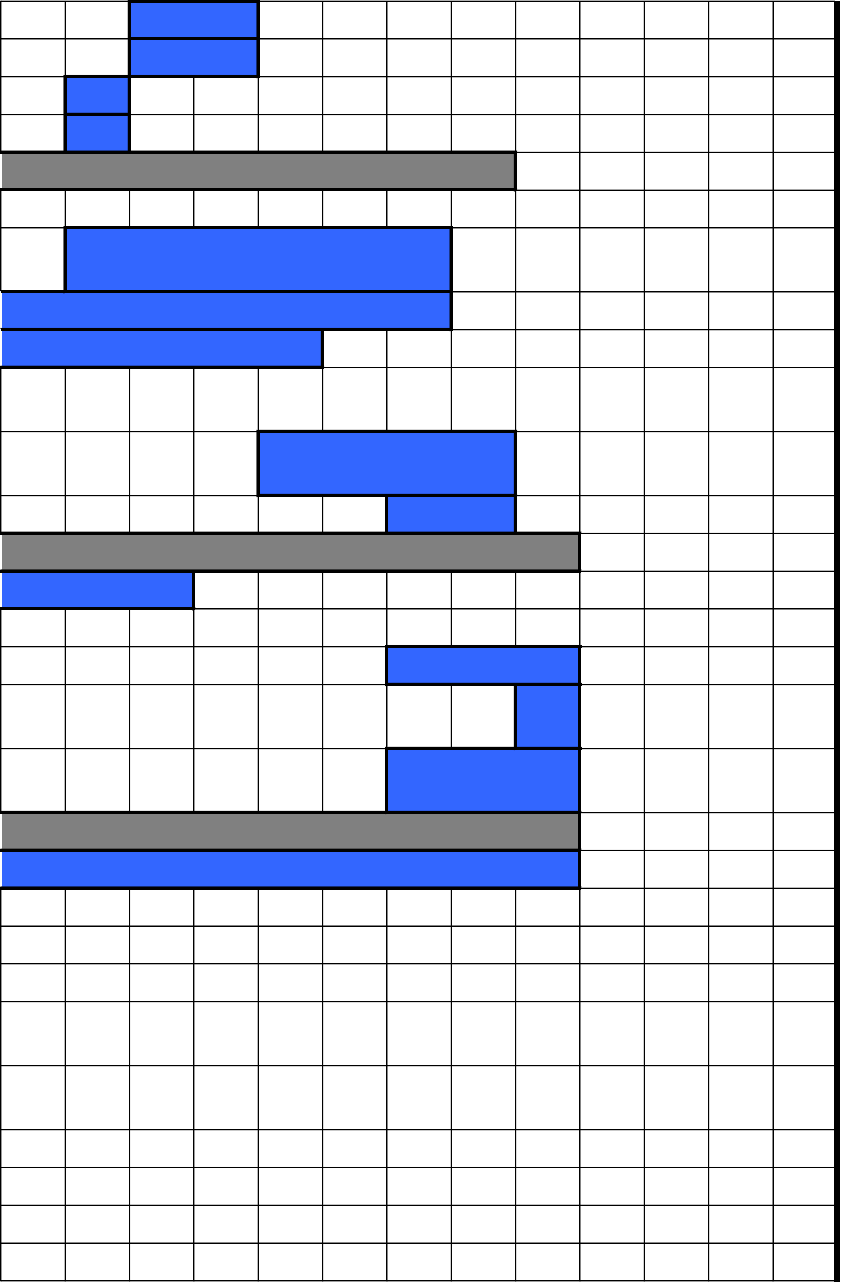


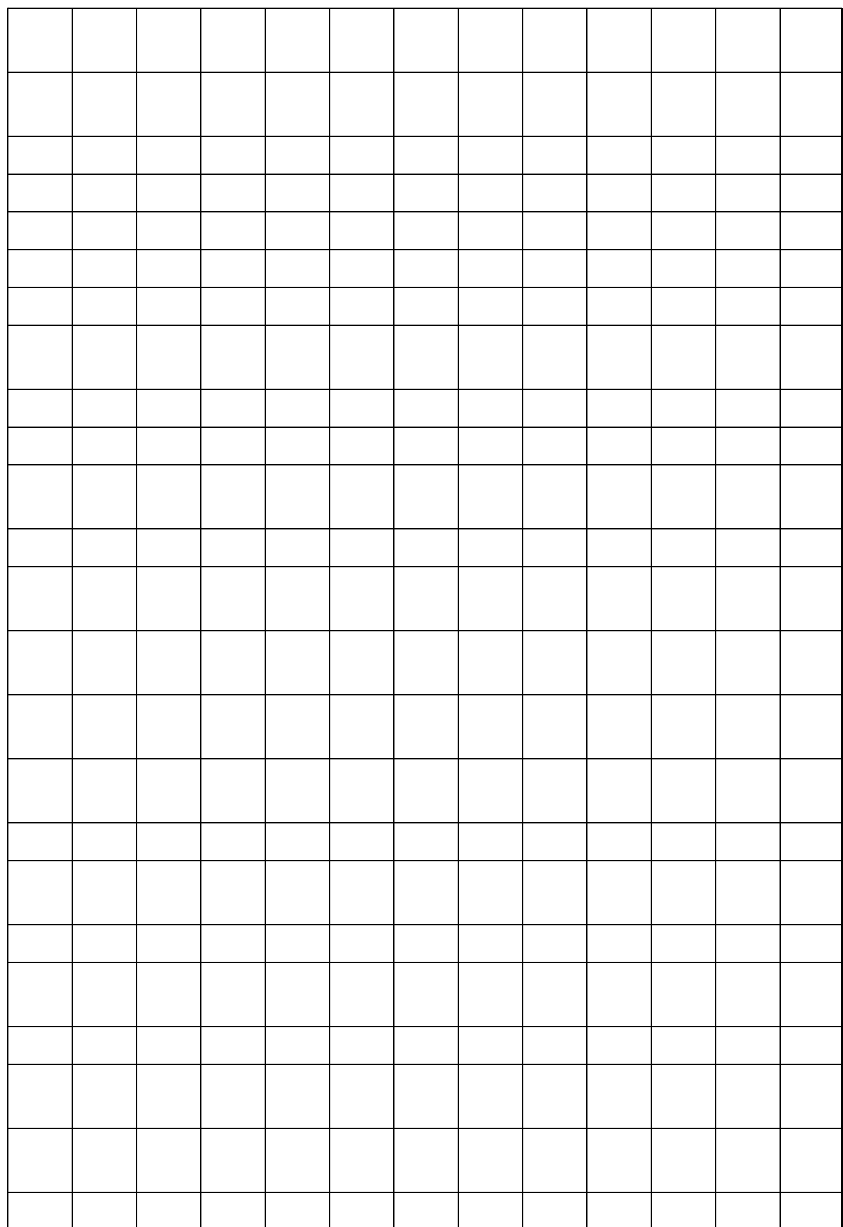


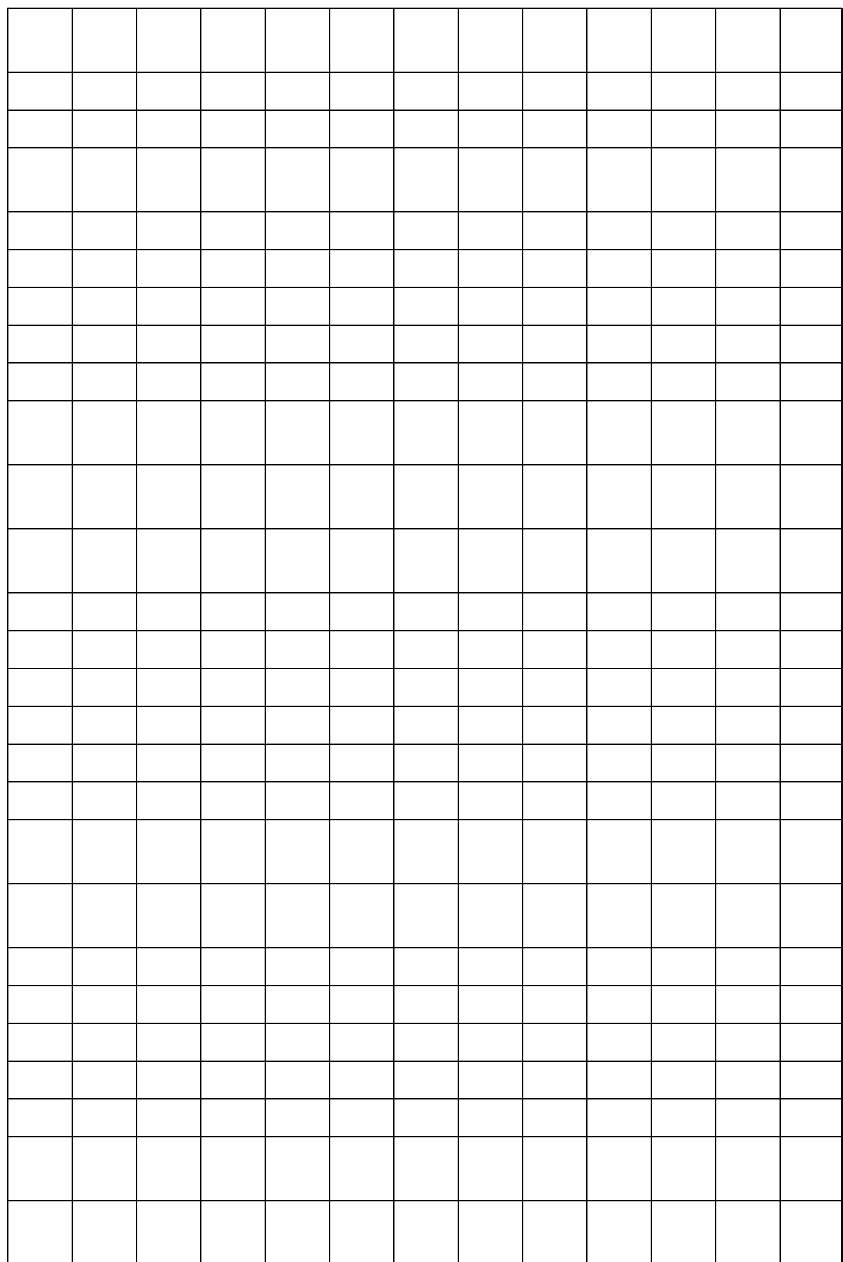


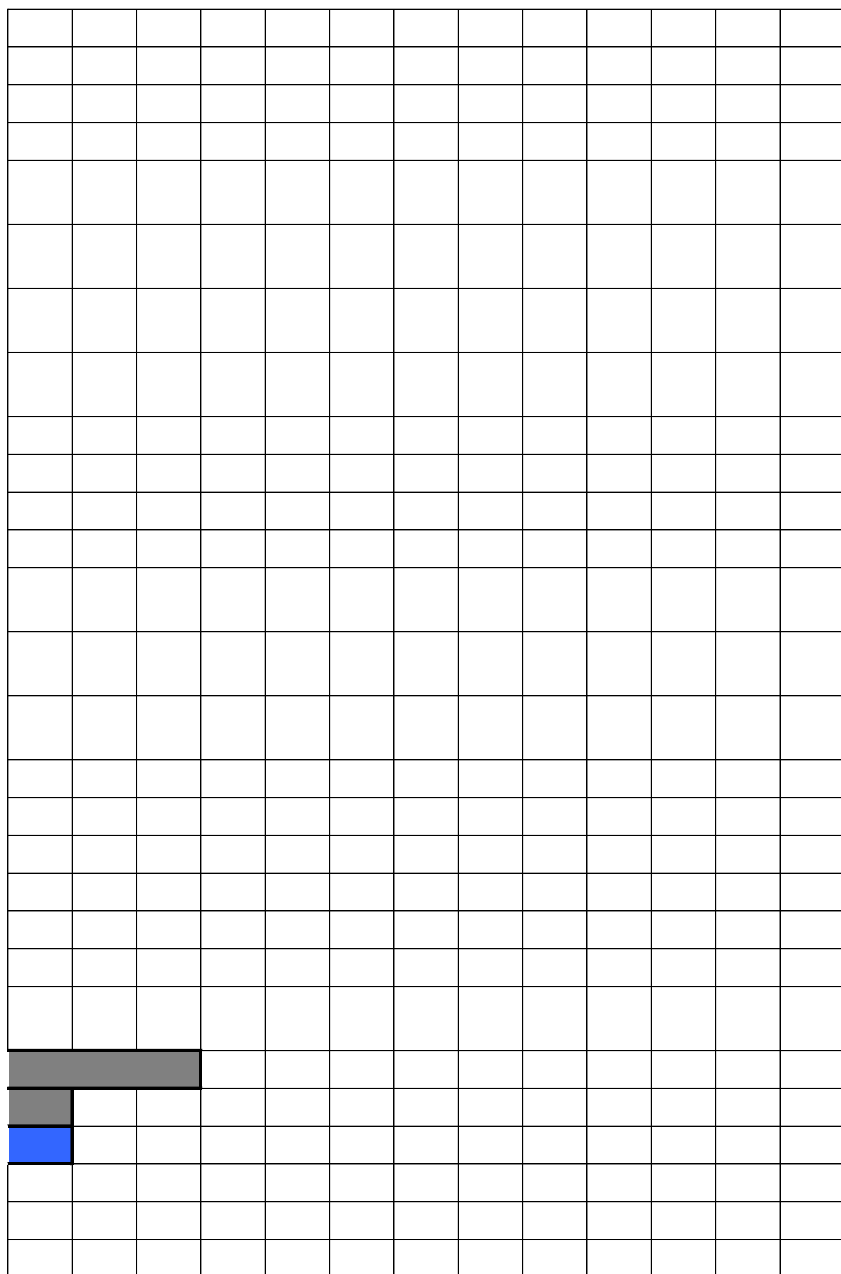


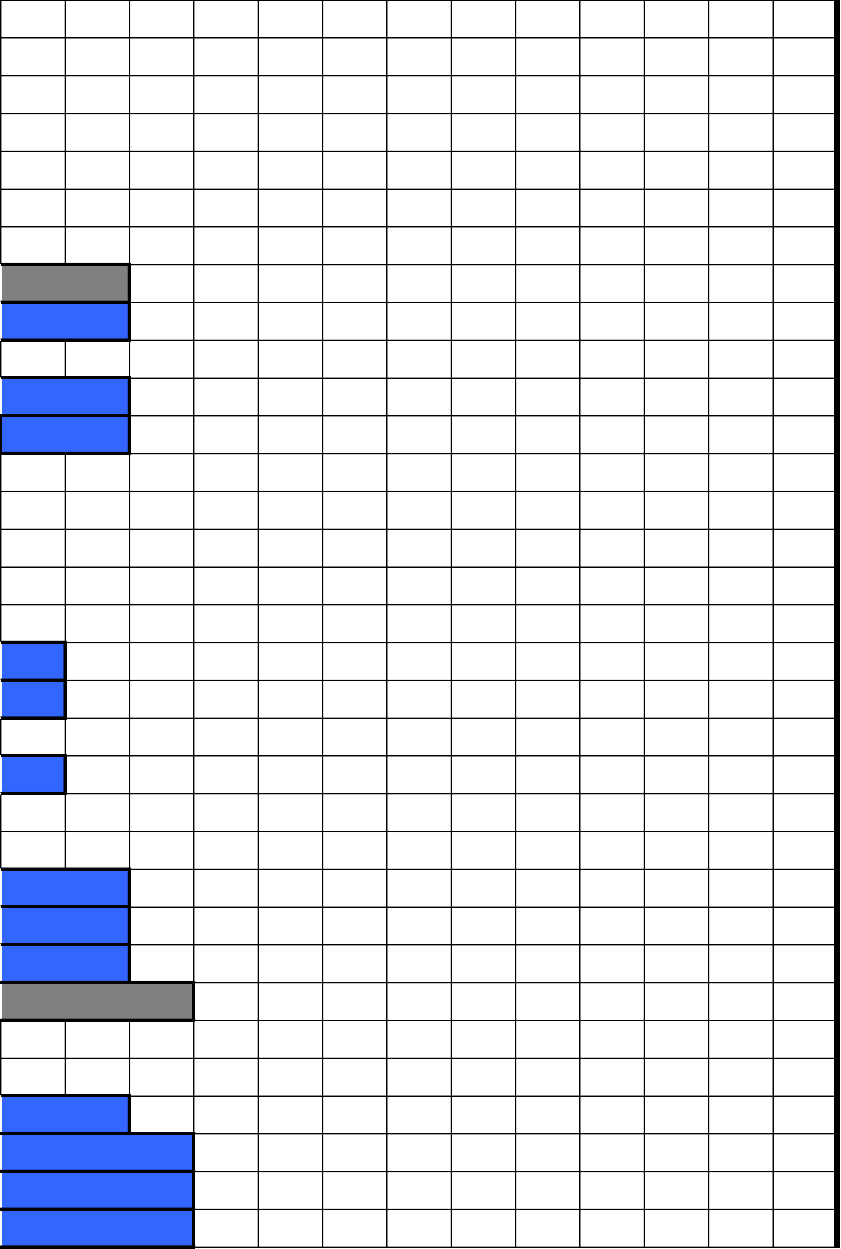


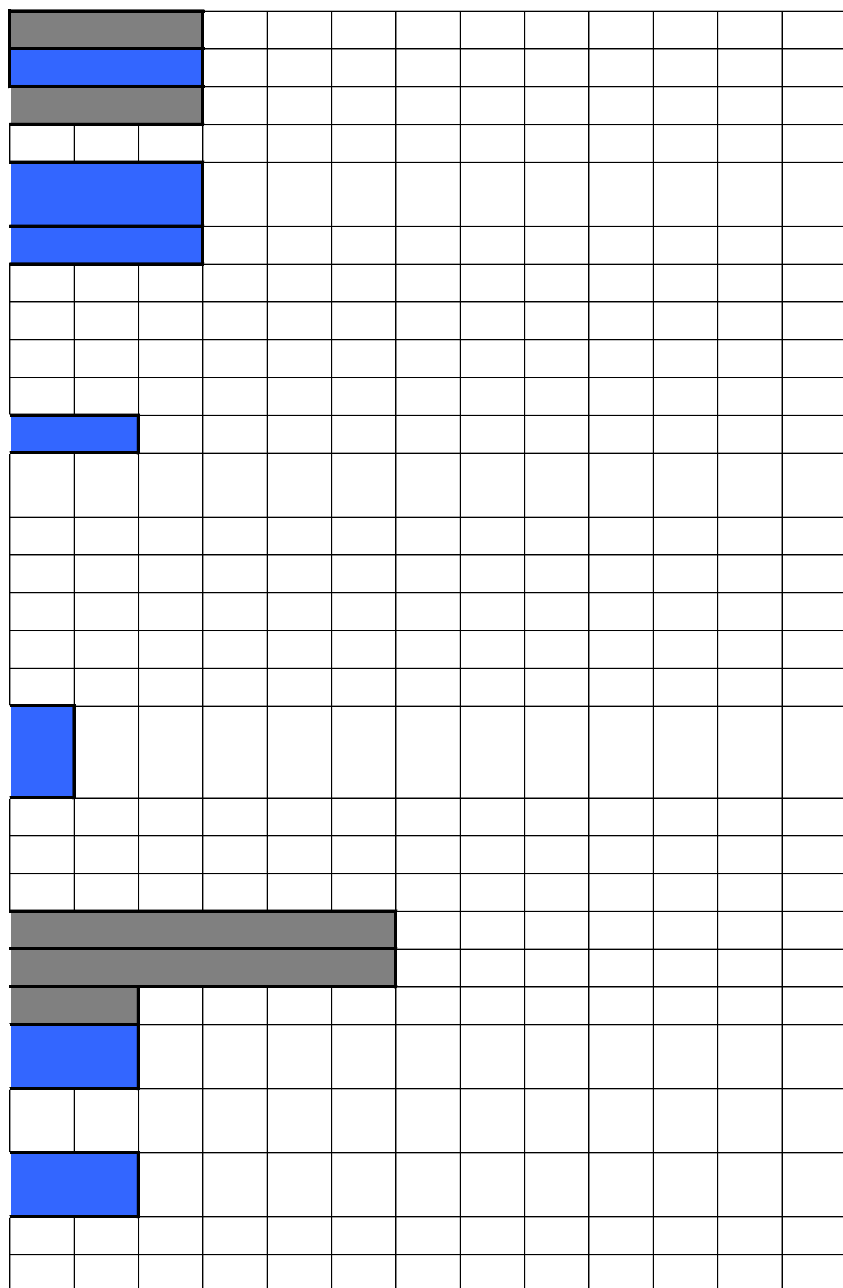


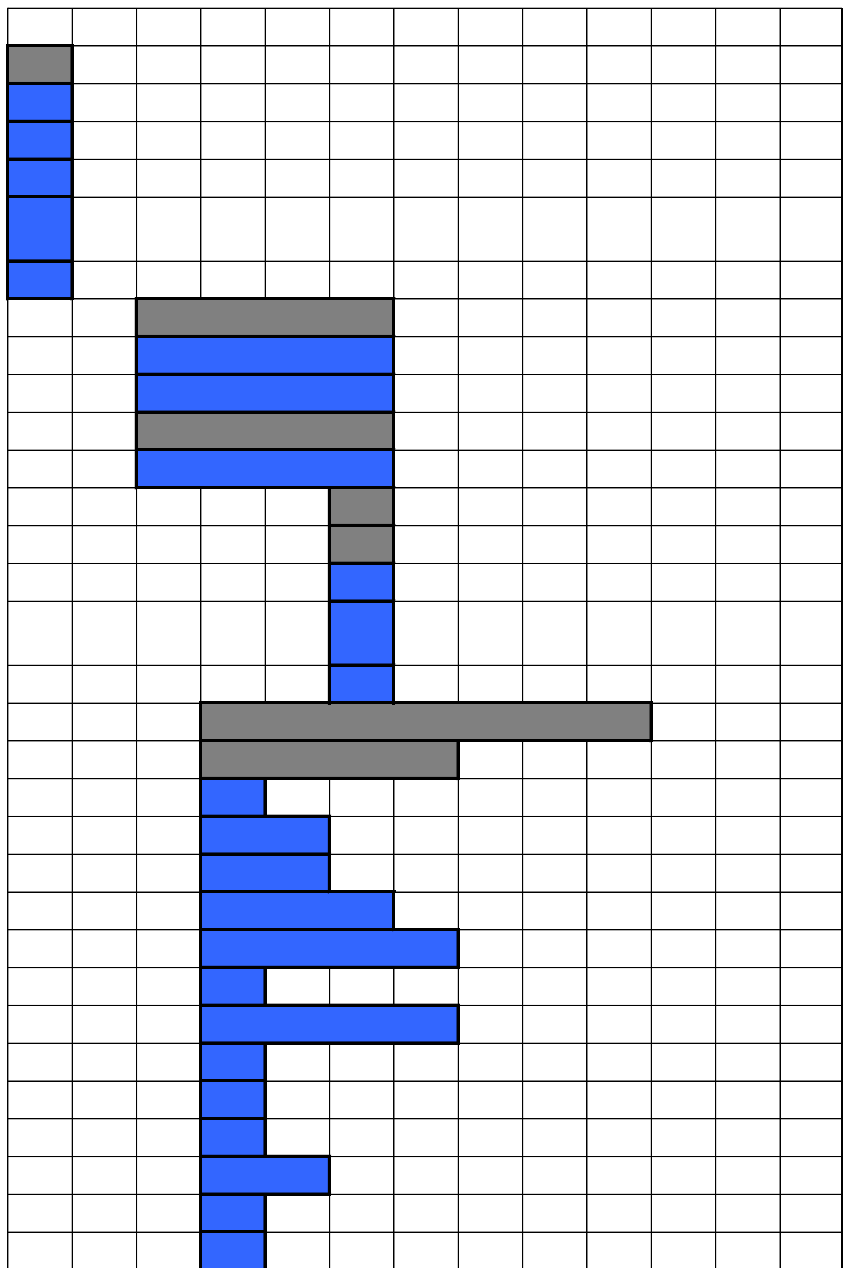


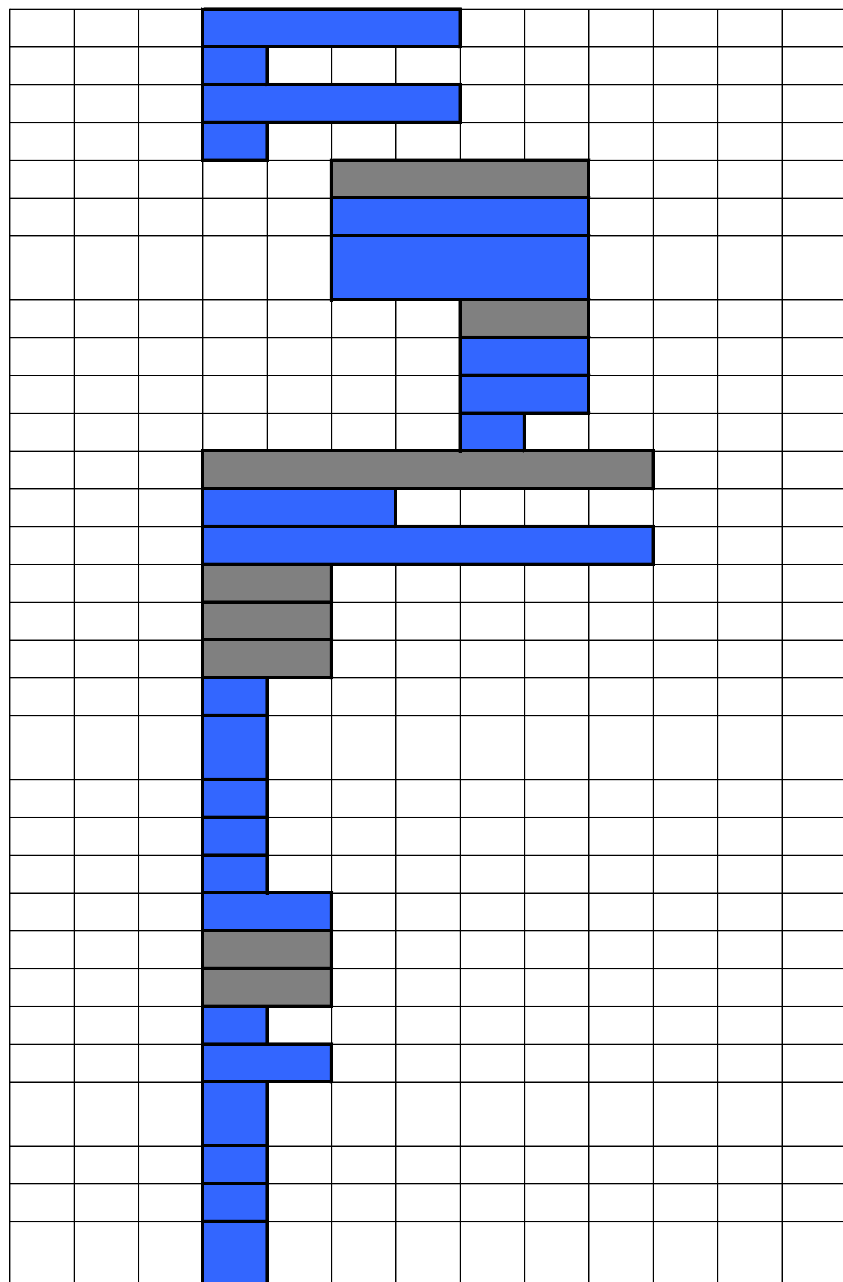


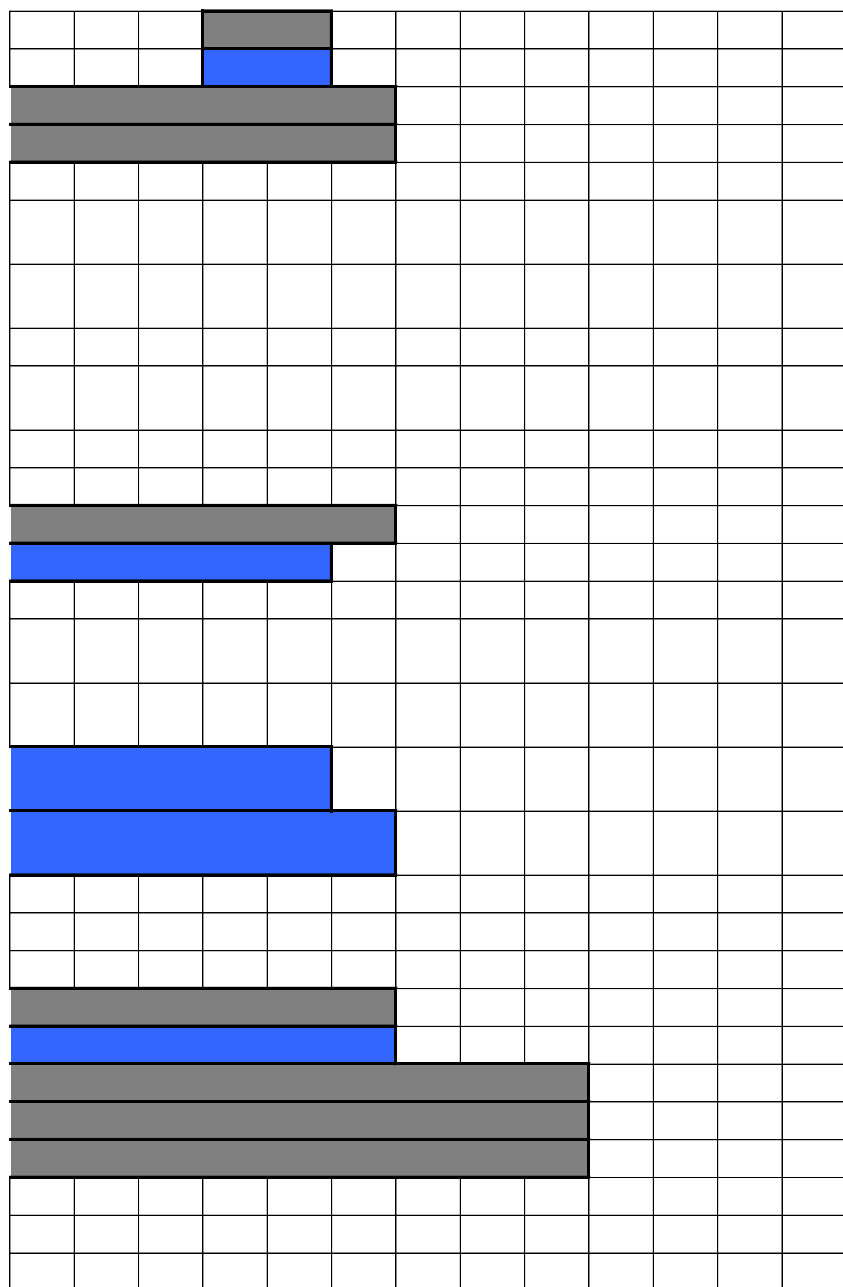


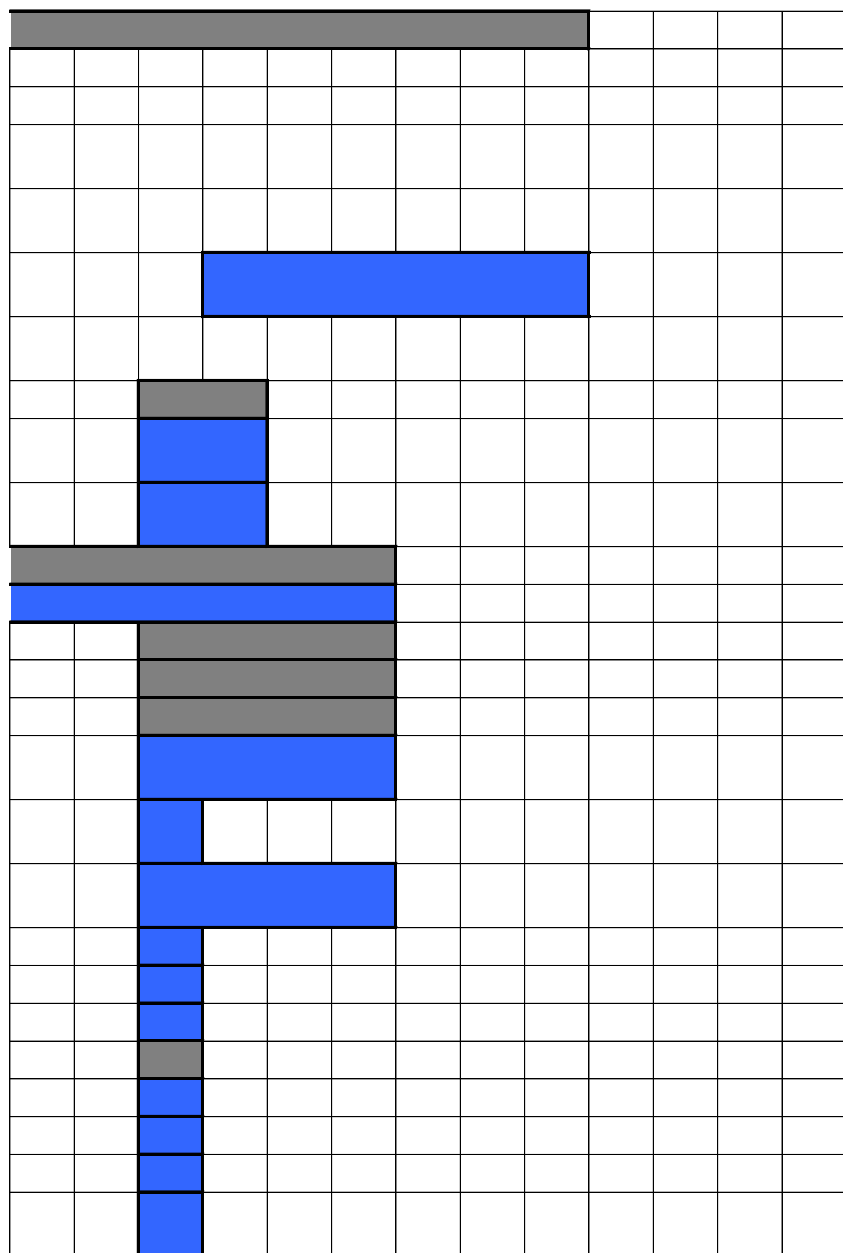


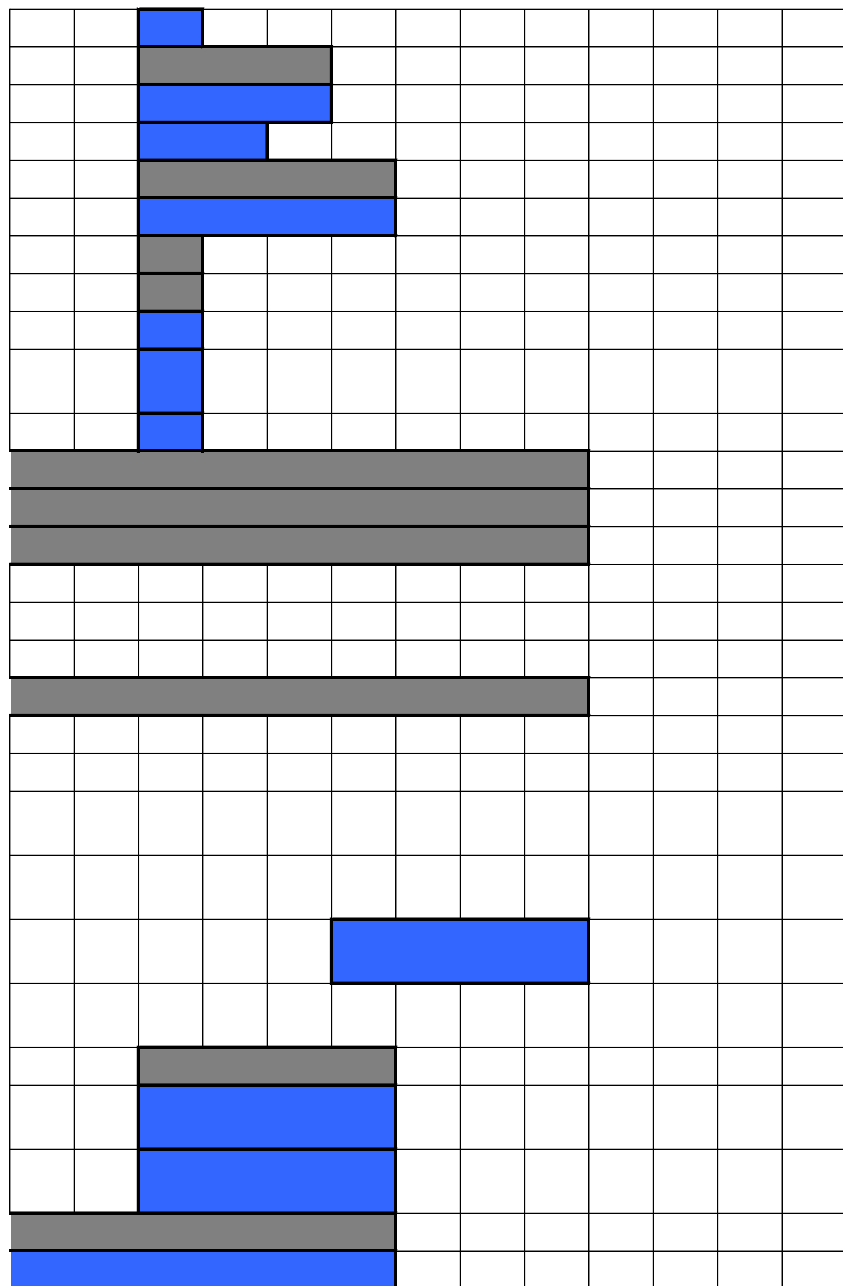


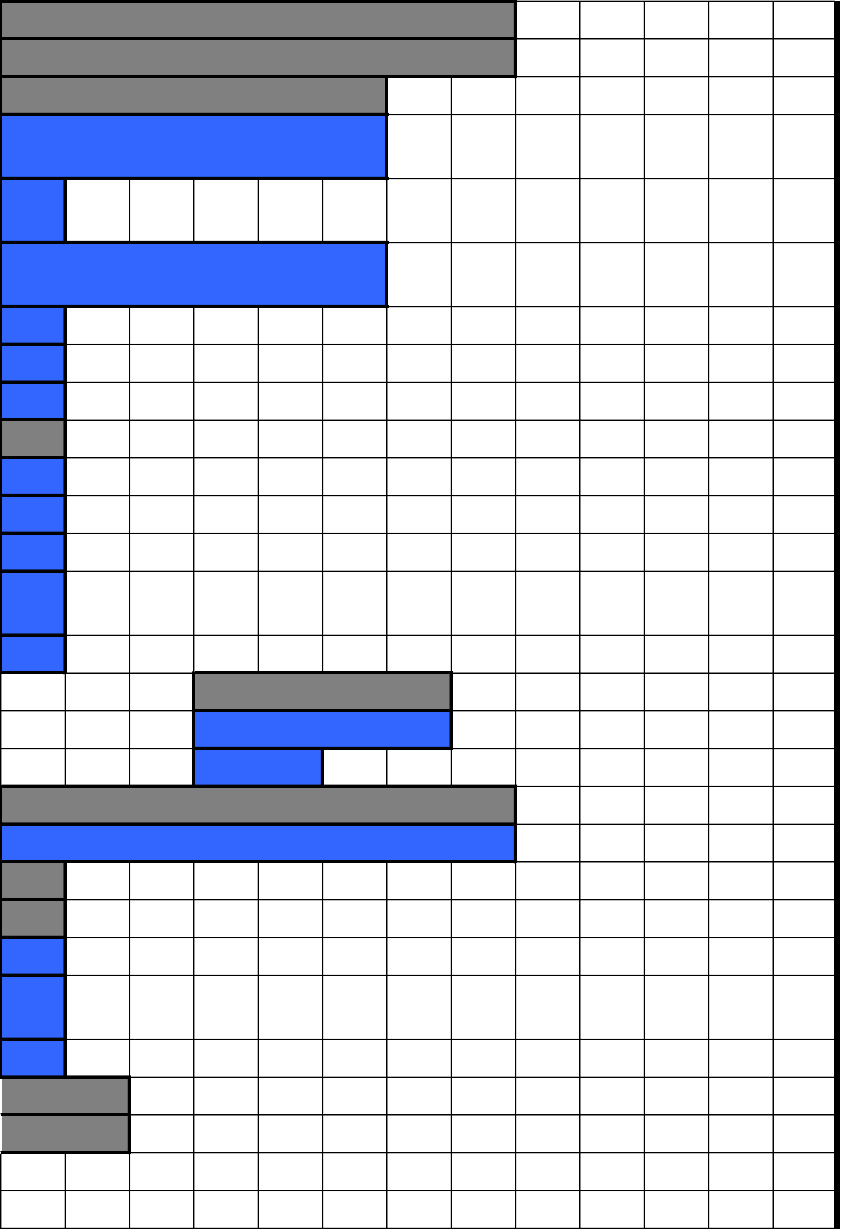


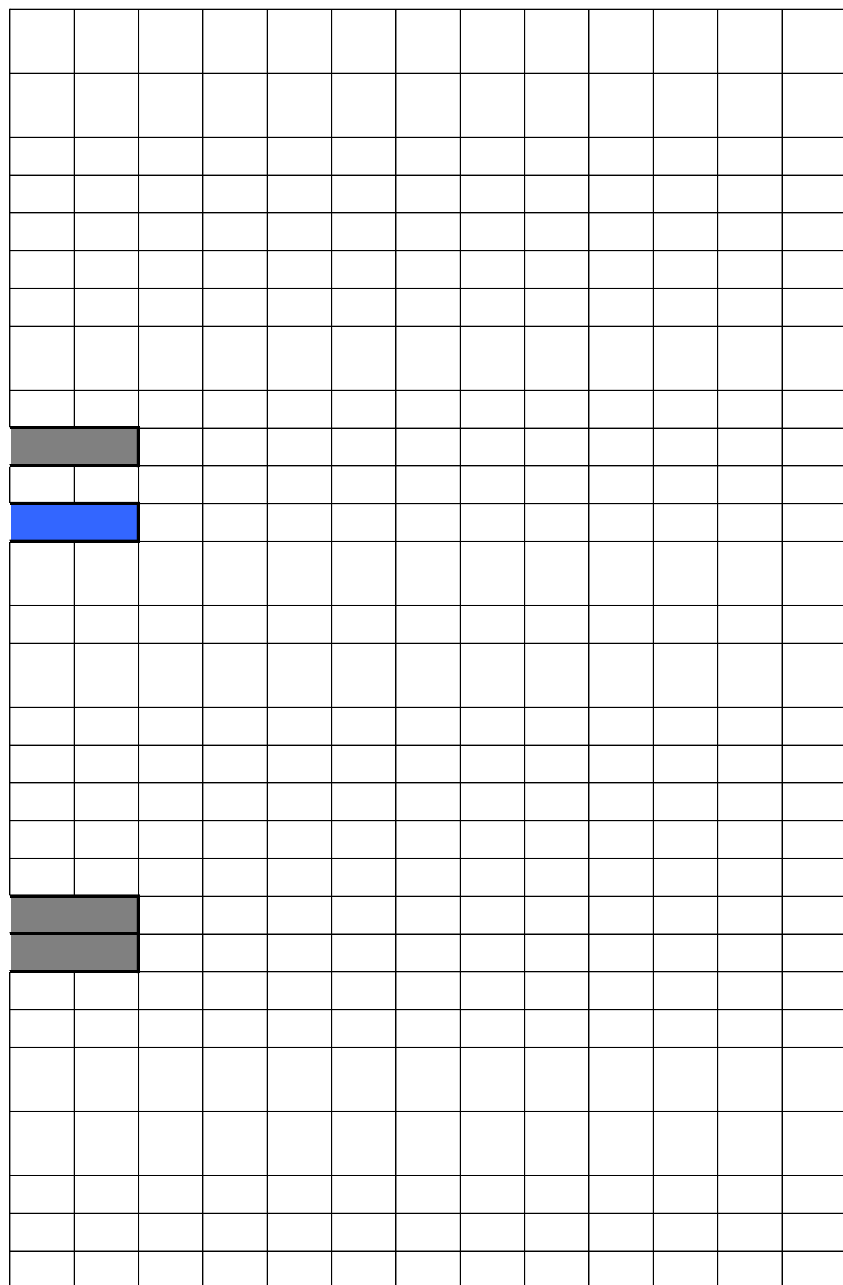


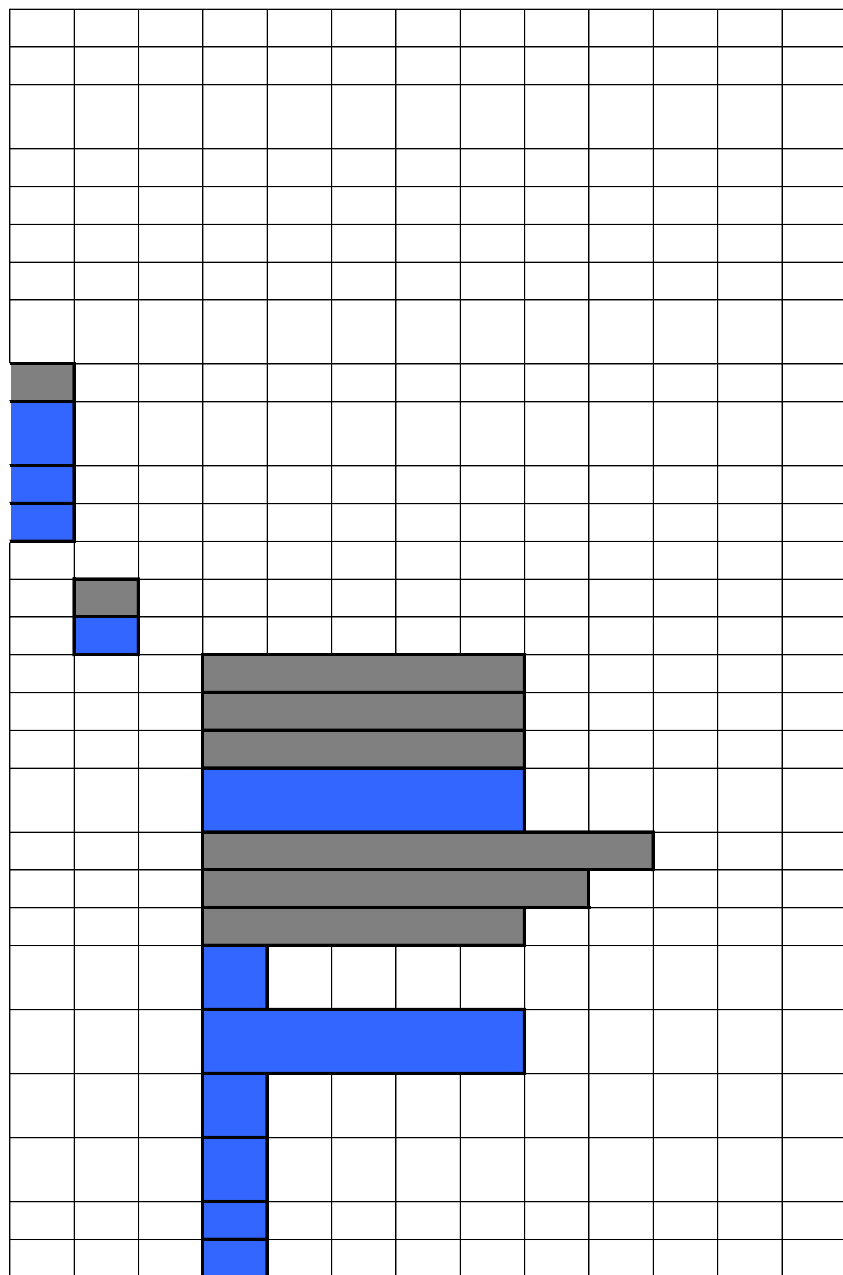


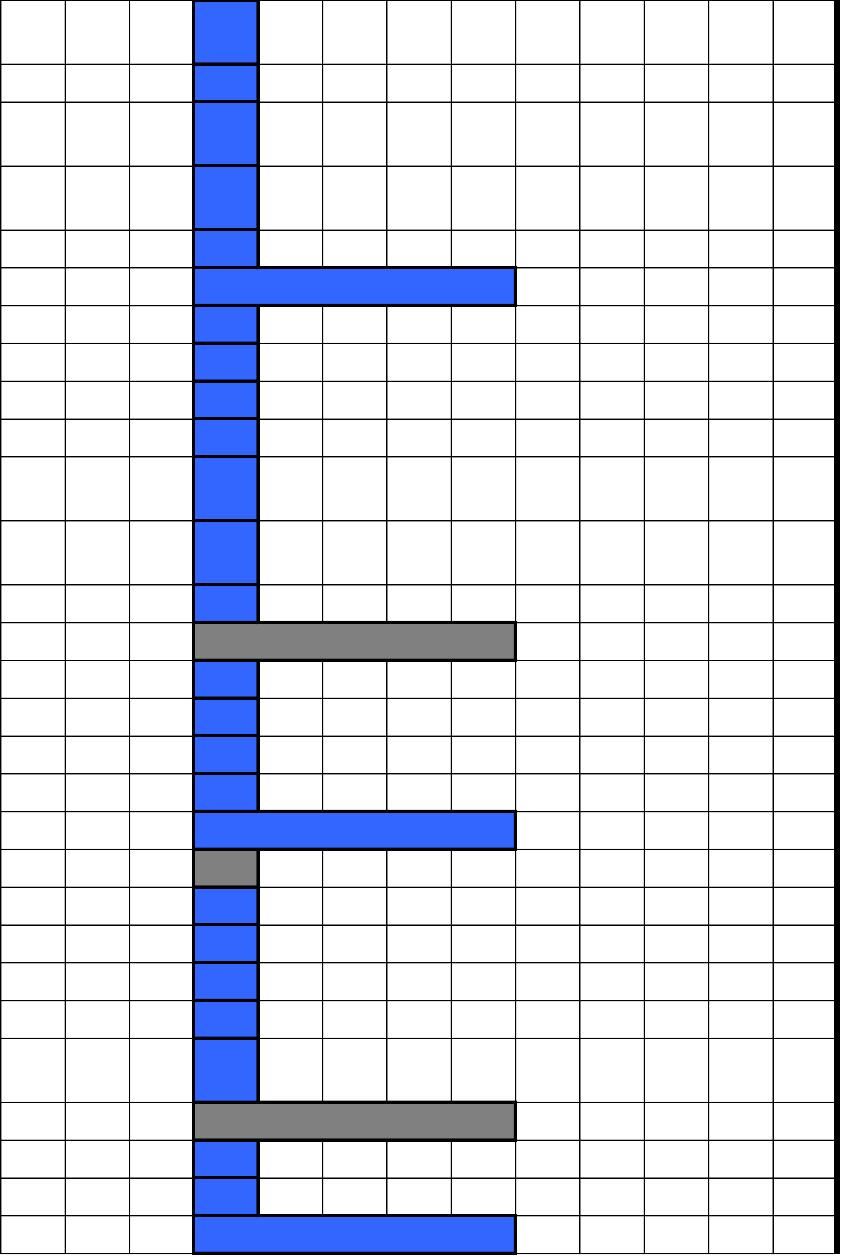


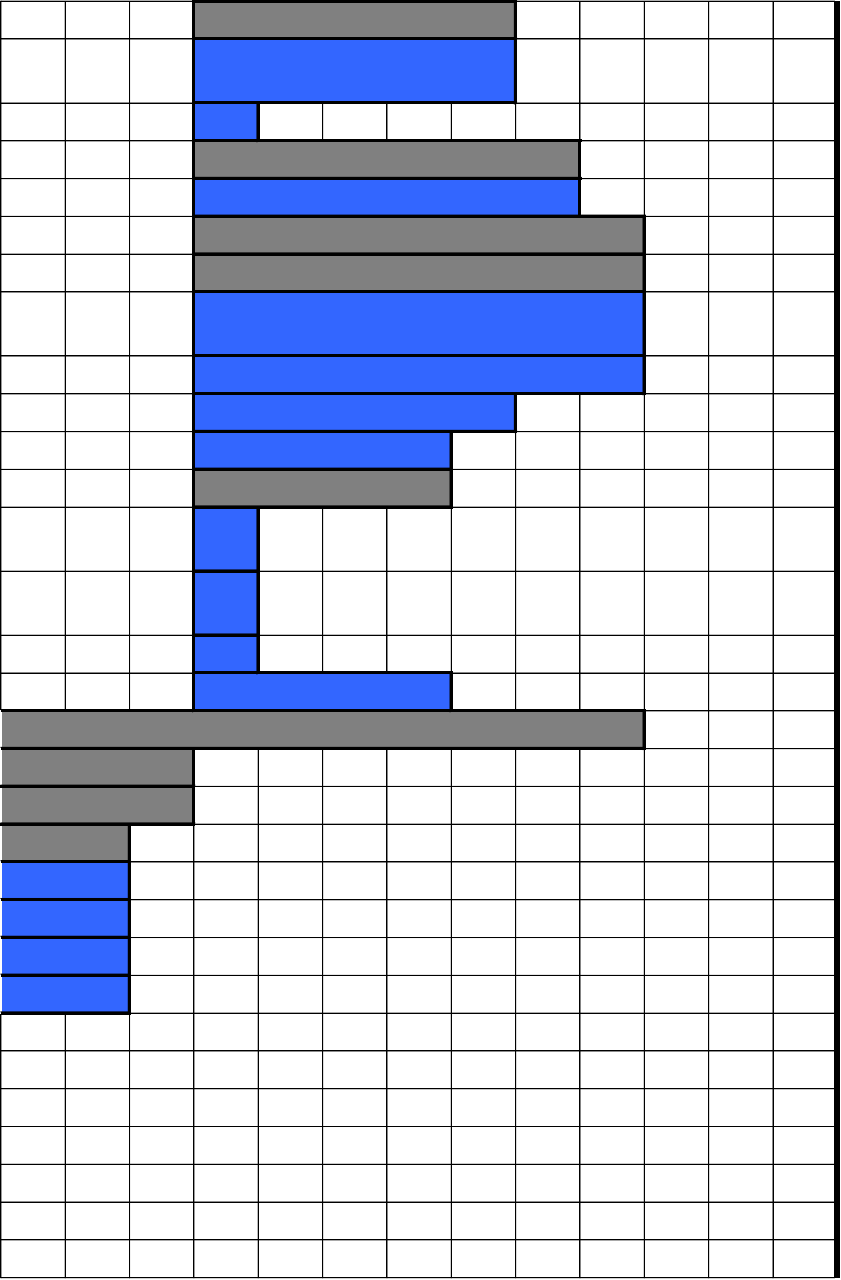


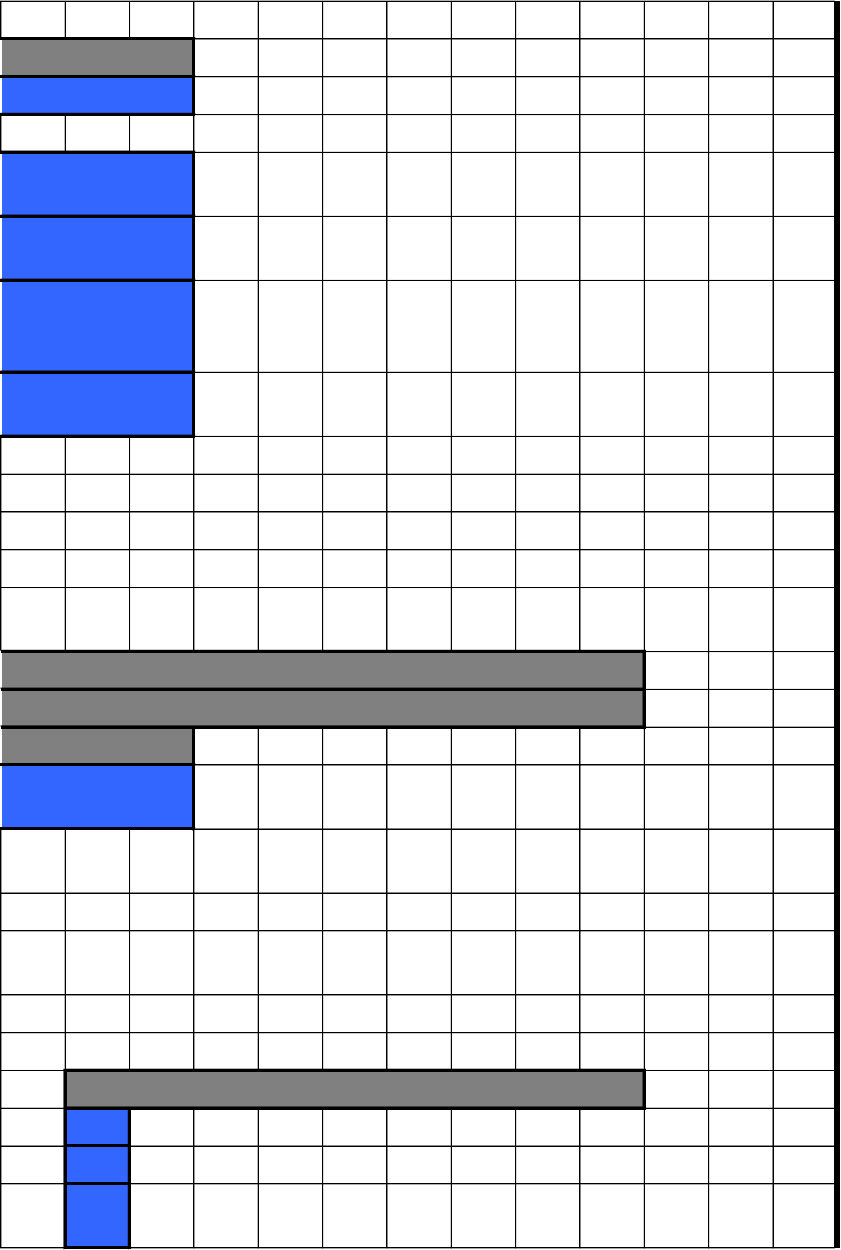


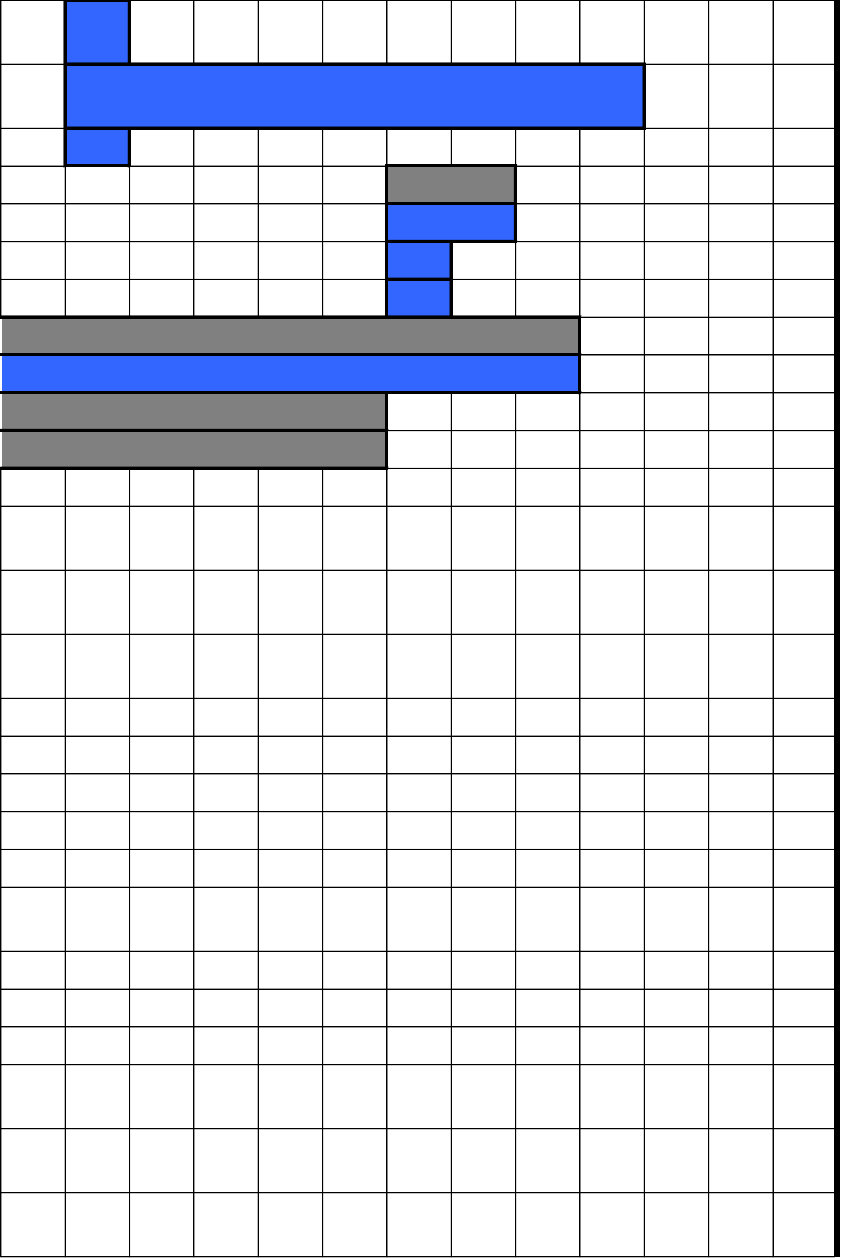

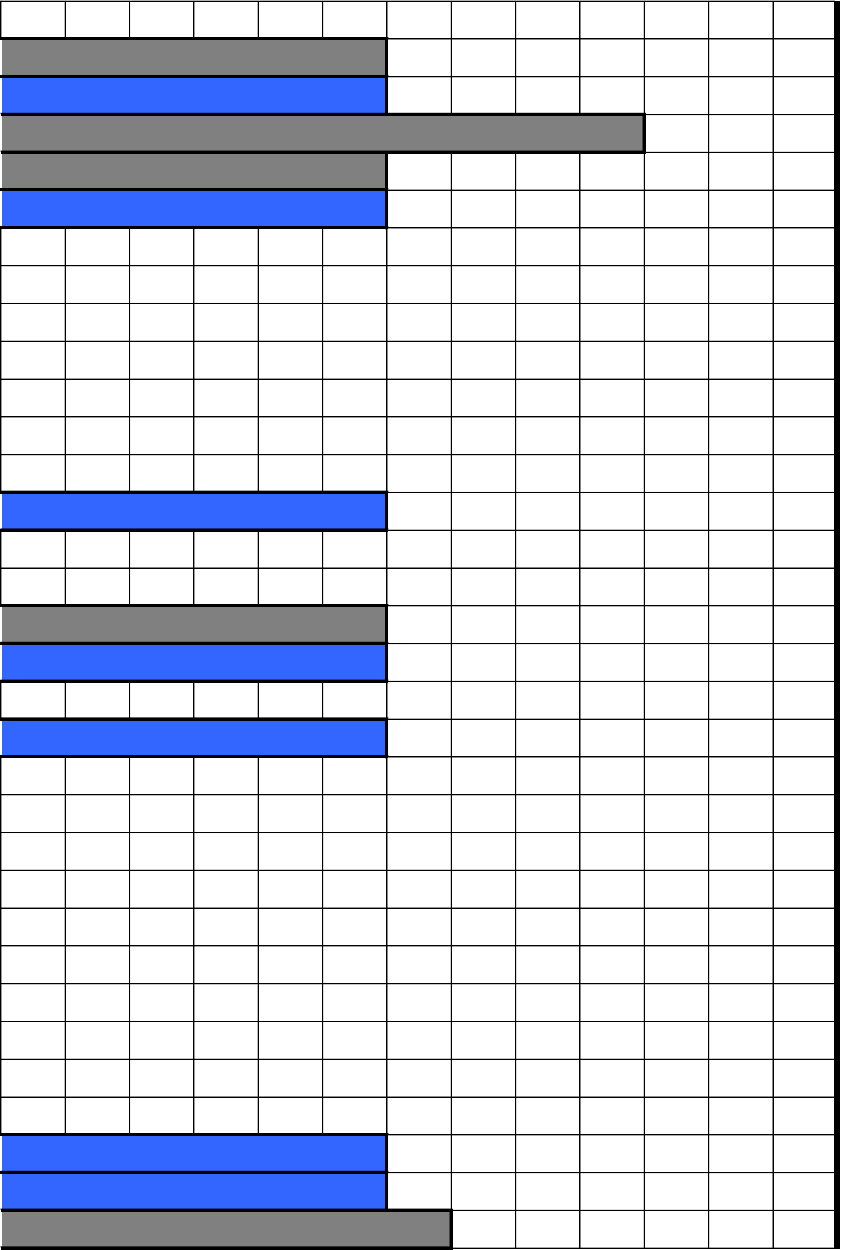

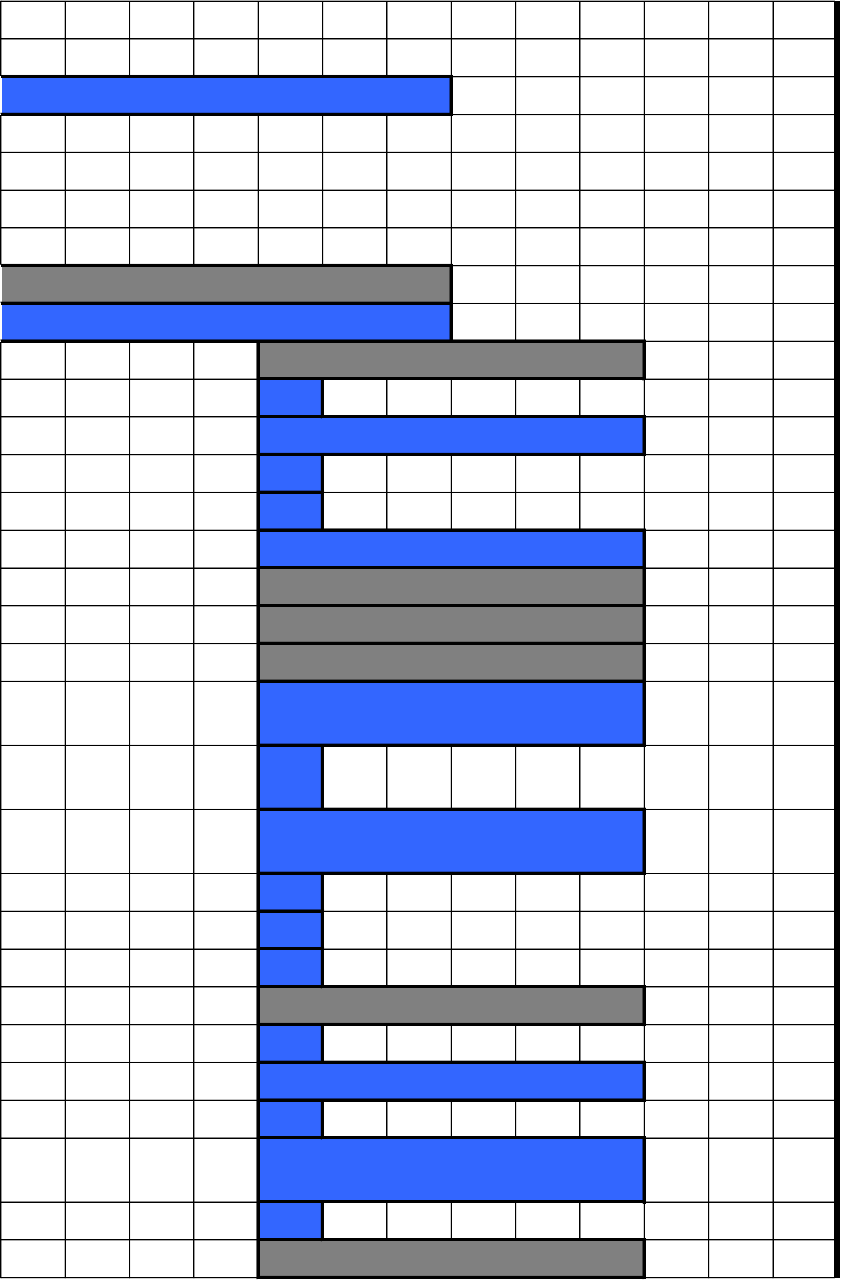

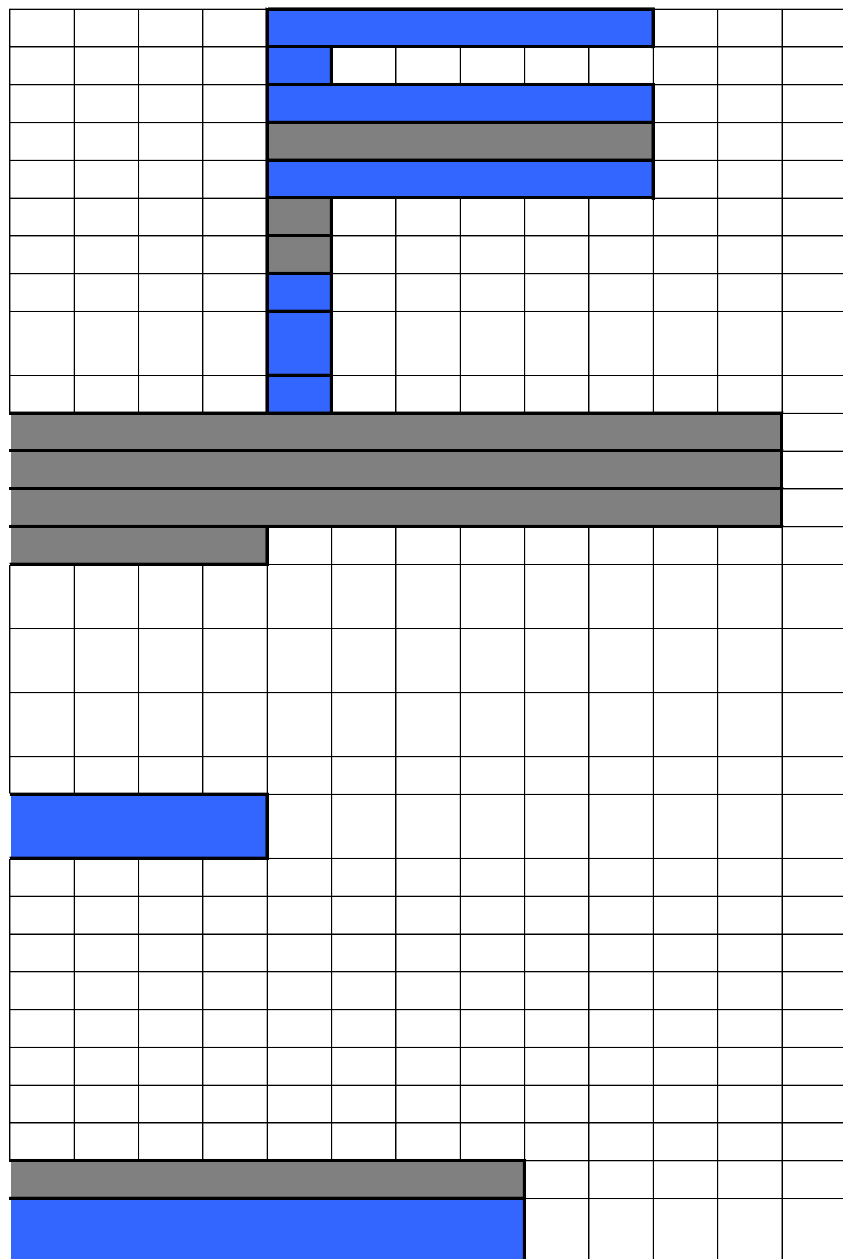

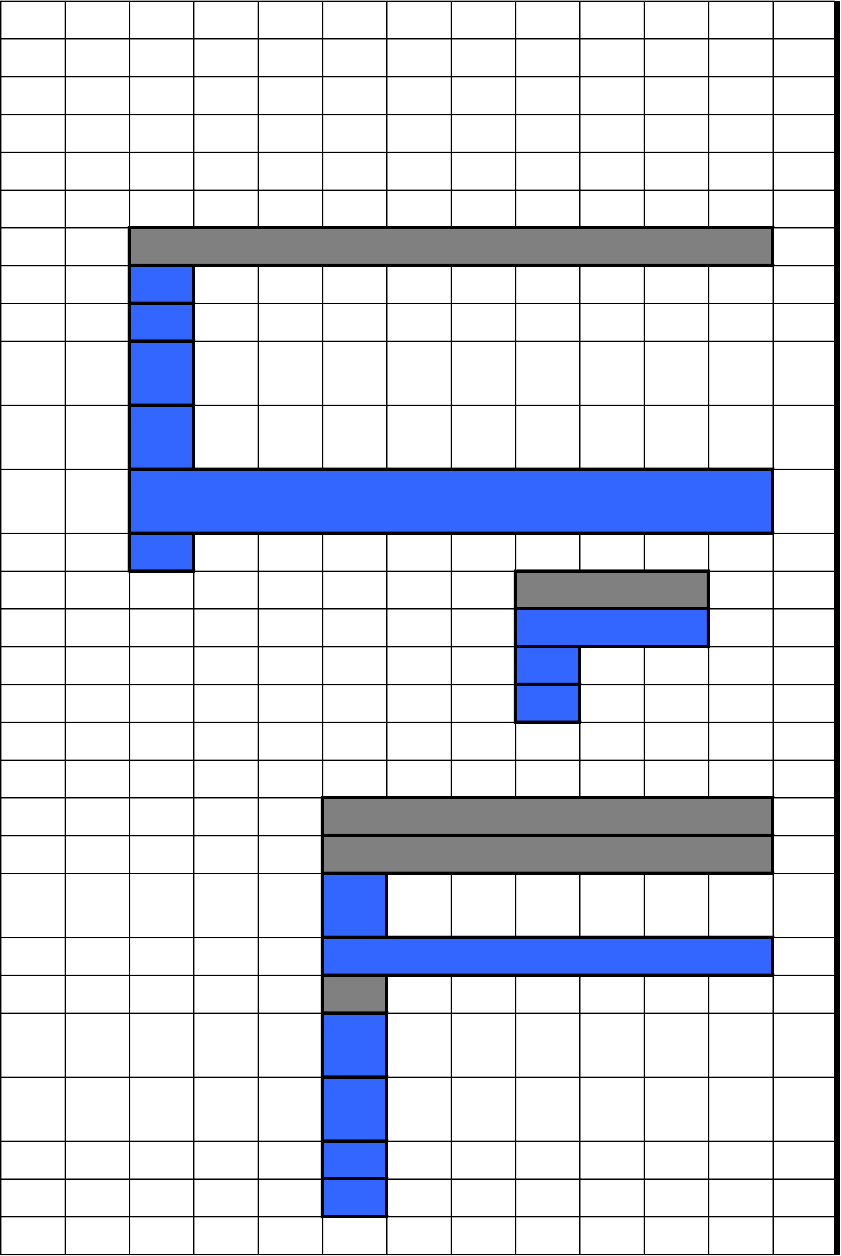

[illegible]

[illegible]
