

Sdružení společností firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o. se zkratkou **S-VGY** se sídlem Tylova 220/17, Kroměříž 767 01 IČ: 254 88 627 – jakožto Generální dodavatel

Dle SOD č. MSP-62/2024-MSP-CES s Investorem **Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**, IČO: 00025429, DIČ: CZ00025429, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2, zastoupená Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M., náměstkem člena vlády na zakázce „**Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby**“.

Vydává průvodní list k **Variaci č.007 – Odkopy nutné pro provedení beranění u objektu C.**


Tato variace vznikla jako reakce na neočekávaný stav podloží. Při provádění zemních prací byly zjištěny stávající velké kameny znemožňující provedení vrtacích prací pro záporové pažení. V této souvislosti je nutné horninu vytěžit a místo ní zavézt zeminou vhodnou pro provedení prací.

Tyto nepředvídatelné změny oproti plánovanému postupu dle DPS se rozdělují do 4 okruhů:

1. V průběhu zemních prací byly zjištěny velké valouny a nebylo možné provádět předvrtání otvorů na záporové pažení dle DPS. Stavba provedla vytěžení o objemu 760 m³ včetně nakládky a odvoz, valouny jsou zejména v oblasti objektů B a C o velikosti až 1100mmx900mm. Toto má vliv na cenu díla.
 - Vyjádření geologa o velikosti valounů – viz níže
2. Stavba provedla zásyp zeminou se zhuťněním o stejném objemu.
3. Provedením variace nedojde ke změně smluvních milníků dle HMG R01.
4. Návrh ocenění variace je 703.823,40 Kč bez DPH.

Součástí vysvětlení jednotlivých bodů budou přílohy níže, ve kterých budou upřesněny jednotlivé problematiky.

Situace:

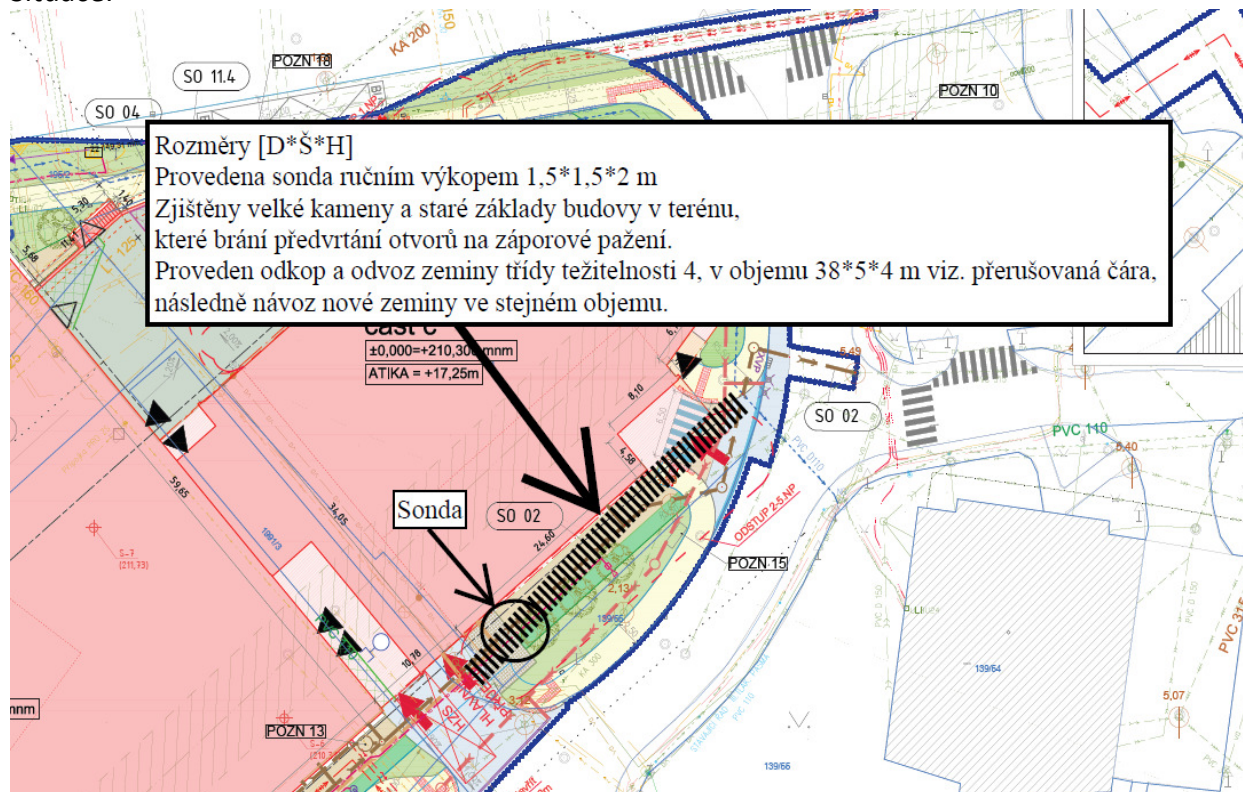

Vyjádření geologa k rozborů a zajištěným podmínkám:

strana | 2

Mgr. Károly Alföldi

Ve Smyčce 2146/2, 400 11, Ústí nad Labem

	(balvany velikosti 0,5-1 m!), kterou nelze laboratorně stanovit. Obsah štěrkovité až balvanité příměsi byla odhadem 30-50%. - Objemová hmotnost čedičových balvanů pevnosti R3 je dle zkušeností v rozmezí 2300 - 2500 kg/m³. - Z tohoto důvodu je na místě počítat z odvezeného objemu materiálu s cca 30-50% obsahem průměrné objemové hmotnosti okolo 2280 kg/m³, ve zbylém objemu pak s hodnotou v průměru 1950 kg/m³.
Zpracoval	Mgr. Károly Alföldi  Odborně způsobilý inženýrský geolog



Foto:





Příloha č.1 průvodního dopisu – záporové pažení – statické posouzení

Za sdružení VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o.

.....

Josef Dolejš

vedoucí projektu, VW WACHAL a.s.
