

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.		
Investor:	Město Trutnov	Datum: 23.10.2025	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkova 465, Trutnov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	D.1.1. Architektonicko stavební řešení	
	na výkresy:	D.1.1.04 Půdorys 1.NP, D.1.1.05 Půdorys 2.NP	
	na rozpočtové podklady:	0017 Sloupy povrchová úprava	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek 03	
Předmět změny: Finální zapravení těsnících pásek okenních ráků Popis a zdůvodnění změny: Zpracovaná PD neřeší, detail stavebního zapravení paropropustných pásek na styku okenních ráků a stávajících sloupů. Bylo zvoleno nejjednodušší řešení a to zakrytí těchto pásek sádkartonem o šířce 20cm, aby vznikl pomyslný rámeček kolem okna. Neúplnost PD			
Počet připojených listů specifikací:		3	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Technický dozor stavebníka - Karel Rychetský			

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Karel Rychetský	
Datum:	23.10.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Finální zapravení těsnících pásek okenních rámu Popis a zdůvodnění změny: Zpracovaná PD neřeší, detail stavebního zapravení paronepropustných pásek na styku okenních rámu a stávajících sloupů. Bylo zvoleno nejjednodušší řešení a to zakrytí těchto pásek sádkokartonem o šířce 20cm, aby vznikl pomyslný rámeček kolem okna. Neúplnost PD		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-3572,66 Kč	91 517,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
87944,98 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 24. 10. 2025	 Datum: 24. 10. 2025	

Za odbor realizace veš

di ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 5 - sloupy

Objekt:

0017 - Sloupy povrchová úprava

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 7. 8. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 944,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 944,98	21,00%	18 468,45
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 413,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 5 - sloupy

Objekt:

0017 - Sloupy povrchová úprava

Místo:

Trutnov

Datum:

7. 8. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 944,98

HSV - Práce a dodávky HSV

20 701,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 766,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

-64,65

PSV - Práce a dodávky PSV

67 243,56

763 - Konstrukce suché výstavby

67 243,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 5 - sloupy

Objekt:

0017 - Sloupy povrchová úprava

Místo:

Trutnov

Datum:

7. 8. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

87 944,98

D HSV Práce a dodávky HSV

20 701,42

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 766,07

17	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	27,400	75,30	2 063,22
1	K	612325421R	Oprava omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	-26,376	133,00	-3 508,01
14	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	168,000	36,60	6 148,80
15	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění SDK	m	137,400	43,50	5 976,90
21	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	137,400	73,40	10 085,16

D 998 Přesun hmot

-64,65

11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-0,150	431,00	-64,65
----	---	-----------	---	---	--------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV


67 243,56

D 763 Konstrukce suché výstavby

67 243,56

20	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	137,400	73,40	10 085,16
19	K	763182313R	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m	m	137,400	416,00	57 158,40

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.		
Investor:	Město Trutnov	Datum: 23.10.2025	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkova 465, Trutnov			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	D.1.1. Architektonicko stavební řešení	
	na výkresy:	D.1.1.04 Půdorys 1.NP, D.1.1.05 Půdorys 2.NP	
	na rozpočtové podklady:	0018	Nově vzniklé chodby – výměna kabeláže
		0019	Zásuvka v nově vzniklém vstupu a nad vstupem
		0020	Dopl. Kabeláže a 2ks světel nad vstupy pod pergolu
na jinou část smlouvy:		Dodatek 02	
Předmět změny: Zajištění funkčnosti elektroinstalace pro potřeby MŠ Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavby bylo zjištěno, že kabeláž na chodbách je značně poškozená venkovními vlivy a před osazením nových svítidel je nutné vyměnit, ale pouze do místa, které je nejbliž původně uzavřené (prostor vedle dříve venkovních chodeb). PD neřeší zásuvky v nově vzniklém zádveří v 1.NP a ve stejném místě i 2.NP. Tyto jsou nutné z provozních potřeb nově vzniklého vnitřního prostoru. Zpracovaná PD řeší realizaci nové pergoly, ale neřeší základní osvětlení tohoto prostoru – požadavek na funkčnost.			
Počet připojených listů specifikací:		11	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Technický dozor stavebníka - Karel Rychetský			

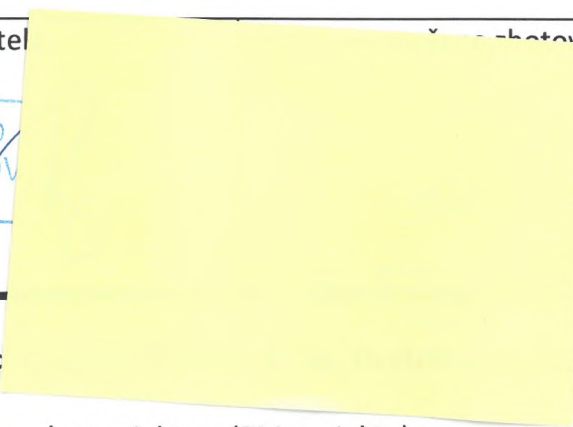ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Karel Rychetský	
Datum:	23.10.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zajištění funkčnosti elektroinstalace pro potřeby MŠ Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavby bylo zjištěno, že kabeláž na chodbách je značně poškozená venkovními vlivy a před osazením nových svítidel je nutné vyměnit, ale pouze do místa, které je nejbliž původně uzavřené (prostor vedle dříve venkovních chodeb). PD neřeší zásuvky v nově vzniklém zádveří v 1.NP a ve stejném místě i 2.NP. Tyto jsou nutné z provozních potřeb nově vzniklého vnitřního prostoru. Zpracovaná PD řeší realizaci nové pergoly, ale neřeší základní osvětlení tohoto prostoru – požadavek na funkčnost.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	63235,03 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
63235,03 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele	Podpis zhotovitele:	
		
Datum: 24. 10. 2025	20. 25	

Za odbor realizace velkých

dí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2349H7
Stavba: Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 6 - elektroinstalace

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo: Trutnov

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel:
Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HAS STAVBY s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			63 235,03
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	63 235,03	13 279,36
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			76 514,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2349H7

Stavba: Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 6 - elektroinstalace

Místo: Trutnov

Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:


Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		63 235,03	76 514,39
0018	Nově vzniklé chodby - výměna kabeláže	33 677,51	40 749,79
0019	Zásuvka v nově vzniklém vstupu a nad vstupem	9 246,48	11 188,24
0020	Doplnění kabeláže a 2 ks světél nad vstupy pod peragolu	20 311,04	24 576,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 6 - elektroinstalace

Objekt:

0018 - Nově vzniklé chodby - výměna kabeláže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 8. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 677,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 677,51	21,00%	7 072,28
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 749,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 6 - elektroinstalace

Objekt:

0018 - Nově vzniklé chodby - výměna kabeláže

Místo:

Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 677,51

D1 - C21M - Elektromontáže

19 476,70

D2 - Rozvaděče - jednoznačné položky

1 107,05

D3 - Materiály

9 172,70

OST - Ostatní

3 921,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 6 - elektroinstalace

Objekt:

0018 - Nově vzniklé chodby - výměna kabeláže

Místo:

Datum:

22. 8. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 677,51

D D1

C21M - Elektromontáže

19 476,70

1	K	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	5,000	45,34	226,70
2	K	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	15,000	25,25	378,75
3	K	210100251	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	5,000	120,91	604,55
4	K	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	5,000	152,84	764,20
5	K	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	210,000	45,25	9 502,50
6	K	215029001	Sekání drážek, vrtání otvorů,demontáže,vyhledání závady apod.	hod	16,000	500,00	8 000,00

D D2

Rozvaděče - jednoznačné položky

1 107,05

7	K	E-2005-1	jistič LSF 10L/2	ks	5,000	221,41	1 107,05
---	---	----------	------------------	----	-------	--------	----------

D D3

Materiály

9 172,70

8	M	1175209	SPINAC C.1 3557G-A01340 B1	ks	5,000	72,76	363,80
9	M	1180256	JEDNORAMECEK 3901G-A00010 B1	ks	5,000	21,01	105,05
10	M	1223262	KRABICE KU 68-45 KA SEDA	KS	5,000	9,01	45,05
11	M	1257383004	KABEL CYKY-J 3x1,5, KRUH 100M	m	210,000	19,44	4 082,40
12	M	AK668610-	Kombinované přístroje - proudové chrániče s jističem / Jistič s proud.chráničem 1+N, AMPARO, 6kA, B10A, 30mA, Typ A	ks	5,000	788,78	3 943,90
13	M	900	Prořez, podružný materiál	kpl	1,000	632,50	632,50

D OST

Ostatní

3 921,06

14	K	001	Podíl přidružených výkonů, přesun	kpl	1,000	3 921,06	3 921,06
----	---	-----	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 6 - elektroinstalace

Objekt:

0019 - Zásuvka v nově vzniklém vstupu a nad vstupem

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 246,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 246,48	21,00%	1 941,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 188,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 6 - elektroinstalace

Objekt:

0019 - Zásuvka v nově vzniklém vstupu a nad vstupem

Místo:

Datum:

22. 8. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 246,48

D1 - C21M - Elektromontáže

4 439,68

D2 - Rozvaděče

442,82

D3 - Materiály

3 377,73

OST - Ostatní

986,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 6 - elektroinstalace

Objekt:

0019 - Zásuvka v nově vzniklém vstupu a nad vstupem

Místo:

Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 246,48

D D1 C21M - Elektromontáže 4 439,68

1	K	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	2,000	45,34	90,68
2	K	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	6,000	25,25	151,50
3	K	210100251	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	2,000	120,91	241,82
4	K	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	2,000	163,34	326,68
5	K	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	36,000	45,25	1 629,00
6	K	215029001	Sekání drážek, vrtání otvorů,demontáže,vyhledání závady apod.	hod	4,000	500,00	2 000,00

D D2 Rozvaděče 442,82

7	K	E-2005-1	jistič LSF 16L/2	ks	2,000	221,41	442,82
---	---	----------	------------------	----	-------	--------	--------

D D3 Materiály 3 377,73

8	M	1196360	DVOJZASUVKA 5513J-C02357 B1	ks	2,000	217,20	434,40
9	M	1223262	KRABICE KU 68-45 KA SEDA	KS	2,000	9,01	18,02
10	M	1257420004	KABEL CYKY-J 3x2,5, KRUH 100M	m	36,000	31,50	1 134,00
11	M	AK668616--	Kombinované přístroje - proudové chrániče s jističem / Jistič s proud.chráničem 1+N, AMPARO, 6kA, B16A, 30mA, Typ A	ks	2,000	788,78	1 577,56
12	M	900	Prořez, podružný materiál	kpl	1,000	213,75	213,75

D OST Ostatní 986,25

13	K	001	Podíl přidružených výkonů, přesun	kpl	1,000	986,25	986,25
----	---	-----	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 6 - elektroinstalace

Objekt:

0020 - Doplnění kabeláže a 2 ks světel nad vstupy pod pergolu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 311,04

DPH základní
snížená

Základ daně
20 311,04
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
4 265,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

24 576,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 6 - elektroinstalace

Objekt:

0020 - Doplnění kabeláže a 2 ks světél nad vstupy pod pergolu

Místo:

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 311,04

D1 - C21M - Elektromontáže

10 781,73

D2 - Rozvaděče - jednoznačné položky

221,41

D3 - Materiály

6 651,65

OST - Ostatní

2 656,25

SOÚPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská školka Dráček - energetická opatření - vícepráce 6 - elektroinstalace

Objekt:

0020 - Doplnění kabeláže a 2 ks světél nad vstupy pod pergolu

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo:

Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 311,04

D	D1	C21M - Elektromontáže					10 781,73
1	K	210010331	krab.inst.listový rozv.typ 2789 bez zapoj.	ks	3,000	89,66	268,98
2	K	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	3,000	25,25	75,75
3	K	210100251	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	1,000	120,91	120,91
4	K	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	3,000	152,84	458,52
5	K	210200058	311 05 02 - 60W svít.žár.prům.stropní (vanička)	ks	3,000	400,59	1 201,77
6	K	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	66,000	45,25	2 986,50
7	K	211010005	osaz.hmožd.do zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 6	ks	65,000	32,66	2 122,90
8	K	215012110	lišta vkladací s víčkem 20mm	m	40,000	88,66	3 546,40

D	D2	Rozvaděče - jednoznačné položky					221,41
9	K	E-2005-1	jistič LSF 10L/2	ks	1,000	221,41	221,41

D	D3	Materiály					6 651,65
10	M	1175209	SPINAC C.1 3557G-A01340 B1	ks	3,000	72,76	218,28
11	M	1180256	JEDNORAMECEK 3901G-A00010 B1	ks	3,000	21,01	63,03
12	M	1185271	KRABICE LISTOVA LK 80X16 T HB	ks	3,000	31,41	94,23
13	M	1186843	LISTA HRANATA 2M LHD 20X20 HD	m	40,000	27,45	1 098,00
14	M	1210660	HMOZDINKA NATLOUKACI NH 6X45	ks	65,000	2,11	137,15
15	M	1257383004	KABEL CYKY-J 3x1,5, KRUH 100M	m	66,000	19,44	1 283,04
16	M	1505727	SVITIDLO VARSO LED 18W-NW-L	ks	3,000	846,38	2 539,14
17	M	AK668610--	Kombinované přístroje - proudové chrániče s jističem / Jistič s proud.chráničem 1+N, AMPARO, 6kA, B10A, 30mA, Typ A	ks	1,000	788,78	788,78
18	M	900	Prořez, podružný materiál	kpl	1,000	430,00	430,00

D	OST	Ostatní					2 656,25
19	K	001	Podíl přidružených výkonů, přesun	kpl	1,000	2 656,25	2 656,25

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.		
Investor:	Město Trutnov	Datum: 23.10.2025	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkova 465, Trutnov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady:	D.1.1. Architektonicko stavební řešení		
	D.1.1.07 Půdorys střech, D.1.1.09 - 11 Řez A-A – C-C		
	0023	Střecha	
na jinou část smlouvy:	Dodatek 02		
Předmět změny: Provedení funkčního napojení izolace střechy Popis a zdůvodnění změny: Po rozkrytí stávající krytiny byl zjištěn skutečný stav konstrukcí pod pláštěm a z tohoto důvodu bylo nutné doplnit navržené izolační vrstvy tak, aby byla zajištěna funkce jednotlivých izolačních vrstev. Rozpor s PD			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Technický dozor stavebníka - Karel Rychetský			

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.		
Investor:	Město Trutnov	Datum: 23.10.2025	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkova 465, Trutnov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	D.1.1. Architektonicko stavební řešení	
	na výkresy:	D.1.1.07 Půdorys střech, D.1.1.09 - 11 Řez A-A – C-C	
	na rozpočtové podklady:	0023 Střecha	
na jinou část smlouvy:	Dodatek 02		
Předmět změny: Provedení funkčního napojení izolace střechy Popis a zdůvodnění změny: Po rozkrytí stávající krytiny byl zjištěn skutečný stav konstrukcí pod pláštěm a z tohoto důvodu bylo nutné doplnit navržené izolační vrstvy tak, aby byla zajištěna funkce jednotlivých izolačních vrstev. Rozpor s PD			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Technický dozor stavebníka - Karel Rychetský			



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	HAS STAVBY s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Karel Rychetský	
Datum:	23.10.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Provedení funkčního napojení izolace střechy Popis a zdůvodnění změny: Po rozkrytí stávající krytiny byl zjištěn skutečný stav konstrukcí pod pláštěm a z tohoto důvodu bylo nutné doplnit navržené izolační vrstvy tak, aby byla zajištěna funkce jednotlivých izolačních vrstev. Rozpor s PD		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	104655,53 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
104655,53 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:  Datum: 24. 10. 25		

Za odbor realizace velkých

ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PMI projekty).

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2349H10
Stavba: Mateřská školka Dráček - vícepráce 8 - střecha

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo: Trutnov

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2025

Zadavatel:
Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HAS STAVBY s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			104 655,53
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	104 655,53	21 977,66
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			126 633,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2349H10

Stavba: **Mateřská školka Dráček - vícepráce 8 - střecha**

Místo: **Trutnov**

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Datum: 2. 9. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			104 655,53	126 633,19
023	Střecha		104 655,53	126 633,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Mateřská školka Dráček - vícepráce 8 - střecha

Objekt:

023 - Střecha

KSO:

Místo:

Trutnov

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2025

Zadavatel:

Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

104 655,53

DPH základní
snížená

Základ daně

104 655,53

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

21 977,66

0,00

Cena s DPH

v CZK

126 633,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Mateřská školka Dráček - vícepráce 8 - střecha
Objekt: 023 - Střecha

Místo: Trutnov
Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov
Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Datum: 2. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		104 655,53
PSV - Práce a dodávky PSV		104 655,53
712 - Povlakové krytiny		100 121,13
762 - Konstrukce tesařské		4 534,40

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Mateřská školka Dráček - vícepráce 8 - střecha

Objekt: 023 - Střecha

Místo: Trutnov

Datum: 2. 9. 2025

Zadavatel: Město Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov

Projektant:

Zhotovitel: HAS STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

104 655,53

D PSV Práce a dodávky PSV

104 655,53

D 712 Povlakové krytiny

100 121,13

1	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	86,000	16,40	1 410,40
2	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,030	67 100,00	2 013,00
3	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	86,000	143,00	12 298,00
4	M	62853005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	98,900	204,00	20 175,60
5	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	48,200	204,00	9 832,80
16	K	712363352R	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 130 mm	m	9,700	480,00	4 656,00
6	K	712363357R	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt lemování - napojení na stěnu	m	48,200	380,00	18 316,00
7	K	712363358R1	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rohová lišta vnější	m	9,700	320,00	3 104,00
8	K	712363605R	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm	m2	10,800	430,00	4 644,00
9	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm	m2	12,420	357,00	4 433,94
10	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	10,800	56,00	604,80
11	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	53,100	68,50	3 637,35
12	M	283431221	rohož separační ze skelných vláken 300g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	48,200	55,00	2 651,00
13	K	7129999901	Očištění stávající PVC folie alkorplus 81044	m	48,200	88,00	4 241,60
14	K	712999999	Připojení svislé parozábrany ke stáv. parotěsu vč. potřebného materiálu	m	64,000	100,00	6 400,00
15	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	984,185	1,73	1 702,64

D 762 Konstrukce tesařské

4 534,40

17	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm(materiál- rozdílná překližka/osb)	m2	4,360	1 040,00	4 534,40
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------
