

Stavba:		Rekonstrukce vstupního předprostoru KBOP	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL - 09	
Dotčená část díla:		Silnoproudá elektrotechnika	
Předmět změny:		Hromosvod	
Objednatel:		Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Ostrava-Poruba, Čkalova 6144/20, PSČ 708 00	
Zhotovitel:		IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, Černovice,627 00 Brno	
ZL zpracoval za zhotovitele :		Lukáš Jahodář	Datum : 27.8.2025
Popis změny: Při realizaci betonových ploch musí být obnovena část hromosvodné sítě v místě stavby, která by se řešila v budoucí plánované stavbě zateplení Krytého bazénu a bylo by nutné zasahovat do nyní realizovaných betonových ploch.			
Zdůvodnění: Výkopové práce a uložení nového zemnicího pásku včetně zemnicích tyčí s následným propojením na stávající hromosvodnou síť v předprostoru Krytého bazénu.			
Řešení: Při realizaci betonových ploch bude nově proveden výkop a pokládka plánovaného nového hromosvodu, viz. dodaná dokumentace. Realizace změny bude mít dopad na konečný termín dokončení díla.			
zpoždění o:			
Předpoklad dopadu do ceny :	93 031,84 Kč	zvýšení: bez DPH	93 031,84 Kč
Seznam příloh: 1. Položkový rozpočet 2. výkres 3. fotodokumentace 4.			
Za Zhotovitele : Lukáš Jahodář stavbyvedoucí Datum : Podpis, razítko :		Za objednatele: Ing. Jaroslav Kovář jednatel Datum : Podpis, razítko :	
Za AD: ing. arch. David Kotek jednatel Datum : Podpis, razítko :		Za TDS: ing. Kamil Bednář jednatel Datum : Podpis, razítko :	

REKONSTRUKCE VSTUPNÍHO PŘEDPROSTORU KRYTÉHO BAZÉNU OSTRAVA-PORUBA

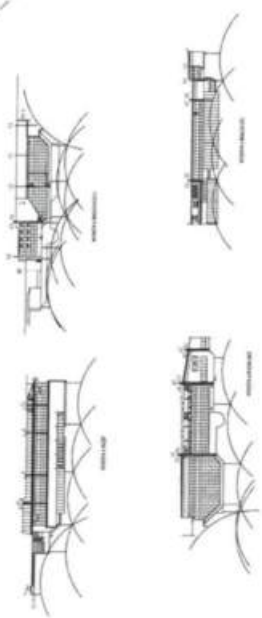

ZL09 Hromosvod celkem:

93 031,84 Kč

SO	Poř. č.	Řádek	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	Způsob ocenění
	1	M	1000300317R	Dehn krabice pro zkušební svorky 230x150x120 litina včetně montáže	ks	5,000	1 998,82	9 994,10	individuální kalkulace
	2	K	113107033	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech ručně	m2	0,150	2 189,43	328,41	ÚRS II/2025
	3	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	18,000	1 639,93	29 518,74	ÚRS II/2025
		VV		0,5*0,4*90		18,000			
	4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,000	160,00	2 880,00	SOD
		VV		"Výkop rýhy" 0,5*0,4*90		18,000			
	5	K	219991111	Položení chráničky z plastových trubek DN do 35 mm	m	5,000	26,44	132,20	ÚRS II/2025
	6	K	741410001	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 na povrchu	m	120,000	132,22	15 866,40	ÚRS II/2025
	7	K	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu	m	30,000	77,36	2 320,80	ÚRS II/2025
	8	K	468101121	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m	15,000	257,58	3 863,70	ÚRS II/2025
	9	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	5,250	16,83	88,36	ÚRS II/2025
		VV		5 * 1,05		5,250			
	10	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	15,000	22,58	338,70	ÚRS II/2025
	11	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	18,634	47,48	884,74	ÚRS II/2025
		VV		"1kg=1,61 m"					
		VV		30*(1/1,61)		18,634			
	12	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	114,286	39,92	4 562,30	ÚRS II/2025
		VV		"1kg=1,05 m"					
		VV		120*(1/1,05)		114,286			
	13	K	939291012	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,500	3 820,77	13 372,70	ÚRS II/2025
	14	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	ks	4,000	628,50	2 514,00	ÚRS II/2025
	15	K	35441055	tyč jímácí s kovaným hrotem 1500mm FeZn	ks	4,000	308,24	1 232,96	ÚRS II/2025
	16	K	220111741	Montáž svorky rozpojovací zkušební	ks	4,000	381,22	1 524,88	ÚRS II/2025
	17	K	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm	ks	4,000	45,76	183,04	ÚRS II/2025
	18	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	ks	1,000	3 425,81	3 425,81	ÚRS II/2025

Poznámka:

Cena dle SOD = 16 695 694,79 Kč
Cena dle DPS = 19 446 601,67 Kč
Koeficient = 0,8586

[illegible][illegible]









