



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 083

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 103.2 - Napojení Litohlav (ZL59 - prodloužení)		
Název / označení změny:	betonová římsa propusti - sanace		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: V průběhu realizace prodloužení napojení SO103 směrem k cyklostezce (SO123) byl zjištěn nevyhovující stav římsy kolmého čela stávající propusti. Z důvodu celistvosti opravy dotčeného úseku a také pro zajištění možnosti osazení zábradlí bylo rozhodnuto o sanaci římsy. Změna se týká položek: viz přiložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:	36 788,19 Kč		
přípočty celkem:	36 788,19 Kč		
odpočty celkem:	- Kč		
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC situace SD obrázková příloha stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Iméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			36 788,19
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	36 788,19	7 725,52
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	44 513,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		36 788,19	44 513,71	
ZL83	SO 103.2 - betonová římsa	36 788,19	44 513,71	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL83 - SO 103.2 - betonová římsa

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 72053119
DIČ:
IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			36 788,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 788,19 0,00	21,00% 15,00%	7 725,52 0,00
Cena s DPH			44 513,71

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL83 - SO 103.2 - betonová římsa

Místo: Rokycansko

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

36 788,19

VCP - VÍCEPRÁCE

36 788,19

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL83 - SO 103.2 - betonová římsa


Místo: Rokycansko
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.


Datum:
Projektant:
Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 36 788,19

D	VCP	VÍCEPRÁCE					36 788,19
1	K	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG			13 429,59
	P		Poznámka k položce: 5 kg/ks á 1 m, kompletní dodávka vč. PKO, vrtů a vlepení.				
	W		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 25				
	W		5 kg/ks á 1 m, kompletní dodávka vč. PKO, vrtů a vlepení.				
	W		použito 10 kg á 1 m				
	W		5,986*10				
	W		Součet				
2	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3			17 081,51
	P		Poznámka k položce: Beton C30/37-XF4, XD3, vč. bednění, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18				
	W		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 26				
	W		5,986*0,2*0,94				
	W		Součet				
3	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T			6 277,09
	P		Poznámka k položce: Betonářská výztuž říms z oceli B500B, 150 kg/m3				
	W		Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 27				
	W		0,2				
	W		Součet				

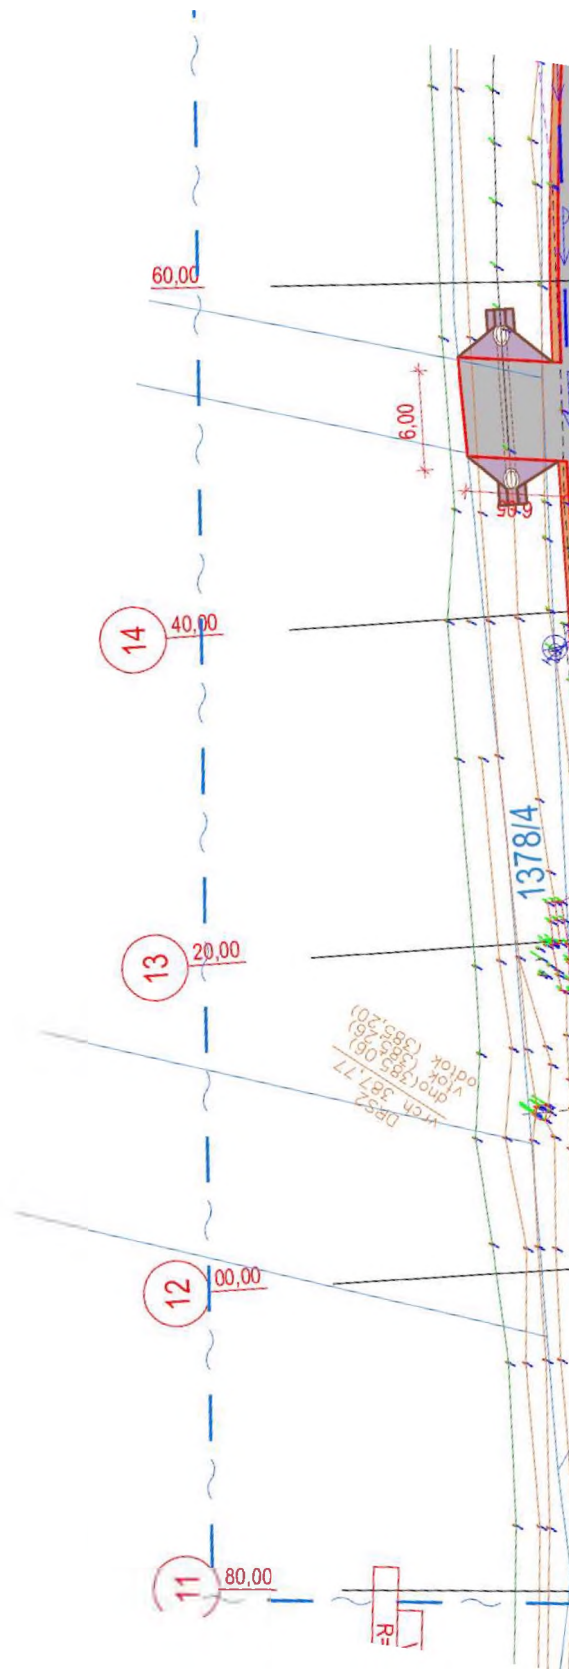

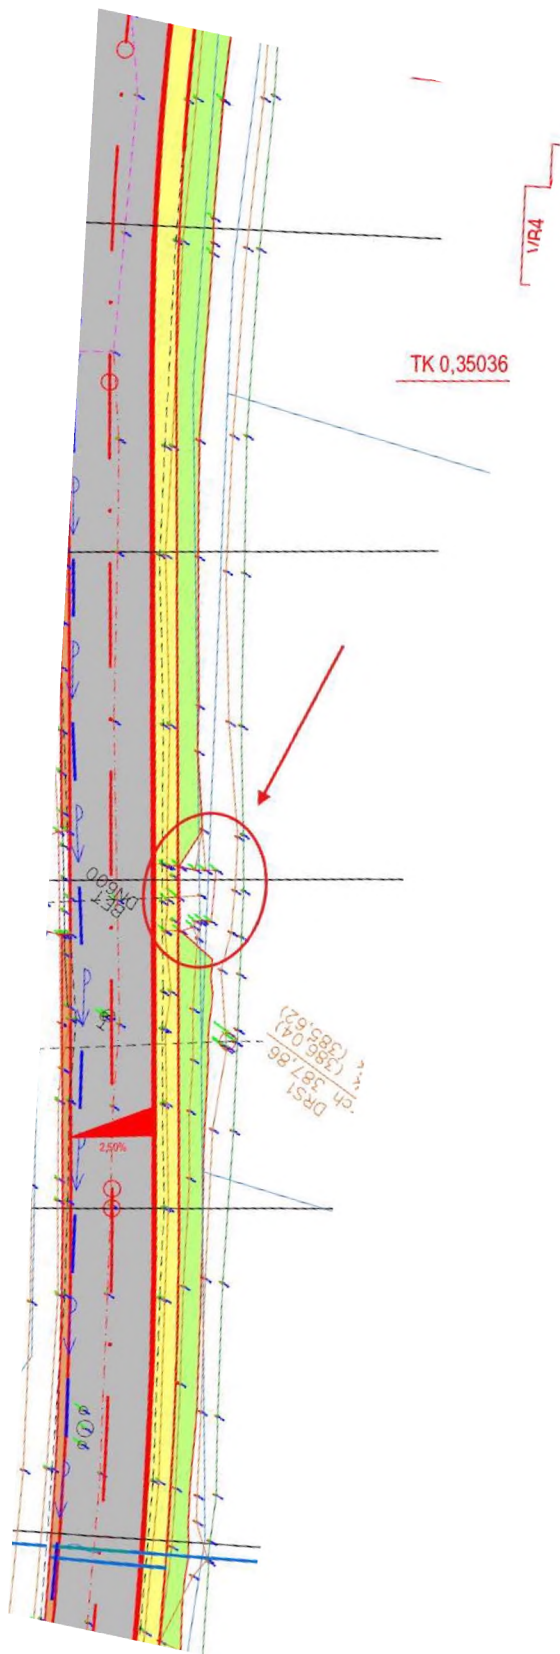



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 103 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 103 - NAPOJENÍ LITOHAV

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	3,0°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	50°	85%
12:00	Jasno	14,7°C	0,0 mm/h	3,6 m/s	27°	42%
18:00	Jasno	16,7°C	0,0 mm/h	3,8 m/s	74°	33%

OSOBY NA STAVENIŠTI:


PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Dělník	1	8				
STRABAG a.s.							
	Mistr Stavby	1	8		Dělník	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Traktorbagr JCB	STRABAG a.s.		1	8
Kolový nakladač	STRABAG a.s.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 103 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 103 - Napojení Litohlav SO103.2 prodloužení úpravy k SO123 chodník - zřízení konstrukce chodníku - práce jsou prováděny nad rámec SOD	STRABAG a.s.		
SO 103 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 103 - Napojení Litohlav SO103.2 prodloužení úpravy k SO123 čelo propustek km 0,320 PS - zřízení bednění pro monolitické čelo propusti - práce jsou prováděny nad rámec SOD	ROADFIN STAVBY s.r.o.		



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 103 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 103 - NAPOJENÍ LITOHAV

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	3,0°C	0,0 mm/h	1,7 m/s	13°	88%
12:00	Jasno	16,0°C	0,0 mm/h	2,4 m/s	127°	43%
18:00	Jasno	19,0°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	35°	36%

OSOBY NA STAVENIŠTI:


PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Dělník	1	8				
STRABAG a.s.							
	Mistr Stavby	1	8		Dělník	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Traktorbagr JCB	STRABAG a.s.		1	8
Kolový nakladač	STRABAG a.s.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 103 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 103 - Napojení Litohlav SO103.2 prodloužení úpravy k SO123 chodník - zřízení konstrukce chodníku - práce jsou prováděny nad rámec SOD	STRABAG a.s.		
SO 103 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 103 - Napojení Litohlav SO103.2 prodloužení úpravy k SO123 čelo propustek km 0,320 PS - zřízení armovací výztuže pro monolitické čelo propusti - práce jsou prováděny nad rámec SOD	ROADFIN STAVBY s.r.o.		



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 103 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 103 - NAPOJENÍ LITOHAV

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	-2,2°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	326°	73%
12:00	Zamračeno	5,2°C	0,0 mm/h	2,7 m/s	307°	49%
18:00	Zamračeno	7,6°C	0,0 mm/h	3,2 m/s	329°	44%

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Dělník	1	8				
STRABAG a.s.							
	Mistr Stavby	1	8		Dělník	1	8


MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Traktorbagr JCB	STRABAG a.s.		1	8
Kolový nakladač	STRABAG a.s.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 103 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 103 - Napojení Litohlav SO103.2 prodloužení úpravy k SO123 chodník - příprava podkladu pod obruby - osazení betonových obrubníků do lože z betonu - práce jsou prováděny v souladu s dodatkem k SOD, stavebním povolením, odsouhlasenou PD, Tepř. a KZP.	STRABAG a.s.		
SO 103 - Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa SO 103 - Napojení Litohlav SO103.2 prodloužení úpravy k SO123 čelo propustek km 0,320 PS - betonování monolitického čela propusti - práce jsou prováděny nad rámec SOD	ROADFIN STAVBY s.r.o.		



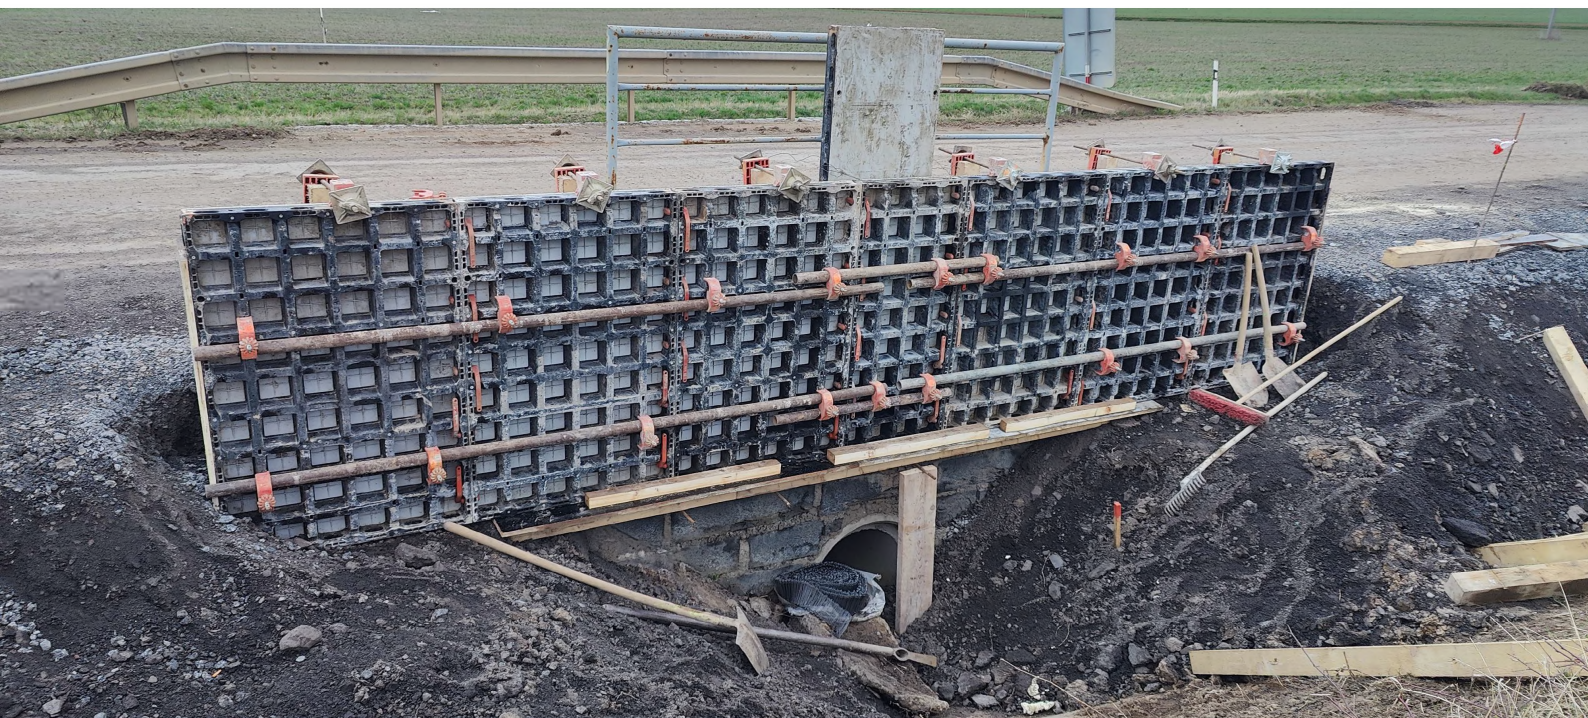















Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235



IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa


Objekt: SO 103.2 - Napojení Litohlav (ZL59 - prodloužení)

ZL č.: 083

Název změny: betonová římsa propusti - sanace

V průběhu realizace prodloužení napojení SO103 směrem k cyklostezce (SO123) byl zjištěn nevyhovující stav římsy kolmého čela stávající propusti. Z důvodu celistvosti opravy dotčeného úseku a také pro zajištění možnosti osazení zábradlí bylo rozhodnuto o sanaci římsy.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 83

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 083

Název ZL: SO 103.2 – Betonová římsa propusti-sanace

Zdůvodnění:

V průběhu realizace prodloužení napojení SO103 směrem k cyklostezce (SO123) byl zjištěn nevyhovující stav římsy kolmého čela stávající propusti. Z důvodu celistvosti opravy dotčeného úseku a také pro zajištění možnosti osazení zábradlí bylo rozhodnuto o sanaci římsy.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo provedena sanace římsy čela na stávající propusti.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu.

Odpočítané položky: - 0,00 Kč

Připočítané položky: 36 788,19 Kč

Celkem ZL: 36 788,19 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS:

 
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213
