



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 102

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy (vč. ZL058)		
Název / označení změny:	SO 123 plochy - skutečnost		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek. Změna se týká položek: viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		-	134 121,90 Kč
připočty celkem:			- Kč
odpočty celkem:		-	134 121,90 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC geodetický protokol vč. situace SD obrázková příloha stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-134 121,90
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-134 121,90	-28 165,60
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-162 287,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-134 121,90	-162 287,50	
ZL102	SO 123 - skutečnost ploch	-134 121,90	-162 287,50	STA
SO 123	Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Lithlavy	-134 121,90	-162 287,50	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ROADFIN

Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL102 - SO 123 - skutečnost ploch
Soupis:
SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		-134 121,90		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	-134 121,90 0,00		21,00% 15,00%	-28 165,60 0,00
Cena s DPH		v CZK	-162 287,50	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL102 - SO 123 - skutečnost ploch
Soupis: **SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy**

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-134 121,90

MPR - MĚNĚPRÁCE

-134 121,90

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL102 - SO 123 - skutečnost ploch
Soupis: SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Lithlavy

Místo: Rokycansko
Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -134 121,90

D	MPR	MÉNĚPRÁCE					-134 121,90
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			-562,45
	P		Poznámka k položce: PS , FP , 0,30 kg/m2				
	W		Položka z SOD z objektu SO 123, pol. 16				
	W		"dle SOD" -925				
	W		"dle ZL 058 pod ACO 11" -483,607				
	W		"dle skutečnosti" 1354				
	W		Součet				
2	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2			-13 158,65
	P		Poznámka k položce: ACO 11 ; tl. 50mm				
	W		Položka z SOD z objektu SO 123, pol. 17				
	W		"dle SOD" -925				
	W		"dle ZL 058" -483,607				
	W		"dle skutečnosti" 1354				
	W		Součet				
3	K	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M			-120 400,80
	P		Poznámka k položce: přímé i obloukové prvky				
	W		Položka z SOD z objektu SO 123, pol. 20				
	W		"dle SOD" -740				
	W		"dle skutečnosti" 474,8				
	W		Součet				

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ DODAVATELE STAVBY

Stavba	Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa	
Stavební objekt	SO1XX, 201, 202	Komunikace a mosty
Hlavní zhotovitel stavby	ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice	
Geodet zhotovitele stavby	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zakázka objednatele	200-2023	

Zadání geodetické práce	Výkaz ploch skutečného provedení ploch a délek - asfalty, dlažba, obruby, liniové žlaby
-------------------------	---

Popis měření, rozsah, výpočet	Po dokončení výstavby bylo provedeno zaměření skutečného provedení. Následně byly nad tímto zaměřením vypočteny plochy a délky jednotlivých stavebních prvků (rozměry vodorovných průmětů do roviny zobrazení). Pouze u SO201 a 202 jsou uvedené prostorové délky a plochy.
-------------------------------	---

Výkaz ploch a délek:

SO	KM	objekt	plocha	
SO101.1		asfalt	9627	m ²
SO101.2		asfalt	9410	m ²
SO101.3		asfalt	7839	m ²
SO101.4		asfalt	11289	m ²
SO101.5		asfalt	9022	m ²
SO102		asfalt	813	m ²
SO103		asfalt	4087	m ²
SO103.2	silnice	asfalt	2097	m ²
	sjezd	asfalt	66	m ²
SO104.1		asfalt	2055	m ²
SO104.2		asfalt	4118	m ²
SO105		asfalt	791	m ²
SO106	silnice	asfalt	583	m ²
	sjezd	asfalt	42	m ²
SO107		asfalt	3892	m ²
SO108		asfalt	2550	m ²
SO109		asfalt	518	m ²
SO111.1		asfalt	1090	m ²
SO111.2		asfalt	810	m ²
SO140		asfalt	892	m ²
SO122		asfalt	614	m ²
SO123		asfalt	1354	m ²
SO201		asfalt	364	m ²

SO101.1		bet. dlažba ostr.	39,0	m ²
		zatrav. dlažba	77,8	m ²
SO101.5		bet. dlažba ostr.	52,9	m ²
SO103		bet. dlažba ostr.	50,7	m ²
		bet. dl. chodník	230,1	m ²
		kamenná dl.	77,6	m ²
SO103.2		bet. dl. chodník	613,0	m ²
		bet. dl. retardér	41,0	m ²
SO104.1		bet. dlažba ostr.	15,6	m ²
SO104.2		bet. dlažba ostr.	15,4	m ²
		bet. dl. chodník	220,0	m ²
SO105		bet. dlažba ostr.	15,3	m ²
SO106		bet. dl. chodník	59,8	m ²
		bet. dlažba ostr.	15,4	m ²
SO107		bet. dl. chodník	193,3	m ²
		bet. dlažba ostr.	15,3	m ²
SO111.1		bet. dlažba ostr.	3,0	m ²
SO111.2		R materiál	147	m ²
SO122		kam. dlažba	17,0	m ²
SO140		R materiál	170,0	m ²
SO201		kam.dlažba	145,3	m ²
SO202		kam.dlažba	70,0	m ²


SO101.1		bet. obr. š.8cm	16,4	m
		bet. obr. š.15cm	944,6	m
		žul. obr. š.20cm	43,7	m
SO101.5		žul. obr. š.20cm	55,7	m
SO103		bet. obr. š.8cm	165,8	m
		bet. obr. š.15cm	185,1	m
		žul. obr. š.20cm	72,9	m
		žul. obr. š.30cm	124,8	m
SO103.2		bet. obr. š.8cm	419,8	m
		bet. obr. š.15cm	395,8	m
SO104.1		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO104.2		bet. obr. š.5cm	2,7	m
		bet. obr. š.15cm	83,6	m
		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO105		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO106		bet. obr. š.8cm	76,6	m
		bet. obr. š.15cm	55,4	m
		žul. obr. š.20cm	19,1	m
SO107		bet. obr. š.8cm	216,9	m
		bet. obr. š.15cm	144,5	m
		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO109		bet. obr. š.8cm	15,0	m
SO111.1		žul. obr. š.20cm	8,3	m
SO122		bet. obr. š.8cm	330,4	m
		palisády	161,5	m
SO123		bet. obr. š.8cm	474,8	m
SO140		bet. obr. š.8cm	54,1	m
SO201		bet. obr. š.8cm	146,2	m
		bet. obr. š.15cm	14,5	m
SO202		bet. obr. š.8cm	68,1	m

SO101.1		liniový žlab	8,0	m
SO109		liniový žlab	7,0	m
SO140		liniový žlab	26,0	m
		odtok KG DN160	4,4	m

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

16.01.2026

15/2026




Přílohy:

Výkaz výměr pro jednotlivá SO - grafická část

Výkaz výměr SOIXX - plochy asfaltů

Grafická část

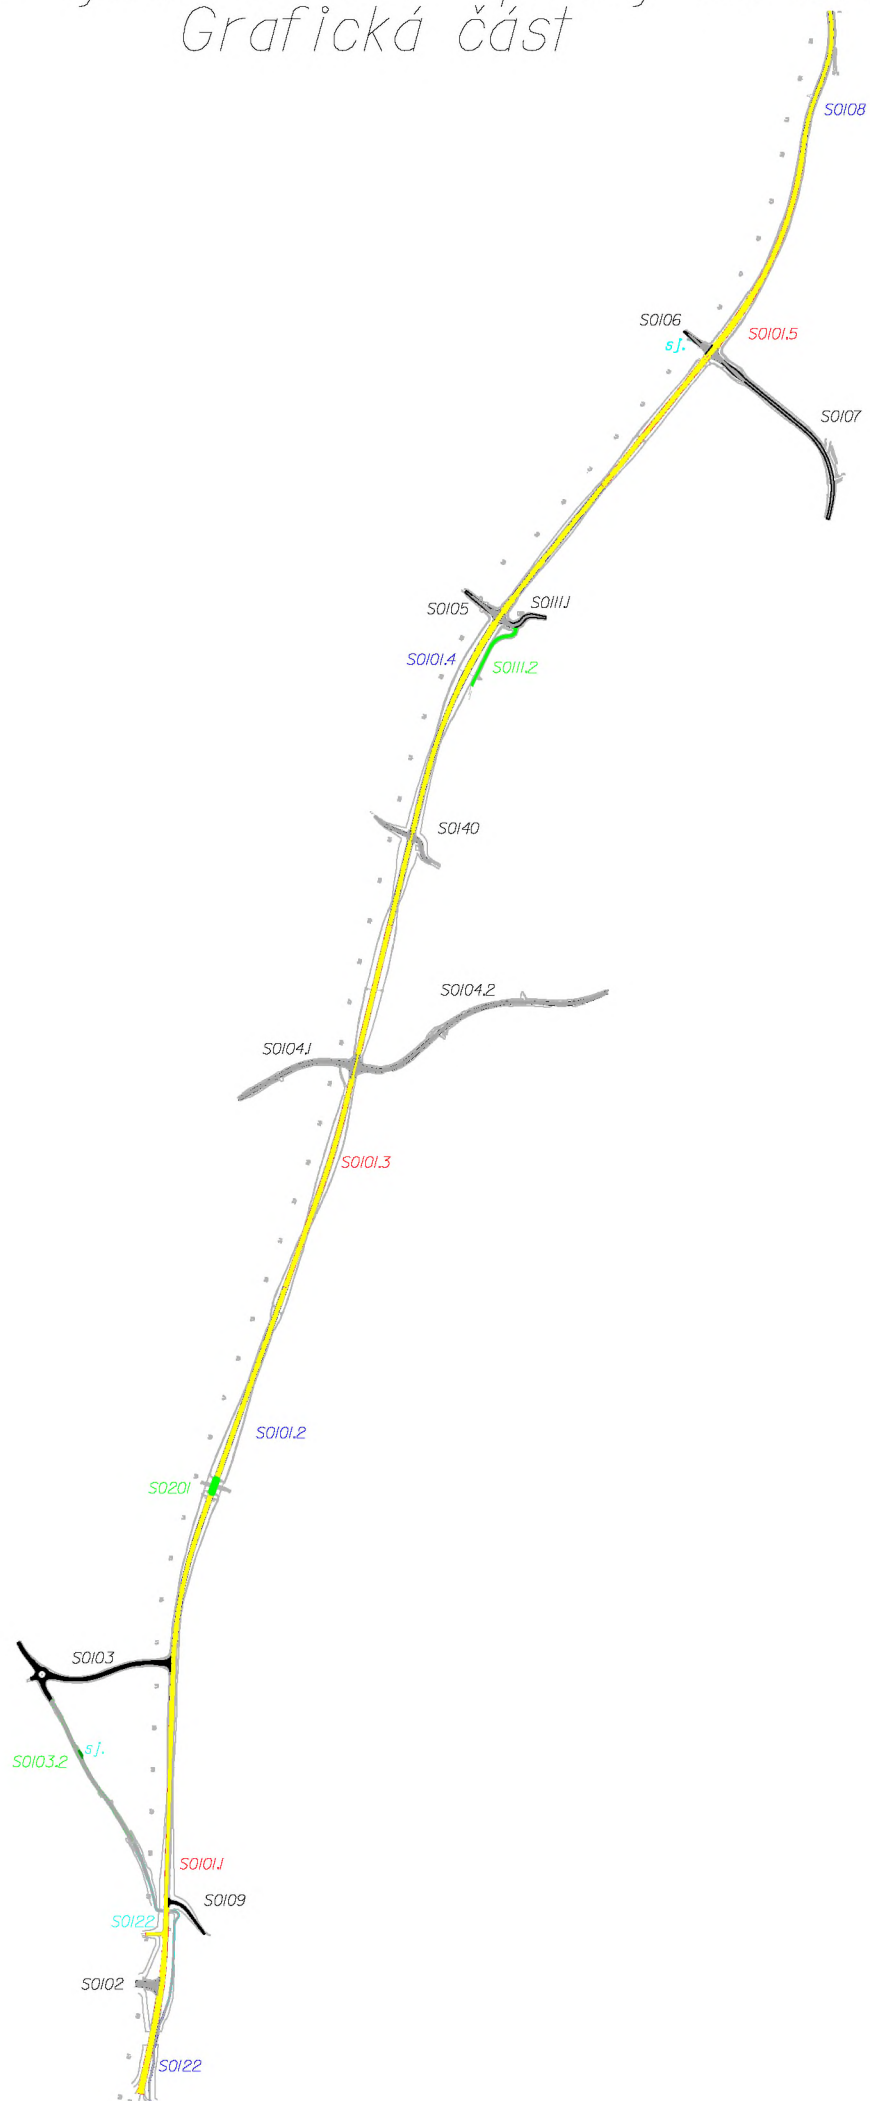

S0123 - výkaz délek a ploch

obr. bet. š. 8cm
dl 474,8m





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



SO 123 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
DENÍK: D5, I. ETAPA SO 123 - STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY V K.Ú.
LITOHLOVY

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Déšť	6,8°C	0,5 mm/h	4,2 m/s	235°	82%
12:00	Zamračeno	7,7°C	0,0 mm/h	3,8 m/s	248°	82%
18:00	Polojasno	5,0°C	0,0 mm/h	2,2 m/s	243°	89%

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
DEKAKOM plus s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8				
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Kolový bagr 14t	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Kloubový dumper	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Zemní fréza	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Dávkočep pojiva TATRA	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8
Zemní válec	DEKAKOM plus s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlovy - prováděna konstrukční vrstva ŠD v tl. 150 mm - hutnění válcem - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	DEKAKOM plus s.r.o.		

Podpisy:







Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235

IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy (vč. ZL058)


ZL č.: 102

Název změny: SO 123 plochy - skutečnost

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Beze změny technického řešení stavby.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 102

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 102

Název ZL: SO 123 plochy skutečnost

Zdůvodnění:

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo provedeno doměření dle skutečného zaměření.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu.


Odpočítané položky: - 134 121,90 Kč

Připočítané položky: 0,00 Kč

Celkem ZL: - 134 121,90 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS:



DOZOR inženýring 5
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213
