



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 100

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

Dotčená část stavby:	SO 111.1 - Napojení MK v km 3,689 - MK		
Název / označení změny:	SO 111.1 plochy - skutečnost		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.01.2026
Zdůvodnění a popis změny: Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek. Změna se týká položek: viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:	213 399,64 Kč		
připočty celkem:	213 399,64 Kč		
odpočty celkem:	- Kč		
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC geodetický protokol vč. situace SD obrázková příloha stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z_241016
Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:
Místo: Rokycansko

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			213 399,64
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	213 399,64	44 813,92
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			258 213,56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z_241016

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		213 399,64	258 213,56	
ZL100	SO 111.1 - skutečnost ploch	213 399,64	258 213,56	STA
SO 111.1	Napojení MK v km 3,689 - MK	213 399,64	258 213,56	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt:
ZL100 - SO 111.1 - skutečnost ploch
Soupis:
SO 111.1 - Napojení MK v km 3,689 - MK

KSO:
Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			213 399,64
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	213 399,64	21,00%	44 813,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			258 213,56
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL100 - SO 111.1 - skutečnost ploch
Soupis: SO 111.1 - Napojení MK v km 3,689 - MK

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	213 399,64
VCP - VÍCEPRÁCE	213 399,64

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
Objekt: ZL100 - SO 111.1 - skutečnost ploch
Soupis: SO 111.1 - Napojení MK v km 3,689 - MK

Místo: Rokycansko
Zadavatel:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							213 399,64
D	VCP	VÍCEPRÁCE					213 399,64
1	K	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2			45 065,85
P			Poznámka k položce: KSC I (SC C8/10); tl. 130mm vč. rozšíření v krajích trasy o 6%				
W			Položka z SOD z objektu SO 111.1, pol.č. 18				
W			"dle PDPS" -867*1,06				
W			"dle skutečnosti" 1090*1,06				
W			Součet				
2	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2			48 911,93
P			Poznámka k položce: ŠDA; tl. 200mm vč. rozšíření v krajích trasy o 14%				
W			Položka z SOD z objektu SO 111.1, pol.č. 19				
W			"dle PDPS" -867*1,14				
W			"dle skutečnosti" 1090*1,14				
W			Součet				
3	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2			3 535,67
P			Poznámka k položce: PI; EP; 0,6 kg/m2 vč. rozšíření v krajích trasy o 5%				
W			Položka z SOD z objektu SO 111.1, pol.č. 21				
W			"dle PDPS" -867*1,05				
W			"dle skutečnosti" 1090*1,05				
W			Součet				
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			2 342,84
P			Poznámka k položce: PS; EP; 0,30 kg/m2 vč. rozšíření v krajích trasy o 2%				
W			Položka z SOD z objektu SO 111.1, pol.č. 22				
W			"dle PDPS" -867*1,02				
W			"dle skutečnosti" 1090*1,02				
W			Součet				
5	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			37 965,75
P			Poznámka k položce: ACO 11; tl. 40mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Položka z SOD z objektu SO 111.1, pol.č. 23				
	W		"dle PDPS" -867				
	W		"dle skutečnosti" 1090				
	W		Součet				
6	K	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2			54 023,70
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ACP 16+ ; tl. 70mm vč. rozšíření v krajích trasy o 2,5%				
	W		Položka z SOD z objektu SO 111.1, pol.č. 24				
	W		"dle PDPS" -867*1,025				
	W		"dle skutečnosti" 1090*1,025				
	W		Součet				
7	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2			432,90
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ŠD tl. 150mm				
	W		Položka z SOD z objektu SO 106, pol.č. 19				
	W		"dle skutečnosti" 3				
	W		Součet				
8	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2			1 533,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dl 60mm, Lože 30mm				
	W		Položka z SOD z objektu SO 106, pol.č. 26				
	W		"dle skutečnosti" 3				
	W		Součet				
9	K	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M			19 588,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> přímé i obloukové prvky				
	W		Položka z SOD z objektu SO 106, pol.č. 30				
	W		"dle skutečnosti" 8,3				
	W		Součet				

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ DODAVATELE STAVBY

Stavba	Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa	
Stavební objekt	SO1XX, 201, 202	Komunikace a mosty
Hlavní zhotovitel stavby	ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice	
Geodet zhotovitele stavby	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň	
Zakázka objednatele	200-2023	

Zadání geodetické práce	Výkaz ploch skutečného provedení ploch a délek - asfalty, dlažba, obruby, liniové žlaby
-------------------------	---

Popis měření, rozsah, výpočet	Po dokončení výstavby bylo provedeno zaměření skutečného provedení. Následně byly nad tímto zaměřením vypočteny plochy a délky jednotlivých stavebních prvků (rozměry vodorovných průmětů do roviny zobrazení). Pouze u SO201 a 202 jsou uvedené prostorové délky a plochy.
-------------------------------	---

Výkaz ploch a délek:

SO	KM	objekt	plocha	
SO101.1		asfalt	9627	m ²
SO101.2		asfalt	9410	m ²
SO101.3		asfalt	7839	m ²
SO101.4		asfalt	11289	m ²
SO101.5		asfalt	9022	m ²
SO102		asfalt	813	m ²
SO103		asfalt	4087	m ²
SO103.2	silnice	asfalt	2097	m ²
	sjezd	asfalt	66	m ²
SO104.1		asfalt	2055	m ²
SO104.2		asfalt	4118	m ²
SO105		asfalt	791	m ²
SO106	silnice	asfalt	583	m ²
	sjezd	asfalt	42	m ²
SO107		asfalt	3892	m ²
SO108		asfalt	2550	m ²
SO109		asfalt	518	m ²
SO111.1		asfalt	1090	m ²
SO111.2		asfalt	810	m ²
SO140		asfalt	892	m ²
SO122		asfalt	614	m ²
SO123		asfalt	1354	m ²
SO201		asfalt	364	m ²


SO101.1		bet. dlažba ostr.	39,0	m ²
		zatrav. dlažba	77,8	m ²
SO101.5		bet. dlažba ostr.	52,9	m ²
SO103		bet. dlažba ostr.	50,7	m ²
		bet. dl. chodník	230,1	m ²
		kamenná dl.	77,6	m ²
SO103.2		bet. dl. chodník	613,0	m ²
		bet. dl. retardér	41,0	m ²
SO104.1		bet. dlažba ostr.	15,6	m ²
SO104.2		bet. dlažba ostr.	15,4	m ²
		bet. dl. chodník	220,0	m ²
SO105		bet. dlažba ostr.	15,3	m ²
SO106		bet. dl. chodník	59,8	m ²
		bet. dlažba ostr.	15,4	m ²
SO107		bet. dl. chodník	193,3	m ²
		bet. dlažba ostr.	15,3	m ²
SO111.1		bet. dlažba ostr.	3,0	m ²
SO111.2		R materiál	147	m ²
SO122		kam. dlažba	17,0	m ²
SO140		R materiál	170,0	m ²
SO201		kam.dlažba	145,3	m ²
SO202		kam.dlažba	70,0	m ²

SO101.1		bet. obr. š.8cm	16,4	m
		bet. obr. š.15cm	944,6	m
		žul. obr. š.20cm	43,7	m
SO101.5		žul. obr. š.20cm	55,7	m
SO103		bet. obr. š.8cm	165,8	m
		bet. obr. š.15cm	185,1	m
		žul. obr. š.20cm	72,9	m
		žul. obr. š.30cm	124,8	m
SO103.2		bet. obr. š.8cm	419,8	m
		bet. obr. š.15cm	395,8	m
SO104.1		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO104.2		bet. obr. š.5cm	2,7	m
		bet. obr. š.15cm	83,6	m
		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO105		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO106		bet. obr. š.8cm	76,6	m
		bet. obr. š.15cm	55,4	m
		žul. obr. š.20cm	19,1	m
SO107		bet. obr. š.8cm	216,9	m
		bet. obr. š.15cm	144,5	m
		žul. obr. š.20cm	19,0	m
SO109		bet. obr. š.8cm	15,0	m
SO111.1		žul. obr. š.20cm	8,3	m
SO122		bet. obr. š.8cm	330,4	m
		palisády	161,5	m
SO123		bet. obr. š.8cm	474,8	m
SO140		bet. obr. š.8cm	54,1	m
SO201		bet. obr. š.8cm	146,2	m
		bet. obr. š.15cm	14,5	m
SO202		bet. obr. š.8cm	68,1	m

SO101.1		liniový žlab	8,0	m
SO109		liniový žlab	7,0	m
SO140		liniový žlab	26,0	m
		odtok KG DN160	4,4	m

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

16.01.2026
15/2026




Přílohy:


Výkaz výměr pro jednotlivá SO - grafická část


Výkaz výměr SOIXX - plochy asfaltů

Grafická část

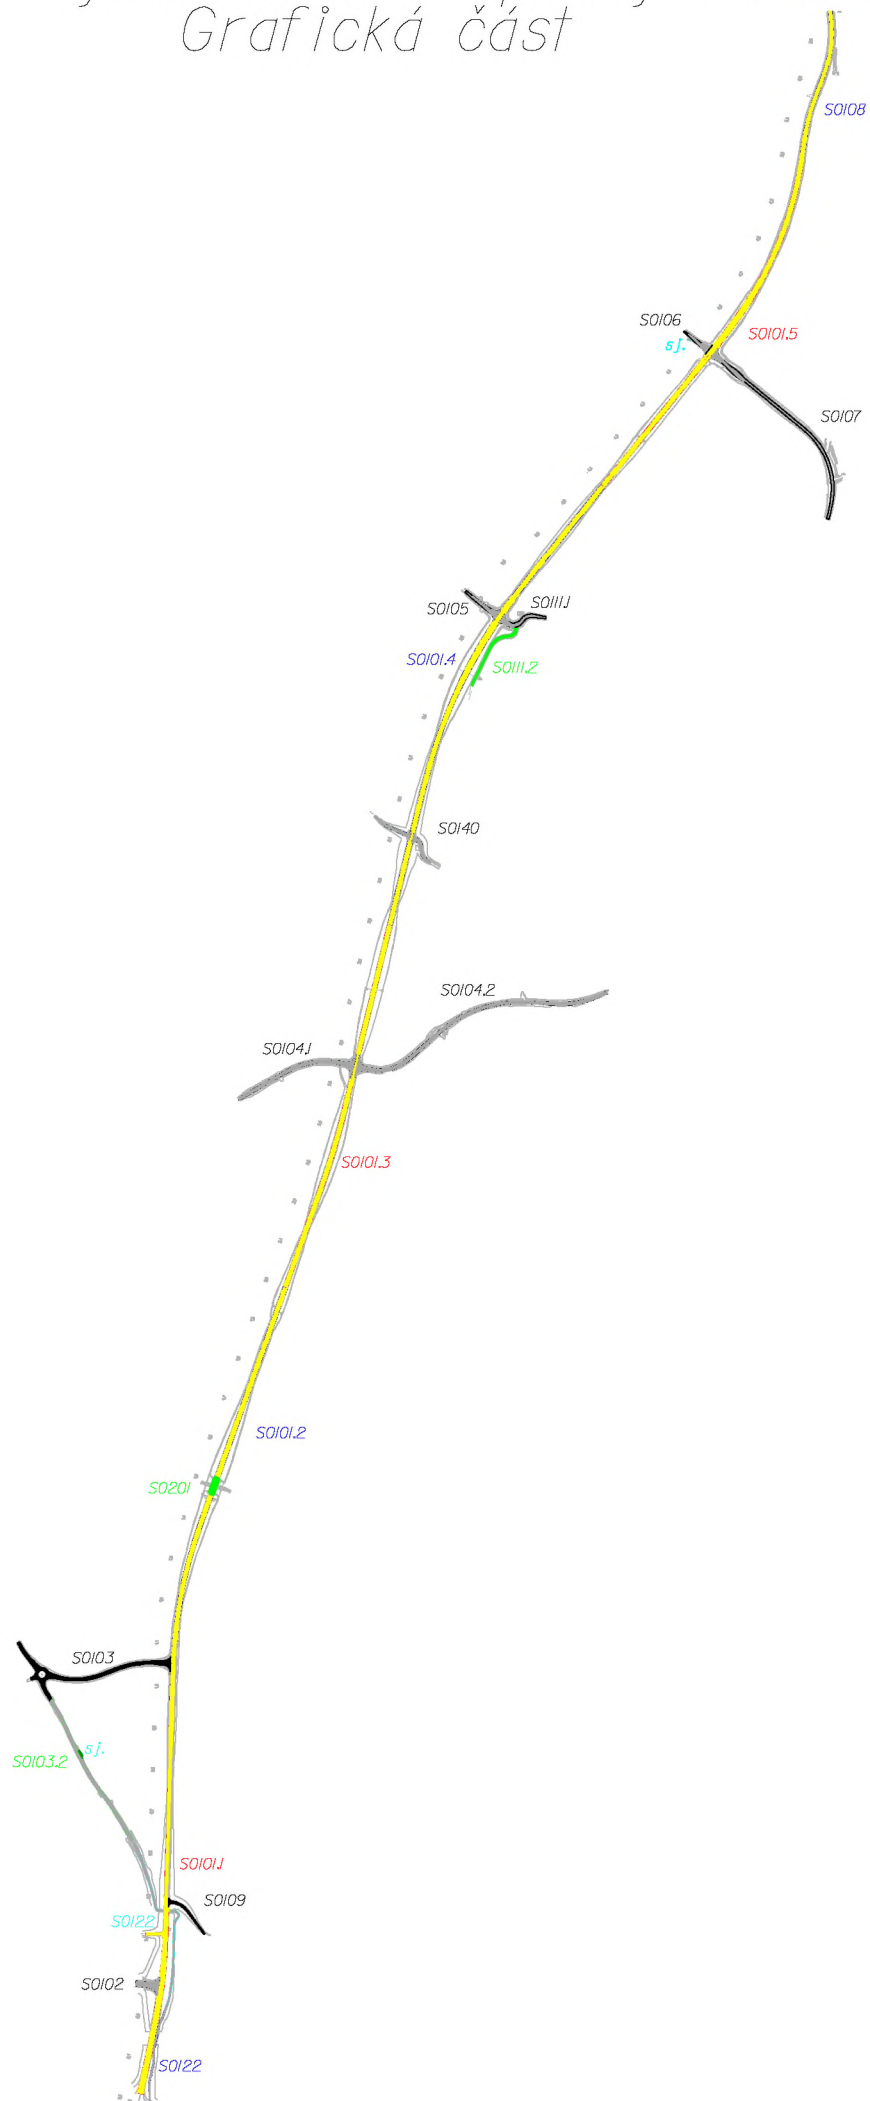

S0111.1 a .2 - výkaz délek a ploch

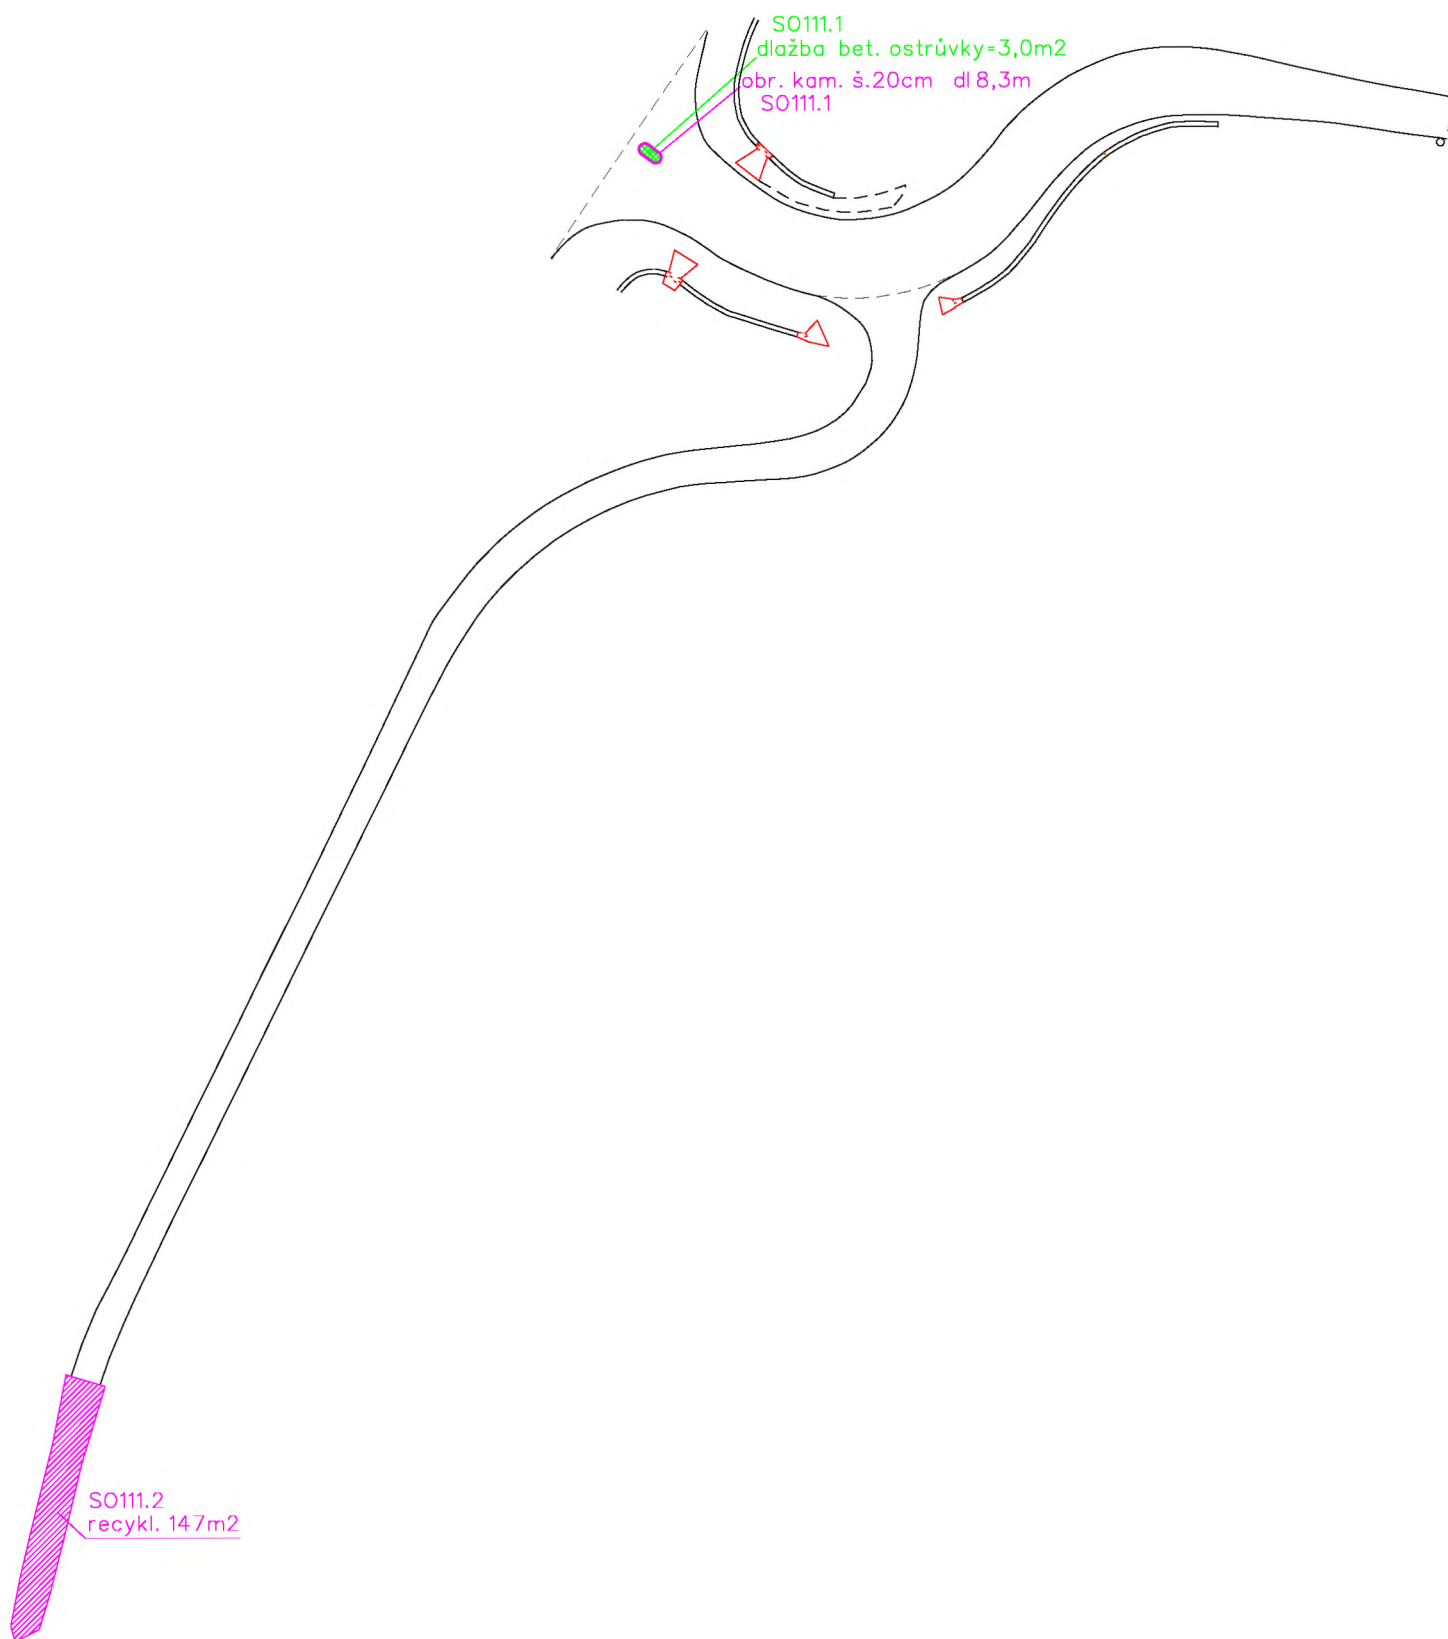



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK: SO 111 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 111 - NAPOJENÍ MK V KM 3,689



POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Déšt	18,3°C	0,1 mm/h	3,1 m/s	214°	83%
12:00	 Polojasno	21,5°C	0,0 mm/h	4,5 m/s	272°	62%
18:00	 Polojasno	21,8°C	0,0 mm/h	5,1 m/s	278°	34%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Dělník	1	8		Vedoucí Pokládky	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Silniční válec Hamm HD12	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Kropící vůz	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Silniční válec Hamm DV90	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Finišer Vogeles 1900	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Nákladní vozidlo - AB směs	ROADFIN STAVBY s.r.o.		6	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
111 - Napojení MK v km 3,689 MK a polní cesta - prováděna pokládka vrstvy ACO v tl. 40 mm - hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění - teplota směsi: 158, 157, 157, 158, 159, 159°C - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	ROADFIN STAVBY s.r.o.		

Podpisy:

ROADFIN
cesty jsou pro



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK: SO 111 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 111 - NAPOJENÍ MK V KM 3,689

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	17,2°C	0,0 mm/h	1,1 m/s	217°	87%
12:00	Déšť	19,3°C	0,5 mm/h	3,8 m/s	246°	92%
18:00	Déšť	23,0°C	0,0 mm/h	4,8 m/s	253°	58%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8		Dělník	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
STRABAG a.s.							
	Dělník	1	8		Dělník	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Pásové rypadlo CAT 30 t	BIGGEST s.r.o.		1	8
Kloubový dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.		1	8
Kolový nakladač	STRABAG a.s.		1	8
Kloubový dumper VOLVO	BIGGEST s.r.o.		1	8
Zemní válec	BIGGEST s.r.o.		1	8
Dozér CAT D8	BIGGEST s.r.o.		1	8


PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO111 - napojení MK v km 3,689 a polní cesta příkopové žlaby - zemní práce, příprava podkladu - pokládka příkopových žlabů z betonu do lože z betonu - práce nad rámec SOD	STRABAG a.s.		
SO111 - napojení MK v km 3,689 a polní cesta MK a polní cesta km ZÚ - KÚ - prováděna pokládka vrstvy ŠD - rovnání do požadované nivelety - hutnění válcem - práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP	BIGGEST s.r.o.		

Podpisy:



projektu)



STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA




 buildary.online

DENÍK: SO 111 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 111 - NAPOJENÍ MK V KM 3,689


POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Jasno	16,0°C	0,0 mm/h	0,5 m/s	345°	97%
12:00	 Polojasno	27,8°C	0,0 mm/h	3,2 m/s	253°	48%
18:00	 Polojasno	29,0°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	251°	45%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.					Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				
	Stavbyvedoucí	1	8				
ROADFIN STAVBY s.r.o.					Vedoucí Pokládky	1	8
	Dělník	1	8				
	Stavbyvedoucí	1	8				
	Stavbyvedoucí	1	8				
					Mistr Stavby	1	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Silniční válec Hamm HD12	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Kropící vůz	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Silniční válec Hamm DV90	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Finišer Vogeles 1900	ROADFIN STAVBY s.r.o.		1	8
Nákladní vozidlo - SC směs	ROADFIN STAVBY s.r.o.		6	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
111 - Napojení MK v km 3,689			
MK a polní cesta			
- prováděna pokládka vrstvy SC v tl. 130 mm			
- statické hutnění válcem			
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP			

Podpisy:



projektu)



Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235



IDDS: pwq8mry

Vyjádření autorského dozoru

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 111.1 - Napojení MK v km 3,689 – MK


ZL č.: 100

Název změny: SO 111.1 plochy – skutečnost

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Beze změny technického řešení stavby.

AD souhlasí s navrženou změnou.



Ragemia, s.r.o.

STANOVISKO TDS K ZL č. 100

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 100

Název ZL: SO 111.1 plochy skutečnost

Zdůvodnění:

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby bylo vypracováno doměření výměr jednotlivých položek.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Bylo provedeno doměření dle skutečného zaměření.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu.

Odpočítané položky: - 0,00 Kč

Připočítané položky: 213 399,64 Kč

Celkem ZL: 213 399,64 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS:

[Redacted signature]

[Redacted stamp]

DOZOR inženýring 5
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozori.cz, IČO: 07870213
