

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ BRDÍČKOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY


STAVBA: „Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova“

Číslo změnového listu: ZL-1


Název změny: **ZMĚNA MATERIÁLU BOURANÝCH PŘÍČEK
A TL. BOURANÝCH IZOLACÍ**

Stavba: Rekonstrukce dle SOD	Adresa objektu: ZŠ Brdičkova 1878/2, Praha 5, Stodůlky
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o navýšení výměr odstranění izolace proti vodě a záměna materiálu bouraných příček.	
Zdůvodnění změny: Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že většina stávajících příček ve 3. NP jsou ze SIPOREXU, vyztužené ocelovou sítí. PD předpokládala příčky zděné. Dále bylo zjištěno rozdílné provedení izolace v podlaze (2-3 vrstvy, tl.: 1-2cm). Podle původní PD se počítalo s odstraněním jednovrstvé tl. 4 mm. Na základě měření bylo zjištěno, že tloušťka původní hydroizolace je 1 – 2 cm ve třech vrstvách. Pro další provedení práce je nutné vybourání všech vrstev izolace vč. jejího uložení na skládku. Fotodokumentace skutečného stavu	

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ BRDÍČKOVA

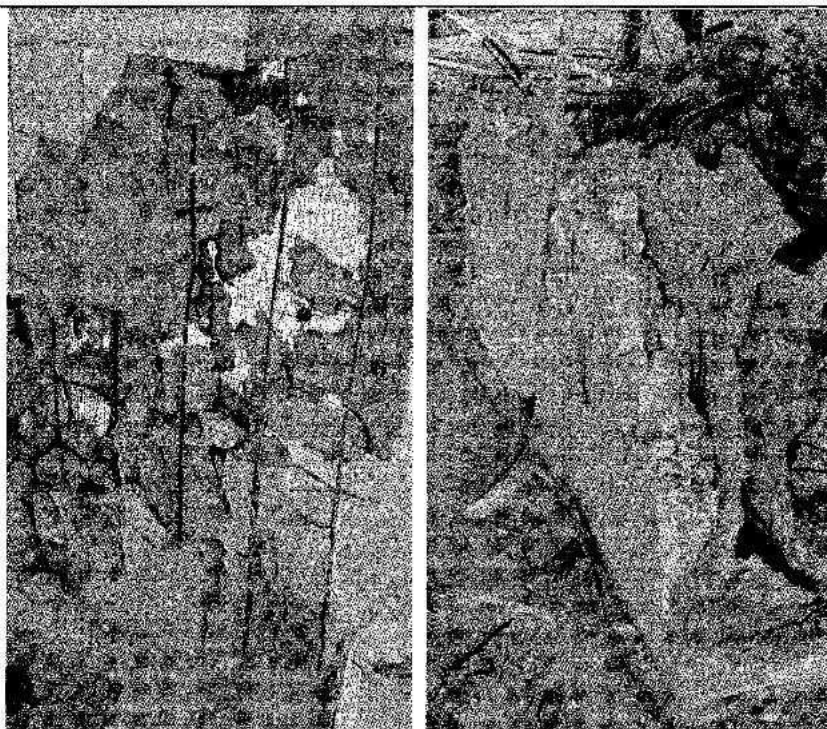

BOURANÉ SIPOREXOVÉ PŘÍČKY

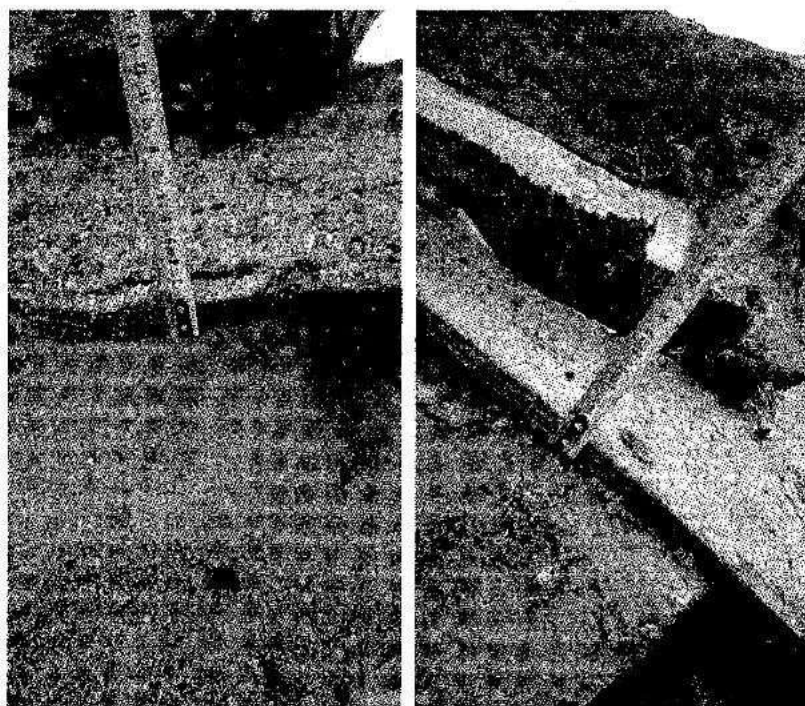

BOURANÉ VRSTVY HYDROIZOLACE

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ BRDÍČKOVA

Dopady změny: - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 291 325,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 11.8.2017
Vyjádření objednatele:	
V Praze dne:	
Za autorského dozora stavby: Jméno: Ing. Evžen Krouský	podpis 
Za technického dozora investora: Jméno: Ing. Jan Bříza	podpis 
Za objednatele: Jméno: Mgr. Evžen Mošovský	podpis 
Za zhotovitele: Jméno: Marek Nesvačil	podpis 

Zakázka:

ZŠ Brdičkova - Rekonstrukce kuchyně a jídelny, Brdičkova 1878/2, Praha 5

Popis	Cena
01: ZŠ - rekonstrukce kuchyně a jídelny	291 325
009: Ostatní konstrukce a práce	102 286
099: Přesun sutí a vybouraných hmot	183 327
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 712
Celkem (bez DPH)	291 325


Poř.	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
01: ZŠ - rekonstrukce kuchyně a jídelny						
009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm - 3.NP	m2	- 243,724	55,00	13 405
2.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	- 107,857	81,00	- 8 736
3.	962084131	Bourání příček siporex potažených ocel. síťmi tl do 100 mm	m2	243,724	114,67	27 948
4.	962085101	Bourání příček siporex potažených ocel. síťmi tl do 150 mm	m2	107,857	164,91	17 787
5.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 - 3.NP - m.č.311, 323-327 bez příček	m3	108,96	1 980,00	215 741
6.	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	2 237,056	8,00	17 896
7.	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 - odpočet místností 311, 323-327;	m3	- 78,255	1 980,00	- 154 945
						291 325
						102 286
099: Přesun suti a vybouraných hmot						
8.	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	97,4	609,89	59 403
9.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	97,4	209,67	20 422
10.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 363,6	9,12	12 433
10.	997013805	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	97,4	935,00	91 069
						183 327
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
13.	07	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	2,0	285 612,51	5 712
						5 712

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova“

Číslo změnového listu: ZL-2

Název změny: **DODÁVKA NOVÝCH SVÍTIDEL DO UČEBEN 2. NP**

Stavba: Rekonstrukce dle SOD	Adresa objektu: ZŠ Brdičkova 1878/2, Praha 5 - Stodůlky
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o výměnu svítidel ve 2. NP	
Zdůvodnění změny: Při demontáži svítidel ve 2. NP bylo zjištěno, že stav stávajících svítidel je velmi špatném stavu a jejich demontáž a zpětná montáž je velmi problematická z důvodu kotvení. Z výše uvedeného důvodu navrhujeme výměnu těchto svítidel za nová.	
FOTODOKUMENTACE STAVU A KOTVENÍ SVĚTEL	
	

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ BRDÍČKOVA

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.

Dopady změny:

- na časový plán výstavby: NE
- na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 81 488,- Kč bez DPH
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Předkládá: M. Nesvačil, Z&D

Datum: 11.8.2017

Vyjádření objednatele:

V Praze dne:

Za autorského dozora stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova“

Číslo změnového listu: ZL-3

Název změny: **MONTÁŽ SDK PŘEDSTĚN VE 2.NP A PŘEVOZ
GASTRO VYBAVENÍ DO ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ MČ PRAHY 13**

Stavba: Rekonstrukce dle SOD	Adresa objektu: ZŠ Brdičkova 1878/2, Praha 5 - Stodůlky
--	---

Navrhovatel změny:

Zhotovitel stavby:

Z&D stavební společnost, spol. s r.o.

K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

IČ: 452 44 618

DIČ: CZ45244618

Popis změny:

Jedná se o provedení SDK předstěn ve 3 učebnách 2. NP

a převoz gastro vybavení vč. odborného odpojení do škol a školek MČ Prahy 13

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k požadavku uživatele navrhujeme provedení SDK předstěn ve třech učebnách 2. NP z důvodu sjednocení povrchů stěn učeben . Tato úprava zvyšuje užitnou hodnotu. Dále navrhujeme vzhledem k požadavku uživatele o odborné odpojení vybraných gastro vybavení a převezení do školských zařízení MČ Prahy 13 pro vylepšení vybavení stávajících kuchyní.

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.

Dopady změny:

- na časový plán výstavby: **NE**
- na cenu stavby: **ANO, navýšení ceny o 79 121,- Kč bez DPH**
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: **NE**

Doložené přílohy:

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ BRDÍČKOVA

Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 15.8.2017
Vyjádření objednatele:	
V Praze dne:	
Za autorského dozora stavby: Jméno: Ing. Evžen Krouský	podpis:
Za technického dozora investora: Jméno: Ing. Jan Bříza	podpis:
Za objednatele: Jméno: Mgr. Evžen Mošovský	podpis:
Za zhotovitele: Jméno: Marek Nesvačil	podpis:

Zakázka:

ZŠ Brdičkova - Rekonstrukce kuchyně a jídelny, Brdičkova 1878/2, Praha 5

Popis	Cena
01: ZŠ - rekonstrukce kuchyně a jídelny	28 988
763: konstrukce suché výstavby	28 420
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	568
Celkem (bez DPH)	28 988

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
01: ZŠ - rekonstrukce kuchyně a jídelny						
763: konstrukce suché výstavby						
1.	763121451	SDK stěna předsazená II 12,5	m2	58,0	490,00	28 420
						28 420
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
2.	07	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	2,0	28 420,00	568
						568

Zakázka:

ZŠ Brdičkova - Rekonstrukce kuchyně a jídelny, Brdičkova 1878/2, Praha 5

Popis	Cena
01: ZŠ - rekonstrukce kuchyně a jídelny	50 133
791: zařízení velkokuchyní	49 150
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	983
Celkem (bez DPH)	50 133

Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
01: ZŠ - rekonstrukce kuchyně a jídelny				50 133
791: zařízení velkokuchyní				49 150
odborné odpojení gastro zařízení od instalací (voda, plyn, elektro)	kpl	1,0	17 500,00	17 500
vnitrostaveništní přesun zařízení ze 3. NP k nákladové rampě	kpl	1,0	21 400,00	21 400
naložení a převoz vybavení do školských zařízení MČ Praha 13	kpl	1,0	19 600,00	19 600
odpočet částí demontáž stávajícího zařízení kuchyně vč. likvidace	kpl	1,0	- 9 350,00	- 9 350
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				983
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	2,0	49 150,00	983

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova“

Číslo změnového listu: ZL-4

Název změny: **PROVIZORNÍ PŘESTŘEŠENÍ STROJOVNY VZT**

Stavba: Rekonstrukce dle SOD	Adresa objektu: ZŠ Brdičkova 1878/2, Praha 5 - Stodůlky
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o provizorní přestřešení části objektu v místě budoucí strojovny VZT	
Zdůvodnění změny: Vzhledem k chybějící parotěsné folii (nad panelem) ve stávající bourané střešní skladbě nad varnou, je nutné zajistit provizorní zastřešení objektu. Bez provedení tohoto opatření může docházet k zatečení do objektu a poškození stávajících i nových konstrukcí. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní veřejné zakázky.	
Dopady změny: - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 108 310,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 9.10.2017
Vyjádření objednatele:	

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ BRDÍČKOVA

V Praze dne:	
Za autorského dozora stavby: Jméno: Ing. Evžen Krouský	podpis:
Za technického dozora investora: Jméno: Ing. Jan Bříza	podpis:
Za objednatele: Jméno: Mgr. Evžen Mošovský	podpis:
Za zhotovitele: Jméno: Marek Nesvačil	podpis:

Zakázka:

Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova, Praha 5 - provizorní přestřešení strojovny

Popis	Cena
02: Provizorní přestřešení strojovny	108 310
762: Konstrukce tesařské	69 901
765: Krytiny tvrdé	36 286
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 124
Celkem (bez DPH)	108 310

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
02: Provizorní přestřešení strojovny						
762: Konstrukce tesařské						
1.	762332142	Montáž vázaných kč krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami - sloupky.	m	203.5	172,82	108 310
2.	762085103	pozednice, krokve - provizorní přestřešení strojovny				69 901
3.	762086111	Montáž kotevnic pater sloupků včetně dodávky	kus	9.0	380,59	3 425
4.	60511166	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg - kotvení pozednic	kg	18.0	238,54	4 294
5.	762395000	Řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I. - provizorní přestřešení strojovny	m3	3,243	6 380,00	20 692
6.	998762202	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	3,243	809,89	2 626
		Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	662,06	3 694
765: Krytiny tvrdé						
7.	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou - provizorní přestřešení strojovny	m2	200.0	28,40	5 680
8.	70921210	Plachta PE, 200 g/m2	m2	210.0	137,00	28 770
9.	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	5,33	344,50	1 836
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
10.	045002000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	2.0	1 061,86	2 124
						2 124

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova“

Číslo změnového listu: ZL-5

Název změny: **STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ**

Stavba: Rekonstrukce dle SOD	Adresa objektu: ZŠ Brdičkova 1878/2, Praha 5 - Stodůlky
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o vybourání nenosné konstrukce výtahové šachty a doplnění nosnými prvky vč. přepažení jednotlivých šachet	
Zdůvodnění změny: Bylo zjištěno, že stěna mezi výtahovou šachtou 313 a 312 je nenosná. Navrhujeme její demolicí. Stěna bude nahrazena náhradní dělicí konstrukcí. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní veřejné zakázky.	
Dopady změny: - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 50 340,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 9.10.2017
Vyjádření objednatele:	

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ BRDÍČKOVA

V Praze dne:

Za autorského dozora stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Zakázka:

Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova - výtahová stěna- bourání a nová z tahokovu

Popis	Cena
03: Výtahová stěna - bourání + tahokov	50 340
009: Ostatní konstrukce a práce	17 855
099: Přesun hmot HSV	7 394
767: Konstrukce zámečnické	23 671
783: Nátěry	433
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	987
Celkem (bez DPH)	50 340

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

03: Výtahová stěna - bourání + tahokov

50 340

009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	12,0	81,00	972
2.	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,197	5 771,53	1 139
3.	964061321	Uvolnění zhlaví ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	14,0	278,41	3 898
4.	973031324	Výsekanie kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	14,0	137,05	1 919
5.	953946111	Montáž atypických ocelových kcl hmotnosti do 1 t z profilu hmotnosti do 13 kg/m - vodící k-ce výtahu	t	0,155	21 700,00	3 359
6.	13010912	Ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,155	22 200,00	3 441
7.	342171110.	Montáž stěn ocelových kcl z TAHOKOVU budov v do 12 m	m2	12,0	260,63	3 128
						17 855

099: Přesun hmot HSV						
1.	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	4,136	848,18	3 508
2.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,136	190,00	786
3.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	57,904	9,00	521
4.	997013805	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,136	210,00	869
5.	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,136	389,19	1 610
6.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,155	645,80	100
						7 394

767: Konstrukce zámečnické						
1.	767122112	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě - Tahokovu	m2	12,0	289,93	3 479
2.	19112341	Stěna z Tahokovu	m2	12,0	1 648,00	19 778
3.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	232,55	416
						23 671

783: Natěry						
1.	783121170	Natěry syntetické OK lehkých "C" barva základní antikorozní - U 120	m2	5,25	82,53	433
						433

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
1.	045002000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	2,0	493,53	987
						987

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova“

Číslo změnového listu: ZL-7

Název změny: **PROVEDENÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ**

Stavba: Rekonstrukce dle SOD	Adresa objektu: ZŠ Brdičkova 1878/2, Praha 5 - Stodůlky
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o provedení slaboproudých rozvodů pro potřeby provozu jídelny a kuchyně	
Zdůvodnění změny: V průběhu výstavby vznesl budoucí uživatel požadavek na doplnění automatického stravovacího systému a doplnění dalších technologií pro provoz. Proto předkládáme nabídku na doplnění těchto prvků zajišťujících bezproblémový provoz kuchyně a výdej jídel. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.	

Dopady změny: - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 287 298,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 9.10.2017
Vyjádření objednatele:	

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ BRDÍČKOVA

V Praze dne:

Za autorského dozora stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

AKCE:
INVESTOR:
OBSAH:
Výkaz výměr

Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova
Městská část Praha 13

Elektroinstalace - dodatky

Popis výkonu	Jedn.	Množství	Jedn. cena		Celkem
			dodávka	montáž	
Wifi					
kabel FTP	m	145	12	24	5 220
Trubka elektroinstalační Ø40mm,	m	125	14	35	6 125
kabel UTP	m	310	12	24	11 160
Lišta kabelová vkladací PVC bílá	m	75	29	30	4 425
Krabice rozbočná na omítku	ks	18	69	120	3 402
Spojka datových kabelů cat.5e	ks	2	40	40	160
Ukončení kabelu konektorem cat.5e	ks	2	40	40	160
Měření kabelů	hod	20	0	200	4 000
Stavební přípomoc - průrazy	kpl	1	0	1 400	1 400
Doprava, podružný materiál	kpl	1	500	1 500	2 000
Telefon					
kabel SYKFY 5x2x0,5	m	138	7	10	2 346
Stavební přípomoc - průrazy	kpl	1	0	1 200	1 200
Doprava, podružný materiál (mj. na lávce v kolektoru)	kpl	1	400	300	700
Propojka ve 3.NP					
Trubka elektroinstalační Ø40mm,	m	52	14	35	2 548
kabel UTP	m	55	12	24	1 980
koaxiální kabel	m	55	7	10	935
Doprava, podružný materiál	kpl	1	600	400	1 000
Videotelefon					
Trubka elektroinstalační Ø32mm,	m	85	9	29	3 230
kabel FTP	m	180	12	24	6 480
koaxiální kabel	m	95	7	10	1 615
tablo s bar.kamerou	ks	1	15 250	2 740	17 990
napáječ	ks	1	6 900	760	7 660
bar.stolní videotelefon vč.připojovací šňůry	ks	2	8 650	430	18 160
el.zámek - bez zámečnických úprav, osazení do dveří a elektropřípravy ve dveřích	ks	1	2 380	650	3 030
kabel CYKY 3Jx2,5 mm2	m	39	13	15	1 092
Rozvaděč Rdt	ks	1	3 850	1 350	5 200
Oživení systému	hod	20	0	1 440	28 800
Stavební přípomoc - průrazy	kpl	1	0	1 960	1 960
Doprava, podružný materiál	kpl	1	800	1 400	2 200
Stravovací systém					
kabel UTP	m	290	14	24	11 020
Trubka elektroinstalační Ø40mm,	m	240	14	35	11 760
kabel CYKY 3Jx1,5 mm2	m	180	8	13	3 780
kabel CYSY 3Jx2,5 mm2	m	15	8	13	315
Krabice univerzální pod omítku KU 68	ks	3	44	115	477
Krabice rozbočná pod omítku	ks	3	69	120	567
Lišta kabelová vkladací PVC bílá	m	12	29	30	708
Ukončení kabelu konektorem cat.5e	ks	3	40	40	240
Vývodka	ks	3	115	80	585
Doplnění rozvaděče	ks	1	1 820	430	2 250
Stavební přípomoc - průrazy	kpl	1	0	800	800
Doprava, podružný materiál	kpl	1	650	900	1 550
Projektor					
kabel WGA	m	15	7	10	255
kabel CYKY 3Jx2,5 mm2	m	29	13	15	812
Lišta kabelová vkladací PVC bílá	m	8	29	30	472
Koncovka kabeláže 230V pro projektor, 2x zásuvka 230V	ks	1	1 620	1 380	3 000
Doprava, podružný materiál	kpl	1	200	750	950
Rozhlas					
kabel CYKY 3Jx2,5 mm2	m	145	13	15	4 060
kabel FTP	m	60	12	24	2 160
Lišta kabelová vkladací PVC bílá	m	10	29	30	590
školní reproduktor	ks	5	460	180	3 200
kontrola funkčnosti	hod	20	0	200	4 000

Stavební přípomoc - průrazy	kpl	1	0	1 100	1 100
Doprava, podružný materiál	kpl	1	800	1 550	2 350
Jednotný čas					
kabel CYKY 3Jx2,5 mm2	m	27	13	15	756
Krabice rozbočná pod omítku	ks	2	69	120	378
Lišta kabelová vkladací PVC bílá	m	35	29	30	2 065
Stavební přípomoc - průrazy	kpl	1	0	1 100	1 100
Doprava, podružný materiál	kpl	1	600	1 350	1 950
Datové zásuvky v kancelářích					
kabel CYKY 3Jx1,5 mm2	m	125	8	13	2 625
Doplnění rozvaděče	ks	1	2 150	500	2 650
kabel UTP	m	75	12	24	2 700
Trubka elektroinstalační Ø20mm,	m	10	5	18	230
Krabice univerzální pod omítku KU 68	ks	2	44	115	318
Zásuvka datová 2xRJ45 cat.5e	ks	2	85	100	370
Stavební přípomoc - průrazy	kpl	1	0	1 300	1 300
Doprava, podružný materiál	kpl	1	500	800	1 300
Rack vč. patch panelu - připojení, oživení, měření					
Rack vč. Patch panelu	hod	20		200	4 000
zásuvka, přívod	kpl	1		4 400	4 400
Měření, oživení	hod	20		200	4 000
aktivní rozbočovače	kpl	2		4 750	9 500
kabel UTP	m	70	12	24	2 520
Lišta kabelová vkladací PVC bílá	m	16	29	30	944
Ukončení kabelu konektorem cat.5e	ks	1	40	40	80
Doprava, podružný materiál	kpl	1	400	800	1 200
Ostatní					
kontrola odpojení kabelů v podlahách	hod	20		200	4 000
napojování obvodů v 2.NP a 1.NP	kpl	1		4 400	4 400
rozvaděč pro osvětlení v 2.NP vč. napojení do rozvaděče RK	kpl	1	9 500	4 800	14 300
dle požadavku napojení osvětlení chodeb na systém vypínání	hod	20		200	4 000
úpravy kabeláží ve třídách v 2.NP	hod	30		200	6 000
Stavební přípomoc - průrazy	kpl	1	0	1 400	1 400
CELKEM					281 665
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					
	%	2		2816,65	5 633
Cena celkem bez DPH					287 298

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova“

Číslo změnového listu: ZL-8

Název změny: **PROVEDENÍ NOVÉHO PVC NA ČTYŘECH
SCHODIŠŤOVÝCH RAMENECH PROVOZNIÍHO SCHODIŠTĚ KUCHYNĚ**

Stavba: Rekonstrukce dle SGD	Adresa objektu: ZŠ Brdičkova 1878/2, Praha 5 - Stodůlky
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o provedení výměny podlahové krytiny na čtyřech schodišťových ramenech provozního schodiště kuchyně a zakrytí prostoru pod schody.	
Zdůvodnění změny: V průběhu výstavby požádal provozovatel školy o sjednocení povrchů stávajících schodišťových ramen v prostoru kuchyně. Dále byl dodavatel požádán o zajištění nedostupného prostoru pod podestou tak, aby nemohlo dojít k pádu předmětů do tohoto prostoru. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.	

Dopady změny: - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 155 188,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 9.10.2017
Vyjádření objednatele:	

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ BRDÍČKOVA

V Praze dne:

Za autorského dozora stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Zakázka:

Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova - výměna PVC na schodišti, uzavření schod. prostoru

Popis	Cena
08: Výměna PVC na schodišti+uzavření schodišťového prostoru	155 188
003: Svislé konstrukce	1 657
004: Vodorovné konstrukce	14 040
006: Úpravy povrchu	9 340
009: Ostatní konstrukce a práce	548
099: Přesun hmot HSV	3 474
776: Podlahy povlakové	123 085
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	3 043
Celkem (bez DPH)	155 188

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
08: Výměna PVC na schodišti+uzavření schodišťového prostoru						
003: Svislé konstrukce						
1.	340238235	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 150 mm - podezdění schodiště	m2	2,0	828,63	155 188
						1 657
						1 657
004: Vodorovné konstrukce						
1.	411354264	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 100 mm plech pozinkovaný tl 0,8 mm	m2	5,25	580,00	3 045
2.	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,683	3 295,99	2 250
3.	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,048	26 606,45	1 285
4.	411941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm OK stropních konstrukcí plošných kromě betonářské oceli	m	7,0	431,40	3 020
5.	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,123	7 809,36	982
6.	13010916	Ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,123	22 800,00	2 804
7.	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	4,0	168,63	675
						14 040
006: Úpravy povrchu						
7.	611423135	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová osamělých trámů nebo stropů žebrových štuková - vyspravení boků schodiště	m2	9,3	413,77	3 848
68.	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	4,0	1 373,11	5 492
009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	4,0	137,05	548
						548
099: Přesun hmot HSV						
1.	997013153	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,476	848,18	404
2.	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,476	190,00	90
3.	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,664	9,10	61
4.	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,476	935,00	445
5.	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,476	389,19	185
6.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,544	645,80	2 289
						3 474
776: Podlahy povlakové						
1.	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně - podesty	m2	15,0	100,64	1 510
2.	776301812	Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů - stupnice, podstupnice	m	115,2	31,14	3 588
3.	776200830	Odstranění lepených podlahovin z hran schodišťových stupňů a podest	m	85,1	11,86	1 010
4.	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	43,8	124,58	5 457
5.	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah	m2	15,0	224,87	3 373
6.	776111211	Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm	m	57,6	75,78	4 365
7.	776111221	Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	57,6	50,52	2 910
8.	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	15,0	10,16	152
9.	776111321	Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm	m	57,6	2,76	159
10.	776111331	Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	57,6	2,37	136

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
11.	776121211	Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm	m	57,6	20,78	1 197
12.	776121221	Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	57,6	15,29	881
13.	776121321	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	15,0	60,09	901
14.	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou min pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	15,0	333,69	5 005
15.	776142112	Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou min pevnosti 35 MPa tl 5 mm	m	57,6	139,12	8 013
16.	776143112	Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou tl 5 mm	m	57,6	91,24	5 255
17.	776144111	Tmelení hran schodišťových - předpoklad 40%	m	23,04	130,59	3 009
18.	776222111	Lepení pásů z PVC	m2	15,0	248,65	3 730
19.	776321112	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky přes 300 mm	m	57,6	106,47	6 133
20.	776321212	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky přes 200 mm	m	57,6	141,06	8 125
21.	28411014	PVC záložové	m2	48,18	590,00	28 426
22.	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	85,1	98,67	8 397
23.	28342164	Hrana schodová z PVC	m	93,61	193,00	18 067
25.	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	20,0	53,65	1 073
26.	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	43,8	29,07	1 273
27.	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,77	1 221,44	941
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						3 043
1.	045002000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	2,0	1 521,49	3 043

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova“

Číslo změnového listu: ZL-9

Název změny: **PROVEDENÍ PŘESKLENÍ VYBRANÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ**

Stavba: Rekonstrukce dle SOD	Adresa objektu: ZŠ Brdičkova 1878/2, Praha 5 - Stodůlky
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o výměnu vybraných okenních výplní z provozních důvodů kuchyně a jídelny	
Zdůvodnění změny: V průběhu výstavby požádal provozovatel o výměnu některých stávajících výplní oken. Jedná se o okna, která mají aktuálně jiné provedení než ostatní výplně ve spojovaném prostoru a dále o okna v kancelářích kuchyně. U těchto oken je nutné stávající výplně vyjmout, zlikvidovat a nahradit výplní novou. Tato úprava zásadně zvyšuje estetickou a funkční kvalitu rekonstruovaného prostoru. Touto úpravou bude zajištěno přirozené osvětlení rekonstruovaných místností. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.	

Dopady změny: - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 50 278,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D Datum: 9.10.2017

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ BRDÍČKOVA

Vyjádření objednatele:

V Praze dne:

Za autorského dozora stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Cenová nabídka přesklení

ZŠ BRDIČKOVA

		šířka	výška	cena	cena celkem
JÍDELNA	1	1,088	0,422	1170	537 Kč
	1	1,088	0,972	1170	1 237 Kč
	1	1,158	0,422	1170	572 Kč
	1	1,158	0,972	1170	1 317 Kč
	1	1,192	0,422	1170	589 Kč
	1	1,192	0,972	1170	1 356 Kč
	1	1,135	0,422	1170	560 Kč
	1	1,135	0,972	1170	1 291 Kč
KANCELÁŘ 1	1	1,132	0,422	1170	559 Kč
	1	1,132	0,972	1170	1 287 Kč
	1	1,135	0,422	1170	560 Kč
	1	1,135	0,972	1170	1 291 Kč
	1	1,192	0,422	1170	589 Kč
	1	1,192	0,972	1170	1 356 Kč
KANCELÁŘ 2	1	1,032	0,422	1170	510 Kč
	1	1,032	0,972	1170	1 174 Kč
	1	0,968	0,422	1170	478 Kč
	1	0,968	0,972	1170	1 101 Kč
	1	0,97	0,422	1170	479 Kč
	1	0,97	0,972	1170	1 103 Kč
JÍDELNA 2	1	1,097	0,422	1170	542 Kč
	1	1,097	0,972	1170	1 248 Kč
	1	1,138	0,422	1170	562 Kč
	1	1,134	0,972	1170	1 290 Kč
BRAMBORÁRNA	1	0,982	0,422	1485	615 Kč
	1	0,982	0,972	1485	1 417 Kč
	1	1,125	0,422	1485	705 Kč
	1	1,125	0,972	1485	1 624 Kč
	1	0,842	0,422	1485	528 Kč
	1	0,842	0,972	1485	1 215 Kč
Přesklení	1			15350	15 350 Kč
Likvidace stávajících výplní	1			6250	6 250 Kč
celkem					49 292 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	2	%		492,89	986 Kč
Cena celkem bez DPH					50 278 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova“

Číslo změnového listu: ZL-10

Název změny: **VYROVNÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRŮVLAKŮ
V JÍDELNÁCH A KUCHYNĚ**

Stavba: Rekonstrukce dle SOD	Adresa objektu: ZŠ Brdičkova 1878/2, Praha 5 - Stodůlky
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o provedení vyrovnání železobetonových průvlaků v jídelnách pro zachování normových a estetických požadavků na povrchy	
Zdůvodnění změny: V průběhu výstavby bylo zjištěno, že stávající betonové průvlakky vykazují značnou křivost. Po provedení rastrů nového podhledu se křivost opticky zvýrazňuje a zásadně kazí výsledná dojem. Navrhujeme provést na stávajících železobetonových průvlacích vyrovnání a modelaci, kterou dojde k vyrovnání stávajících nerovností. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.	
Dopady změny: - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 247 659,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 9.10.2017
Vyjádření objednatele:	

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ BRDÍČKOVA

V Praze dne:

Za autorského dozora stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Zakázka:

Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova, Praha 5 - vyrovnaní ŽB průvlaků v jídelnách

Popis	Cena
09: Vyrovnaní ŽB průvlaků v jídelnách	247 659
006: Úpravy povrchu	233 672
099: Přesun hmot HSV	9 131
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	4 856
Celkem (bez DPH)	247 659

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
09: Vyrovnání ŽB průvlaků v jídelnách						
006: Úpravy povrchu						
1.	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	140,0	153,36	21 471
2.	611135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	280,0	39,51	11 062
3.	621215105.	Oprava podhledů průvlaků polystyrenovými deskami tloušťky do 40 mm - různá tloušťka- řezání požadované tloušťky a tvaru desky podle nerovnosti podkladu	m2	140,0	760,68	106 495
4.	28376090	Deska fasádní polystyrenová EPS	m3	4,62	2 780,00	12 844
5.	611131121	Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně	m2	140,0	48,00	6 720
6.	611423124	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová osamělých trámů nebo stropů žebrových hladká	m2	140,0	342,80	47 992
7.	611471413	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou tl do 3 mm	m2	140,0	193,48	27 088
8.		099: Přesun hmot HSV				9 131
9.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	14,139	645,80	9 131
10.	045002000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	2,0	2 428,03	4 856 4 856

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**STAVBA:** „Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova“

Číslo změnového listu: ZL-11

Název změny: **MONTÁŽ LEŠENÍ PRO OPLÁŠTĚNÍ STROJOVNY VZT**

Stavba: Rekonstrukce dle SOD	Adresa objektu: ZŠ Brdičkova 1878/2, Praha 5 - Stodůlky
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o montáž fasádního lešení pro opláštění strojovny VZT	
Zdůvodnění změny: Vzhledem k zajištění bezpečnosti na stavbě je nutná montáž fasádního lešení ve dvorní části rekonstruovaného prostoru. Bez tohoto doplnění je práce na strojovně VZT z hlediska bezpečnosti nerealizovatelná. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní veřejné zakázky.	

Dopady změny: - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 63 935,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 9.10.2017
Vyjádření objednatele:	

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ BRDÍČKOVA

V Praze dne:

Za autorského dozora stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technického dozora investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Zakázka:

Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova, Praha 5 - montáž lešení pro opláštění strojovny

Popis	Cena
15: Montáž lešení pro opláštění strojovny	70 737
094: Lešení	33 388
099: Přesun hmot HSV	35 961
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 387
Celkem (bez DPH)	70 737

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

15: Montáž lešení pro opláštění strojovny

094: Lešení						
1.	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	216,58	55,05	11 922
2.	941111222	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	12 994,8	1,10	14 294
3.	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	216,58	33,11	7 172
						33 388
						70 737

099: Přesun hmot HSV

3.	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	34,436	1 044,29	35 961
						35 961

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1.	045002000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	2,0	693,50	1 387
						1 387

Výkaz výměr

Název stavby:				Doba výstavby:				Objednatel:			
Druh stavby:				Začátek výstavby:				Projektant:			
Lokalita:				Konec výstavby:				Zhotovitel:			
CPV				Zpracováno dne:				Zpracoval:			
JKSO											

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova“

Číslo změnového listu: ZL-12

Název změny: **ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH EMAILOVÝCH NÁTĚRŮ
STĚN A PROVEDENÍ NOVÝCH OMYVATELNÝCH NÁTĚRŮ**

Stavba: Rekonstrukce dle SOD	Adresa objektu: ZŠ Brdičkova 1878/2, Praha 5 - Stodůlky
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o odstranění původních emailových nátěrů stěn v jídelnách a provedení nových omyvatelných nátěrů v požadovaných odstínech	
Zdůvodnění změny: V průběhu provádění rekonstrukce vznesl uživatel požadavek na sjednocení stávajících emailových nátěrů v prostoru jídelny s nově budovaným obkladem. Proto navrhujeme oškrábání stávající malby a její nahrazení novou povrchovou úpravou. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.	
Dopady změny: - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 141 257,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 9.10.2017
Vyjádření objednatele:	

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ BRDÍČKOVA

V Praze dne:

Za autorského dozora stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Zakázka:

Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova - odstranění omyvatelných nátěrů, nové nátěry

Popis	Cena
04: Odstranění omyvatelných nátěrů a nové nátěry	141 257
006: Úpravy povrchu	43 702
099: Přesun hmot HSV	3 299
783: Nátěry	68 351
784: Malby	23 136
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 770
Celkem (bez DPH)	141 257

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
04: Odstranění omyvatelných nátěrů a nové nátěry						141 257
006: Úpravy povrchu						43 702
1.	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	150,0	46,37	6 955
2.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vřačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	150,0	132,00	19 800
3.	63180020	Profil sklotextilní výztužný rohový l= 2600mm	kus	8,0	155,00	1 240
4.	612471411	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem	m2	150,0	104,71	15 706
099: Přesun hmot HSV						3 299
1.	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	1,34	848,18	1 136
2.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,34	190,00	255
3.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,76	9,10	171
4.	997013805	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,34	210,00	281
5.	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,34	389,19	522
6.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,448	645,80	935
783: Nátěry						68 351
1.	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	150,0	14,12	2 118
2.	783813131	Penetrační nátěr hladkých a štukových omítek	m2	150,0	57,07	8 561
3.	783821124	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů malný povrch 2x základní a 2x email	m2	150,0	384,48	57 672
784: Malby						23 136
1.	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,0	154,24	23 136
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						2 770
10.	045002000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	2,0	1 384,88	2 770

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova“

Číslo změnového listu: ZL-13

Název změny: **ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU**

Stavba: Rekonstrukce dle SOD	Adresa objektu: ZŠ Brdičkova 1878/2, Praha 5 - Stodulky
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o provedení přeložení kamerového systému mimo rekonstruované prostory	
Zdůvodnění změny: V průběhu výstavby bylo zjištěno, že v rekonstruovaném prostoru je umístěna část kamerového systému objektu. Vzhledem prováděným úpravám je nutné provést přeložení tohoto systému mimo dotčené prostory. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.	
Dopady změny: - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 93 722,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 9.10.2017
Vyjádření objednatele:	

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ BRDÍČKOVA

V Praze dne:

Za autorského dozora stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

AKCE: Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Břidčikova 1878/2, Praha 5 -
INVESTOR: Městská část Praha 13

OBSAH:

Výkaz výměr

Elektroinstalace - dodatky

Popis výkonu	Jedn	Množství	Jedn. cena	Celkem
Úprava kamerového systému				
Koaxiální kabel, impedance 75 Ohm, vnitřní vodič - čistá měď, ø vnitřního vodiče 1,0mm, pěnové dielektrikum, stínění CU fólií a opletením 48x0,12mm CU	m	440	14	6 160
Kabel CYKY 3x1,5mm ² - barevné značení J ©	m	250	11	2 750
Příchytka pro montáž trubky a průměru 25mm, UV odolná	ks	80	8	640
Koaxiální BNC F konektory a spojky - impedance 75 Ohm	kpl	2	996	1 992
Žlab MARS EKO 250/100 5106	m	30	229	6 870
Víko MARS EKO 100 5151	m	30	119	3 570
Elektroinstalační trubka ohebná, bezhalogenová, UV odolná, ø 50mm, mechanická odolnost 320N, teplotní rozsah -45 až 90°C	m	30	88	2 640
Příchytka pro montáž trubky ø 50 mm, UV odolná	ks	60	15	900
Průchozí krabice, UV stabilní, voděodolná (na propojení napájecích kabelů a připojení kamer)	ks	2	135	270
Venkovní barevná kamera s IR přísuvitem SAMSUNG SCO-2120-RP (SIR-4170-RP)	ks	1	15 402	15 402
Montáž - hodinová sazba montážního technika	hod	122	385	46 970
Nastavení a kontrola - hodinová sazba montážního technika CCTV	hod	3	1 020	3 060
Doprava materiálu a osob	m	60	11	660
celkem				91 884

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	2	919	1 838
----------------------------------	---	---	-----	-------

Cena celkem bez DPH				93 722
---------------------	--	--	--	--------

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**STAVBA:** „Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova“

Číslo změnového listu: ZL-13

Název změny: **ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU**

Stavba: Rekonstrukce dle SOD	Adresa objektu: ZŠ Brdičkova 1878/2, Praha 5 - Stodůlky
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o provedení přeložení kamerového systému mimo rekonstruované prostory	
Zdůvodnění změny: V průběhu výstavby bylo zjištěno, že v rekonstruovaném prostoru je umístěna část kamerového systému objektu. Vzhledem prováděným úpravám je nutné provést přeložení tohoto systému mimo dotčené prostory. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní veřejné zakázky.	

Dopady změny: - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 93 722,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 9.10.2017
Vyjádření objednatele:	

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ BRDÍČKOVA

V Praze dne:

Za autorského dozora stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

AKCE: Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova 1878/2, Praha 5 -
INVESTOR: Městská část Praha 13
OBSAH:

Elektroinstalace - dodatky				
Výkaz výměr	Jedn	Množství	Jedn. cena	Celkem
Popis výkonu				
Úprava kamerového systému				
Koaxiální kabel, impedance 75 Ohm, vnitřní vodič - čistá měď, ø vnitřního vodiče 1,0mm, pěnové dielektrikum, stínění CU fólií a opletením 48x0,12mm CU	m	440	14	6 160
Kabel CYKY 3x1,5mm2 - barevné značení J ©	m	250	11	2 750
Příchytka pro montáž trubky a průměru 25mm, UV odolná	ks	80	8	640
Koaxiální BNC F konektory a spojky - impedance 75 Ohm	kpl	2	996	1 992
Žlab MARS EKO 250/100 5106	m	30	229	6 870
Víko MARS EKO 100 5151	m	30	119	3 570
Elektroinstalační trubka ohebná, bezhalogenová, UV odolná, ø 50mm, mechanická odolnost 320N, teplotní rozsah -45 až 90°C	m	30	88	2 640
Příchytka pro montáž trubky ø 50 mm, UV odolná	ks	60	15	900
Průchozí krabice, UV stabilní, voděodolná (na propojení napájecích kabelů a připojení kamer)	ks	2	135	270
Venkovní barevná kamera s IR přísvitkem SAMSUNG SCO-2120-RP (SIR-4170-RP)	ks	1	15 402	15 402
Montáž - hodinová sazba montážního technika	hod	122	385	46 970
Nastavení a kontrola - hodinová sazba montážního technika CCTV	hod	3	1 020	3 060
Doprava materiálu a osob	m	60	11	660
celkem				91 884

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	2	919	1 838
----------------------------------	---	---	-----	-------

Cena celkem bez DPH				93 722
---------------------	--	--	--	--------

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova“

Číslo změnového listu: ZL-14

Název změny: **MONTÁŽ INSTALACE SYSTÉMU IRC – MĚŘENÍ A
REGULACE ÚT**

Stavba: Rekonstrukce dle SOD	Adresa objektu: ZŠ Brdičkova 1878/2, Praha 5 - Stodůlky
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o provedení instalace systému IRC – měření a regulace topného systému rekonstruovaných prostor	
Zdůvodnění změny: V objektu je proveden systém měření a regulace topného systému. Tato regulace musí být zachována i podkonstrukci prostoru. Proto navrhujeme připojení nových těles do stávajícího systému. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.	
Dopady změny: - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 179 821,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 9.10.2017

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ BRDÍČKOVA

Vyjádření objednatele:

V Praze dne:

Za autorského dozora stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

TEL: [REDACTED]

IČ: 452 44 618, DIČ: CZ45244618

Cenová nabídka na provedení instalace systému IRC ZŠ BRDIČKOVA

Demontáž stávajících nepoškozených komponent systému DIRC včetně termopohonů. Cena přitom obsahuje i příslušný podíl cestovních nákladů a cenu za provedení potřebných softwarových úprav souvisejících s dílčí demontáží.

43 ks 965 41 495,00 Kč

Úpravy, repase a software stávajících zónových jednotek, které budou instalovány zpět po rekonstrukci místností, pro podomítkovou instalaci kabeláže - jedná se o nové krabičky zónových jednotek a zapuštěné K68.

43 ks 890 38 270,00 Kč

Dodávka nových zónových jednotek s we snímači a řízenými hlavicemi, provedení podomítkové (podlahové) kabeláže pro zásadně rekonstruované části prostor.

16 ks 4955 79 280,00 Kč

Konečné úpravy software po úplném dokončení rekonstrukce. Strukturální definice nového systému DIRC, konečná podoba vizualizace.

1 kpl 17250 17 250,00 Kč

celkem

176 295,00 Kč

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

2 % 1762,95 3 525,90 Kč

Cena celkem bez DPH

179 821 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova“

Číslo změnového listu: ZL-15

Název změny: **AKUSTICKÝ PODHLED V PROSTORU JÍDELEN**

Stavba: Rekonstrukce dle SOD	Adresa objektu: ZŠ Brdičkova 1878/2, Praha 5 - Stodůlky
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o provedení akustického podhledu s útlumem alfa – 0,8	
Zdůvodnění změny: V průběhu výstavby vzešel od uživatele požadavek na zlepšení akustických vlastností prostoru jídelny. Proto navrhujeme použití akustického podhledu s útlumem $\alpha = 0,8$. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.	
Dopady změny: - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 97 403,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 9.10.2017
Vyjádření objednatele:	

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ BRDÍČKOVA

V Praze dne:

Za autorského dozora stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Zakázka:

Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova, Praha 5 - akustický podhled

Popis	Cena
14: Akustický podhled	97 403
763: Konstrukce montované	95 493
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 910
Celkem (bez DPH)	97 403

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
14: Akustický podhled						
763: Konstrukce montované						
1.	763431000	Akustický minerální kazetový podhled s útlumem 0,8	m2	370,0	250,00	92 500
3.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	1 847,50	2 993
						97 403
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
1.	045002000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	2,0	954,93	1 910
						1 910
