

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Dozdívky špalet vnitřních ostění dveří, překlady nade dveřmi

Část díla dotčená změnovým listem

Celý objekt

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Do stávajících otvorů osadit obložkové zárubně, bez nutnosti úprav ostění.

Nové řešení :

Do stávajících otvorů přizdít špalety pro osazení zárubní, nadpraží snížit na úroveň dle zárubně. Nadpraží vystužit vložením překladu z ocelového L profilu 50/50 mm.

Zdůvodnění změny :

Do otvorů bez provedené přizdívky a úpravy nadpraží by bylo možné osadit obložkovou zárubeň pouze na celou šířku ostění. Po zhodnocení situace na stavbě, požadoval objednatel přizdění špalet a úpravu nadpraží tak, aby obložky mohly být provedeny v tloušťce dle soupisu prací.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyla zpracována změna PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zapsáno ve stavebním deníku strana 30703 a 30706

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne


Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano


Přípočty k ceně díla bez DPH:	34 912,80 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	34 912,80 Kč
DPH:	7 331,69 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	42 244,49 Kč

ele:

na



**PŘÍPOČTY
ZMĚNOVÝ LIST č. 1**

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant: 

REKAPITULACE


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 615,00				
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		28 297,80			
776 Podlahy povlakové					
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					
998 Přesun hmot					
CELKEM OBJEKT	6 615,00	28 297,80	0,00	0,00	0,00


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			34 912,80	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:	
Josef Liebscher	
Za projektanta:	
	
Za objednatele:	
	



**PŘÍPOČTY
ZMĚNOVÝ LIST č. 1**

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
3 - Svislé a kompletní konstrukce							6 615,00
SOD	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav	t	0,10	33 000,00	3 300,00
IK	K	34923181r	Dozdívká z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	5,10	650,00	3 315,00
776 - Podlahy povlakové							28 297,80
URS	k	776511821	Odstranění povlakových podlah lepených s podložkou č. 103	m2	40,10	110,00	4 411,00
URS	K	776511822	Odstranění povlakových podlah lepených s podložkou 2x č. 105	m2	47,00	110,00	5 170,00
URS	K	776511820	Odstranění povlakových podlah lepených s podložkou 2x č. 106	m2	37,10	110,00	4 081,00
URS	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah - (č. 103,105,105)	m2	124,20	117,00	14 531,40
SOD	K	998775202r	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,00	104,40	104,40
Celkem změnový list 1							34 912,80

Za zhotovitele:


Josef Liebscher

Za projektanta:



Za objednatele:





Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 2

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Úprava průvlaků

Část díla dotčená změnovým listem

Místnosti číslo 109,114,202,220,302,320.

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Průvlaký ponechat, pouze vymalovat.

Nové řešení :

Průvlaký vyrovnat vložením, resp. přilepením a přikotvením fasádního polystyrenu, povrch vystužit lepidlem a tkaninou, přestukovat.

Zdůvodnění změny :

Výškové rozdíly průvlaků by bylo velmi složité povrchově upravit. Skutečný stav průvlaků byl zjištěn v průběhu prací, po odbourání příček.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyla zpracována změna PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zapsáno v zápise z KD - 2/4


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	12 564,06 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	12 564,06 Kč
DPH:	2 638,45 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	15 202,51 Kč



Tele:

a

**PŘÍPOČTY
ZMĚNOVÝ LIST č. 2**

REKAPITULACE

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant: 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 197,80				
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 325,00				
998 Přesun hmot	41,26				
CELKEM OBJEKT	12 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				


Za zhotovitele:


Josef Liebscher

Za projektanta:



Za objednatele:



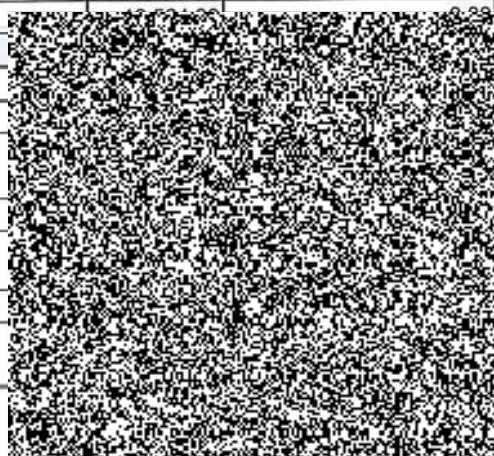

**PŘÍPOČTY
ZMĚNOVÝ LIST č. 2**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant: 

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							10 197,80
URS	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	34,00	135,00	4 590,00
URS	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	35,00	110,00	3 850,00
IK	K	622218011R	Montáž kontaktního zateplení polystyrenovými deskami celkové tloušťky izolace do 140 mm	m2	7,65	52,00	397,80
URS	M	283758710	deska fasádní polystyrénová EPS 70 - 1000 x 500 x 80 mm	m2	8,50	160,00	1 360,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							2 325,00
SOD	K	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	15,00	35,00	525,00
SOD	K	973031842	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových překladů, tl. do 100 mm	m	15,00	120,00	1 800,00
998 - Přesun hmot							41,26
SOD	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,42	98,00	41,26
Celkem změnový list 2							12 564,06


Za zhotovitele:

Josef Liebscher

Za projektanta:




Za objednatele:



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	3
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant:	
Předmět změnového listu	
Změna konstrukce podlah ve společných chodbách 2, 3 a 4 NP a na podestách	
Část díla dotčená změnovým listem	
Schodišťové podesty a mč. 201, 222, 223, 301, 322, 323, 401, 404	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Odstranit stávající konstrukci po dřevěný záklop a provést novou skladbu dle PD.	
Nové řešení :	
Navíc proti PD odstranit hrubou dřevěnou podlahu, podlahové polštáře, urovnat škvárový záklop, přebytečný materiál odstranit. Provést novou podlahu dle změny PD - výkres S26.	
Zdůvodnění změny :	
Po odstranění stávajících podlahových vrstev bylo zjištěno, že projektovaná skladba z důvodu návaznosti výšek podlah v jednotlivých místnostech nelze provést. Navíc hrubá dřevěná podlaha vykazovala výrazné nerovnosti.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Práce jsou prováděny dle změny PD - výkres S26.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Zapsáno v zápise z KD - 3/1.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ne	
Vliv na kvalitu: Ne.	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	145 253,57 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 78 075,14 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	67 178,43 Kč
DPH:	14 107,47 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	81 285,90 Kč
Za objednatele:	
	
	
	
	

ZMĚNOVÝ LIST č. 3**PŘÍPOČTY**

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.


REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	75 588,15				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 459,34				
997 Přesun sutě	13 620,00				
998 Přesun hmot	2 450,00				
762 Konstrukce tesařské		17 750,40			
713 Izolace tepelné		6 385,68			
CELKEM OBJEKT	121 117,49	24 136,08	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			145 253,57	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.


REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské		-78 075,14			
CELKEM OBJEKT	0,00	-78 075,14	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-78 075,14	0,00
CELKEM VRN				0,00


Za zhotovitele:

Josef Liebscher

Za projektanta:



Za objednatele:




PŘÍPOČTY ZMĚNOVÝ LIST č. 3

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kofenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s r.o.
Projektant: 


Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							75 588,15
SOD	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nárců na prostředí tl. do 60 mm tl. B 25 - FODESTY, CHODBA, MÍSTO PRO DLAŽEŽ	m3	4,6	3200	14 720,00
URS	K	631342112	D-M mazanina tl. do 80 mm z betonu lehčeného o objem hmot 1 000 kg/m3 - HASIT 410 LEICHT	m3	7,8	6830	53 274,00
URS	K	631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. do 80 mm - glazovacím hladítkem	m3	4,6	400	1 840,00
URS	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	143,25	22,2	3 180,15
SOD	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu K651 4mm, 150x150	t	0,117	22000	2 574,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							29 459,34
SOD	K	952901111	Vyčistění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - podlah	m2	130,2	45	5 859,00
URS	K	953312111	Dilatace obvodu stěn z pěnového profilu tl. 10 mm	m2	130,2	73,5	9 830,10
SOD	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	6,43	1900	12 312,00
URS	K	A1	Příplatek za prašné prostředí s použitím respirátoru	m2	130,2	11,2	1 458,24
997 - Přesun sutě							13 620,00
SOD	K	997013312	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	11	310	3 410,00
SOD	K	997013322	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně - 3312 - 14, dní	m	154	45	6 930,00
SOD	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4	220	880,00
SOD	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na svařovací nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km od 1 km - spočítá se	t	20	10	200,00
SOD	K	997013501	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	1,5	450	675,00
SOD	K	997013511	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,5	500	250,00
SOD	K	997013514	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkové)	t	0,5	1200	600,00
SOD	K	997013531	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného	t	1,5	450	675,00
998 - Přesun hmot							2 450,00
SOD	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodotěsná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	25	98	2 450,00
713 - Izolace tepelné							6 385,68
URS	K	R.A.00-713-151 002	pokládka separační fólie, mezi podkladem a novou vrstvou z lehkého betonu, přilepení spojů, přilepení k obvodové dilatační pásce.	m2	130,32	49	6 385,68
762 - Konstrukce tesařské							17 750,40
URS	K	713190812	Odstřanění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 100 mm - 2-4.NP	m2	65	85	5 525,00
URS	K	762522812	Demontáž podlahy prken nebo fólen tloušťky přes 32 mm	m2	130,32	69,7	9 083,30
URS	K	762511867	Demontáž kce podkladové z desek DTD tl. přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	26,67	56,1	1 496,19
URS	K	783001453	Vysátí po bourání betonu pod dlažbu	m2	76,6	9,24	707,78
					0,01	16 812,28	
URS	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	5,58	168,12	938,12
Celkem změnový list 3							145 253,57

Za zhotovitele:	
Josef Liebscher	
Za projektanta:	
	
Za objednatele:	
	

Jedná se použití shozu podle skutečnosti, který se používal pro postupný přesun odpadu, sutě. Pracovalo se postupně od 4.NP až do 2. NP, tak jak byly práce odsouhlasovány objednatelem. Provádělo se částečné odbourání betonových podlah, demontáž podlahových prken, vč. podtářů a ubírání vrstvy ze škvárových násypů z převážné části ploch podlaží. Vybouraný materiál ze všech podlaží se postupně přenášel přes celou délku patra k místu shozu, kde se likvidoval. Shoz bylo nutné postavit pouze na jednom místě, na jedné straně budovy, protože stávající prostorová situace na stavbě to nedovoluje jinak. Vybouraný materiál také nebylo možno skladovat na jedné hromadě v místnosti poblíž shozu, a pak to vše vyházet do shozu najednou, neboť nedovoluje skladba stávajících podlah a stropů většího bodového zatížení, hrozilo by zřícení podlahy do spodního patra. Proto se musela sut' odnášet a likvidovat pomocí shozu postupně, přes celou délku každého patra.

**ODPOČTY
ZMĚNOVÝ LIST č. 3**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s r.o.
Projektant: 

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
762 - Konstrukce tesařské							-78 075,14
SOD	K	762511272	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 12 mm broušených, tloušťky desky	m2	115	-290	-33 350,00
SOD	K	762511274	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 18 mm broušených, tloušťky desky	m2	101	-350	-35 350,00
SOD	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	216	-10	-2 160,00
SOD	M	611553510	podložka izolační z pěnového PE 3 mm	m2	237,6	-13	-3 088,80
URS	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	-739,49	-4 126,34
Celkem změnový list 3							-78 075,14

ok


ok


Za zhotovitele:

Josef Liebscher

Za projektanta:

Za objednatele:



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	4
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant:	
Předmět změnového listu	
Změna konstrukce podlah v 1. NP	
Část díla dotčená změnovým listem	
1. NP - m. č. 103 - 120	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Odstranit stávající konstrukce dle skladby v jednotlivých místnostech a provést nové skladbu dle PD.	
Nové řešení :	
Navíc proti PD odstranit dřevěný záklop, podlahové polštáře, urovnat škvárový záklop, přebytečný materiál odstranit. Odbourat podkladní beton v části, kde byly provedena dlažba. Provést novou podlahu dle změny PD detail S26.	
Zdůvodnění změny :	
Po odstranění stávajících podlahových vrstev bylo zjištěno, že projektovaná skladba z důvodu návaznosti výšek podlah v jednotlivých místnostech nelze provést. Navíc hrubá dřevěná podlaha vykazovala výrazné nerovnosti.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Práce jsou prováděny dle změny PD - výkres S26 PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Zapsáno v zápise z KD - 3/3.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ne	
Vliv na kvalitu: Ne	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	262 025,14 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 87 220,99 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	174 804,15 Kč
DPH:	36 708,87 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	211 513,02 Kč
	
ele:	
a	

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
 Projektant: 

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	93 460,59				
310 Podlahy povlakové		8 202,26			
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	38 220,61				
997 Přesun sutě	12 381,00				
998 Přesun hmot	2 450,00				
762 Konstrukce tesařské		107 310,68			
CELKEM OBJEKT	146 512,20	115 512,94	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			262 025,14	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
 Projektant: 


REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské		-87 220,99			
CELKEM OBJEKT	0,00	-87 220,99	0,00	0,00	0,00


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-87 220,99	0,00
CELKEM VRN				0,00




ZMĚNOVÝ LIST č. 4

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s r.o.
 Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							93 460,59
SOD	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. do 60 mm tř. B 25 - 1.NP	m3	4,600	3 200,00	14 720,00
SOD	K	631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. do 80 mm	m3	4,600	400,00	1 840,00
URS	K	631342112	Mazanina tl. do 80 mm z betonu lehčeného o objem hmot 1 000 kg/m3	m3	9,900	6 830,00	67 617,00
SOD	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 4mm, 150x150	t	0,252	22 000,00	5 544,00
URS	K	619991001	Zaškrtytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	168,450	22,20	3 739,59
310 Podlahy povlakové							8 202,26
SOD	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm - 2-4.NP	m2	68,100	120,00	8 172,00
SOD	K	998776202a	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	Kč	1,000	30,26	30,26
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							38 220,61
SOD	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	8,580	36,00	308,88
SOD	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - podlah	m2	256,150	45,00	11 526,75
URS	K	953312111	Dilatace obvodu stěn z pěnového profilu tl 10 mm	m2	168,450	75,50	12 717,98
SOD	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	5,690	1 900,00	10 811,00
URS	K	A1	Příplatek za prašné prostředí s použitím respirátoru	m2	255,000	11,20	2 856,00
997 Přesun sutě							12 381,00
SOD	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,200	220,00	3 784,00
SOD	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - KOŠTÁLOV	t	17,200	10,00	172,00
SOD	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,900	450,00	1 305,00
SOD	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,500	1 200,00	600,00
SOD	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,200	500,00	3 100,00
SOD	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	7,600	450,00	3 420,00
998 Přesun hmot							2 450,00
SOD	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	25,000	98,00	2 450,00
762 Konstrukce tesařské							107 310,68
URS	K	713190812	Odstanění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 100 mm - 1.NP	m2	55,000	85,00	4 675,00
URS	K	762511171	Podlahové kce podkladové dvourstvé z desek CETRIS tl 2x10 mm na sraz šroubovaných - soc. zařízení 2-4.NP	m2	136,200	589,00	80 221,80
URS	K	762522812	Demontáž podlah z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	212,060	69,70	14 780,58
URS	K	783901453	Vysátí po bourání betonu pod dlažbu	m2	212,320	9,24	1 961,84
URS	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	5,580	1 016,39	5 671,46
Celkem změnový list							262 025,14



ZMĚNOVÝ LIST č. 4

OSPÓČTY

Navba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukci objektu

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MI	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
762 Konstrukce tesařské							-85 567,29
SOD	K	762511272	Podlahové konstrukce podkladové z dřevotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 12 mm broušených, tloušťky desky	m2	55,900	-290,00	-16 211,00
SOD	K	762511276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 22 mm broušených, tloušťky desky	m2	157,400	-380,00	-59 812,00
SOD	K	775591191.1	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	213,300	-10,00	-2 133,00
SOD	M	611553510.1	podložka izolační z pěnového PE 3 mm	m2	234,630	-13,00	-3 050,19
			přesun hmot	%	5,580	-78 156,00	-4 361,10
775 Podlahy skládané							-1 653,70
SOD	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící - 2-4.NP	m2	68,100	-10,00	-681,00
SOD	M	611553510	podložka izolační z pěnového PE 3 mm - 2-4.NP	m2	68,100	-13,00	-885,30
			přesun hmot	%	5,580	-15,66	-87,40

Celkem změnový list

-87 220,99

