

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY


1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“

Číslo změnového listu: ZL-1

Název změny: **PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - NAVÝŠENÍ BOURÁNÍ
BETONOVÉHO PODKLADU**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praha Stodůlky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o navýšení množství bouraného betonu při odstranění stávajících zemních konstrukcí.	
Zdůvodnění změny: PD počítala s menší mocností podkladních betonových vrstev stávajících zpevněných ploch. Po zahájení prací bylo zjištěno, že oproti předpokladu dosahuje skutečná mocnost podkladní betonové konstrukce až 60 cm. Vzhledem k tomuto faktu je nutné navýšení výměr bourání, likvidace a opětovné doplnění podkladního materiálu. Fotodokumentace skutečného stavu	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

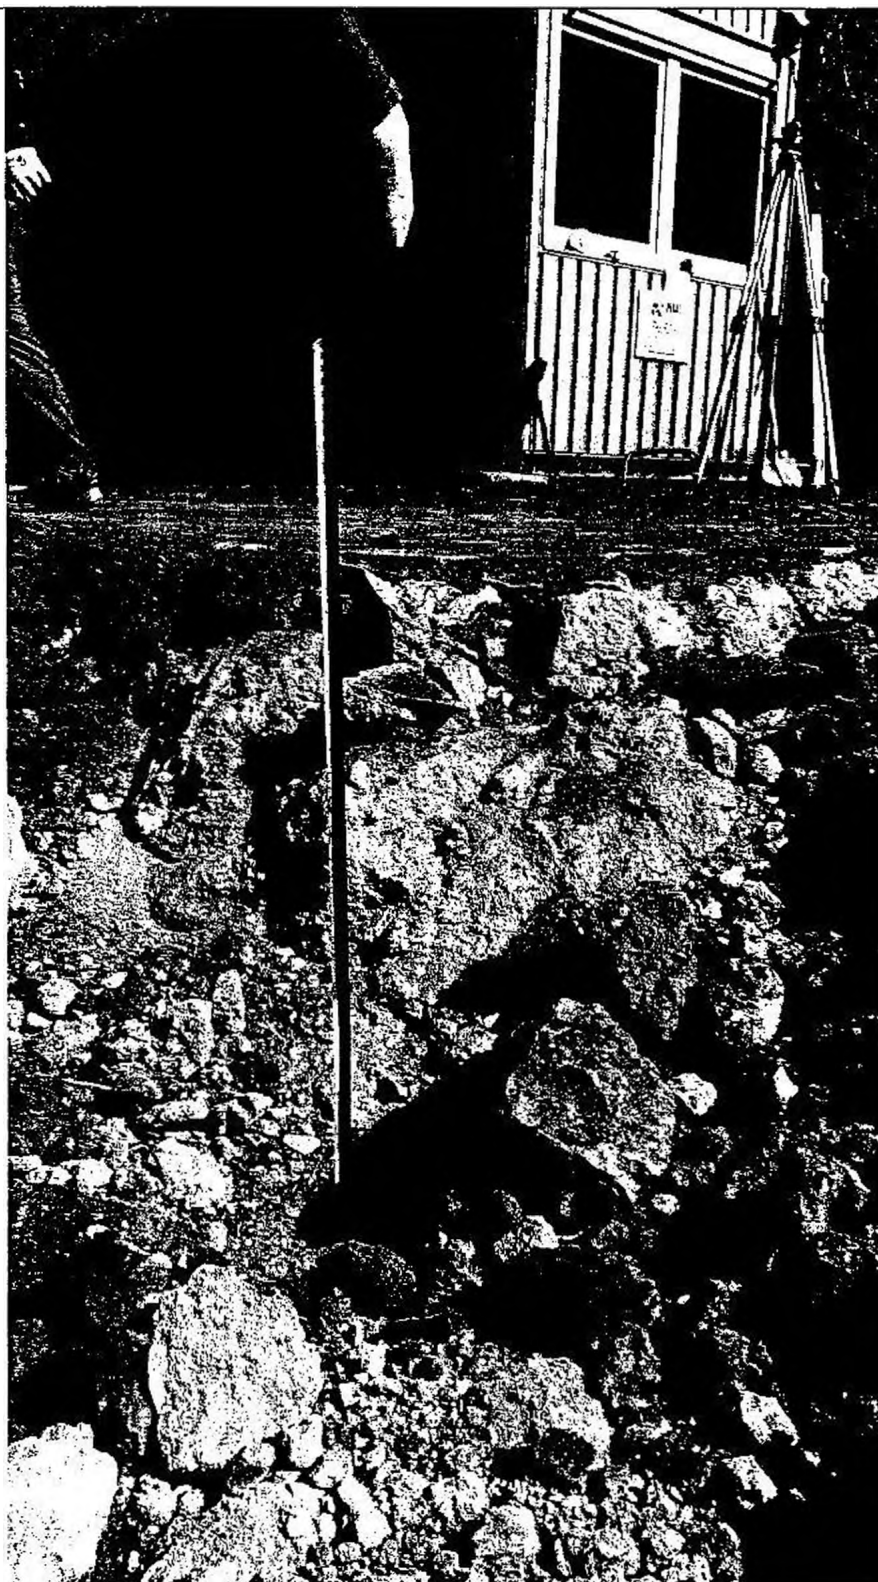

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 512 440,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 7.9.2018
Vyjádření objednatele:	
V Praze dne:10.9.2018	
Za autorský dozor stavby: Jméno: Ing. Evžen Krouský	podpis:
Za technický dozor investora: Jméno: Ing. Jan Bříza	podpis:
Za objednatele: Jméno: Mgr. Evžen Mošovský	podpis:
Za zhotovitele: Jméno: Marek Nesvačil	podpis:

Zakázka:

**ZŠ Kuncova - Příloha ke změnovému listu - změna výšky stávajícího
podkladního betonu**

Popis	Cena
SO 02a: Příprava území - navýšení bourání betonového podkladu	512 440
001: Zemní práce	217 810
005: Komunikace	112 789
099: Přesun hmot HSV	27 945
997: Přesun sutě	129 493
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	24 402
Celkem (bez DPH)	512 440

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 02a: Příprava území - navýšení bourání betonového podkladu						512 440
001: Zemní práce						217 810
1.	11310723R	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 200 mm	m2	543,0	143,03	77 665
2.	120901121	Bourání základového prahu z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách	m3	24,55	5 708,54	140 145
005: Komunikace						112 789
4.	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm - doplnění zpevnění po vybouraném betonu	m2	543,0	207,72	112 789
099: Přesun hmot HSV						27 945
6.	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	385,265	72,54	27 945
997: Přesun sutě						129 493
7.	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	374,258	25,00	9 356
8.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	5 239,612	6,00	31 438
9.	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	374,258	90,00	33 683
10.	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	374,258	147,00	55 016
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						24 402
11.	030001000	Zařízení slaveniště	%	2,0	488 037,85	9 761
12.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	1,0	488 037,85	4 880
13.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	2,0	488 037,85	9 761


VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“

Číslo změnového listu: ZL-2

Název změny: **PŘÍSTAVBA - PROHLoubENÍ ZÁKLADOVÝCH PATEK F2 A F3**

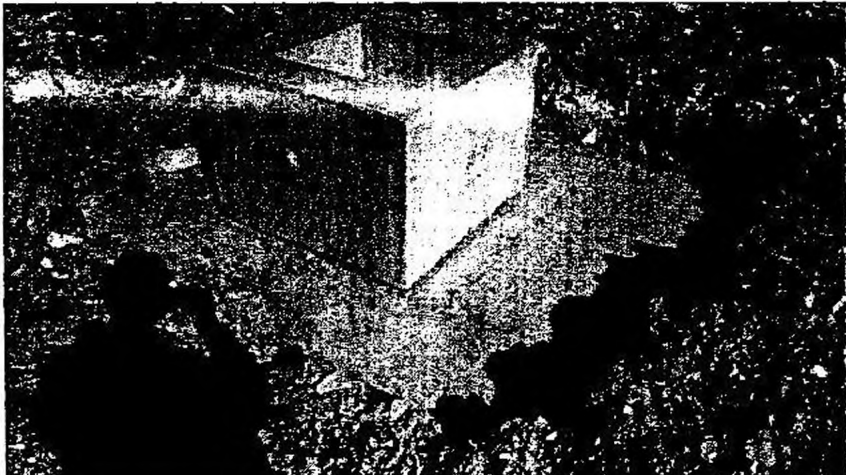Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praha Stodůlky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Po zahájení práce bylo zjištěno, že v některých místech je nutné prohloubení a zvětšení základových patek a to vzhledem k malé únosnosti zeminy.	
Zdůvodnění změny: Při provádění základových patek bylo zjištěno, že v pozici F3 a F4 není v projektované hloubce dostatečně únosná zemina. Na základě vyjádření geologa ze dne 9.4.2018 je nutné prohloubení těchto patek na dostatečně únosnou zeminu. Dle tohoto vyjádření je též nutné provést betonáž spodního dílu patky v celé ploše výkopu. Fotodokumentace skutečného stavu	
	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.

Dopady změny:

- na časový plán výstavby: **NE**
- na cenu stavby: **ANO, navýšení ceny o 111 757,- Kč bez DPH**
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: **NE**

Doložené přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Předkládá: **M. Nesvačil, Z&D**

Datum: 7.9.2018

Vyjádření objednatele:

V Praze dne:10.9.2018

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Zakázka:

ZŠ Kuncova - Příloha ke změnovému listu - Prohloubení základových patek F.3, F4

Popis	Cena
SO 01: Přístavba - prohloubení základ. patek F3, F4	111 757
000: Poznámky	
001: Zemní práce	29 374
002: Základy	70 745
099: Přesun hmot HSV	6 316
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 322
Celkem (bez DPH)	111 757

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: Přístavba - prohloubení základ. patek F3, F4						111 757
000: Poznámky						-
1.	000	Změny dle zápisu geologa - bod 2		-	-	-
001: Zemní práce						29 374
1.	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,8	670,00	13 266
2.	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	9,4	105,00	987
3.	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	19,8	124,30	2 461
4.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,8	150,00	2 970
5.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	158,4	14,00	2 218
6.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	19,8	25,00	495
7.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,8	13,00	257
8.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	42,0	160,00	6 720
002: Základy						70 745
9.	275311128	Základové patky a bloky z betonu prostého C 30/37	m3	19,8	3 572,96	70 745
099: Přesun hmot HSV						6 316
10.	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	43,56	145,00	6 316
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						5 322
11.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	106 434,88	2 129
12.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	1,0	106 434,88	1 064
13.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	2,0	106 434,88	2 129

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“

Číslo změnového listu: ZL-3

Název změny: **PŘÍSTAVBA - NAVÝŠENÍ VÝKOPU A BETONÁŽE
ZÁKLADOVÝCH PATEK**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praha Stodůlky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Po zahájení práce bylo zjištěno, že je nutné zajištění základových patek proti zatékání a dále zajištění stabilizace výkopů.	
Zdůvodnění změny: Při provádění základových patek bylo zjištěno, že je nutné zajištění základových patek proti zatékání a dále zajištění stabilizace výkopů. Na základě vyjádření geologa ze dne 9.4.2018 je nutné provedení podkladního betonu a spodního dílu patky v celé šíři výkopu. Tato úprava je nutná vzhledem ke stabilizaci výkopů a zajištění základové spáry proti zatékání. Fotodokumentace skutečného stavu	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA



Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní veřejné zakázky.

Dopady změny:

- na časový plán výstavby: **NE**
- na cenu stavby: **ANO, navýšení ceny o 596 917,- Kč bez DPH**
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: **NE**

Doložené přílohy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Předkládá: M. Nesvačil, Z&D

Datum: 7.9.2018

Vyjádření objednatele:

V Praze dne:10.9.2018

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:



VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Zakázka:

**ZŠ Kuncova - Příloha ke změnovému listu - navýšení ve výkopu a betonáži
základových patek**

Popis	Cena
SO 01.2: Přístavba - navýšení výkopu a betonáže základových patek -	596 917
000: Poznámky	
001: Zemní práce	107 399
002: Základy	423 324
099: Přesun hmot HSV	37 770
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	28 425
Celkem (bez DPH)	596 917

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01.2: Přístavba - navýšení výkopu a betonáže základových patek -						596 917
000: Poznámky						-
1.	000	Změna dle zápisu geologa - bod 3		-	-	-
001: Zemní práce						107 399
1.	132201201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - rozdílová položka - navýšení	m3	118,48	260,00	30 805
2.	132201209	Příplatek za teplost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	59,24	19,00	1 126
3.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	118,48	65,00	7 701
4.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	118,48	150,00	17 772
5.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 657,6	14,00	23 206
6.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	118,48	25,00	2 962
7.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	118,48	13,00	1 540
8.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	139,29	160,00	22 286
002: Základy						423 324
9.	275311128	Základové patky a bloky z betonu prostého C 30/37	m3	118,48	3 572,96	423 324
099: Přesun hmot HSV						37 770
10.	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	260,48	145,00	37 770
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						28 425
11.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	568 492,37	11 370
12.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	1,0	568 492,37	5 685
13.	071002000	Provoz investora, lřetích osob	%	2,0	568 492,37	11 370

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“

Číslo změnového listu: ZL-4

Název změny: **PŘÍSTAVBA - STRAVOVACÍ SYSTÉM - ZMĚNY**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praha Stodůlky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o úpravu stravovacího systému tak, aby byl kompatibilní k systému ISIC a strava.cz	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele a odsouhlasení investora navrhujeme úpravu navržených HW a SW částí tak, aby tento systém byl kompatibilní se systémem ISIC a strava.cz. Tato úprava umožňuje použití jedné karty jak pro systém stravování, tak pro další funkce.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 339 999,- Kč bez DPH, snížení ceny o 176 720,- Kč bez DPH, navýšení celkem 163 279,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 7.9.2018
Vyjádření objednatele:	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

V Praze dne:10.9.2018


Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis: 

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis: 


Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis: 

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis: 

Zakázka:

ZŠ Kuncova - Příloha ke změnovému listu - stravovací systém

Popis	Cena
SO 01.5: Přístavba - stravovací systém - změny	163 279
742.5: Stravovací systém-rozdílové položky	155 504
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	7 775
Celkem (bez DPH)	163 279

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01.5: Přístavba - stravovací systém - změny						163 279
742.5: Stravovací systém-rozdílové položky						155 504
1.	742500001	SW vybavení - SW vybavení pro stravovací systém, strava.cz	kpl	1,0	96 060,00	96 060
2.	742500002	HW vybavení - identifikátor Milfare USB (přidělování čipů v systému)	kpl	1,0	8 004,00	8 004
3.	742500003	HW vybavení - výdejní terminál NERO Milfare Ethernet (tónová i hlasová signalizace, dotykový display	kus	2,0	47 035,00	94 070
4.	38510010R	výdejní terminál EM 485 gLCD	kus	- 3,0	34 500,00	- 103 500
5.	742500004	HW vybavení - objednávací box BIANCO Milfare Ethernet	kus	1,0	89 562,00	89 562
6.	38510020R	Objednávací box GRANDE	kus	- 1,0	69 500,00	- 69 500
7.	742500005	HW vybavení - nap.zdr. zál- AWZ 333 12V/3A/7.2Ah	kus	1,0	3 818,00	3 818
8.	38510040R	nap.zdr. zál. AWZ 101 12V/1A/1.2Ah	kus	- 2,0	1 860,00	- 3 720
16.	742500009	Výpočetní technika - počítač pro komplexní dodávka	kus	2,0	20 355,00	40 710
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						7 775
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	155 504,00	3 110
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	155 504,00	1 555
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	155 504,00	3 110

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“

Číslo změnového listu: ZL-5

Název změny: **PŘÍSTAVBA - OPLÁŠTĚNÍ REVIZNÍHO ŽEBŘÍKU
TAHOKOVEM**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praha Stodůlky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Opláštění revizního žebříku	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele a odsouhlasení investora na zajištění požárního žebříku proti vniknutí nepovolených osob, navrhujeme žebřík oplástit konstrukcí z tahokovu. Toto provedení nezhoršuje estetickou stránku objektu a zároveň plní požadovanou funkci.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 27 154,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 7.9.2018
Vyjádření objednatele:	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

V Praze dne:10.9.2018

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Zakázka:

ZŠ Kuncova - Příloha ke změnovému listu - opláštění revizního žebříku tahokovem

Popis	Cena
SO 01.7: Opláštění revizního žebříku tahokovem	27 154
767: Konstrukce zámečnické	25 861
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 293
Celkem (bez DPH)	27 154

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01.7: Opláštění revizního žebříku tahokovem						27 154
767: Konstrukce zámečnické						25 861
1.	76741500R	Montáž vnějšího obkladu pláště ochranného koše žebříku budov v do 6 m - včetně pomocných, kotevnic prvků pro obklad stěn a úprav dílců Tahokovu pro osazení na OK	m2	10,8	987,00	10 660
2.	19112340	Tahokov	m2	11,88	795,00	9 445
3.	767331150	Bezpečnostní - uzavíratelný poklop z tahokovu 900 x 900 mm	kus	1,0	5 540,00	5 540
5.	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,1	197,15	217
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						1 293
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	25 861,07	517
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	25 861,07	259
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	25 861,07	517

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“

Číslo změnového listu: ZL-6

Název změny: **PŘÍSTAVBA - ZVÝŠENÁ VÝMĚRA PLECHOVÉHO OPLÁŠTĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE VZT POTRUBÍ**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praha Stodůlky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Zvýšená výměra plechového opláštění VZT potrubí na střeše objektu	
Zdůvodnění změny: Z důvodu zamezení tepelných ztrát v zimním období navrhujeme pro ochranu VZT potrubí použít do venkovního prostoru tepelnou izolaci tl. 100 mm. Touto úpravou dojde ke zvýšení výměry plechového opláštění VZT potrubí Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 36 015,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 7.9.2018

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

Vyjádření objednatele:

V Praze dne:10.9.2018

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Zakázka:

**ZŠ Kuncova - Příloha ke změnovému listu - zvýšená výměra
plechového opláštění tepelné izolace VZT potrubí**

Popis	Cena
SO 01.6: zvýšená výměra plechového opláštění tepelné izolace VZT potrubí	36 015
751.1: Zařízení č.1 - Větrání jídelny - přípočet	34 300
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 715
Celkem (bez DPH)	36 015

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01.6: zvýšená výměra plechového opláštění tepelné izolace VZT potrubí						36 015
751.1: Zařízení č.1 - Větrání jídelny - přípočet						34 300
1.	751-1.13bR	Mříž a dodávka tepelné izolace s oplechováním na střeše	m2	35.0	980,00	34 300
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						1 715
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	34 300,00	686
2.	071002000	Provoz investora, třelích osob	%	1,0	34 300,00	343
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	34 300,00	686

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“

Číslo změnového listu: ZL-7

Název změny: **PŘÍSTAVBA - OBKLAD SLOPŮ V JÍDELNĚ**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praha Stodůlky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Keramický obklad sloupů v jídelně	
Zdůvodnění změny: Vzhledem k zajištění čistoty a udržitelnost požaduje investor provedení keramického obkladu na vnitřních sloupech v jídelně. Tato úprava nahrazuje původní výmalbu, která je z hlediska zajištění čistoty problémovější.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: , navýšení ceny o 37 563,- Kč bez DPH, snížení ceny o 2 662,- Kč bez DPH, navýšení celkem 34 901,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 7.9.2018
Vyjádření objednatele:	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

V Praze dne:10.9.2018

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Zakázka:

**ZŠ Kuncova - Příloha ke změnovému listu - obklad sloupů v jídelně a
obklad do výšky 3m v místnosti č. P.106**

Popis	Cena
ZŠ Kuncova - Příloha ke změnovému listu - obklad sloupů v jídelně a obklad do výšky 3m v místnosti č. P.106	34 901
781: Dokončovací práce - obklady	33 239
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 662
Celkem (bez DPH)	34 901

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZŠ Kuncova - Příloha ke změnovému listu - obklad sloupů v jídelně a obklad do výšky 3m v místnosti č. P.106						34 901
781: Dokončovací práce - obklady						33 239
1.	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	45,9	365,00	16 754
2.	597813602R	obkládačky keramické matné barevné světlý odstín 20 x 20 x 0,7	m2	50,49	270,00	13 632
3.	781479198R	Příplatek za spárování hmotou se zvýšenou odolností proti bakteriím a plísním - plošně	m2	45,9	25,00	1 148
4.	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	84,0	52,00	4 368
5.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	- 45,9	16,00	- 734
6.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	- 45,9	42,00	- 1 928
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						1 662
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	33 239,10	665
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	33 239,10	332
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	33 239,10	665

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“


Číslo změnového listu: ZL-8

Název změny: **ELEKTROINSTALACE - DELŠÍ TRASA PŘÍVODNÍHO KABELU V KOLEKTORU**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praha Stodůlky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Prodloužení přívodního kabelu elektro	
Zdůvodnění změny: Při provádění přívodního elektrického kabelu bylo zjištěno, že v některých částech je nutná úprava trasy. Tuto úpravu je nutné provést zejména vzhledem proveditelnosti uložení tohoto kabelu. Tato úprava má za následek prodloužení tohoto přívodního kabelu. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 18 018,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 7.9.2018
Vyjádření objednatele:	
V Praze dne:10.9.2018	
Za autorský dozor stavby: Jméno: Ing. Evžen Krouský	podpis:
Za technický dozor investora: Jméno: Ing. Jan Bříza	podpis:
Za objednatele: Jméno: Mgr. Evžen Mošovský	podpis:
Za zhotovitele: Jméno: Marek Nesvačil	podpis:



Zakázka:

ZŠ Kuncova - Příloha ke změnovému listu - Elektroinstalace kuchyň- delší přívod

Popis	Cena
SO 01.43: Elektroinstalace - delší trasa přívodního kabelu v kolektoru	18 018
740: Silnoproud	17 160
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	858
Celkem (bez DPH)	18 018

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01.43: Elektroinstalace - delší trasa přívodního kabelu v kolektoru						18 018
740: Silnoproud						17 160
1.	74100030	AYKY 3x240+120	m	52,0	295,00	15 340
2.	74100031	Montáž	m	52,0	35,00	1 820
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						858
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	17 160,00	343
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	17 160,00	172
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	17 160,00	343

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“

Číslo změnového listu: ZL-9

Název změny: **ELEKTROINSTALACE - JINÉ PŘÍVODY PRO VZT DLE POŽADAVKU MaR**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praha Stodůlky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Změna přírodních kabelů pro zařízení MaR	
Zdůvodnění změny: Z důvodu upřesnění technologie VZT se změnil požadavek MaR na připojení elektro. Původní připojení bylo do strojovny VZT, které bylo změněno dle požadavku k jednotkám VZT na střeše objektu. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: , navýšení ceny o 24 981,- Kč bez DPH, snížení ceny o 8 260,- Kč bez DPH, navýšení celkem 16 721,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 7.9.2018
Vyjádření objednatele:	
V Praze dne: 10.9.2018	
Za autorský dozor stavby: Jméno: Ing. Evžen Krouský	podpis:
Za technický dozor investora: Jméno: Ing. Jan Bříza	podpis:
Za objednatele: Jméno: Mgr. Evžen Mošovský	podpis:
Za zhotovitele: Jméno: Marek Nesvačil	podpis:

Zakázka:

ZS Kuncova - Příloha ke změnovému listu - Elektroinstalace kuchyň-jiné
přívody pro VZT

Popis	Cena
SO 01.42: Elektroinstalace - jiné přívody pro VZT dle požadavku MaR	16 721
740: Silnoproud	15 925
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	796
Celkem (bez DPH)	16 721

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01.42: Elektroinstalace - jiné přívody pro VZT dle požadavku MaR						16 721
740: Silnoproud						15 925
1.	74100010	CYKY 5x25	m	- 35,0	236,00	- 8 260
2.	74100011	CYKY 5x16	m	35,0	115,00	4 025
3.	74100012	CYKY 5x25	m	70,0	236,00	16 520
4.	74100013	trubka kopoflex 50	m	40,0	41,00	1 640
5.	74100014	Montáž	kpl	1,0	2 000,00	2 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						796
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	15 925,00	319
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	15 925,00	159
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	15 925,00	319

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“

Číslo změnového listu: ZL-10

Název změny: **ELEKTROINSTALACE - HROMOSVOD - V MÍSTĚ
SLUNOLAMU SKRYTÉ SVODY**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praha Stodůlky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Úprava hromosvodu v místě slunolamu.	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora na zajištění estetického křížení hromosvodu a slunolamu navrhuje provést hromosvod (v místě křížení) jako zapuštěný. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: , navýšení ceny o 6 746,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 7.9.2018
Vyjádření objednatele:	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

V Praze dne:10.9.2018

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Zakázka:

**ZŠ Kuncova - Příloha ke změnovému listu - Elektroinstalace kuchyň-
Hromosvod-doplnění svodu**

Popis	Cena
SO 01.45: Elektroinstalace - hromosvod- v místě slunolamu skryté svody	6 746
740: Silnoproud	6 425
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	321
Celkem (bez DPH)	6 746

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01.45: Elektroinstalace - hromosvod- v místě slunolamu skryté svody						6 746
740: Silnoproud						6 425
2.	74100052	skryté svody (vysekání, ochranná trubka)	kpl	1,0	6 425,00	6 425
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						321
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	6 425,00	129
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	6 425,00	64
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	6 425,00	129

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“

Číslo změnového listu: ZL-11

Název změny: **ELEKTROINSTALACE - GUMOVÉ KABELY MÍSTO
CYKY - K PŘÍSTROJŮM MUSÍ BÝT POHYBLIVÉ (LANĚNÉ)**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praha Stodůlky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: záměna typu kabelů k zařízení gastro spotřebičům	
Zdůvodnění změny: Z důvodu bezpečnosti a hygienických bylo připojení spotřebičů změněno z CYKY vodičů na laněné kabely. Změněné provedení zlepší manipulaci se zařízeními při jejich údržbě a při úklidu podlah ve varně. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní veřejné zakázky.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: , ANO, navýšení ceny o 76 364,- Kč bez DPH, snížení ceny o 32 968,- Kč bez DPH, navýšení celkem 43 396,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

Předkládá: M. Nesvačil, Z&D

Datum: 7.9.2018

Vyjádření objednatele:

V Praze dne: 10.9.2018

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Zakázka:

ZŠ Kuncova - Příloha ke změnovému listu - Elektroinstalace kuchyň - gumové kabely

Popis	Cena
SO 01.41: Elektroinstalace - gumové kabely místo CYKY - k přístrojů musí být pohyblivé (laněné)	43 396
740: Silnoproud	41 331
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 065
Celkem (bez DPH)	43 396

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01.41: Elektroinstalace - gumové kabely místo CYKY - k přístrojům musí být pohyblivé (laněné)						43 396
740: Silnoproud						41 331
1.	74100001	CGSG 5x35	m	18,0	625,00	11 250
2.	74100002	CGSG 5x25	m	36,0	398,00	14 328
3.	74100003	CGSG 5x16	m	33,0	289,00	9 537
4.	74100004	CGSG 5x10	m	113,0	208,00	23 504
5.	74100005	CGSG 5x6	m	28,0	147,00	4 116
6.	74100006	CGSG 5x2,5	m	30,0	78,00	2 340
7.	74100007	CGSG x1,5	m	52,0	62,00	3 224
8.	74100008	CYKY 5x35	m	- 18,0	365,00	- 6 570
9.	74100009	CYKY 5x25	m	- 36,0	236,00	- 8 496
10.	74100010	CYKY 5x16	m	- 33,0	115,00	- 3 795
11.	74100011	CYKY 5x10	m	- 113,0	89,00	- 10 057
12.	74100012	CYKY5x6	m	- 28,0	78,00	- 2 184
13.	74100013	CYKY 5x2,5	m	- 30,0	31,00	- 930
14.	74100014	CYKY3x1,5	m	- 52,0	18,00	- 936
15.	74100008	Montáž	kpl	1,0	6 000,00	6 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						2 065
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	413,00	826
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	413,00	413
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	413,00	826

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“

Číslo změnového listu: ZL-12

Název změny: **ELEKTROINSTALACE - SVÍTIDLA ZÁŘIVKOVÁ -
DOPLNĚNÍ RÁMEČKU V NÁSTŘIKU RAL**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praha Stodůlky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Doplnění barevných rámečků na zářivková svítidla	
Zdůvodnění změny: Vzhledem k požadavku investora na oživení interiéru jídelny, navrhujeme doplnění barevných rámečků na 52ks čtvercových světél. Jedná se o plastické a barevné oživení pohledu.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: , ANO, navýšení ceny o 69689,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 7.9.2018
Vyjádření objednatele:	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

V Praze dne:10.9.2018

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Zakázka:

ZŠ Kuncova - Příloha ke změnovému listu - Elektroinstalace kuchyň- svítidla

Popis	Cena
SO 01.46: Elektroinstalace - svítidla zářivková - doplnění rámečku v nástřiku RAL	69 689
740: Elektroinstalace	66 370
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	3 319
Celkem (bez DPH)	69 689

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01.46: Elektroinstalace - svítidla zářivková - doplnění rámečku v nástřiku RAL						69 689
740: Elektroinstalace						66 370
1.	74100060	Rámeček 600x600 pro LED osvětlení	kpl	52,0	620,00	32 240
2.	74100061	nástřik rámečku syntetickou barvou	kpl	52,0	495,00	25 740
3.	74100062	dodávka a montáž podkladové konstrukce pro ukotvení svítidel	kpl	52,0	95,00	4 940
4.	74100063	podružný materiál	kpl	1,0	3 450,00	3 450
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						3 319
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	66 370,00	1 327
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	66 370,00	664
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	66 370,00	1 327

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“

Číslo změnového listu: ZL-13

Název změny: **ELEKTROINSTALACE - DOPLNĚNÍ VIDEOTELEFONŮ**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praha Stodůlky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Doplnění videotelefonů	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele a odsouhlasení investora na zajištění bezpečnosti při vstupu do jídelny navrhujeme doplnění videotelefonů na vstupní dveře do objektu. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.	

Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: , ANO, navýšení ceny o 53 615,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 7.9.2018
Vyjádření objednatele:	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

V Praze dne:10.9.2018

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



Zakázka:

ZŠ Kuncova - Příloha ke změnovému listu - Elektroinstalace kuchyň- DT

Popis	Cena
SO 01.44: Elektroinstalace - doplnění videotelefonů	53 615
740: Elektroinstalace	51 062
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 553
Celkem (bez DPH)	53 615

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01.44: Elektroinstalace - doplnění videotelefonů						53 615
740: Elektroinstalace						51 062
1.	74100040	BTNS instal. krabice do zdi 1m/350010/	ks	2,0	188,82	378
2.	74100041	BTNS RAM+SASI kov 1m/350211/	ks	2,0	769,09	1 538
3.	74100042	BTNS BAR. AUD/VIDEO JEDN. /351200/	ks	2,0	7 890,00	15 780
4.	74100043	BTNS kryt 351200 2T/2SL kov /351221/	ks	2,0	621,78	1 244
5.	74100044	BT VDT CLASSE 100 VIDEO STANDARD /344522/	ks	1,0	8 544,00	8 544
6.	74100045	BT AUDIOTELEFON SPRINT 2VOD 344232	ks	1,0	531,44	531
7.	74100046	BT kombinovaný napájecí zdroj 3469050 6m	ks	1,0	1 838,74	1 839
8.	74100047	Příslušenství	kpl	1,0	918,00	918
9.	74100048	kabely, podružný materiál	kpl	1,0	5 850,00	5 850
10.	74100049	montáž	kpl	1,0	12 460,00	12 460
11.	74100050	konfigurace	kpl	1,0	1 980,00	1 980
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						2 553
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	51 061,56	1 021
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	51 061,56	511
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	51 061,56	1 021

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“

Číslo změnového listu: ZL-14

Název změny: **ELEKTROINSTALACE - ŠKOLNÍ ZVONEK A JEDNOTNÝ ČAS**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praha Stodůlky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Doplnění elektroinstalace pro školní zvonek a jednotný čas	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora bude v prostoru jídelny doplněn školní zvonek a hodiny se systémem jednotného času. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: , ANO, navýšení ceny o 40 352,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 7.9.2018
Vyjádření objednatele:	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

V Praze dne:10.9.2018

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



Zakázka:

ZŠ Kuncova - Příloha ke změnovému listu - Elektroinstalace kuchyň- není vyřešeno

Popis	Cena
SO 01.47: Elektroinstalace - školní zvonek a jednotný čas	40 352
740: Elektroinstalace	38 430
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 922
Celkem (bez DPH)	40 352

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01.47: Elektroinstalace - školní zvonek a jednotný čas						40 352
740: Elektroinstalace						38 430
1.	74100070	jednotný čas				-
	74100071	kabel, lišty	kpl	1,0	1 950,00	1 950
	74100072	podružný materiál	kpl	1,0	300,00	300
	74100073	hodiny jednotného času, závěsné s LED displejem, 2 pozice, 60 mm výška číslic vč.montáže	ks	1,0	19 890,00	19 890
	74100074	montáž	kpl	1,0	6 500,00	6 500
2.	74100075	školní zvonek				-
	74100076	kabel, lišty	kpl	1,0	1 850,00	1 850
	74100077	podružný materiál	kpl	1,0	300,00	300
	74100078	zvonek	ks	1,0	2 740,00	2 740
	74100079	montáž	kpl	1,0	4 900,00	4 900
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						1 922
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	38 430,00	769
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	38 430,00	384
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	38 430,00	769

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“

Číslo změnového listu: ZL-15

Název změny: **PŘÍSTAVBA - SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praha Stodůlky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Instalace schodišťové plošiny	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora na bezbariérového propojení jídelny, navrhujeme instalaci schodišťové plošiny na spojovací schodiště. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: , ANO, navýšení ceny o 261 729,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 7.9.2018
Vyjádření objednatele:	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

V Praze dne:10.9.2018

Za autorský dozor stavby:
Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technický dozor investora:
Jméno: Ing. Jan Bříza


podpis:

Za objednatele:
Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:
Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

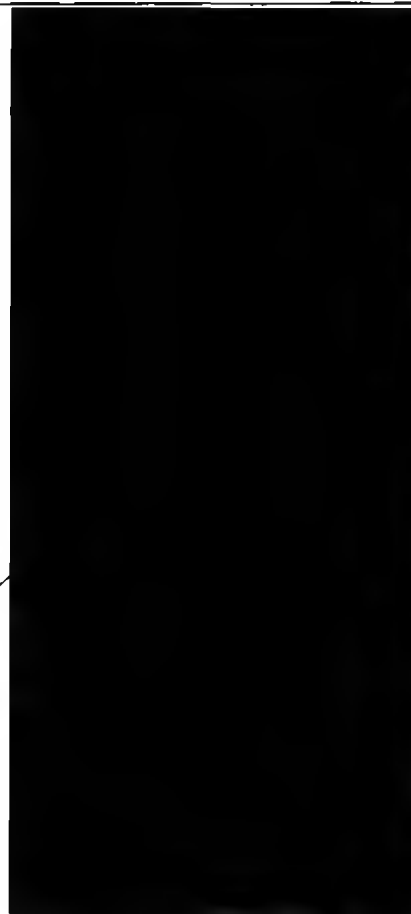

Zakázka:

ZŠ Kuncova - Příloha ke změnovému listu - plošina pro invalidy

Popis	Cena
SO 01.3: Přístavba - schodišťová plošina	261 729
033: Dopravní zařízení	247 040
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	14 689
Celkem (bez DPH)	261 729

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01.3: Přístavba - schodišťová plošina						261 729
033: Dopravní zařízení						247 040
1.	331030330	Šikmá schodišťová plošina typ X3 pro invalidy - dodávka + montáž + kompletační činnost po osazení plošiny	kpl	1,0	222 240,00	222 240
2.	33103033R	Automatické provedení (samoobslužné) - příplatek	kpl	1,0	9 800,00	9 800
3.	950000001	Stavební připravenost pro osazení plošiny	kpl	1,0	15 000,00	15 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						14 689
5.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	2 937,75	5 876
6.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	1,0	2 937,75	2 938
7.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	2,0	2 937,75	5 876

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“

Číslo změnového listu: ZL-16

Název změny: **PŘÍSTAVBA - URYCHLENÍ MONTÁŽE PODLAH**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praha Stodůlky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Urychlení montáže podlah	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora ze dne 15.8.2018 na urychlení termínu dokončení, navrhuje použití hydrofobní impregnace pod PVC. Tato impregnace je nutná pro umožnění pokládky finální podlahové krytiny v požadovaném čase. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: , ANO, navýšení ceny o 144 501,- Kč bez DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 7.9.2018

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

Vyjádření objednatele:

V Praze dne:10.9.2018

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

Zakázka:

ZŠ Kuncova - Příloha ke změnovému listu - urychlení montáže PVC penetrací

Popis	Cena
SO 01.7: Urychlení montáže vinylových podlah penetrací	144 501
009: Ostatní konstrukce a práce	137 618
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	6 883
Celkem (bez DPH)	144 501

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01.7: Urychlení montáže vinylových podlah penetrací						144 501
009: Ostatní konstrukce a práce						137 618
1.	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný - podklad pod PVC (podlaha + schody) IMPREGNACE hydrofobní pro savé podklady	m2	539,6	255,04	137 618
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						6 883
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,0	1 376,57	2 753
2.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	1,0	1 376,57	1 377
3.	030001000	Zařízení staveniště	%	2,0	1 376,57	2 753

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Výstavba kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80385“

Číslo změnového listu: ZL-17

Název změny: **GASTRO ZAŘÍZENÍ - ÚPRAVA DODÁVKY ZAŘÍZENÍ**

Stavba: Nová stavba dle SOD	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praba Stodůlky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Dopřesnění vybavení Gastro zařízení	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele a souhlasu investora byly provedeny změny ve vybavení gastro zařízení bez vlivu na cenu Dále došlo ke sloučení pozic v mytí bílého nádobí v m.č. 109 - pozice 3 a 5, umyvadla s kolenovým ovládním budou z důvodu rozměru žlb sloupů širě 400 mm	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: NE- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 7.9.2018
Vyjádření objednatele:	

VÝSTAVBA KUCHYNĚ A JÍDELNY V AREÁLU ZŠ KUNCOVA

V Praze dne: 10.9.2018

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Evžen Krouský

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba objektu jídelny s kuchyní ZŠ Kuncova

Objekt:

SO 01 - Stavební objekt

Soupis:

Gastro - Zařízení a vybavení gastronomického provozu

Místo:

Kuncova 1580/1, Praha 5

Datum:

19. 2. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Z&D STAVEBNÍ SPOLEČNOST SPOL. S R.O.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

766 200,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

766 200,00

27	K	791.1.24	Umyvadlo nerez s pákovou směšovací baterií, - pozice č.24	soubor	1,000	8 600,00	8 600,00	
45	K	791.2.17	Umyvadlo nerez s pákovou směšovací baterií, - pozice č.17	soubor	1,000	8 600,00	8 600,00	
60	K	791.3.15	Kutr na maso velkokapacitní,, stacionární, rychlost 1500 až 3000 otáček/min - pozice č.15	soubor	1,000	484 200,00	484 200,00	
74	K	791.3.29	Umyvadlo nerez s pákovou směšovací baterií, - pozice č.29	soubor	2,000	8 450,00	16 900,00	
104	K	791.3.58	Pracovní stůl s dvoudřezem a roštovou polici, zadní a pravý lem, vč. baterie s tlakovou sprchou a sifonu, deska podlepena, jeklová konstrukce 40x40mm, AISI 304, stavitelné nohy - pozice č.58	soubor	1,000	23 400,00	23 400,00	
106	K	791.3.60	Univerzální kuchyňský stroj (objem kotlíku 60 a 30l), třírychlostní motor, příslušenství (hnětací hák, míchač, šlehací metla, vozík a podstavec pod kotlík) - pozice č.60	soubor	1,000	215 700,00	215 700,00	
133	K	791.10.5	Umyvadlo nerez s pákovou směšovací baterií, - pozice č.5	soubor	1,000	8 800,00	8 800,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 01 - Stavební objekt

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							766 200,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	791		Zařízení velkokuchyní				
1a	K	791.1.1a	Podnos jídelní GN 1/1 - pozice č.1a	kus	700,000	477,00	333 900,00
1b	K	791.1.1b	Pojízdný stojan na podnosy - pozice č.1b	kus	2,000	29 900,00	59 800,00
27	K	791.1.24	Umyvadlo nerez s kolenovým ovládáním, - pozice č.24	soubor	1,000	9 800,00	9 800,00
45	K	791.2.17	Umyvadlo nerez s kolenovým ovládáním, - pozice č.17	soubor	1,000	9 800,00	9 800,00
60	K	791.3.15	Umyvadlo nerez s kolenovým ovládáním, vč. Instalací a přízdívky - pozice č.15	soubor	2,000	26 500,00	53 000,00
74	K	791.3.29	Umyvadlo nerez s kolenovým ovládáním, - pozice č.29	soubor	2,000	9 800,00	19 600,00
104	K	791.3.58	Pracovní stůl s jedním velkým dřezem (600x600) a roštovou polici, zadní a pravý lem, vč. baterie s tlakovou sprchou a sifonu, deska podlepena, jeklová konstrukce 40x40mm, AISI 304, stavitelné nohy - pozice č.58	soubor	1,000	35 200,00	35 200,00
106	K	791.3.60	Univerzální kuchyňský stroj (objem kotlíku 2 x 60ltr.), třírychlostní motor, příslušenství (hnětací hák, míchač, šlehací metla, vozík a podstavec pod kotlík) - pozice č.60	soubor	1,000	235 300,00	235 300,00
133	K	791.10.5	Umyvadlo nerez s kolenovým ovládáním, - pozice č.5	soubor	1,000	9 800,00	9 800,00
