


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 17
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	6. 9. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 17 – Zazdívky a dobetonávky instalačních šachet</u> Původní, většinou siporexové zdivo bylo různě doplňováno dutinovými příčkovkami. Během provádění otloukání omítek byly zjištěny lokální dozdívky a zároveň došlo místně k uvolnění stávajícího zdiva (např. během sekání rozvodů, vybourání zárubní ...). Takto objevená místa byla doplněna tvarovkami Ytong, které splňují předepsané požární požadavky. V místě osazení WC byly zjištěny lokální násypy, které byly vybrány a nahrazeny dobetonávkou.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....



PROXIMA a.s.
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)

.....
 Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....



 Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....


MIRRO s.r.o.
 Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 68
 100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 68



 Podpis



Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

27-09-2018

Podpis

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 17, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).

Fotodokumentace.

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 17	Dobetonávky, zadržky a překlady - instalační šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				76 953,04
-------------	----------	--------------------------------------	--	--	--	------------------

1	317168111R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm	kus	1	211,50	211,50
---	--------------	---	-----	---	--------	--------

RTS

Včetně dodávky překladů.

1.NP : 1

1

2	317168112R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm	kus	33	292,00	9 636,00
---	--------------	---	-----	----	--------	----------

RTS

Včetně dodávky překladů.

1.NP : 12

12

2.NP : 9

9

3.NP : 12

12

3	340271410R00	Zadržka otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm	kus	49	227,50	11 147,50
---	--------------	---	-----	----	--------	-----------

RTS

3.NP : 9

9

2.NP : 10

10

1.NP : 6

6

1.PP : 23

23

Dozdivky zárubně 1.-3.NP : 1

1

4	340271510R00	Zadržka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm	m3	3,83	4 910,00	18 812,76
---	--------------	---	----	------	----------	-----------

RTS

3.NP : 1,13

1,13

2.NP : 1,11

1,11

1.NP : 0,78

0,78

1.PP : 0,59

0,59

Dozdivky zárubně 1.-3.NP : 0,53

0,22

5	340271610R00	Zadržka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm	m3	8,19	4 535,00	37 145,28
---	--------------	---	----	------	----------	-----------

RTS

3.NP : 1,63

1,63

2.NP : 1,57

1,57

1.NP : 3,27

3,27

1.PP : 0,78

0,78

Dozdivky hydrantů 1.-3.NP : 0,53

0,53

Dozdivky zárubně 1.-3.NP : 0,53

0,41

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				76 448,80
-------------	----------	-----------------------------	--	--	--	------------------

6	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách	kus	101	347,00	35 047,00
---	--------------	--	-----	-----	--------	-----------

RTS

3.NP : 34

34

2.NP : 37

37

1.NP : 30

30

7	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropěch	m3	2,97	13 940,00	41 401,80
---	--------------	---	----	------	-----------	-----------

RTS

3.NP : 0,59

0,59

2.NP : 1,36

1,36

1.NP : 1,02

1,02

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 17	Dobetonávky, zazdívký a překlady - instalační šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				9 258,68
111	9980110RRR	Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m	t	23,98	386,10	9 258,68

SOD

Celkem						162 660,52
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Výpočty

3.NP - zazdivky

		dl.	v.	Plocha	Celkem	Do 4m2	Do 1m2	Do 0,25m2
1	Dviřka	2,40 -0,50	1,80 0,80	4,32 -0,40	3,92	3,92		
2		0,30	0,40	0,12	0,12			0,12
3	Dviřka	1,10 -0,50	1,70 0,80	1,87 -0,40	1,47	1,47		
4	Dviřka	0,66 -0,50	1,70 0,80	1,12 -0,40	0,72		0,72	
5	Dviřka	0,64 -0,50	1,76 0,80	1,13 -0,40	0,73		0,73	
6		0,60	0,60	0,36	0,36		0,36	
7		1,00	0,35	0,35	0,35		0,35	
8		0,65	0,65	0,42	0,42		0,42	
9	Dviřka	0,70 -0,50	1,70 0,80	1,19 -0,40	0,79		0,79	
10		0,80	0,80	0,64	0,64		0,64	
11	Dviřka	0,70 -0,50	1,70 0,80	1,19 -0,40	0,79		0,79	
12		0,56	0,90	0,50	0,50		0,50	
13		0,86	0,40	0,34	0,34		0,34	
14	Dviřka	0,64 -0,50	1,71 0,80	1,09 -0,40	0,69		0,69	
15	Dviřka	0,90 -0,50	2,00 0,80	1,80 -0,40	1,40	1,40		
16		0,50	0,40	0,20	0,20			0,20
17		0,60	0,47	0,28	0,28			0,28
18		0,80	0,40	0,32	0,32		0,32	
19		0,30	0,30	0,09	0,09			0,09
20	Dveře	1,30 -0,80	2,16 2,00	2,81 -1,60	1,21	1,21		
21	Dviřka	0,70 -0,50	1,87 0,80	1,31 -0,40	0,91		0,91	
22		0,25	0,95	0,24	0,24			0,24
23		1,00	2,20	2,20	2,20	2,20		
24		0,15	1,30	0,20	0,20			0,20
25	Dviřka	0,80 -0,50	2,20 0,80	1,76 -0,40	1,36	1,36		
26		0,10	0,45	0,05	0,05			0,05

27		0,25	0,37	0,09	0,09		0,09		
28	Dvířka	0,60	1,70	1,02					
		-0,50	0,80	-0,40	0,62		0,62		
29		0,35	0,90	0,32	0,32		0,32		
30	Dvířka	0,65	1,67	1,09					
		-0,50	0,80	-0,40	0,69		0,69		
31		0,80	0,94	0,75	0,75		0,75		
32	Dvířka	0,80	1,70	1,36					
		-0,50	0,80	-0,40	0,96		0,96		
33		0,80	1,75	1,40	1,40	1,40			
34		0,33	0,75	0,25	0,25				0,25
35	Dvířka	1,30	1,80	2,34					
		-0,50	0,80	-0,40	1,94	1,94			
36	Dvířka	0,45	1,80	0,81					
		-0,50	0,80	-0,40	0,41		0,41		
37		0,80	1,80	1,44	1,44	1,44			
				29,16	16,34	11,31	1,51	Kontrola	
				m2	1,63	1,13	9	29,16	m2
					m3	m3	ks		

3.NP - dobetonávky v podlahách u geberitů, prostupy 3.NP

	dl.	š.	v.	m3		Do 1m2	Do 0,25m2
4.3.12	0,40	0,50	0,20	0,04	0,20		0,20
	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01
4.3.18	0,40	0,80	0,20	0,06	0,32	0,32	
	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01
4.3.24	0,45	0,80	0,20	0,07	0,36	0,36	
	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01
4.3.30	0,35	0,80	0,20	0,06	0,28	0,28	
	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01
4.3.36	0,35	0,70	0,20	0,05	0,25		0,25
	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01
4.3.42	0,75	0,45	0,15	0,05	0,34	0,34	
	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01
4.3.48	0,65	0,73	0,20	0,09	0,47	0,47	
	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01
4.3.54	0,33	0,70	0,20	0,05	0,23		0,23
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01
4.3.60	0,36	0,70	0,20	0,05	0,25		0,25
	0,30	0,25	0,20	0,02	0,08		0,08

	0,36	0,70	0,20	0,05	0,25		0,25	
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01	
4.3.67	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06	
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01	
4.3.70	1,00	0,90	0,20	0,18	0,90	0,90		
4.3.73	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06	
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01	
4.3.76	0,50	0,70	0,20	0,07	0,35	0,35		
	0,30	0,70	0,20	0,04	0,21		0,21	
4.3.79	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06	
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01	
4.3.82	0,10	0,60	0,20	0,01	0,06		0,06	
4.3.85	0,45	0,35	0,20	0,03	0,16		0,16	
4.3.92	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01	
4.3.98	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01	
4.3.101	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01	Kontrola
				1,08	5,48	3,02	2,46	5,48 m2
				m3		0,59 m3	34 ks	

2.NP - zazdivky

	dl.	v.	Plocha	Celkem	Do 4m2	Do 1m2	Do 0,25m2
1	2,70	1,80	4,86				
Dvířka	-0,50	0,80	-0,40	4,46	4,46		
2	0,20	0,30	0,06	0,06			0,06
3	0,87	1,78	1,55				
Dvířka	-0,50	0,80	-0,40	1,15	1,15		
4	0,38	0,60	0,23	0,23			0,23
5	0,60	0,26	0,16	0,16			0,16
6	0,37	0,27	0,10	0,10			0,10
7	0,60	1,60	0,96				
Dvířka	-0,50	0,80	-0,40	0,56		0,56	
8	0,70	1,80	1,26				
Dvířka	-0,50	0,80	-0,40	0,86		0,86	
9	0,75	1,80	1,35				
Dvířka	-0,50	0,80	-0,40	0,95		0,95	
10	0,70	1,60	1,12				
Dvířka	-0,50	0,80	-0,40	0,72		0,72	
11	0,30	1,10	0,33	0,33		0,33	
12	0,30	0,40	0,12	0,12			0,12
13	0,40	0,40	0,16	0,16			0,16
14	0,60	1,60	0,96				
Dvířka	-0,50	0,80	-0,40	0,56		0,56	

15	Dviřka	0,60	1,60	0,96					
		-0,50	0,80	-0,40	0,56			0,56	
16		1,00	1,15	1,15	1,15	1,15			
17		0,70	1,95	1,37	1,37	1,37			
18		0,70	2,10	1,47	1,47	1,47			
19		0,25	1,70	0,43	0,43			0,43	
20	Dviřka	0,60	1,60	0,96					
		-0,50	0,80	-0,40	0,56			0,56	
21		0,30	0,30	0,09	0,09				0,09
22		2,10	0,25	0,53	0,53			0,53	
23		0,40	2,10	0,84	0,84			0,84	
24		0,30	2,10	0,63	0,63			0,63	
25		1,20	2,10	2,52	2,52	2,52			
26		0,35	2,00	0,70	0,70			0,70	
27	Dviřka	0,90	1,75	1,58					
		-0,50	0,80	-0,40	1,18	1,18			
28	Dviřka	0,60	1,50	0,90					
		-0,50	0,80	-0,40	0,50			0,50	
29		0,25	1,50	0,38	0,38			0,38	
30		0,40	3,00	1,20	1,20	1,20			
31		0,10	0,50	0,05	0,05				0,05
32		0,20	1,30	0,26	0,26				0,26
33	Dviřka	0,90	1,78	1,60					
		-0,50	0,80	-0,40	1,20	1,20			
34		0,30	2,00	0,60	0,60			0,60	
35	Dviřka	0,60	1,60	0,96					
		-0,50	0,80	-0,40	0,56			0,56	
36		0,30	0,50	0,15	0,15				0,15
37		0,23	1,70	0,39	0,39			0,39	
38		1,35	0,35	0,47	0,47			0,47	
					28,18	15,69	0,47		Kontrola
					m2	1,57	11,12	1,37	28,18
						m3	1,11	10	m2
							m3	ks	

2.NP - Dobetonávky v podlahách u geberitů, prostupy 2.NP

	dl.	š.	v.	m3		Do 1m2	Do 0,25m2
4.2.12	0,70	1,00	0,20	0,14	0,70	0,70	
	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01
4.2.18	0,70	1,00	0,20	0,14	0,70	0,70	

	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.2.24	1,00	0,70	0,20	0,14	0,70	0,70			
	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.2.30	0,40	0,70	0,20	0,06	0,28	0,28			
	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.2.36	0,70	1,00	0,20	0,14	0,70	0,70			
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.2.42	0,50	0,70	0,15	0,05	0,35	0,35			
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06		
4.2.48	0,70	1,00	0,20	0,14	0,70	0,70			
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.2.54	1,00	0,70	0,20	0,14	0,70	0,70			
	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.2.60	1,00	0,70	0,20	0,14	0,70	0,70			
	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.2.67	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.2.70	0,30	0,70	0,20	0,04	0,21		0,21		
4.2.76	1,00	0,70	0,20	0,14	0,70	0,70			
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.2.79	0,25	0,25	0,20	0,01	0,06		0,06		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.2.82	0,65	1,00	0,20	0,13	0,65	0,65			
4.2.85	0,45	0,35	0,20	0,03	0,16		0,16		
4.2.92	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.2.101	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
				1,59	8,02	6,88	1,14	Kontrola	
				m3		1,36	37	8,02	m2
						m3	ks		

1.NP - zazdivky

	dl.	v.	Plocha	Celkem	Do 4m2	Do 1m2	Do 0,25m2
1	0,30	0,40	0,12				

					0,12	0,12
2	Dviřka	2,67 -0,50	2,62 0,80	7,00 -0,40	6,60	6,60
3	Dviřka	1,00 -0,50	1,70 0,80	1,70 -0,40	1,30	1,30
4		1,50	0,70	1,05	1,05	1,05
5	Dviřka	0,70 -0,50	1,60 0,80	1,12 -0,40	0,72	0,72
6	Dviřka	0,90 -0,50	1,90 0,80	1,71 -0,40	1,31	1,31
7		1,40	1,65	2,31	2,31	2,31
8		0,50	0,33	0,17	0,17	0,17
9		0,70	1,30	0,91	0,91	0,91
10	Dviřka	1,70 -0,50	2,30 0,80	3,91 -0,40	3,51	3,51
11	Dviřka	1,60 -0,50	2,60 0,80	4,16 -0,40	3,76	3,76
12		0,80	0,15	0,12	0,12	0,12
13		0,40	0,80	0,32	0,32	0,32
14		0,80	0,55	0,44	0,44	0,44
15		0,60	3,00	1,80	1,80	1,80
16	Dviřka	0,60 -0,50	1,60 0,80	0,96 -0,40	0,56	0,56
17	Dviřka	1,30 -0,50	1,80 0,80	2,34 -0,40	1,94	1,94
18		1,60	0,27	0,43	0,43	0,43
19		0,30	0,60	0,18		

					0,18			0,18	
20	Dvířka	1,60 -2,00	2,21 0,80	3,54 -1,60					
					1,94	1,94			
21		2,20	0,18	0,40					
					0,40		0,40		
22	Dveře	1,30 -2,00	2,20 0,80	2,86 -1,60					
					1,26	1,26			
23		0,60	0,60	0,36					
					0,36		0,36		
24	Dvířka	1,15 -0,50	2,00 0,80	2,30 -0,40					
					1,90	1,90			
25		0,15	0,40	0,06					
					0,06		0,06		
26		0,25	0,50	0,13					
					0,13		0,13		
27	Dvířka	0,60 -0,50	1,60 0,80	0,96 -0,40					
					0,56		0,56		
28		0,70	0,40	0,28					
					0,28		0,28		
29		2,00	0,20	0,40					
					0,40		0,40		
30	Dvířka	0,70 -0,50	1,80 0,80	1,26 -0,40					
					0,86		0,86		
31	Dvířka	0,70 -0,50	1,80 0,80	1,26 -0,40					
					0,86		0,86		
32	Dvířka	2,75 -0,50	1,60 0,80	4,40 -0,40					
					4,00	4,00			
33	Dvířka	0,70 -0,50	1,60 0,80	1,12 -0,40					
					0,72		0,72		
					41,26	32,67	7,82	0,77	Kontrola
					m2	3,27	0,78	6	41,26
						m3	m3	ks	m2

1.NP - Dobetonávky v podlahách u geberitů, prostupy 1.NP

	dl.	š.	v	m3		Do 1m2	Do 0,25m2
4.1.12	0,75	0,40	0,20	0,06	0,30	0,30	
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01
	0,20	0,20	0,20	0,01	0,04		0,04
4.1.18	0,75	0,25	0,20	0,04	0,19		0,19
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01
	0,20	0,20	0,20	0,01	0,04		0,04
4.1.24	0,80	0,30	0,20	0,05	0,24		0,24

	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
	0,20	0,20	0,20	0,01	0,04		0,04		
4.1.30	0,75	0,25	0,20	0,04	0,19		0,19		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
	0,20	0,20	0,20	0,01	0,04		0,04		
4.1.36	0,30	0,45	0,20	0,03	0,14		0,14		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
	0,15	0,15	0,20	0,00	0,02		0,02		
4.1.39	0,30	0,40	0,20	0,02	0,12		0,12		
4.1.42	0,50	0,30	0,20	0,03	0,15		0,15		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.1.48	2,00	0,30	0,20	0,12	0,60	0,60			
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.1.54	1,80	0,50	0,20	0,18	0,90	0,90			
	0,20	0,20	0,20	0,01	0,04		0,04		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.1.60	0,88	0,45	0,20	0,08	0,40	0,40			
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.1.92	0,85	1,15	0,20	0,20	0,98	0,98			
4.1.90	0,15	0,15	0,30	0,01	0,02		0,02		
4.1.85	0,48	0,35	0,30	0,05	0,17		0,17		
4.1.82	0,35	0,60	0,30	0,06	0,21		0,21		
4.1.79	0,20	0,20	0,20	0,01	0,04		0,04		
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.1.76	0,80	1,20	0,20	0,19	0,96	0,96			
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.1.73	0,20	0,20	0,30	0,01	0,04		0,04		
4.1.70	0,80	1,20	0,20	0,19	0,96	0,96			
	0,10	0,10	0,20	0,00	0,01		0,01		
4.1.67	0,20	0,20	0,20	0,01	0,04		0,04		
				1,44	6,98	5,09	1,88	Kontrola	
				m3		1,02	30	6,98	m2
						m3	ks		

1.PP - zazdivky

	dl.	v.	tl. zdi	Celkem	Do 4m2	Do 1m2	Do 0,25m2	
1	1,70	0,30	0,40	0,51		0,51		0,51
2	0,50	0,80	0,10	0,40		0,40		
3	0,30	0,55	0,10	0,17			0,17	
4	0,20	0,30	0,10	0,06			0,06	
5	0,30	0,20	0,10	0,06			0,06	
6	0,50	0,80	0,10	0,40		0,40		
7	0,30	0,10	0,10	0,03			0,03	

8	0,30	0,20	0,10	0,06		0,06			
9	0,30	0,20	0,10	0,06			0,06		
10	0,30	0,40	0,10	0,12			0,12		
11	0,30	0,10	0,10	0,03			0,03		
12	0,30	0,40	0,10	0,12			0,12		
13	0,30	0,40	0,30	0,12			0,12		
14	0,30	0,40	0,30	0,12			0,12		
15	0,15	0,25	0,10	0,04			0,04		
16	0,60	0,30	0,10	0,18			0,18		
17	0,60	0,70	0,10	0,42		0,42			
18	0,40	0,30	0,10	0,12			0,12		
19	0,30	2,60	0,10	0,78		0,78			
20	0,33	0,80	0,10	0,26		0,26			
21	0,40	0,40	0,10	0,16			0,16		
22	0,30	0,40	0,20	0,12			0,12		
23	0,15	0,70	0,20	0,11			0,11		
24	0,40	0,40	0,20	0,16			0,16		
25	0,40	0,40	0,20	0,16			0,16		
26	0,20	6,00	0,10	1,20	1,20				
27	0,80	0,20	0,15	0,16			0,16		
28	0,45	2,40	0,10	1,08	1,08				
29	0,20	0,20	0,15	0,04			0,04		
30	0,80	0,20	0,35	0,16			0,16		
31	0,30	0,30	0,35	0,09			0,09		
32	0,30	1,50	0,35	0,45		0,45			
33	3,00	0,53	0,35	1,59	1,59				
				9,53	3,87	3,22	2,44	Kontrola	
				m2	0,78	0,59	23	9,53	m2
					m3	m3	ks		


1NP, 2.NP a 3.NP - dozdivky u hydrantů

	dl.	v	tl. zdi	Celkem	Do 4m2
1.NP	0,60	2,97	0,08	1,78	1,78
2.NP	0,60	2,97	0,08	1,78	1,78
3.NP	0,60	2,97	0,08	1,78	1,78
				5,35	5,35
				m2	0,53
					m3

Dozdivky zjištěné během osazování ocelových dveřních zárubní (zaměřeno 14.5.2018)

3.NP - dozdivky									
	dl	v	tl. zdi	Celkem	Do 4m2	Do 1m2	Do 0,25m2		
38	0,80	0,75	0,08	0,60		0,60			
1.NP - dozdivky									
34	0,60	2,10	0,08	1,26	1,26				
35	0,50	2,00	0,08	1,00		1,00			
36	0,40	0,50	0,08	0,20			0,20		
37	0,60	0,90	0,08	0,54		0,54			
38	0,44	0,75	0,08	0,33		0,33			
39	0,46	0,65	0,08	0,30		0,30			
40	1,55	2,50	0,08	3,88	3,88			Kontrola	
				8,10	5,14	2,77	0,20	8,10	m2
				m2	0,41	0,22	1		
					m3	m3	ks		



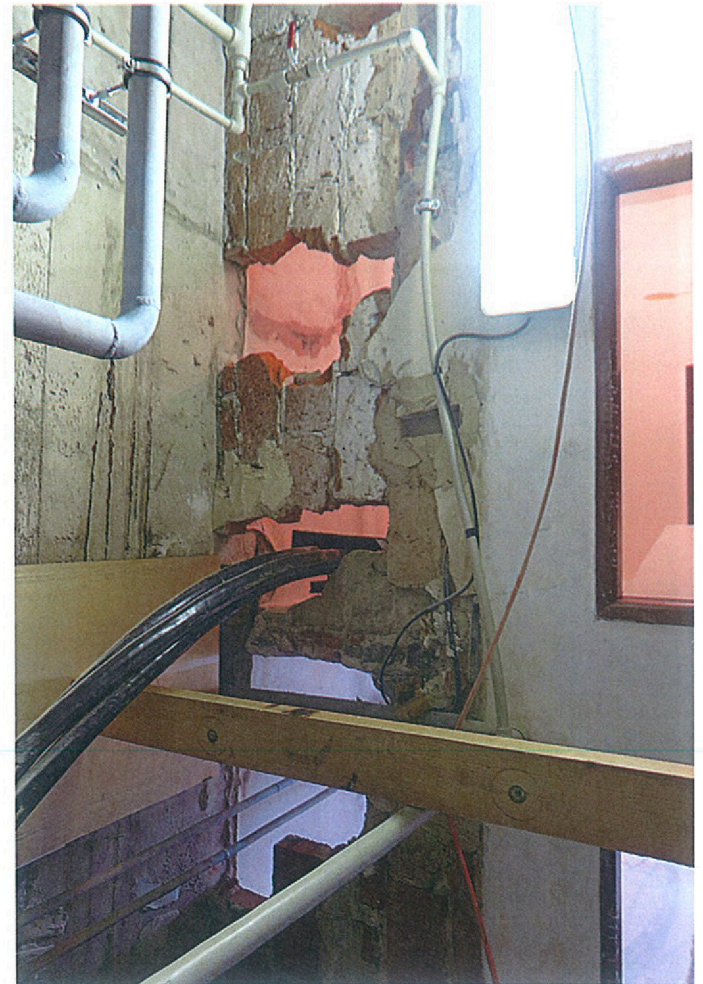




ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 18
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 , manažer projektu	
Datum:	4. 9. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 18 – Záměna zařizovacích předmětů</u> Záměnou zařizovacích předmětů v koupelnách jednotlivých z důvodu navýšení jejich standardu. Dalším důvodem záměny jsou ale provozní zkušenosti. Záměnou a doplněním zařizovacích předmětů dojde k zamezení vytékání vody během sprchování mimo prostor sprchy.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:





 Charles de Gaulle 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)

Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10




Podpis

Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 68
 100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 68

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

27-09-2019

Podpis

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 18, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).



Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 18	ZTI - záměny zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 717,72
-------------	----------	--------------------------------------	--	--	--	-----------------

1	346244312RP0	Vyzdívka soklu pro sprch. kouty, Ytong tl. 75 mm	m2	15,60	559,00	8 717,72
		1.NP : 0,12*1,2*(25*1,2+1,25*2+1,6+1,0*2)		5,20		
		2.NP : 0,12*1,2*(25*1,2+1,25*2+1,6+1,0*2)		5,20		
		3.NP : 0,12*1,2*(25*1,2+1,25*2+1,6+1,0*2)		5,20		

RTS

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				11 838,38
-------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	------------------

2	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř. stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	53,93	219,50	11 838,38
		1.NP : (0,12+0,075+0,12+0,1)*1,2*(25*1,2+1,25*2+1,6+1,0*2)		17,98		
		2.NP : (0,12+0,075+0,12+0,1)*1,2*(25*1,2+1,25*2+1,6+1,0*2)		17,98		
		3.NP : (0,12+0,075+0,12+0,1)*1,2*(25*1,2+1,25*2+1,6+1,0*2)		17,98		

RTS

Díl:	781	Obklady keramické				42 625,47
-------------	------------	--------------------------	--	--	--	------------------

373	781410014RA0	Obklad vnitřní pórovinný 15 x 15 cm do tmelu	m2	22,74	594,98	13 531,63
		1.NP : (0,05+0,075+0,05)*1,2*(25*1,2+1,25*2+1,6+1,0*2)		7,58		
		2.NP : (0,05+0,075+0,05)*1,2*(25*1,2+1,25*2+1,6+1,0*2)		7,58		
		3.NP : (0,05+0,075+0,05)*1,2*(25*1,2+1,25*2+1,6+1,0*2)		7,58		
4	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru, obkl.pórovinné	m2	53,93	237,50	12 809,18
382	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady, pod nové	m2	53,93	27,70	1 493,96
386	781491001RT1	Lišty k obkladům rohových_1NP_D+M	m	259,92	55,38	14 394,37
		1.NP : 2*1,2*(25*1,2+1,25*2+1,6+1,0*2)		86,64		
		2.NP : 2*1,2*(25*1,2+1,25*2+1,6+1,0*2)		86,64		
		3.NP : 2*1,2*(25*1,2+1,25*2+1,6+1,0*2)		86,64		

SOD

RTS

SOD

SOD

391	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,33	297,99	396,33
-----	--------------	--	---	------	--------	--------

SOD

Díl:	720	Zdravotechnické instalace				1 079 424,00
-------------	------------	----------------------------------	--	--	--	---------------------

1	720-1	D+M Podlahová vpust' HL 310N s nerezovou mřížkou 115/115mm a izolační souprava HL 83.M	ks	90	2 338,80	210 492,00
2	720-2	D+M Sprchové dveře Roltechnik LLD4 1100x1900mm, sklo transparent / profil brillant, posuvné dveře	ks	84	8 500,80	714 067,20
3	720-3	D+M Sprchové dveře Roltechnik LLD4 1600x1900mm, sklo transparent / profil brillant, posuvné dveře	ks	3	9 252,00	27 756,00
4	720-4	D+M Sprchový kout čtverec ATYP LLS2 100x100 sklo transparent / profil brillant	ks	3	12 529,20	37 587,60
5	720-5	D+M Nastavovací profil Roltechnik P3206 pro LLD4 (rozšiřující lišta), šíře nastavení 1,5cm	ks	243	368,40	89 521,20

Indiv.

Indiv.

Indiv.

Indiv.

Indiv.

Celkem						1 142 605,57
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Odpočet SOD

13	17	Žlab nerez, svislý odtok cca 1200mm	kpl	70	-5 881,45	-411 701,50	SOD
14	18	Žlab nerez, boční odtok odtok cca 1200mm	kpl	11	-7 137,35	-78 510,85	SOD
15	17	Žlab nerez, svislý odtok cca 1600mm	kpl	2	-11 143,50	-22 287,00	SOD
16	18	Žlab nerez, boční odtok odtok cca 1600mm	kpl	1	-12 577,05	-12 577,05	SOD

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 18	ZTI - záměny zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
17	17	Žlab nerez rohový, svislý odtok cca 2000mm	kpl	3	-15 659,80	-46 979,40

Celkem						-572 055,80
---------------	--	--	--	--	--	--------------------


Rekapitulace bez DPH						570 549,77
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

SOD

LLD4+LLB

Čtyřdílné posuvné sprchové dveře LLD4 v kombinaci s pevnou stěnou LLB

Zcela nová polorámová řada prakticky kombinuje **5mm dveřní a 4mm bezpečnostní sklo** pevných částí v rámu. Kompletní řada nabízí **praktické řešení** pro standardní modely, stejně jako **provelkorozměrové sprchy**, které se těší stále větší oblibě. Jednoduchost, trvanlivost a **vynikající poměr ceny a kvality** může tuto řadu LEGA LINE učinit novou hvězdou sériové výroby.



4+5mm


Tvrzené ESG sklo



Rámové provedení




Povrchová úprava



Spodní odklápění

2+3
ROKY

Záruka od nás



Typ	Objednací číslo	Způsob dodání	Výška (h)	Výplň	Instalační rozměr (y)	Vstupní otvor (c)	Profil
LLD4/1100	574-1100000-00-02	S	1900 mm	Transparent	1080-1110	420	Brillant
LLB/1000	553-1000000-00-02	S	1900 mm	Transparent	979-1005	---	Brillant
LLB/900	553-9000000-00-21	O	1900 mm	Intinglass	879-905	---	Brillant
LLB/900	553-9000000-00-02	S	1900 mm	Transparent	879-905	---	Brillant
LLB/800	553-8000000-00-21	O	1900 mm	Intinglass	779-805	---	Brillant
LLB/800	553-8000000-00-02	S	1900 mm	Transparent	779-805	---	Brillant
LLB/750	553-7500000-00-21	O	1900 mm	Intinglass	729-755	---	Brillant

Typ	Objednací číslo	Způsob dodání	Výška (h)	Výplň	Instalační rozměr (y)	Vstupní otvor (c)	Profil
LLB/750	553-7500000-00-02	S	1900 mm	Transparent	729-755	---	Brillant
LLB/700	553-7000000-00-21	O	1900 mm	Intinglass	679-705	---	Brillant
LLB/700	553-7000000-00-02	S	1900 mm	Transparent	679-705	---	Brillant
LLD4/1600	574-1600000-00-02	S	1900 mm	Transparent	1580-1610	670	Brillant
LLD4/1500	574-1500000-00-02	S	1900 mm	Transparent	1480-1510	620	Brillant
LLD4/1400	574-1400000-00-02	S	1900 mm	Transparent	1380-1410	570	Brillant
LLD4/1300	574-1300000-00-02	S	1900 mm	Transparent	1280-1310	520	Brillant
LLD4/1200	574-1200000-00-02	S	1900 mm	Transparent	1180-1210	470	Brillant
LLB/1000	553-1000000-00-21	O	1900 mm	Intinglass	979-1005	---	Brillant

*h - výška sprchového koutu včetně kotvících elementů

ZPŮSOB DODÁNÍ:

S - zboží SKLADEM - dodání v nejbližším možném termínu

O - zboží na OBJEDNÁVKU - termín dodání by neměl přesáhnout 14 pracovních dnů


Z - zboží na ZAKÁZKU - termín dodání by neměl přesáhnout 30 pracovních dnů

POZOR: Nominální rozměry sprchových stěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší, než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů uvedených v souboru "TECHNICKÁ SPECIFIKACE", který je u produktů k dispozici ke stažení.

LLS2

Čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout s dvoudílnými posuvnými dveřmi

Tento **sprchový kout LLS2** se přizpůsobí vaší koupelně - sami si vyberete, zda chcete obdélníkový, nebo čtvercový rozměr. Dvoudílné posuvné dveře se pohybují po **dvojitých ložiskových pojezdech** a spodní část dveří je výklopná, což oceníte při údržbě. Na polorámový sprchový kout LLS2 vám dáváme prodlouženou **záruku 5 let**.

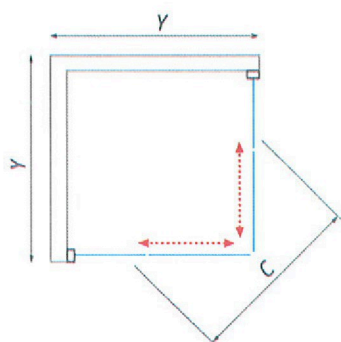

Typ	Objednací číslo	Výplň	Vstupní otvor (c)	Instalační rozměr (y)	Profil	Způsob dodání	Výška (h)
LLS2/800 SMONT	554-8000000-00-02	Transparent	430	775-790	Brillant	S	1900 mm
LLS2/900 SMONT	554-9000000-00-21	Intimglass	460	875-890	Brillant	O	1900 mm
LLS2/1000×800	554-1008000-00-21	Intimglass	505	(975-990)×(775-790)	Brillant	O	1900 mm
LLS2/1200×800	554-1208000-00-21	Intimglass	525	(1175-1190)×(775-790)	Brillant	O	1900 mm
LLS2/1200×900	554-1209000-00-21	Intimglass	535	(1175-1190)×(875-890)	Brillant	O	1900 mm
LLS2/1200×900	554-1209000-00-02	Transparent	535	(1175-1190)×(875-890)	Brillant	S	1900 mm
LLS2/1200×800	554-1208000-00-02	Transparent	525	(1175-1190)×(775-790)	Brillant	O	1900 mm

Typ	Objednací číslo	Výplň	Vstupní otvor (c)	Instalační rozměr (y)	Profil	Způsob dodání	Výška (h)
LLS2/1000×800	554-1008000-00-02	Transparent	505	(975-990)×(775-790)	Brillant	S	1900 mm
LLS2/900 SMONT	554-9000000-00-02	Transparent	460	875-890	Brillant	S	1900 mm
LLS2/800 SMONT	554-8000000-00-21	Intimglass	430	775-790	Brillant	O	1900 mm

*h - výška sprchového koutu včetně kotvicích elementů

ZPŮSOB DODÁNÍ:

S - zboží SKLADEM - dodání v nejbližším možném termínu

O - zboží na OBJEDNÁVKU - termín dodání by neměl přesáhnout 14 pracovních dnů

Z - zboží na ZAKÁZKU - termín dodání by neměl přesáhnout 30 pracovních dnů

POZOR: Nominální rozměry sprchových stěn jsou určeny pro INSTALACI NA VANIČKU a montují se vždy s odsazením od kraje vaničky. Při INSTALACI NA DLAŽBU tak hrozí, že rozměr sprchové zástěny bude menší, než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů uvedených v souboru "TECHNICKÁ SPECIFIKACE", který je u produktů k dispozici ke stažení.
