



Změnový list pro změny dle § 222 odst. (5) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Jílkova, č. akce 1046/1 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 3	Číslo ZBV: 3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.10.2024: Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II, DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení) SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení)			
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek (b) Přehled změn stavby (c) Zápis z KD č. 3 (d) Fotodokumentace (e) Vzorový řez komunikace (f) Situace s vyznačenou trasou nových krajníků		Paré č. 1 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice Paré č. 2 DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 Paré č. 3 SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město	
Iniciátor změny: Objednatel, Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny: V rámci jednání na KD č.3 bylo rozhodnuto, že z technického důvodu bude doplněna obruba (žulový krajník) v úrovni rozhraní chodníku a zeleně na jihovýchodní části stavby. Po bouracích pracích nebyl totiž nalezený základ plotu. Kladení dlažby bez ohraničení po stranách by bylo technologicky nesprávné. Dále byla navíc realizována výšková úprava poklopu kanalizačních šachet a slepeckou dlažbu ze syntetického kamene a realizace drenážního potrubí. Realizace všech vypsaných změn byla nezbytná z technického a funkčního hlediska. Výškovou úpravu KŠ je nezbytné udělat pro správné napojení povrchových znaků kanalizace (poklopy) na novou obrusnou asfaltovou vrstvu. Taktéž realizaci drenážního potrubí bylo nezbytné provést kvůli správnému odvodnění pláňě. Slepecká dlažba do povrchu chodníku z kamene je dle manuálu ze syntetického kamene. Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 5 ZZVZ, a to vzhledem k tomu, že zrealizovat změnu bylo nezbytné z technického a funkčního hlediska.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	414 509,20	414 509,20
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně			
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec		jméno	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy		jméno	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS popsaný, zdůvodněný, dokladovaný a oceněný v tomto Změnovém listu, jsou uvedeny všechny změny, které jsou součástí závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné o			
Objednatel (místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy, a.s.)		jméno	
Zhotovitel (místopředseda představenstva SILNICE GROUP a.s.)		jméno	














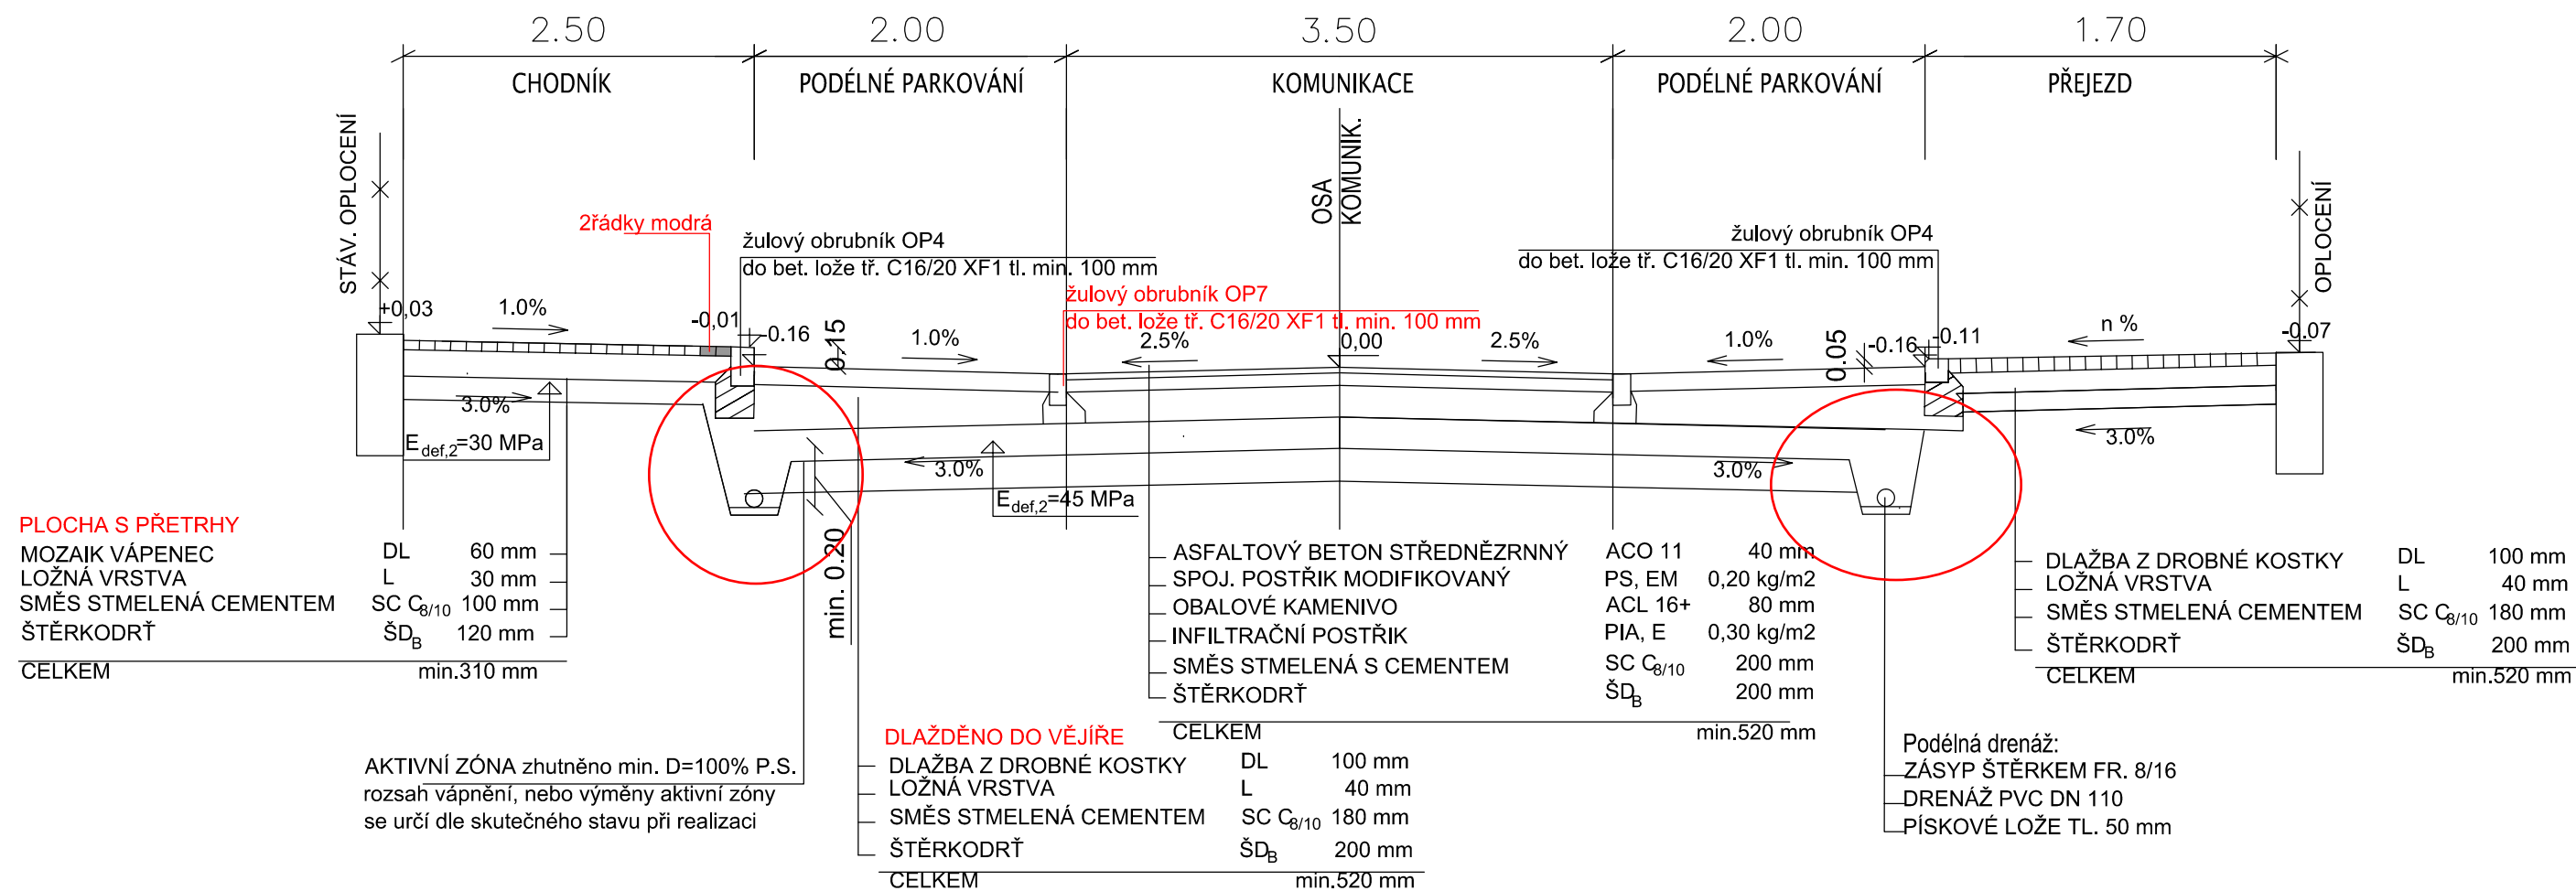

 AVSProjekt s.r.o. IČ 25080342, 142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31		INVESTOR Hlavní město Praha 110 00, Praha 1, Mariánské nám. 2		OBJEDNATEL Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 110 15 Praha1 Rásoňská 770/8			
AKCE Jílkova, Praha 6, č. akce 1046						ČÍSLO PŘÍLOHY D1	
HLAVNÍ ING. PROJEKTU ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol		KATASTR Břevnov STUPEŇ SOUŘ. SYSTÉM JTSK		ČÁST STAVEBNÍ ČÁST DATUM 03/2025 VARIANTA A		PŘÍLOHA VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	
KRESLIL ZAMĚŘIL		MĚŘITKO POČET FORMÁTŮ 2A4		ČÍSLO ZAKÁZKY		ČÍSLO SOUPRAVY	

