




<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>			číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.			
Investor:	Město Milevsko	Datum: 15.10.2019		
Název akce: Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	MS 2014+ <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Změnový list č. 1		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> změna (změnový list ) vychází z  <b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE=&gt;SPECIFIKACE MATERIÁLŮ=&gt;SOUPIS PRACÍ</b>  V soupisu prací není specifikováno připojení potrubí PVC DN200 na stokové potrubí PVC DN 300 .  Nutno realizovat připojení potrubí PVC DN200 na stokové potrubí PVC DN 300 navrtávacími sedly REDI EASY CLIP DN 300/200 v počtu 10 ks a osazením 10ks kanalizačních kolen PVC KG 200 x45°</p>				
Počet připojených listů specifikací:		6		
Důvod <b>vícepráce</b> / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Město Milevsko Ing. Ivan Radosta, starosta města				
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Vaniš Luboš ing. Luboš Vaniš				
Ing. Luboš Vaniš „Souhlasím“ .....podpis.....  Tel.: 383 809 228 e-mail: info@viprojekt.eu -1-				
Stanovisko autorského dozoru : Ing. Jan Bouchal				
Ing. Jan Bouchal „Souhlasím“ .....podpis..... 				
Přílohy:				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Potvrzení změny vystavil:	<b>Miroslav Korčák</b>	Datum: 15.10.2019
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> změna (změnový list) vychází z <b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE=&gt;SPECIFIKACE MATERIÁLŮ=&gt;SOUPIS PRACÍ</b> V soupisu prací není specifikováno připojení potrubí PVC DN200 na stokové potrubí PVC DN 300 . Nutno realizovat připojení potrubí PVC DN200 na stokové potrubí PVC DN 300 navrtávacími sedly REDI EASY CLIP DN 300/200 v počtu 10 ks a osazením 10ks kanalizačních kolen PVC KG 200 x45°		
Počet připojených listů specifikací: <b>6</b>	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,- Kč</b>	<b>45.100,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>45.100,- Kč</b>	<b>Beze změny</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 15.10.2019	Datum: 15.10.2019	

STAV

IC

Tel.:

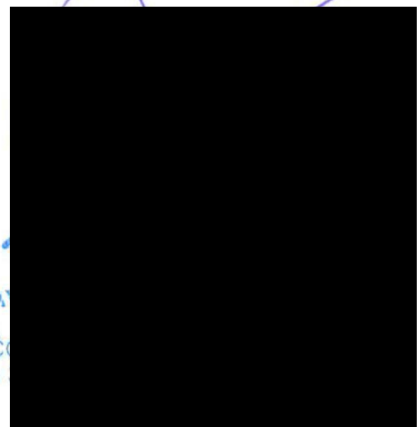

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N19-018-0135

Stavba: Milevsko, sportovní areál - ZL č. 1

Místo: Datum: 31. 7. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

SO 01	Likvidace a využití dešťových odpadních vod	45 100,00	54 571,00
-------	---	-----------	-----------

odsouhlasil : ing.Vaniš L -TDI

odsouhlasil : AD Ing.BOUCHAL JAN



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: N19-018-0135  
Stavba: Milevsko, sportovní areál - ZL č. 1

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 31. 7. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

**45 100,00**

DPH základní sazba daně 21,00%  
snižená 15,00%

Základ daně 45 100,00  
0,00

Výše daně 9 471,00  
0,00

## Cena s DPH

v

CZK

**54 571,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N19-018-0135

Stavba: Milevsko, sportovní areál - ZL č. 1

Místo: Datum: 31. 7. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

SO 01	Likvidace a využití dešťových odpadních vod	45 100,00	54 571,00
-------	---	-----------	-----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mlýnsko, sportovní areál - ZL č. 1  
Objekt:

**SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod**

KSO:

CC-CZ: Datum: 31. 7. 2019

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**45 100,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 100,00	21,00%	9 471,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**54 571,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milčevsko, sportovní areál - ZL č. 1

Objekt:

SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod

Místo:

Datum: 31. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	45 100,00
8 - Trubní vedení	45 100,00
	45 100,00

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Milevsko, sportovní areál - ZL č. 1

Objekt:

SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod

Místo:

Datum: 31. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

45 100,00

## D HSV Práce a dodávky HSV

45 100,00

D	8	Trubní vedení					45 100,00	
201	K	R001	Montáž navrtávacích sedel na kanalizačním potrubí z PVC trub hladkých DN200	kus	10,00000	385,00	3 850,00	
	PP		Montáž navrtávacích sedel na kanalizačním potrubí z PVC trub hladkých DN200					
202	M	R002	sedlo RED/ EASY CLIP DN 300/200 5-30 mm	kus	10,00000	3 430,00	34 300,00	
	PP		sedlo RED/ EASY CLIP DN 300/200 5-30 mm					
203	K	R003	Navrtání otvoru pro navrtávací sedlo do PVC potrubí DN 300	kus	10,00000	200,00	2 000,00	
	PP		Navrtání otvoru pro navrtávací sedlo do PVC potrubí DN 300					
204	K	877355211	Montáž varovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	10,00000	226,00	2 260,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž varovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
205	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	10,00000	269,00	2 690,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		koleno kanalizace PVC KG 200x45°					
