

Průvodka k faktuře

Přijatá faktura číslo: 122/2020

Datum vystavení průvodky: 31. 08. 2020 Datum splatnosti: 25. 09. 2020

Zařízení (odbor): **OBEC ČÍČENICE**

Přeúčtovat na základě (fa, smlouvy): -----

Přeúčtovat/Proplatit částku: **1.051.514,20Kč**

Komu: **Roman Kučera – stavitelství, České Budějovice**

Specifikace předmětu dle ROZPOČTU: **Smlouva o dílo**

Udržovací práce na objektu obecní hospody Čičenice

Přípustnost - správnost a hospodárnost prováděného opatření byla přezkoumána podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce: Regálová Renata

(osoba odpovědná za účetní případ) 31. 08. 2020

Razítko, podpis, datum

Ověření věcné správnosti: Marcela Borovková 31. 08. 2020

Razítko, podpis, datum

Vráceno účtárně k proplacení: Marcela Borovková 31. 08. 2020

Razítko, podpis, datum


Hlavní účetní, správce rozpočtu Eva Vovesná

(osoba odpovědná za zaúčtování)

Razítko, podpis, datum

Předpis, dne:

Úhrada, dne 31. 08. 2020

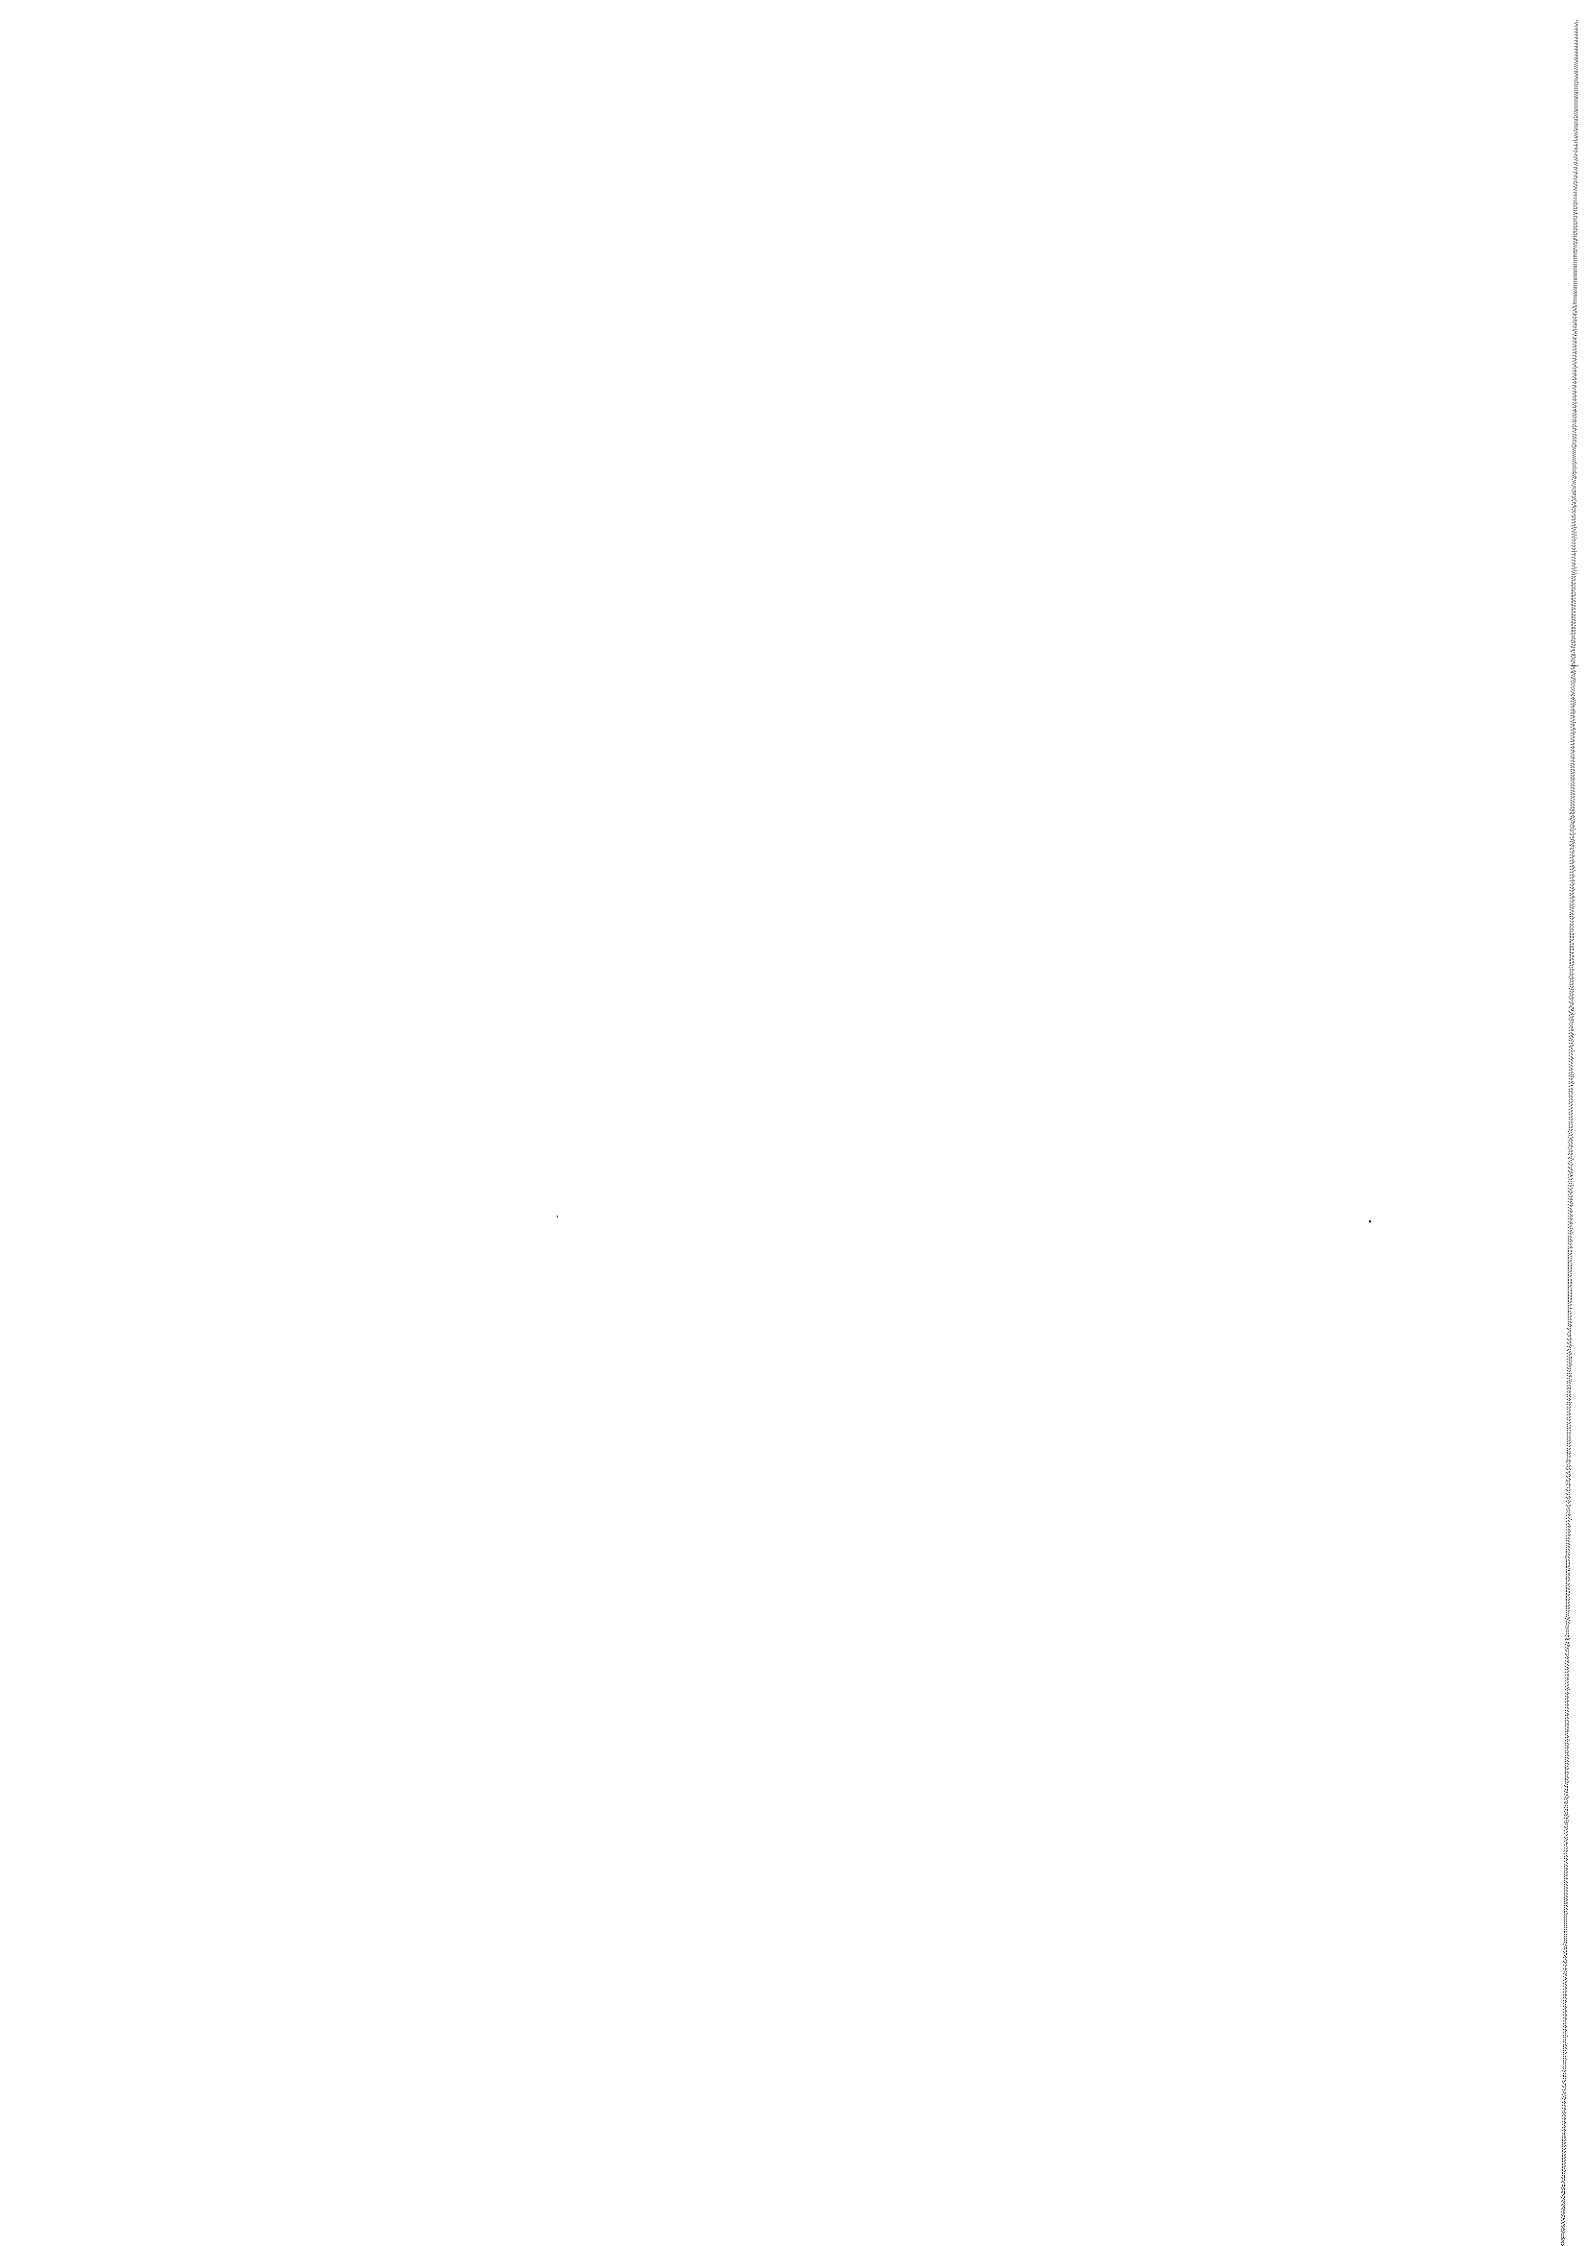

ROMAN KUČERA - STAVITELSTVÍ

Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice, IČ: 60823020, DIČ: CZ6908271249



FAKTURA - daňový doklad

DODAVATEL: Roman Kučera - stavitelství Strádova 1725/37 370 07 České Budějovice IČ: 60823020 DIČ: CZ6908271249 Tel.: 602 438 174 e-mail: stavkucera@volny.cz Výpis z ŽR č.j.: Ž/501/2020/HŘ/56068/3 Magistrát města České Budějovice Banka: FIO BANKA a.s. Číslo účtu: 2500196205/2010	FAKTURA číslo: 2020-044
	Variabilní symbol: 20200044
PRÍJEMCE: Obec Čičenice Čičenice 79,387 71 Čičenice zastoupení: Renata Regálová-starostka obce	ODBĚRATEL: Obec Čičenice Čičenice 79 387 71 Čičenice IČ: 00.251097 DIČ: není plátce DPH
	Konstantní symbol: 0308 Forma úhrady: převodem HS - č. objednávky: 2020-08 ze dne 11.03.2020 Akce/zakázka: Udržovací práce na objektu obecní hospody
Způsob dopravy: vlastní Odebral: TDI Miloš Štědrý Středisko: Kučera -VÝROBA Zpracoval: Roman Kučera-VEDENÍ	Datum vystavení: 26.08.2020 Datum splatnosti: do 30 dnů od převzetí faktury Dat. uskut. zd. pl.: 25.08.2020

Na podkladě uzavřené SOD č.2020-08 ze dne 11.03.2020, Vám fakturujeme za řádně provedené stavební práce za období 04-08/2020, v souladu s Zápisem o předání a převzetí díla ze dne 25.08.2020 a v rozsahu Zjišťovacího protokolu č.1 ze dne 25.08.2020

akce: Udržovací práce na objektu obecní hospody Čičenice

Stavební práce bez DPH				869 020,00 Kč
	základ	21%	869 020,00	869 020,00 Kč
	DPH	21%	182 494,20	182 494,20 Kč
	základ	15%	0,00	0,00 Kč
	DPH	15%	0,00	0,00 Kč
Stavební práce včetně 21% DPH				1 051 514,20 Kč

CELKEM K FAKTURACI 08/2020 K PROPLACENÍ


1 051 514,20 Kč

.....
 Převzal, dne: *Fakturaci zpracoval: Roman Kučera*
 mobil: 602 438 174

Roman Kučera Digitálně podepsal
 Roman Kučera
 Datum: 2020.08.26
 07:11:41 +02'00'

Příloha: Zjišťovací protokol č. včetně Položkového soupisu prací a dodávek ze dne 25.08.2020
 Zápis o předání a převzetí díla ze dne 25.08.2020

Suplankm s proplacením faktury TDI
ŠTĚDRÝ MILOŠ
 investorská činnost - stavební dozor
 Aug. Křížka 136/1
 389 01 VODŇANY
 IČO 158 160 28, Mob. 603 480 746

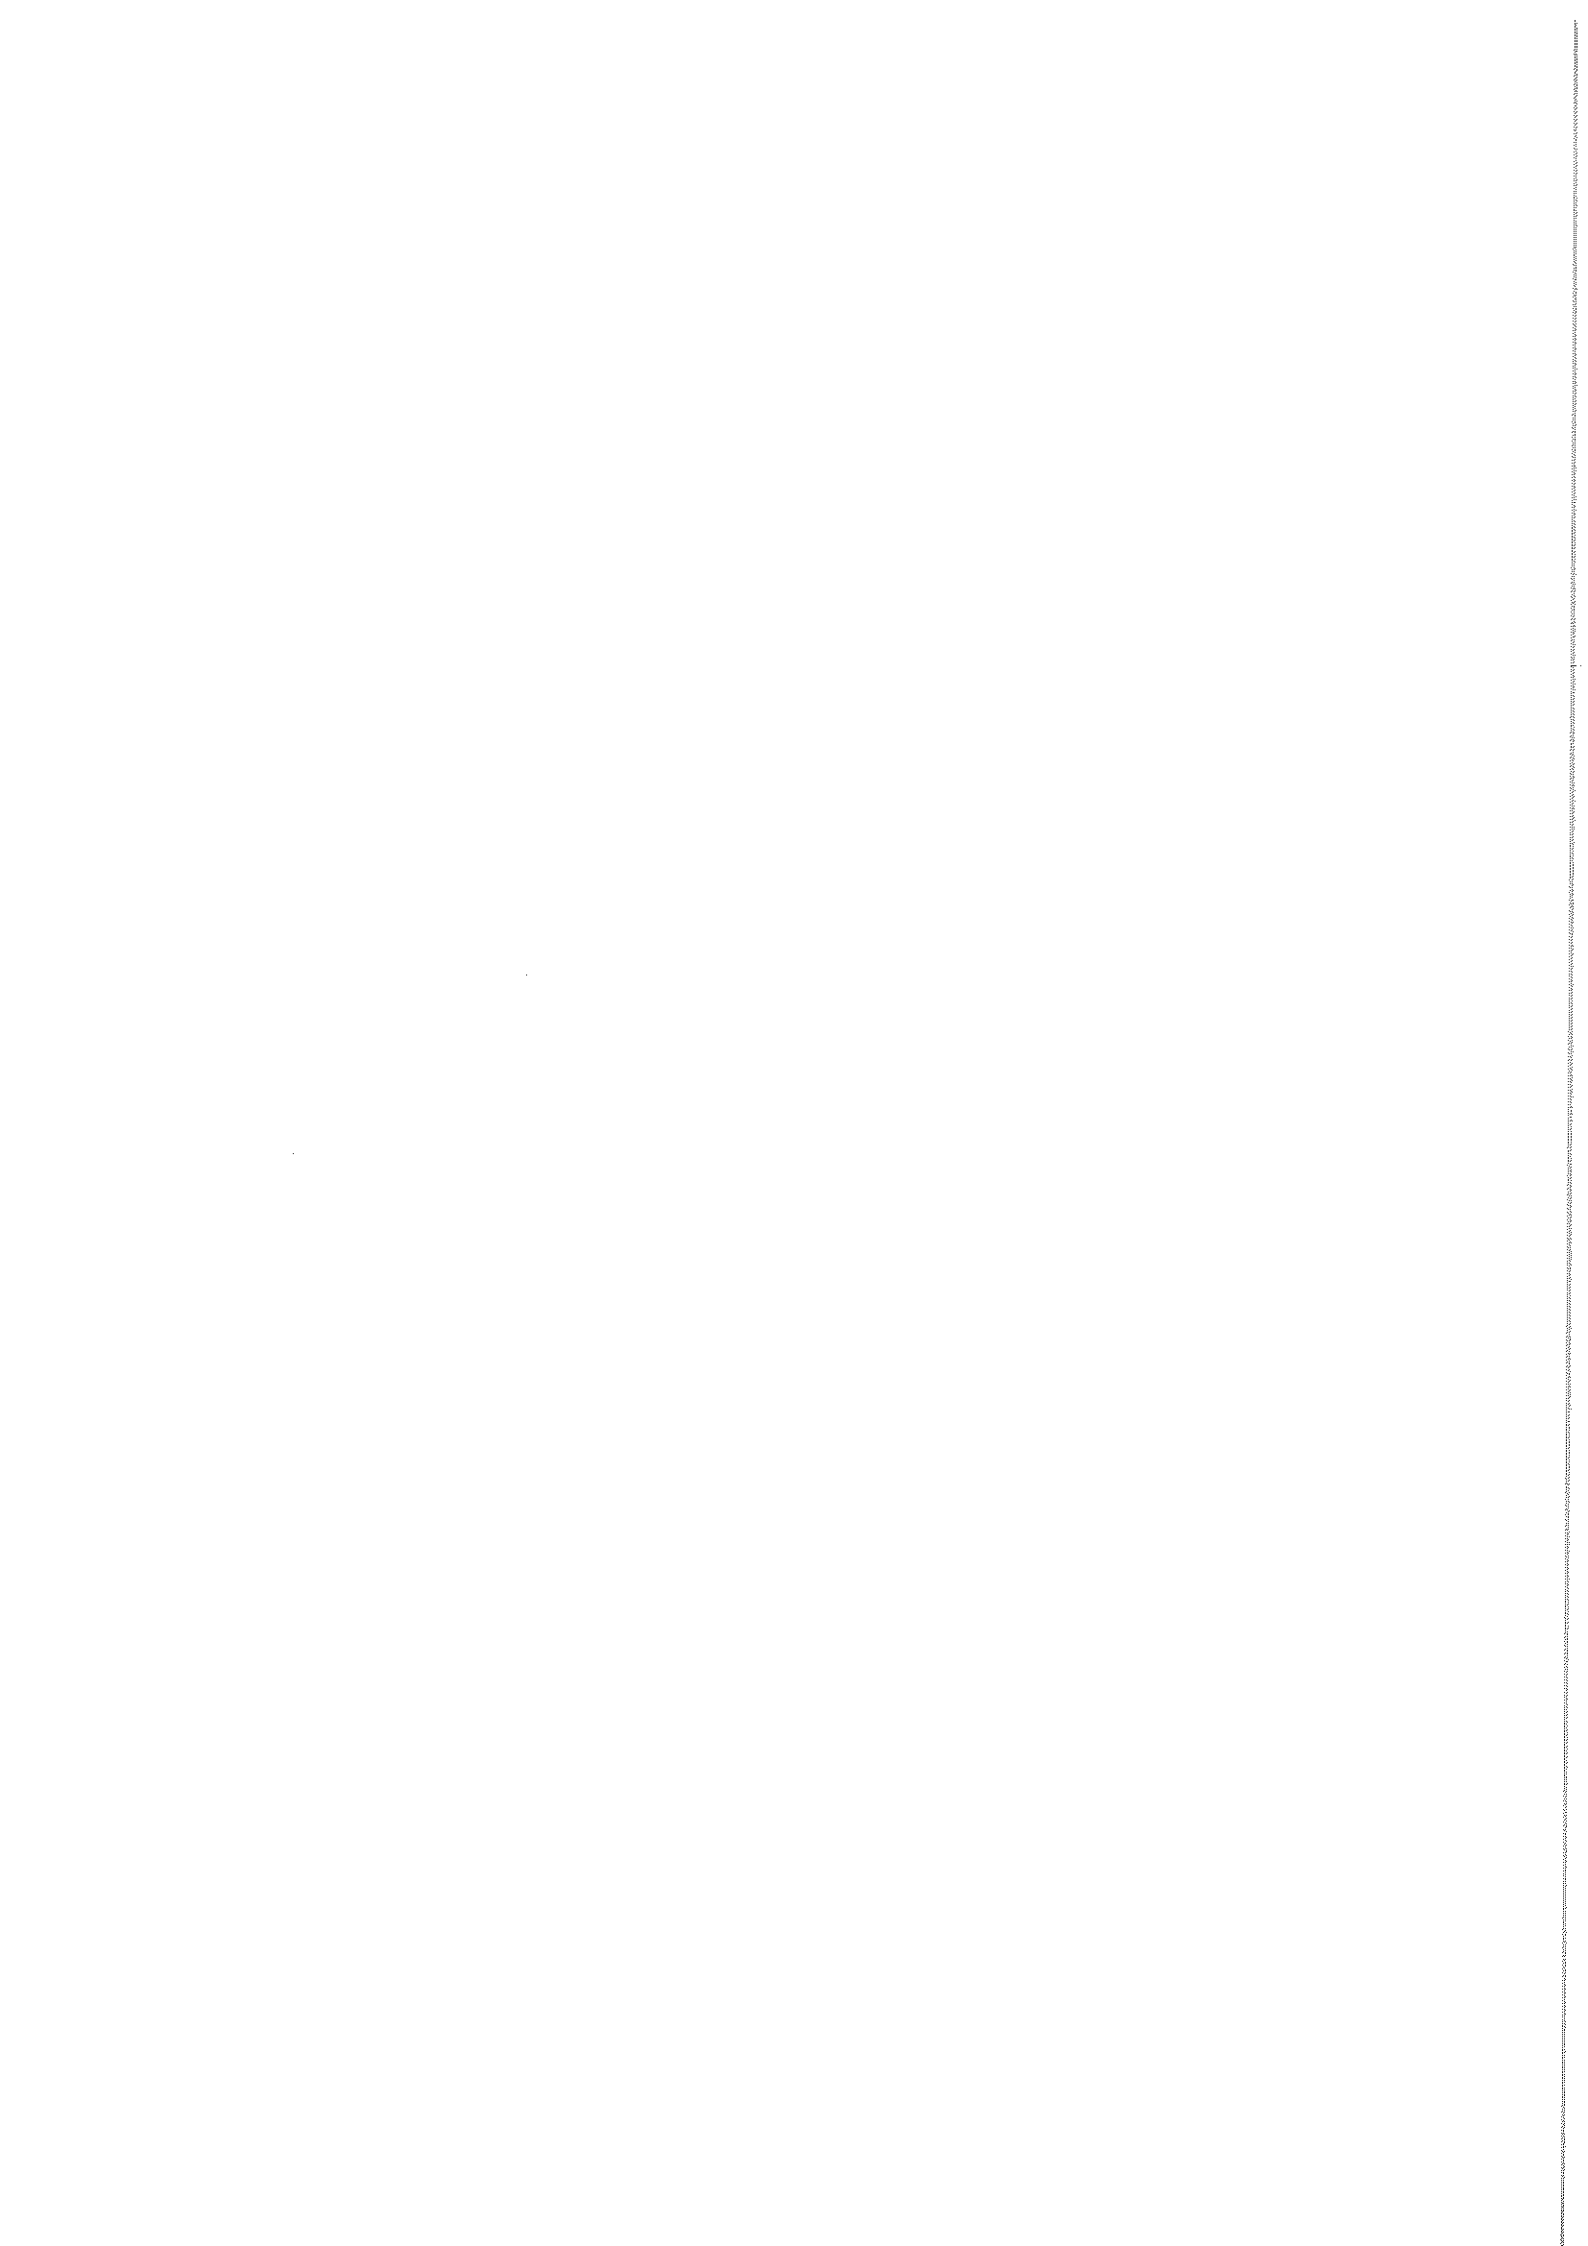

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Udržovací práce na objektu obecní hospody č.p. 46 na p.č. 24, k.ú. Čičenice
O:	
R:	01 Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mn.	cena / MJ	Zjišť. protokol č. 1		Zbývá	
						celkem	mn.		celkem
1	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhrutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 16 mm	m3	7,830	1 181,59	9 251,85	7,830	9 251,85	0,00
2	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky	m2	9,701	94,50	916,74	9,701	916,74	0,00
3	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	100,000	78,48	7 848,00	100,000	7 848,00	0,00
4	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	21,258	29,34	623,71	21,258	623,71	0,00
5	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	28,890	75,60	2 184,08	28,890	2 184,08	0,00
6	622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti I stěn v rozsahu do 100%	m2	3,000	720,90	2 162,70	3,000	2 162,70	0,00
7	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu tř. C 16/20	m3	10,560	3 077,99	32 503,58	10,560	32 503,58	0,00
8	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	10,560	555,30	5 863,97	10,560	5 863,97	0,00
9	631319222	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	10,560	760,50	8 030,88	10,560	8 030,88	0,00
10	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	945,90	1 891,80	2,000	1 891,80	0,00
11	55331156	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 levá,pravá	kus	2,000	1 802,48	3 604,95	2,000	3 604,95	0,00
12	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000	1 159,20	1 159,20	1,000	1 159,20	0,00
13	55331164	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 1600 dvoukřídlá	kus	1,000	2 913,35	2 913,35	1,000	2 913,35	0,00
14	642953221	Osazování dřevěných leštěných dveřních zárubní a rámu dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	2,000	1 159,20	2 318,40	2,000	2 318,40	0,00
15	61182286	zárubeň obložková pro dveře 2křídle atypické 2150x2200mm tl 200 mm	kus	2,000	6 156,00	12 312,00	2,000	12 312,00	0,00

16	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	121,400	106,40	12 916,96	121,400	12 916,96	0,00
17	952901111	Vyčištění budov bytových a občanských výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	169,790	92,40	15 688,60	169,790	15 688,60	0,00
18	958100101	Demontáž zákrty dřevěné desky pro přístup ke dveřím do sklepa (pozn. 5 - bourací práce INP)	kus	1,000	86,40	86,40	1,000	86,40	0,00
19	958100100	Demontáž podlahy podlaží (pozn. 6 bourací práce INP)	m ²	33,840	87,61	2 964,65	33,840	2 964,65	0,00
20	958100100A	Demontáž nosné konstrukce podlaží (pozn. 6 bourací práce INP)	m ²	33,840	64,08	2 168,47	33,840	2 168,47	0,00
21	958100101A	Demontáž stávajícího dřevěného krycího prkna z čelá podlaží (pozn. 7 bourací práce INP)	m	6,500	50,24	326,56	6,500	326,56	0,00
22	958100102	Demontáž dřevěného obkladu zdi (pozn. 8 bourací práce INP)	m	2,500	57,12	142,80	2,500	142,80	0,00
23	958100103	Demontáž obkladu schodišťového stupně (pozn. 10 bourací práce INP)	kus	1,000	96,00	96,00	1,000	96,00	0,00
24	958100104	Demontáž stávající opony podlaží (pozn. 11 bourací práce INP)	kus	1,000	3 296,00	3 296,00	1,000	3 296,00	0,00
25	958100105	Demontáž stávající garnýže vč. závěsů (pozn. 12 bourací práce INP)	kus	11,000	66,08	726,88	11,000	726,88	0,00
26	958100106	Demontáž stávajícího potrubí topení (pozn. 13 bourací práce INP)	m	5,000	164,80	824,00	5,000	824,00	0,00
27	958100107	Demontáž stávající garnýže (pozn. 14 bourací práce INP)	m	7,200	56,08	403,78	7,200	403,78	0,00
28	958100108	Demontáž stávajících dvířek komínového tělesa (pozn. 15 bourací práce INP)	kus	1,000	64,08	64,08	1,000	64,08	0,00
29	958100109	Demontáž stávající přikenné podlahy včetně dřevěného roštu v sále u podlaží	m ²	12,000	87,61	1 051,30	12,000	1 051,30	0,00
30	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	12,000	2 235,99	26 831,90	12,000	26 831,90	0,00
31	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m ²	m ³	2,400	272,40	653,76	2,400	653,76	0,00
32	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	8,360	1 844,00	15 415,84	8,360	15 415,84	0,00

33	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,600	294,00	1 058,40	3,600	1 058,40	3,600	1 058,40	0,00
34	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. přes 2 m2	m2	3,255	227,20	739,54	3,255	739,54	3,255	739,54	0,00
35	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	132,201	7,76	1 025,88	132,201	1 025,88	132,201	1 025,88	0,00
36	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	100,000	7,76	776,00	100,000	776,00	100,000	776,00	0,00
37	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	3,000	51,83	155,50	3,000	155,50	3,000	155,50	0,00
38	997013151	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	39,825	585,89	23 333,11	39,825	23 333,11	39,825	23 333,11	0,00
39	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	39,825	198,00	7 885,35	39,825	7 885,35	39,825	7 885,35	0,00
40	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 001,350	14,13	14 149,08	1 001,350	14 149,08	1 001,350	14 149,08	0,00
41	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	26,400	270,00	7 128,00	26,400	7 128,00	26,400	7 128,00	0,00
42	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	3,650	1 111,50	4 056,98	3,650	4 056,98	3,650	4 056,98	0,01
43	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	14,353	1 111,50	15 953,36	14,353	15 953,36	14,353	15 953,36	0,00
44	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	3,360	198,00	665,28	3,360	665,28	3,360	665,28	0,00
45	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	42,032	328,96	13 826,80	42,032	13 826,80	42,032	13 826,80	0,00
46	731501	D=M nové potrubí k otopnému tělesu vč. izolace a tlakové zkoušky - viz pozn. 4 řez nový stav)	m	5,000	442,00	2 210,00	5,000	2 210,00	5,000	2 210,00	0,00
47	763121438	SDK stěna předosažená tl 150 mm profil CW-UW 100 deska 1xA 15 bez TI EI 15	m2	18,936	2 281,50	43 202,48	18,936	43 202,48	18,936	43 202,48	0,00

48	763131411	SDK pochled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spojný kce profil CD+UD	m2	121,400	608,39	73 858,67	121,400	73 858,67	0,00
49	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	1,763	968,41	1 707,31	1,763	1 707,31	0,00
50	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,700	58,59	99,60	1,700	99,60	0,00
51	764216446	Oplechování rovných parapetů celoplošné lepené z Pz plechu š 500 mm	m	1,710	809,00	1 383,39	1,710	1 383,39	0,00
52	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,006	1 894,01	11,36	0,006	11,36	0,00
53	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	761,00	1 522,00	2,000	1 522,00	0,00
54	61161721	dveře vnitřní hladké dýhované piné 1křídle 800x1970mm	kus	2,000	3 990,00	7 980,00	2,000	7 980,00	0,00
55	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	6,000	1 174,99	7 049,94	6,000	7 049,94	0,00
56	61162419	dveře vnitřní hladké dýhované sklo 2křídle 1450x1970mm	kus	1,000	7 980,00	7 980,00	1,000	7 980,00	0,00
57	61160311	dveře dřevěné vnitřní hladké piné 2křídle atypické 1840x2200mm vč. povrchové úpravy	kus	1,000	17 556,00	17 556,00	1,000	17 556,00	0,00
58	61160312	dveře dřevěné vnitřní hladké piné 2křídle atypické 1970x2200mm vč. povrchové úpravy	kus	1,000	18 102,00	18 102,00	1,000	18 102,00	0,00
59	766660728	D+M dveřního interiérového kování - zámku	kus	8,000	282,00	2 256,00	8,000	2 256,00	0,00
60	766660729	D+M dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	8,000	620,00	4 960,00	8,000	4 960,00	0,00
61	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	2,000	47,90	95,80	2,000	95,80	0,00
62	766662812	Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových	kus	3,000	65,30	195,90	3,000	195,90	0,00
63	766691914	Vyřešení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	8,000	16,20	129,60	8,000	129,60	0,00
64	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	2,000	125,51	251,02	2,000	251,02	0,00
65	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	2,000	138,00	276,00	2,000	276,00	0,00
66	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky přes 10 cm	kus	3,000	168,00	504,00	3,000	504,00	0,00

67	61187501	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 1600mm š 150mm	kus	1,000	192,10	192,10	1,000	192,10	192,10	0,00
68	61187501R	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 1900mm š 150mm	kus	2,000	230,60	461,20	2,000	461,20	461,20	0,00
69	766801810	D+M nové zákrytové desky podlah pro zakrytí vstupu do sklepa 1000/1300 mm vč. povrchové úpravy - pozn. 6 - nový stav	kus	1,000	14 200,00	14 200,00	1,000	14 200,00	14 200,00	0,00
70	766801811	D+M nové podlahy pódia vč. povrchové úpravy - specifikace viz pozn. 7 - nový stav	m2	34,000	800,01	27 200,34	34,000	27 200,34	27 200,34	0,00
71	766801811A	D+M nové nosné konstrukce pódia vč. povrchové úpravy - specifikace viz pozn. 7 - nový stav	m2	34,000	1 673,02	56 882,68	34,000	56 882,68	56 882,68	0,00
72	766801812	D+M nové obložení čela pódia palubkami, vč. povrch. úpravy - specifikace viz pozn. 11 - nový stav	m2	5,500	686,99	3 778,45	5,500	3 778,45	3 778,45	0,00
73	766801813	D+M nové obložení stáv. schodišťových stupňů dřevěnými prkny, vč. povrch. úpravy - specifikace viz pozn. 12 - nový stav	kus	1,000	1 840,00	1 840,00	1,000	1 840,00	1 840,00	0,00
74	766801814	D+M nové obložení schodu dřevěnými prkny, vč. povrch. úpravy - specifikace viz pozn. 16 - nový stav	kus	1,000	1 008,00	1 008,00	1,000	1 008,00	1 008,00	0,00
75	766801815	D+M nové madlo u schodiště, vč. povrch. úpravy specifikace viz pozn. 21 - nový stav	m	1,600	800,00	1 280,00	1,600	1 280,00	1 280,00	0,00
76	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,157	858,00	134,71	0,157	134,71	134,71	0,00
77	767501510	D+M ocelového U profilu pro montáž opony - pozn. 13 - nový stav	m	7,200	672,00	4 838,40	7,200	4 838,40	4 838,40	0,00
78	767501511	D+M nová kovová dvířka vyfřací otvoru komínu, vč. zednického zapravení - pozn. 15 - nový stav	kus	1,000	482,00	482,00	1,000	482,00	482,00	0,00
79	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	97,590	6,02	587,59	97,590	587,59	587,59	0,00
80	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	97,590	22,32	2 178,21	97,590	2 178,21	2 178,21	0,00
81	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	97,590	196,29	19 155,94	97,590	19 155,94	19 155,94	0,00
82	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	5,000	25,29	126,45	5,000	126,45	126,45	0,00
83	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	38,000	88,02	3 344,76	38,000	3 344,76	3 344,76	0,00


84	59761003	dlažba keramická protiskluzná do interiéru přes 9 do 12 ks/m2 - specifikace viz PD	m2	4,370	539,10	2 355,87	4,370	2 355,87	4,370	2 355,87	0,00
85	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	11,438	72,14	825,18	11,438	825,18	11,438	825,18	0,00
86	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	97,590	362,52	35 378,33	97,590	35 378,33	97,590	35 378,33	0,00
87	59761003	dlažba keramická protiskluzná do interiéru přes 9 do 12 ks/m2 - specifikace viz PD	m2	107,349	359,19	38 558,69	107,349	38 558,69	107,349	38 558,69	0,00
88	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	47,880	25,34	1 213,47	47,880	1 213,47	47,880	1 213,47	0,00
89	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	47,880	17,10	818,75	47,880	818,75	47,880	818,75	0,00
90	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	3,410	532,81	1 816,88	3,410	1 816,88	3,410	1 816,88	0,00
91	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	73,000	74,00	5 402,00	73,000	5 402,00	73,000	5 402,00	0,00
92	77551180R	Demontáž dřevěného podkladního roštu	m2	73,000	42,01	3 066,73	73,000	3 066,73	73,000	3 066,73	0,00
93	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	8,444	15,84	133,75	8,444	133,75	8,444	133,75	0,00
94	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	8,444	114,30	965,15	8,444	965,15	8,444	965,15	0,00
95	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	8,444	319,95	2 701,66	8,444	2 701,66	8,444	2 701,66	0,00
96	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,920	9,72	38,10	3,920	38,10	3,920	38,10	0,00
97	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,920	25,91	101,57	3,920	101,57	3,920	101,57	0,00
98	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,920	115,74	453,70	3,920	453,70	3,920	453,70	0,00
99	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	2,040	16,38	33,42	2,040	33,42	2,040	33,42	0,00
100	783406807	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	1,360	21,61	29,39	1,360	29,39	1,360	29,39	0,00
101	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	2,040	54,79	111,78	2,040	111,78	2,040	111,78	0,00
102	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	2,040	178,79	364,74	2,040	364,74	2,040	364,74	0,00
103	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	50,000	18,09	904,50	50,000	904,50	50,000	904,50	0,00
104	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých,	m2	50,000	27,09	1 354,50	50,000	1 354,50	50,000	1 354,50	0,00

105	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	50,000	172,80	8 640,00	50,000	8 640,00	0,00
106	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	77,794	36,00	2 800,58	77,794	2 800,58	0,00
107	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	388,971	10,89	4 235,89	388,971	4 235,89	0,00
108	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	388,971	36,72	14 283,02	388,971	14 283,02	0,00
109	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	388,971	32,40	12 602,66	388,971	12 602,66	0,00
110	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	11 891,32	11 891,32	1,000	11 891,32	0,00
						748 100,00	748 100,00	0,00	0,00

Celkem za objekt:

Roman
Digitálně
podepsal Roman
Kučera

Kučera
Datum: 2020.08.26
07:56:43 +02'00'

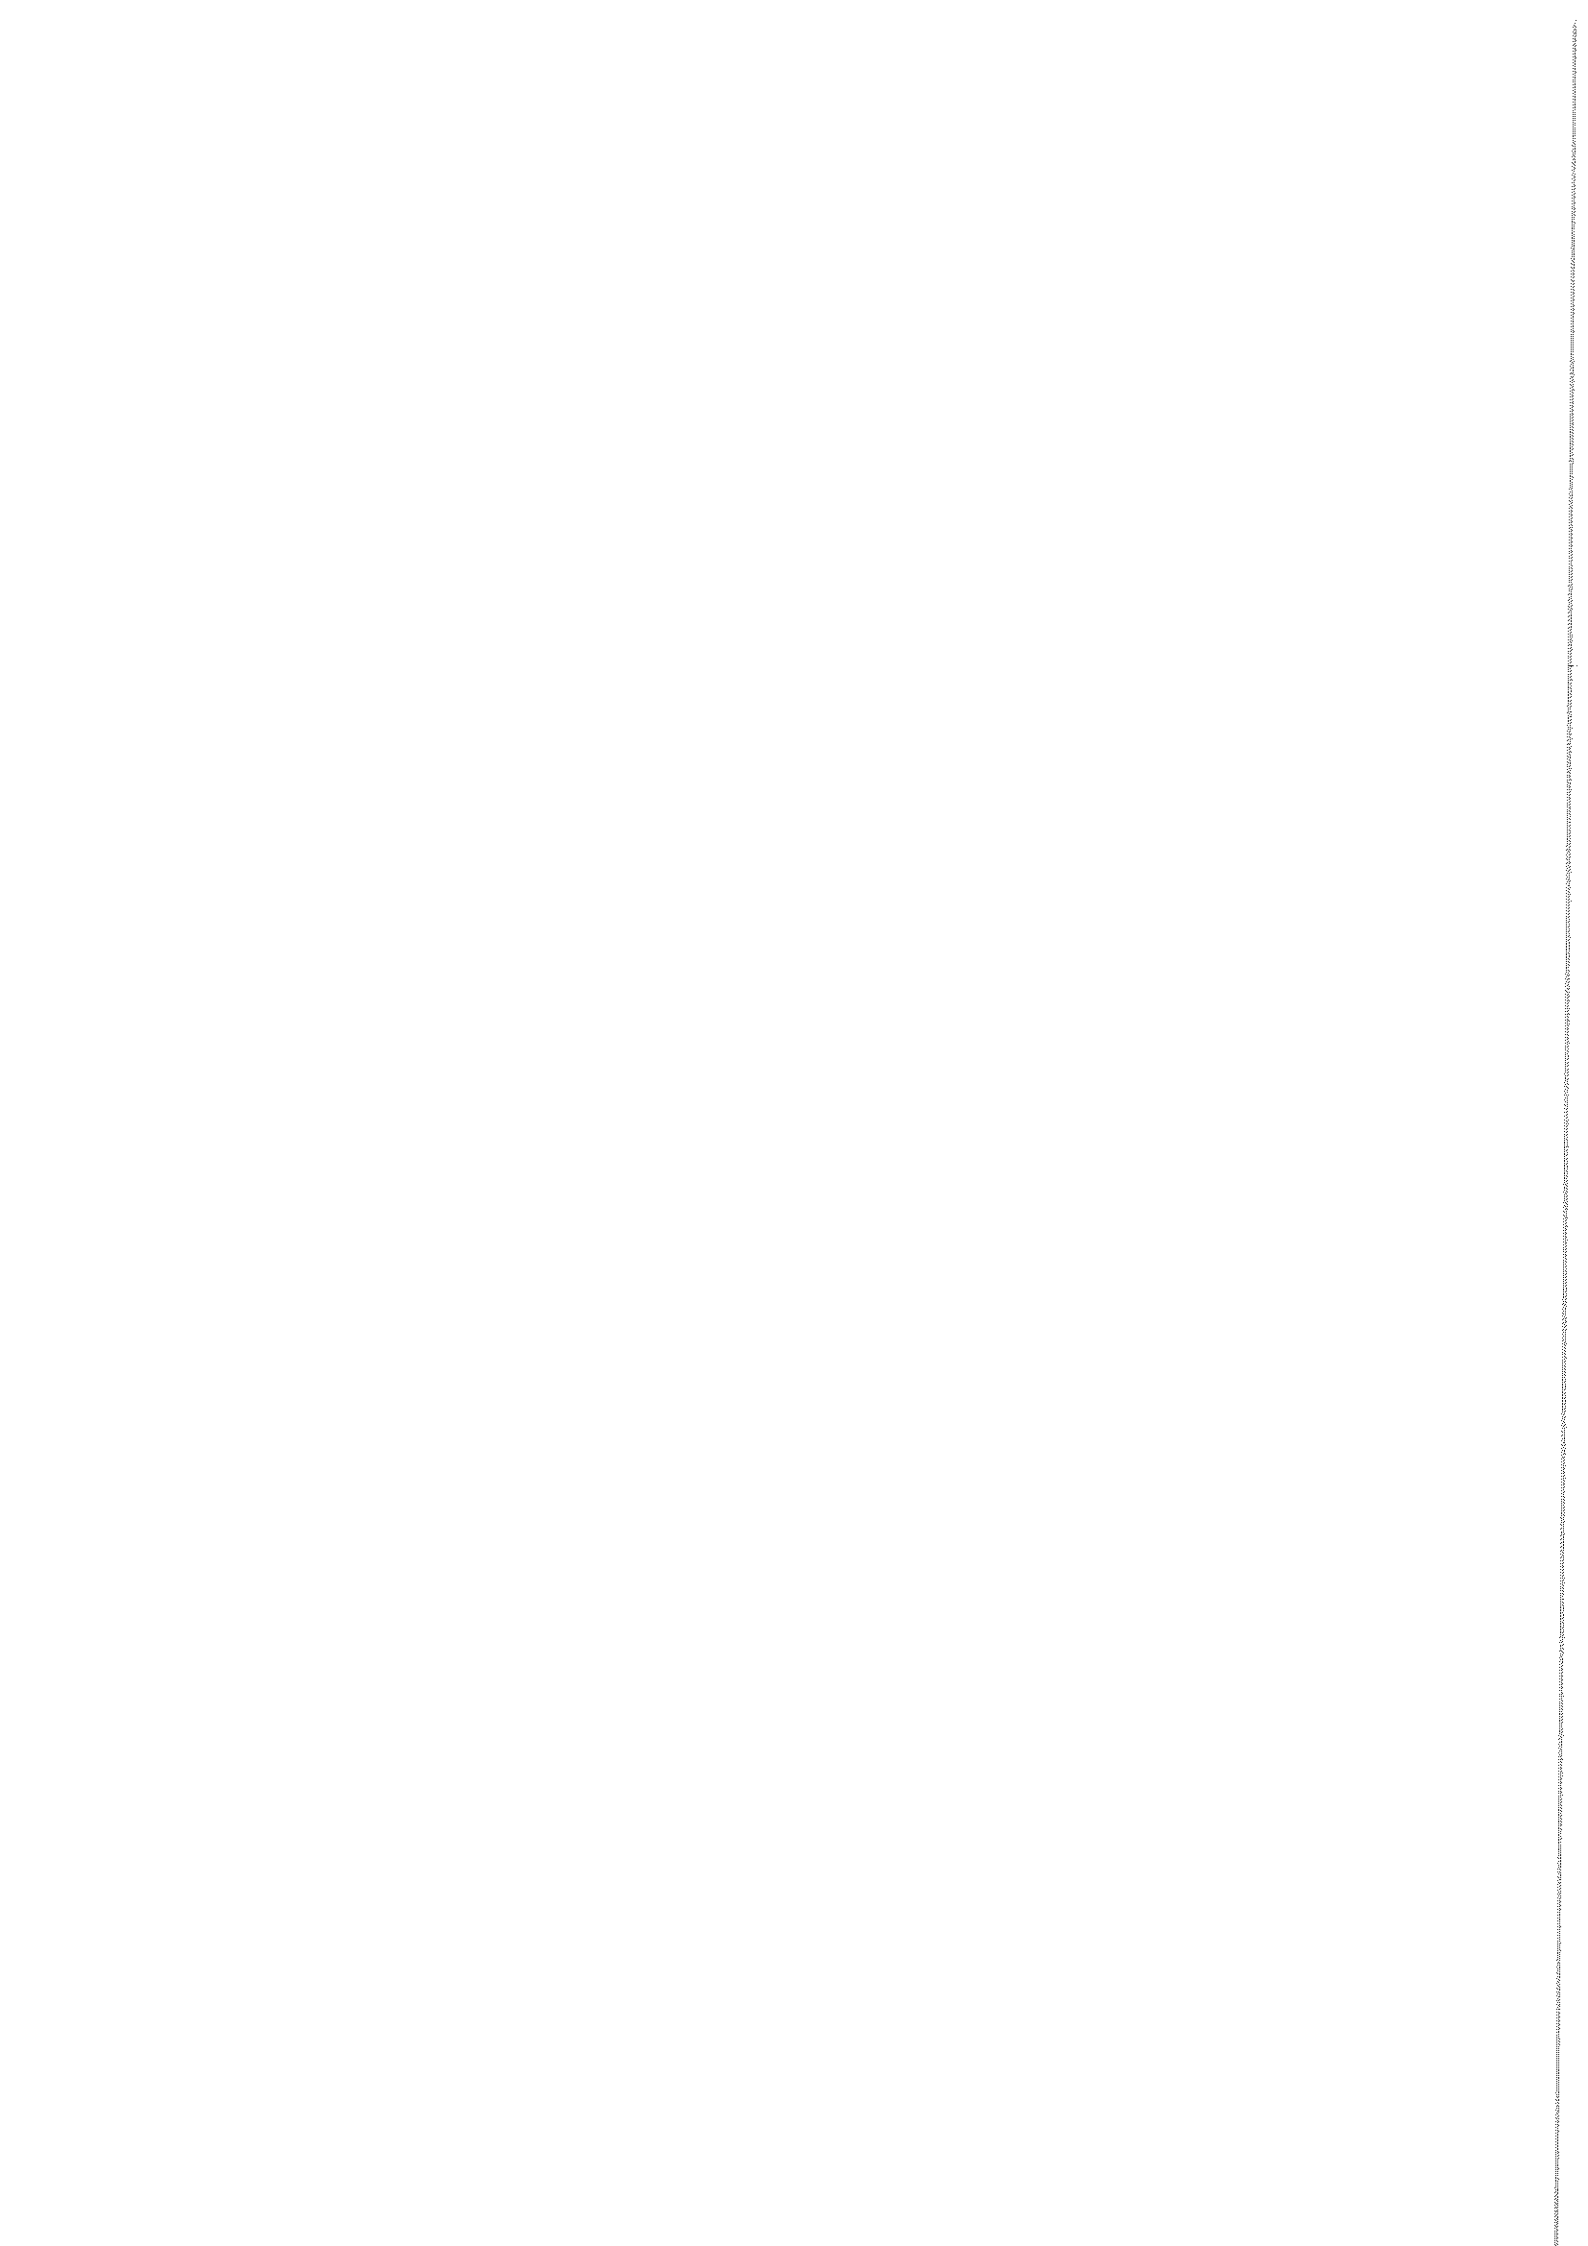

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Udržovací práce na objektu obecní hospody č.p. 46 na p.č. 24, k.ú. Čičenice
O:	
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mn.	cena / MJ	Zjišť. protokol č. 1	
						celkem	Zbývá
1	3411100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm ²	m	3,00000	126,50	379,50	379,50
2	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5	m	70,00000	21,00	1 470,00	1 470,00
3	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm ²	m	80,00000	25,30	2 024,00	2 024,00
4	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm ²	m	85,00000	13,80	1 173,00	1 173,00
5	34142157R	Vodič silový pevné uložení CVA 6,00 mm ²	m	25,00000	20,70	517,50	517,50
6	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	18,00000	40,30	725,40	725,40
7	pol_498	Příchytka Wapro HC-2 pro vázací pásku	kus	100,00000	2,30	230,00	230,00
8	pol_115	Páska stahovací	kus	100,00000	0,50	50,00	50,00
9	35442150R	Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm	kus	6,00000	299,00	1 794,00	1 794,00
10	35443118R	Pásek měděný páska Cu	m	2,00000	30,00	60,00	60,00
11	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg	t	0,03000	7 950,00	238,50	238,50
12	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	5,00000	433,10	2 165,50	2 165,50
13	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	3,60000	311,80	1 122,48	1 122,48
14	pol_201	Rozváděč RP.1, viz výkres 3.1	kpl	1,00000	18 691,00	18 691,00	18 691,00
15	pol_401	Přisazené LED svítidlo, průměr 285mm, 9W, typ: A	kus	7,00000	1 050,00	7 350,00	7 350,00
16	pol_402	LED panel, čtverec, 35W, DALI, typ: B	kus	4,00000	2 880,00	11 520,00	11 520,00
17	pol_403	LED panel, čtverec, 49W, DALI, typ: C	kus	8,00000	3 460,00	27 680,00	27 680,00
18	pol_404	Magnet pro uchycení čtvercového svítidla	kus	46,00000	20,00	920,00	920,00
19	pol_405	Nouzové svítidlo, typ: NZ1	kus	1,00000	860,00	860,00	860,00
20	pol_406	Nouzové svítidlo, EXIT, typ: NZZ	kus	1,00000	989,00	989,00	989,00
21	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	4,00000	156,40	625,60	625,60
22	34535400R	Přístroj strmiče pro otočné ovládání a tlačítkové, spínání	kus	2,00000	2 139,00	4 278,00	4 278,00

23	34551614R	Zásuvka Tango 5519A-A02357	kus	7,00000	218,50	1 529,50	7,00000	1 529,50	0,00
24	34551622R	Zásuvka dvojnásobná Tango 5513A-C02357	kus	4,00000	276,00	1 104,00	4,00000	1 104,00	0,00
25	612403380R00	Hrubá výpiň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	50,00000	54,70	2 735,00	50,00000	2 735,00	0,00
26	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	20,00000	132,50	2 650,00	20,00000	2 650,00	0,00
27	974031121R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	50,00000	71,80	3 590,00	50,00000	3 590,00	0,00
28	210810057R00	Kabel CVKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uloženy	m	3,00000	25,30	75,90	3,00000	75,90	0,00
29	210810046R00	Kabel CVKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uloženy	m	70,00000	23,00	1 610,00	70,00000	1 610,00	0,00
30	210810055R00	Kabel CVKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uloženy	m	85,00000	23,00	1 955,00	85,00000	1 955,00	0,00
31	210810045R00	Kabel CVKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uloženy	m	85,00000	23,00	1 955,00	85,00000	1 955,00	0,00
32	210220321R00	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	6,00000	284,00	1 704,00	6,00000	1 704,00	0,00
33	220270605R00	Mont vodiče av,cy,cya 6 pevně	m	25,00000	23,00	575,00	25,00000	575,00	0,00
34	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	18,00000	48,30	869,40	18,00000	869,40	0,00
35	222111031R00	Skříň rozváděče do 100 p. zasekání v pál.cihlách	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00	1,00000	3 150,00	0,00
36	pol_501	Sestavení rozváděče, odzkoušení, výrobní štítek rozváděče	kpl	1,00000	2 080,00	2 080,00	1,00000	2 080,00	0,00
37	pol_502	Osazení, zapojení, popis kabelů na místě, oživení	kpl	1,00000	230,10	230,10	1,00000	230,10	0,00
38	210200013R00	Svítilno LED, přisazené/nástěnné, typ: A, B, C	kus	19,00000	220,00	4 180,00	19,00000	4 180,00	0,00
39	210200043R00	Svítilno LED, nouzové, typ: NZ1, NZ2	kus	2,00000	228,00	456,00	2,00000	456,00	0,00
40	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	4,00000	50,00	200,00	4,00000	200,00	0,00
41	pol_501	Regulátor osvětlení (stmívač)	kus	2,00000	192,00	384,00	2,00000	384,00	0,00
42	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	7,00000	85,00	595,00	7,00000	595,00	0,00
43	210111014R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení Zx (2P+PE)	kus	4,00000	82,00	328,00	4,00000	328,00	0,00
44	005231010R	Revize výchozí	Soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00	1,00000	2 100,00	0,00
45	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	1,00000	1 200,00	0,00
46	pol_701	Funkční zkoušky elektroinstalace	Soubor	1,00000	800,62	800,62	1,00000	800,62	0,00

Celkem za objekt:

120 920,00

120 920,00

0,00

Digitálně
Roman podepsal Roman
Kučera
Datum: 2020.08.26
07:59:24 +02'00'
