

Návrhový list - vodohospodářské stavby

Druh stavby:

VH

 číslo stavby (Jasanora):

Lesní správa:

Dvůr Králové nad Labem

 Rajón:

703

Informace o dotčených parcelách:

k.ú:	p.p./st.č.:	LV:	omezení pro stavbu:
1. Hynčice u Broumova	506/2	292	ne
2. Ruprechtice u Broumova	1743/1	291	ne
3. Jetřichov	1631	265	ne
4.			
5.			
6.			

Informace o stavbě:

Název VN/úprava VT (IDVT):
Majetkové vztahy (vlastnictví/stav)
INVENT. číslo:

Ruprechtický potok, Hynčice

LČR

vypořádáno

PONT

Název stavby v IMA:
výkon IMA:
zůstatková cena (v IMA):

PONT

Popis současného stavu:

1. současný tech. stav:

Koryto vodního toku Ruprechtický potok v úseku ř.km 0,345 – 0,380 je zazemněno téměř v celé kapacitě průtočného profilu. Kapacita koryta toku je výrazně zmenšena a při větších průtocích dochází k problémům s nátokem do silničního mostu.

2.


ne

Konstrukce vodní nádrže/ opevnění VT:

3. Základní parametry VN/ úpravy VT :

ne

Situační zákres:

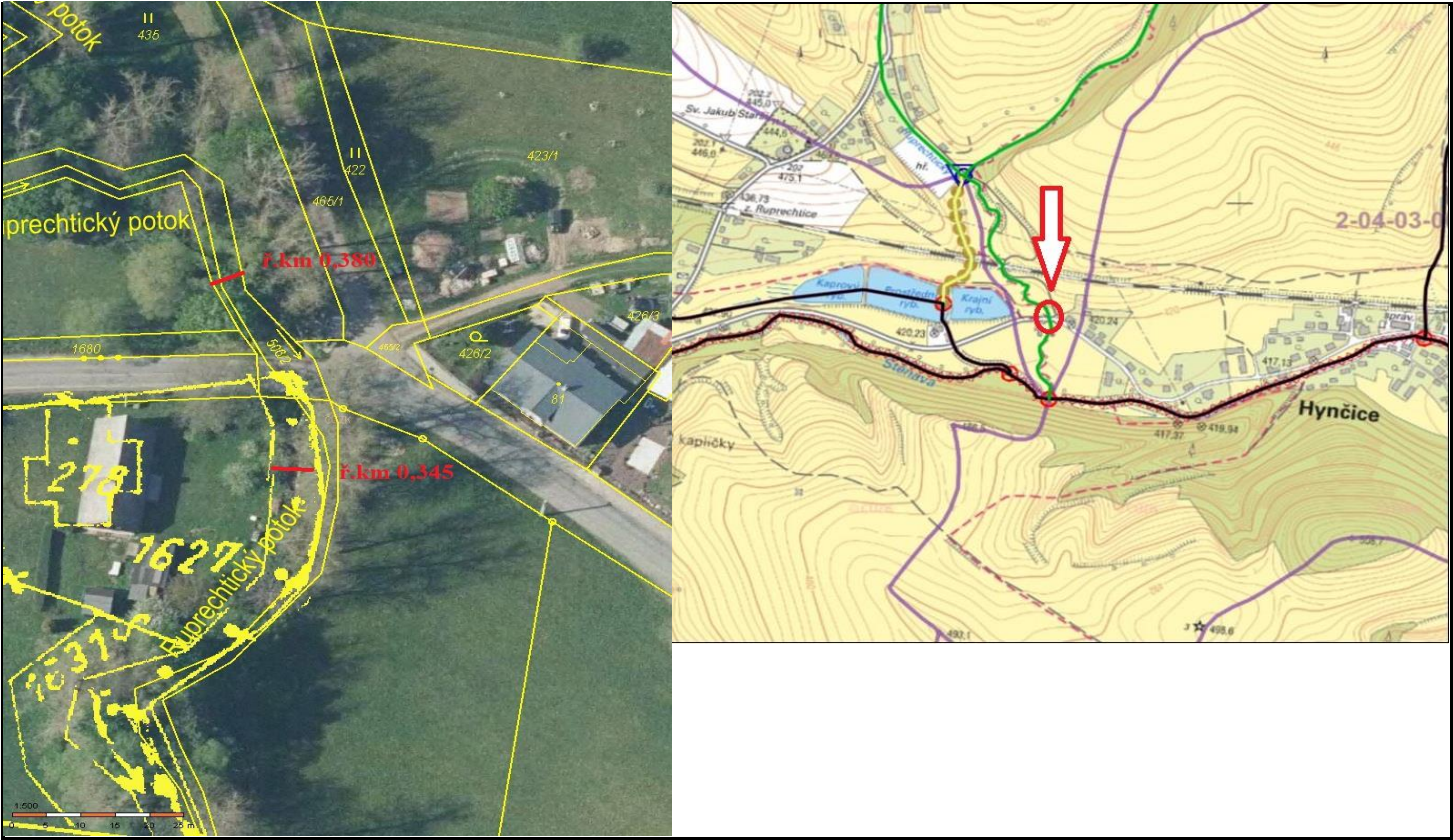

Záměr rozsahu a způsobu provedení stavby:

1. provozní zdůvodnění budoucí potřeby:	Obnovení průtočného profilu koryta VT.
2. stručný popis lokality:	Hranice intravilánu ve východní části obce Obce Hynčice v místě křížení s komunikací III. třídy.
3. technické řešení:	Bude provedeno odstranění sedimentů a naplavenin v množství 20 m3 strojně. Vytěžený materiál bude odvezen a využit jako vedlejší produkt k dalšímu použití – k terénním úpravám. Po dokončení prací budou pozemky urovňány, případně osety travním semenem, a předány majitelům zpět do užívání.

Financování stavby:

Kontrolní rozpočet:	58884
---------------------	-------

cena navržena dodavatelem:

cena:

54700

dodavatel:

SVOBODA24 SMF s.r.o., stavebně mechanizační firma, Hlavňov 24, 549 54 Police nad Metují

rozpočet:

ANO

cena smluvní:

objednávka

Vypracoval:



Datum:

26.10.2022

Fotodokumentace:







