



SITUACE

Lhota - doplnění kanalizačního a vodovodního systému
SO 04 lokalita Polívkov

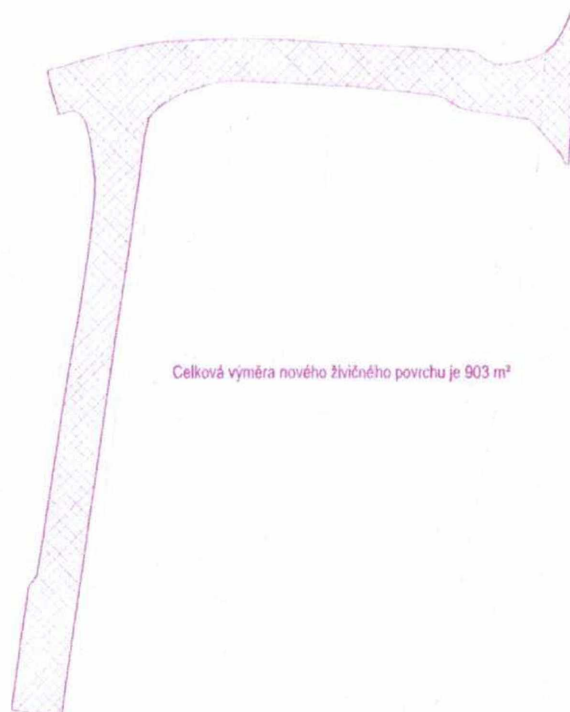

NOVÝ ŽIVIČNÝ POVRCH 903m²

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY

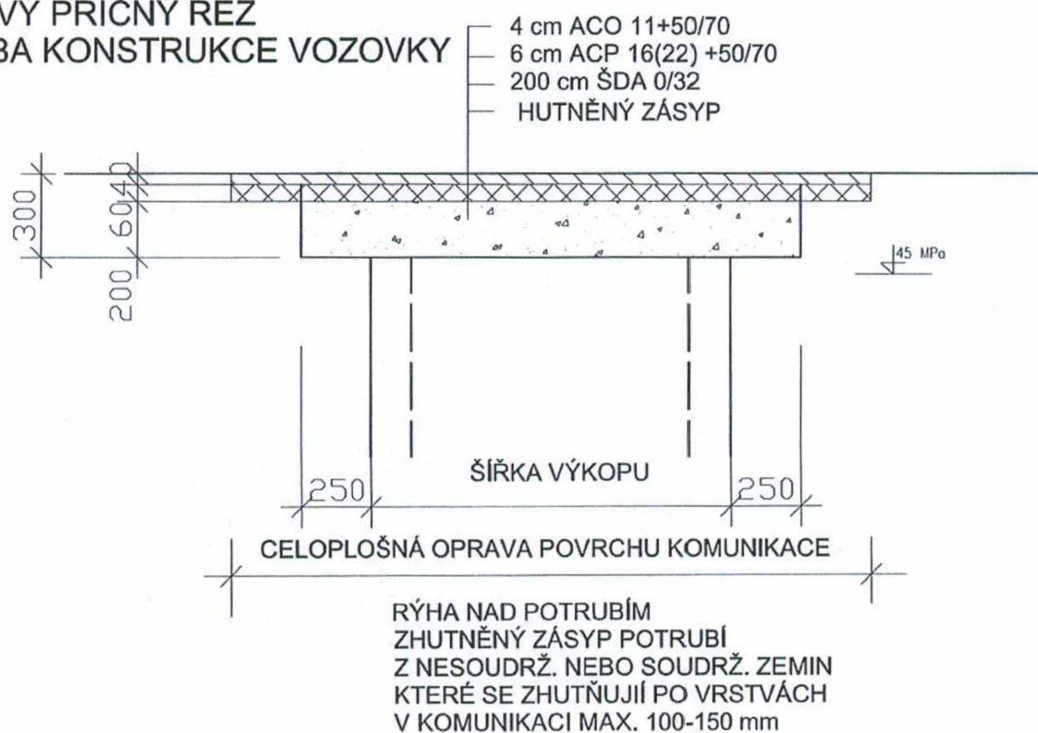

Lhota - doplnění kanalizačního a vodovodního systému
SO 04 lokalita Polívkov











Název projektu: Odkanalizování Lhoty II

Registrační číslo projektu: 

Změnový list č. 13:

Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)

Vyjádření TDS ke Změnovému listu č.13

Předmětem změnového listu č.13 - Při geodetickém vytýčení trasy kanalizace a přeložky vodovodu v lokalitě Polívkov bylo zjištěno, že v ulicích Cedrová, Meduňková a Mátová byl v období realizace projektu se soutěží a realizace stavby proveden živičný kryt na komunikaci s čímž projekt nepředpokládal. Z výše popsaného je nutné pro realizaci kanalizace a přeložky vodovodu odfrézování živičného krytu tl. 40. Vzhledem k porušení více jak poloviny povrchu komunikace a dosti velkému dopravnímu zatížení v části ulice Cedrová po křižovatku s Meduňkovou ulicí a v Meduňkové ulici požaduje správce komunikace v daném úseku celoplošné doplnění živičného krytu ve skladbě podkladní vrstva z ACP 16+ v tl. 60 mm a vrchní obrusná vrstva z ACO 11+ v tl. 40mm s výškovou úpravou poklopů kanalizačních šachet a hrnků vodovodních uzávěrů a hydrantů. Po geodetickém zaměření je plocha provedeného živičného krytu 903m² s tím, že napojení na stávající vjezdy a zelenou plochu bylo provedeno dosypáním a úpravou krajnice ze štěrkodrti v průměrné šířce 25cm a tl. 10cm.

TDS provedl kontrolu předloženého ocenění změnového listu a konstatuje, že je provedeno v souladu s uzavřenou SOD.


Z hlediska průběhu stavby lze konstatovat, že navržené úpravy budou mít vliv na dokončení této části stavby, prodloužení termínu dokončení o 10 dní. Ostatní části stavby nebudou tímto změnovým listem z hlediska termínu dokončení dotčeny.

Tato změna bude mít dopad na náklady, jednak dodávek materiálu, jednak prací spojených s výstavbou. Zvýší hodnotu zakázky dle odsouhlaseného oceněného soupisu prací.

Změna vychází ze skutečného průběhu výstavby a je projednána s provozovatelem. Je zpracovaná a odsouhlasená ADP.

TDS považuje Změnový list č. 13 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

V Plzni dne 16.12.2022



Název projektu: **Odkanalizování Lhoty II**

Registrační číslo projektu: 

Změnový list č. 13:


Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)

Vyjádření AD ke Změnovému listu č.13

Předmětem změnového listu č.13 - Při geodetickém vytýčení trasy kanalizace a přeložky vodovodu v lokalitě Polívkov bylo zjištěno, že v ulicích Cedrová, Meduňková a Mátová byl v období realizace projektu se soutěží a realizace stavby proveden živičný kryt na komunikaci s čímž projekt nepředpokládal. Změnový list řeší obnovu povrchu po stavbě do původního stavu.

AD souhlasí se změnovým listem.

V Plzni dne 16.12.2022



Název projektu: Odkanalizování Lhoty II

Registrační číslo projektu: 

Změnový list č. 13:

Změna uváděná ve změnovém listě se provádí na základě § 222 ZZVZ, odstavce (6)

Vyjádření Objednatele ke Změnovému listu č. 13

Předmětem změnového listu č. 13 je doplnění živičného krytu komunikace v lokalitě Polívkov.

Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že se v ulicích Cedrová, Meduňková a Mátová nachází živičný kryt komunikace, s čímž projektová dokumentace neuvažovala. Z toho důvodu muselo být provedeno odfrézování krytu a následně dle požadavku správce komunikace provedení zpětného doplnění konstrukce komunikace v určených mocnostech a tloušťkách jednotlivých vrstev skladby komunikace.

TDS provedl kontrolu předloženého ocenění změnového listu a konstatuje, že je provedeno v souladu s uzavřenou SOD.

Z hlediska průběhu stavby lze konstatovat, že navržené úpravy budou mít vliv na dokončení této části stavby, prodloužení termínu dokončení o 10 dní. Ostatní části stavby nebudou tímto změnovým listem z hlediska termínu dokončení dotčeny.

Tato změna bude mít dopad na náklady, jednak dodávek materiálu, jednak prací spojených s výstavbou. Zvýší hodnotu zakázky dle odsouhlaseného oceněného soupisu prací.

Změna vychází ze skutečného průběhu výstavby a je projednána s provozovatelem. Je zpracovaná a odsouhlasená ADP.

TDS považuje Změnový list č. 13 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

Objednatel po doporučení ADP a TDS považuje Změnový list č. 13 za oprávněný a z výše uvedených důvodů s ním souhlasí.

V Plzni dne 17.12.2022

