


ZMĚNOVÝ LIST					č. 29	
věc: Lišty k obkladům + tmelení spár silikonem						
Stavba:		Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary				
Objekt:		ASŘ - Stavební část				
Předkládá:		STAVÉR Luže s.r.o.				
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0	listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			2	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Die projektové dokumentace budou nově zbudované betonové schody obloženy keramickou dlažbou. Styk podstupnice se stupnicí bude opatřen hliníkovým ukončovacím profilem.						
1.2 Popis nového řešení:						
Nově vybudované betonové schody budou obloženy keramickou dlažbou. Styk podstupnice se stupnicí bude zakončen originální keramickou dlaždicí=schodovkou.						
2 Zdůvodnění změny:						
Použitím keramické schodovky dojde k dosažení výrazného prodloužení životnosti tohoto detailu schodiště. Dále tímto změnovým listem dojde k narovnání výměr keramické dlažby pro schodiště a k dořešení chybějících položek v SOD rozpočtu.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO			☒	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			☒	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		–	-12 290,40 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	37 492,90 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			25 202,50 Kč	bez DPH	
7 Schválil:						
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Všeslavy - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	07a	Dodatek č. 2 - úprava 11.02.2025
R:	29	ZL č. 29 - lišty k obkladům + tmelení spár silikonem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				25 202,50	
1	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby Příprava a montáž před provedením dlažby, včetně profilu, který pro schodové hrany a ukončení dlažby https://područky.cz/s-cs-urs-2023-01/771161022 Dle SoD: 0,7*3 : 0,8*6 : 0,9*2 Mezisoučet 10*2,65 "hrana stupňů okolo výtahu : 2*(9*1,25) "hrany stupňů nové schodiště - západní šlit : Mezisoučet 32,7	m	57 70000	89,50	5 164,20	SoD
2	771591115	Podlahy spočívání silitonem 1.NP : 90 2.NP : 165	m	255 00000	37,81	9 641,60	URS 24/II x 0,74
3	781492211	Montáž profilu na obkladech lepených flexibilním cementním lepením 1.NP : 12,57	m	53 00000	131,72	6 981,20	URS 24/II x 0,74
4	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot podlahy z dlaždic stanovený zhmotností přesunovacího prostředku s maximální výpravou vzdáleností do 50 m v objektech s výškou přesahující do 12 m https://područky.cz/s-cs-urs-2023-01/998771102	t	0 01800	539,50	9,70	SoD
5	59054133	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů, blisk leskle eloxovaný chromem 10x2500mm profil ukončovací pro vnější hrany obkladů, blisk leskle eloxovaný chromem 10x2500mm Dle SoD: množství*koeficient 57,7*1,1 : 63,47*1,1 Přepočtené koeficientem množství -69,817 Mezisoučet 64,13990	m	-5 68700	331,50	-1 885,20	SoD
6	59761003	dlažba keramická kulná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 dlažba keramická kulná, hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 množství* zvýšený koeficient 21,5*0,28*1,25 "stupnice" : 7,53 Mezisoučet 31,22 Celková výška dlažby : 34,64	m2	-17 47000	300,00	-5 241,00	SoD
7	59761085	schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný II do 10mm š přes 250 do 300mm dl do 300mm 10*2,65 "hrana stupňů okolo výtahu : 10*2,65*1,1 2*(9*1,25) "hrany stupňů nové schodiště - západní šlit : 2*(9*1,25)*1,1 Mezisoučet 29,15000 24,78000	m	53 90000	387,02	20 860,40	URS 24/II x 0,74
Celkem						25 202,50	

PŮDORYS 1.NP - nový stav

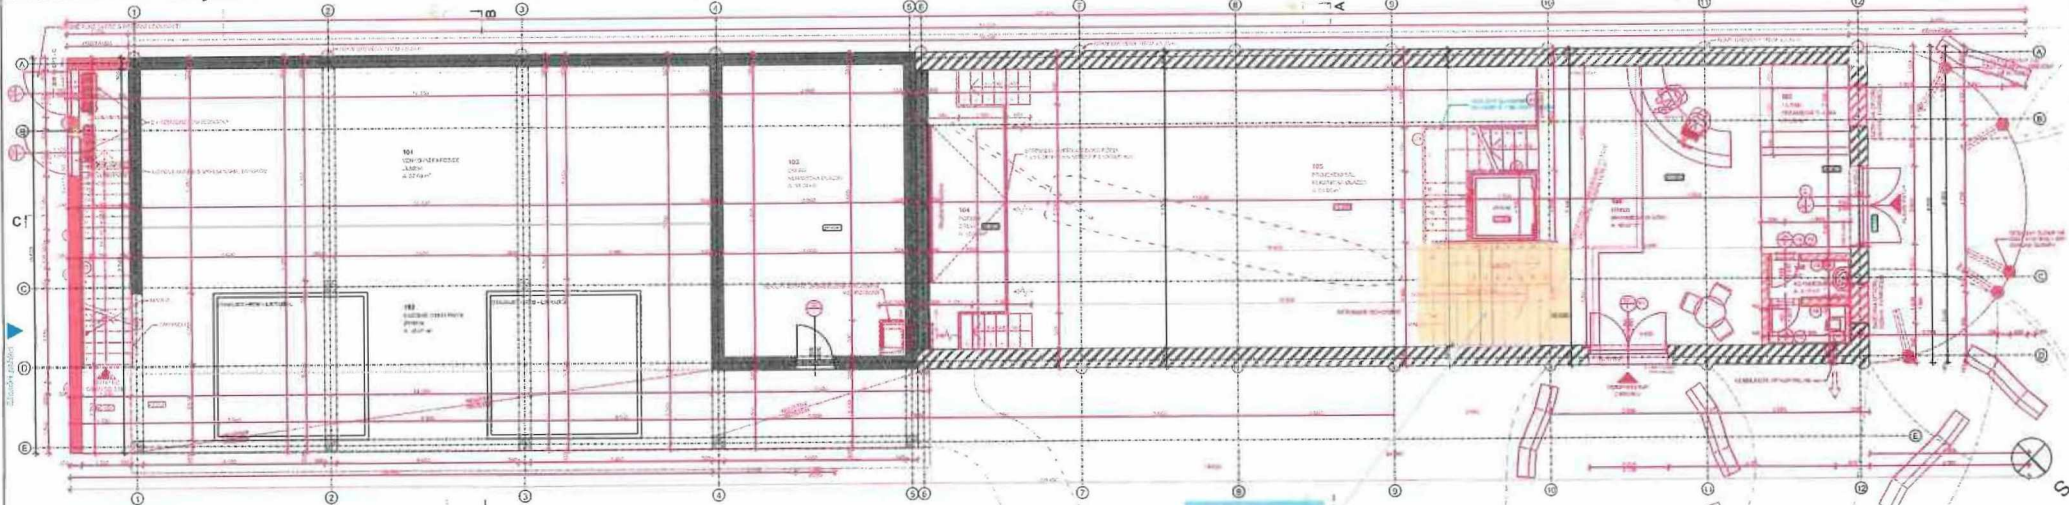

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ

	beton
	keramická cihla
	tepelná izolace
	omítka
	podlahová krytina
	obložení stěn
	obložení stropu
	sklo
	kov
	dřevo

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ

	beton
	keramická cihla
	tepelná izolace
	omítka
	podlahová krytina
	obložení stěn
	obložení stropu
	sklo
	kov
	dřevo

ČÍSLO	NÁZEV MATERIÁLU	PODROBNOSTI	POZNÁMKA
1	beton	stěny, sloupky	
2	keramická cihla	stěny	
3	tepelná izolace	stěny, strop	
4	omítka	stěny, strop	
5	podlahová krytina	podlaha	
6	obložení stěn	stěny	
7	obložení stropu	strop	
8	sklo	okna, dveře	
9	kov	okna, dveře	
10	dřevo	okna, dveře	

POZNÁMKA

Podrobnosti a specifikace materiálů a konstrukcí jsou uvedeny v příloze a v technické specifikaci. Všechny materiály a konstrukce musí být provedeny podle požadavků a specifikací uvedených v této příloze a v technické specifikaci. Všechny materiály a konstrukce musí být provedeny podle požadavků a specifikací uvedených v této příloze a v technické specifikaci.

TABULKA REVIZÍ PD

ČÍSLO	DATA	POZNÁMKA
1		
2		
3		
4		
5		

LEGENDA STAVBY

	beton
	keramická cihla
	tepelná izolace
	omítka
	podlahová krytina
	obložení stěn
	obložení stropu
	sklo
	kov
	dřevo



PROJEKTANT	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT	ARCHITEKTURA

PŘÍSTAVBA A NASTAVENÍ PODLAHY SE ZMĚNOU
UVEDENÉ OBJEKTY SOUČASNĚ - ARCHITEKTURA
STAVBY A NASTAVENÍ PODLAHY SE ZMĚNOU
UVEDENÉ OBJEKTY SOUČASNĚ - ARCHITEKTURA

PŮDORYS 1.NP - nový stav

D 1.134

PUDORYS 2.NP - nový stav

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ

LEGENDA STÁVAJÍCICH MATERIÁLŮ

POZNAMKA

TABULKA REVIZI P0

PRÍLOHA A

PUDORYS 2.NP - nový stav

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST				č. 30	
věc: Vybavení wc pro imobilní osoby					
Stavba:		Rozšíření expozice v Archeoparku Všešary			
Objekt:		ZTI - Zdravotechnika			
Předkládá:		STAVER Luže s.r.o.			
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		1	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V projektové dokumentaci bylo vybavení WC pro invalidy řešeno pouze z části a vybavení WC, které vyplývalo z požadavku NIPI, nebylo zapracováno do PD a SOD rozpočtu.					
1.2 Popis nového řešení:					
V prostoru WC invalidé budou nainstalována potřebná nerezová madla k WC míse a dále bude tato místnost vybavena doplňky typu zrcadlo, zásobník papírových ručníků apod...					
2 Zdůvodnění změny:					
WC pro invalidy musí být vybaveno příslušnými madly u WC mísy, oddáleným tlačítkem pro splachování, zrcadlem a dále je pak vhodné, aby byl prostor WC vybaven ostatními běžnými doplňky v podobě zásobníku na papír apod...Jedná se částečně o chybu v projektové dokumentaci a částečně o chybu v SOD rozpočtu.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐ ANO		☒ NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒ NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 6	
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	12 382,10 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			12 382,10 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	07a	Dodatek č. 2 - úprava 11.02.2025
R:	30b	ZL č. 30 - vybavení wc pro imobilní osoby - 20.2.2025

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 725		Zařizovací předměty				9 199,80	
1	725291551R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezové držáky tekutého mydla na 350 ml - ozn. A3	soubor	1,00000	1 312,50	1 312,50	SoD
2	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezové držáky tekutého mydla na 350 ml - ozn. A4	soubor	1,00000	1 897,50	1 897,50	SoD
3	725291662R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - nerezové provedení štěrky WC volně stojící - ozn. A7	soubor	1,00000	1 125,00	1 125,00	SoD
4	725291678	Montáž madla invalidního křesla	ks	1,00000	174,60	174,60	URS 250 x 0,74
5	725291679	Montáž madla invalidního křesla - sklápěcího	ks	1,00000	181,30	181,30	URS 250 x 0,74
6	725291680	Madlo invalidní krakorcové - nerez lesk 900mm	ks	1,00000	1 790,80	1 790,80	URS 250 x 0,74
7	725291681	Madlo invalidní krakorcové - sklápěcí s držákem toaletního papíru nerez lesk 813mm	ks	1,00000	2 627,00	2 627,00	URS 250 x 0,74
8	725291682	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	91,08700	1,00	91,10	SoD
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				3 182,30	
9	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým lepidlem na keramický obklad	m2	0,40000	445,00	178,00	SoD
10	63465122.A5	Zrcadlo čtvereční 3mm max (označení 500 x 800 mm - ozn. A5)	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	SoD
11	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,00800	539,50	4,30	SoD
Celkem						12 382,10	

This architectural floor plan depicts a restaurant layout. The plan is rectangular with a prominent curved section on the right side. The layout includes several dining areas with tables and chairs, a central service area, and a curved bar or reception area at the far right. The plan is annotated with various labels in Russian, such as 'Зона обслуживания' (Service Zone), 'Зона приготовления пищи' (Food Preparation Zone), and 'Зона хранения' (Storage Zone). Dimensions and room numbers are also indicated throughout the plan.

[illegible]

	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA
	CELANO, KAMPIONE, BIELLO, IL NOVO MONDO (1957/1972) FRANCIA

PROGRAMOWANIE WYSTĘPÓW						
№	NAZWA WYSTĘPU	REPERT	PROGRAM	STREFA	STREFA	POZIOMY
1	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
2	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
3	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
4	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
5	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
6	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
7	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
8	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
9	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
10	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
11	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
12	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
13	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
14	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
15	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
16	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
17	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
18	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
19	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
20	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
21	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
22	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
23	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
24	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
25	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
26	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
27	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
28	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
29	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
30	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
31	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
32	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
33	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
34	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
35	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
36	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
37	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
38	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
39	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
40	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
41	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
42	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
43	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
44	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
45	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
46	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
47	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
48	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
49	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
50	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
51	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
52	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
53	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
54	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
55	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
56	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
57	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
58	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
59	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
60	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
61	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
62	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
63	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
64	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
65	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
66	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
67	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
68	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
69	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
70	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
71	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
72	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
73	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
74	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
75	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
76	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
77	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
78	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
79	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
80	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
81	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
82	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
83	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
84	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
85	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
86	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
87	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
88	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
89	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
90	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
91	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
92	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
93	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
94	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
95	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
96	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
97	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
98	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
99	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000
100	WYSTĘP	1000	WYSTĘP	1000	1000	1000

[illegible][illegible][illegible]

PRISÍJAVBA A NASTAVBA SPOJENÁ SE ZM
UŽÍVÁNÍ OBJEKTU SO 02, SO 00 - ARCHÉ
51, p.č. 791/792 a p.p.č. 31643, 3434 k.ú. Všecký
ARCHITEKTONICKO STAVBY A RST (tr)



ARCN
AFLA

	1997-1998	1998-1999
Suburban	58.20%	
Suburban	44%	
Urban	42.00%	
Urban	47%	

Topic:	22/5/20
Code system:	D 1.1.4


ZMĚNOVÝ LIST				č. 31	
věc: Oprava komunikace po zhotovení přípojky elektro					
Stavba:		Rozšíření expozice v Archeoparku Věstary			
Objekt:		ASŘ - Stavební část			
Předkládá:		STAVÉR Luže s.r.o.			
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		1	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V projektové dokumentaci nebylo uvažováno s realizací okolních zpevněných ploch v souvislosti s novou přípojkou elektro.					
1.2 Popis nového řešení: Po zhotovení nové elektro přípojky bude předlážděna část přístupové komunikace jenž je tvořena betonovou zámkovou dlažbou.					
2 Zdůvodnění změny:					
Jelikož elektro přípojka byla, dle PD, vedena přes příjezdovou komunikace do Archeoparku, bylo tedy nutné po její realizaci uvést příjezdovou komunikaci zpět do původního stavu. Práce spojené s uvedením komunikace zpět do původního stavu chyběly v SOD rozpočtu a jedná se tedy o chybu v PD/ SOD rozpočtu.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				☐ ANO	☒ NE
4 Dopad do smluvních termínů:				☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	3 352,40 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		3 352,40 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	07a	Dodatek č. 2 - úprava 11.02.2025
R:	31a	ZL č. 31 - oprava komunikace po zhotovení přípojky elektro - úprava 19.2.2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				803,60	
1	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně <i>pro zhotovení přípojky elektro : 5*1,2</i>	m2	6,00000	133,94	803,60	URS 25/I x 0,74
				6,00000			
Díl: 5		Komunikace				2 406,50	
2	460891221	Osazení betonového obrubníku silničního stojatého do betonu při elektromontážích <i>po realizaci elektro přípojky : 2</i>	m	2,00000	206,46	412,90	URS 25/I x 0,74
				2,00000			
3	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 <i>po zhotovení přípojky elektro : 5*1,2</i>	m2	6,00000	332,26	1 993,60	URS 25/I x 0,74
				6,00000			
Díl: 998		Přesun hmot				142,30	
4	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným <i>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	t	0,76600	185,74	142,30	URS 25/I x 0,74
Celkem						3 352,40	

KOORDINAČNÍ SITUACE

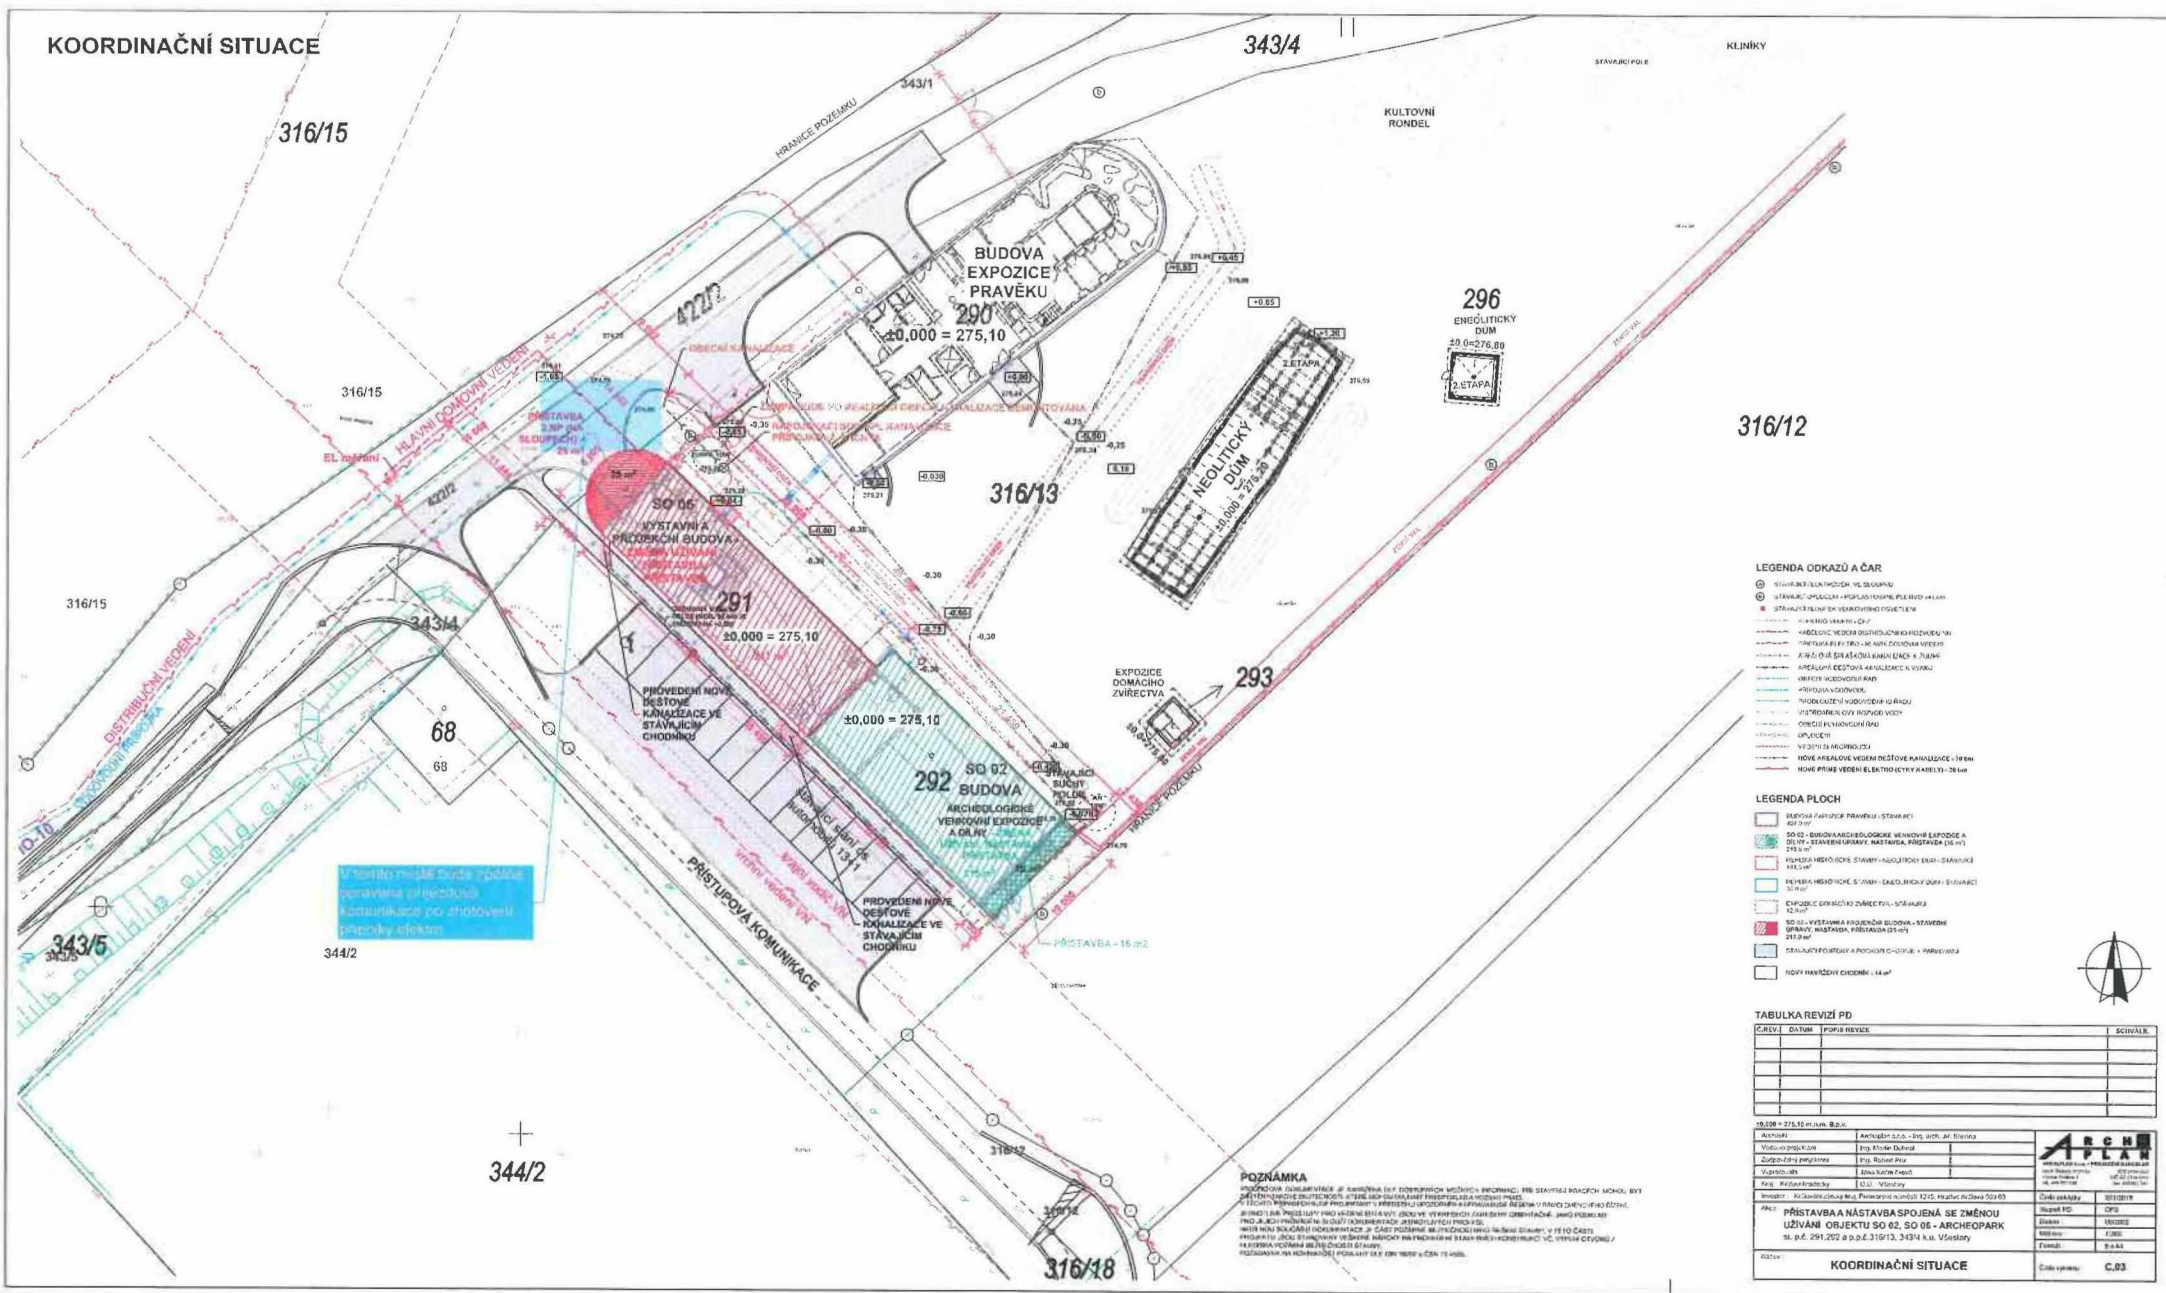

ZMĚNOVÝ LIST					č. 32	
věc: 1.N.P., úprava stávajících betonových mazanin						
Stavba:		Rozšíření expozice v Archeoparku Věstary				
Objekt:		ASŘ - Stavební část				
Předkládá:		STAVÉR Luže s.r.o.				

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny		1 listů		
e-mailem	☒	2) Projektové podklady		0 listů, výkresů		
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		1 listů		

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
Projektová dokumentace úpravy stávající podlahy v 1.N.P., před pokládkou keramické dlažby, neřešila.

1.2 Popis nového řešení:
Stávající betonové podlahy v místnostech č. 103, 104, 105 budou před pokládkou keramické dlažby zbrušeny do přijatelné rovinnosti. Zbrusení se musí provést kvůli zvýšené křivosti stávajících podlah. V místnosti č. 103 se navíc provede vyrovnaní podlahy nivelační hmotou po samotném zbrusení.

2 Zdůvodnění změny:
Práce obsažené v tomto změnovém listu se musí provést z důvodu nepřijatelné křivosti stávajících podlah v dotčených místnostech. Bez provedení těchto prací by nešlo provést pokládku nové keramické dlažby v přijatelné kvalitě/rovinatosti. Dále změnovým listem dojde k narovnání špatných výměr pro pokládku a dodávku keramické dlažby v 1.N.P.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐ ANO	☒ NE	
--	------------------------------	--	--

4 Dopad do smluvních termínů:	☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE	
--------------------------------------	--	--	--

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5
--	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	49 731,80 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			49 731,80 Kč bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	07a	Dodatek č. 2 - úprava 11.02.2025
R:	32a	ZL č. 32 - 1.NP, úprava stávajících betonových mazanin - úprava 19.2.2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				49 731,80	
1	771121011	Nátěr penetrační na podlahu Práce před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011 M.č. 104 : 15,28	m2	15,28000	47,30	722,70	SoD
2	771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem M.č. 103, 104, 105 : 34,04+15,28+94,06	m2	143,38000	213,00	30 539,90	Vlastní
3	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574112 M.č. 104 : 15,28	m2	15,28000	500,50	7 647,50	SoD
4	776141112	Vyrovnaní podkladu podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm M.č. 103 : 7,5	m2	7,50000	298,22	2 236,70	URS 24/II x 0,74
5	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stávající zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771102	t	0,49000	539,50	264,40	SoD
6	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 15,28*1,1*1,1 : 18,49	m2	18,49000	450,00	8 320,50	SoD
Celkem						49 731,80	

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST				č. 33	
věc: Kobercové čtverce na podium a schody					
Stavba:		Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary			
Objekt:		ASŘ - Stavební část			
Předkládá:		STAVÉR Luže s.r.o.			
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		1	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Povrchová úprava pódia v místnosti č. 104 nebyla součástí PD. Řešena byla pouze její nepohledová nosná kce.					
1.2 Popis nového řešení:					
V 1.N.P., místnost č. 104, bude nainstalováno přednáškové pódium, které bude opatřeno zátěžovým kobercem.					
2 Zdůvodnění změny:					
Jelikož přednáškové pódium navržené v PD nelze provozovat bez povrchové krytiny, musí se tedy pódium opatřit krytinou v podobě zátěžového koberce. Jedná se o chybu v projektové dokumentaci a SOD rozpočtu.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐ ANO		☒ NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒ NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-44 813,40 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	54 684,60 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		9 871,20 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S	039	Všešary - rozšíření expozice v Archeoparku
IO	07a	Dodatek č. 2 - úprava 11.02.2025
R	83	Zl. č. 33 - koberecové čtverce na podium a schody

Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / Mj	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				-5 334,00	
1.766221120	D+M dřevěného schodiště -1,500/-0,500 pro přístup na podium - stupnice, podstupnice, schodnice vč. povrchové úpravy, kolování, spojovacího materiálu	ks	-2,00000	8 000,00	-16 000,00	ScD

D+M dřevěného schodiště -1,500/-0,500 pro přístup na podium - stupnice, podstupnice, schodnice vč. povrchové úpravy, kolování, spojovacího materiálu
2.104/105 - podium (projekt č.3)

2.766221120x	D+M dřevěného schodiště -1,500/-0,500 pro přístup na podium - stupnice, podstupnice, schodnice vč. povrchové úpravy, kolování, spojovacího materiálu	ks	2,00000	5 333,00	10 666,00	Vlastní
--------------	--	----	---------	----------	-----------	---------

D+M dřevěného schodiště -1,500/-0,500 pro přístup na podium - stupnice, podstupnice, schodnice vč. povrchové úpravy, kolování, spojovacího materiálu
2.104/105 - podium (projekt č.3)

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				-11 965,70	
3.767541121	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 600 do 700 mm	m2	15,28000	1 102,60	16 847,70	URS 24/II x 0,74

104 - podium

4.767541122	Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 700 do 800 mm	m2	-15,28000	1 560,00	-23 836,80	SoD
-------------	--	----	-----------	----------	------------	-----

Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 700 do 800 mm
104 - podmínky, úprava rozřazení/URS 2004 104/767541122
15,28 "104 - podium"

5.767541911	Zakopání čela pódia výšky 200 mm vč. povrchové konstrukce	m2	-2,36000	1 200,00	-2 836,00	SoD
-------------	---	----	----------	----------	-----------	-----

Zakopání čela pódia výšky 200 mm vč. povrchové konstrukce
Díl: SoD
6.311 0+2*(1.2*0,7) "104 - podium 6.311"
Skupovina: 6.3110+2*1.2*0,7

6.767541912	Finisová hmotnostní podlažní konstrukce v obkladech v přes 6 do 12 m	t	0,00000	1 700,00	-141 180,00	
-------------	--	---	---------	----------	-------------	--

Finisová hmotnostní podlažní konstrukce v obkladech v přes 6 do 12 m
Finisová hmotnostní podlažní konstrukce v obkladech v přes 6 do 12 m

7.60721002	deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana AI, horní strana AI II 30mm 600x600mm	m2	-2,47800	999,00	-2 475,50	ScD
------------	--	----	----------	--------	-----------	-----

deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana AI, horní strana AI II 30mm 600x600mm

Díl: 776	Podlahy povlakové				27 170,90	
-----------------	--------------------------	--	--	--	------------------	--

8.Pol.VL01	Montáž koberecových čtverců na podium vč. fixačního lepidla	m2	15,28000	265,00	4 049,20	Vlastní
------------	---	----	----------	--------	----------	---------

104 - podium 104

9.Pol.VL02	Ukonečovací schodová hrana	m	24,30000	159,00	4 106,70	Vlastní
------------	----------------------------	---	----------	--------	----------	---------

10.Pol.VL03	Montáž schodů z koberce	ks	8,00000	540,00	4 320,00	Vlastní
-------------	-------------------------	----	---------	--------	----------	---------

11.Pol.VL04	Montáž soklu z koberecových čtverců vč. lepidla	m	10,00000	119,50	1 195,00	Vlastní
-------------	---	---	----------	--------	----------	---------

12.Pol.VL05	Koberecové čtverce na podium a schody	m2	25,00000	540,00	13 500,00	Vlastní
-------------	---------------------------------------	----	----------	--------	-----------	---------

Celkem					9 871,20	
---------------	--	--	--	--	-----------------	--

This architectural floor plan depicts a building layout with a grid system. The rooms and their details are as follows:

- Room 101:** Labeled "101 OFFICE/RECEPTION AREA 10' x 15'". It contains a desk, a chair, and a reception counter.
- Room 102:** Labeled "102 OFFICE/RECEPTION AREA 10' x 15'". It contains a desk, a chair, and a reception counter.
- Room 103:** Labeled "103 OFFICE/RECEPTION AREA 10' x 15'". It contains a desk, a chair, and a reception counter.
- Room 104:** Labeled "104 OFFICE/RECEPTION AREA 10' x 15'". It contains a desk, a chair, and a reception counter.
- Room 105:** Labeled "105 OFFICE/RECEPTION AREA 10' x 15'". It contains a desk, a chair, and a reception counter.

The plan also shows a central corridor, a staircase, and various architectural details such as doors, windows, and furniture. Dimensions are provided for the rooms and the overall building footprint.

[illegible]

Poznámka

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST

věc: Svítidla KEEN

č. 34

Stavba:	Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary
Objekt:	SV_AV - Svítidla + auto, video
Předkládá:	STAVER Luže s.r.o.

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů
poštou	1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem	2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci nebylo uvažováno s výměnou dotčených svítidel.

1.2 Popis nového řešení:

Stará svítidla budou demontována a nahrazena novými. Jedná se o svítidla umístěná na fasádě objektu.

2 Zdůvodnění změny:

Při bližším prozkoumání (během provádění okolních prací) dotčených svítidel bylo konstatováno, že tyto svítidla jsou již na hraně životnosti a bude lepší je vyměnit za svítidla nová. Výměnou svítidel dojde k úspoře spotřeby elektrické energie a bude zvýšen uživatelský komfort v dotčeném prostoru.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO	☒ NE
---	-----	--

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
-------------------------------	--	--

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst. 4
---	---------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	22 080,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		22 080,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	07a	Dodatek č. 2 - úprava 11.02.2025
R:	34	ZL č. 34 - svítidla KEEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: D1		Označ. Popis svítidla Referenční typ					17 820,00
1	741 003x	NOVA LUCE KEEN 9270027	ks	12,00000	1 485,00	17 820,00	Vlastní
		svítidla na fasádu : 12	12,00000				
Díl: D3_MTZ		Ostatní rozvody - montáž					4 260,00
2	Pol196	MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ - dle projektu " umělého osvětlení" svítidlo obecně	ks	12,00000	355,00	4 260,00	SoD
		MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ - dle projektu " umělého osvětlení" svítidlo obecně					
Celkem						22 080,00	

LEGENDA MATERIÁLŮ

Číslo	Název materiálu	Popis	Barva	Text	Poznámka
1	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
2	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
3	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
4	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
5	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
6	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
7	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
8	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
9	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
10	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
11	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
12	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
13	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
14	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
15	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
16	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
17	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
18	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
19	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
20	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
21	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
22	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
23	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
24	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
25	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
26	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
27	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
28	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
29	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
30	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
31	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
32	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
33	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
34	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
35	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
36	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
37	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
38	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
39	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
40	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
41	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
42	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
43	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
44	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
45	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
46	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
47	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
48	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
49	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
50	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
51	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
52	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
53	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
54	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
55	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
56	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
57	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
58	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
59	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
60	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			
61	Stropní svítidlo	Stropní svítidlo			

ZMĚNOVÝ LIST				č. 35	
věc: Dilatace podlah 2.N.P.					
Stavba:		Rozšíření expozice v Archeoparku Všešary			
Objekt:		ASŘ - Stavební část			
Předkládá:		STAVÉR Luže s.r.o.			
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		1	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Projektová dokumentace toto neřešila.					
1.2 Popis nového řešení:					
U PVC podlahové krytiny na galerii ve 2.N.P. budou na dvou místech osazeny systémové dilatační lišty korespondující s místem dilatačních spár v podkladním betonu.					
2 Zdůvodnění změny:					
Kvůli dodržení správného technologického postupu pokládky PVC krytiny bylo nutné k této PVC krytině vyřešit systémové dilatační lišty.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐ ANO		☒ NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒ NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 4	
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	4 850,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			4 850,00 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková


Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	07a	Dodatek č. 2 - úprava 11.02.2025
R:	35	ZL č. 35 - dilatace podlah 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenná úroveň
Díl: 776		Podlahy povlakové					4 850,00
1	Pol VL01	Sešiti dilatací v betonu vč. pryskyřice a sponek, D+M dilatační lišty	ks	2,00000	2 425,00	4 850,00	Vlastní
		M.č. 201 : 2		2,00000			

Celkem	4 850,00
--------	----------

PŮDORYS 2.NP - nový stav

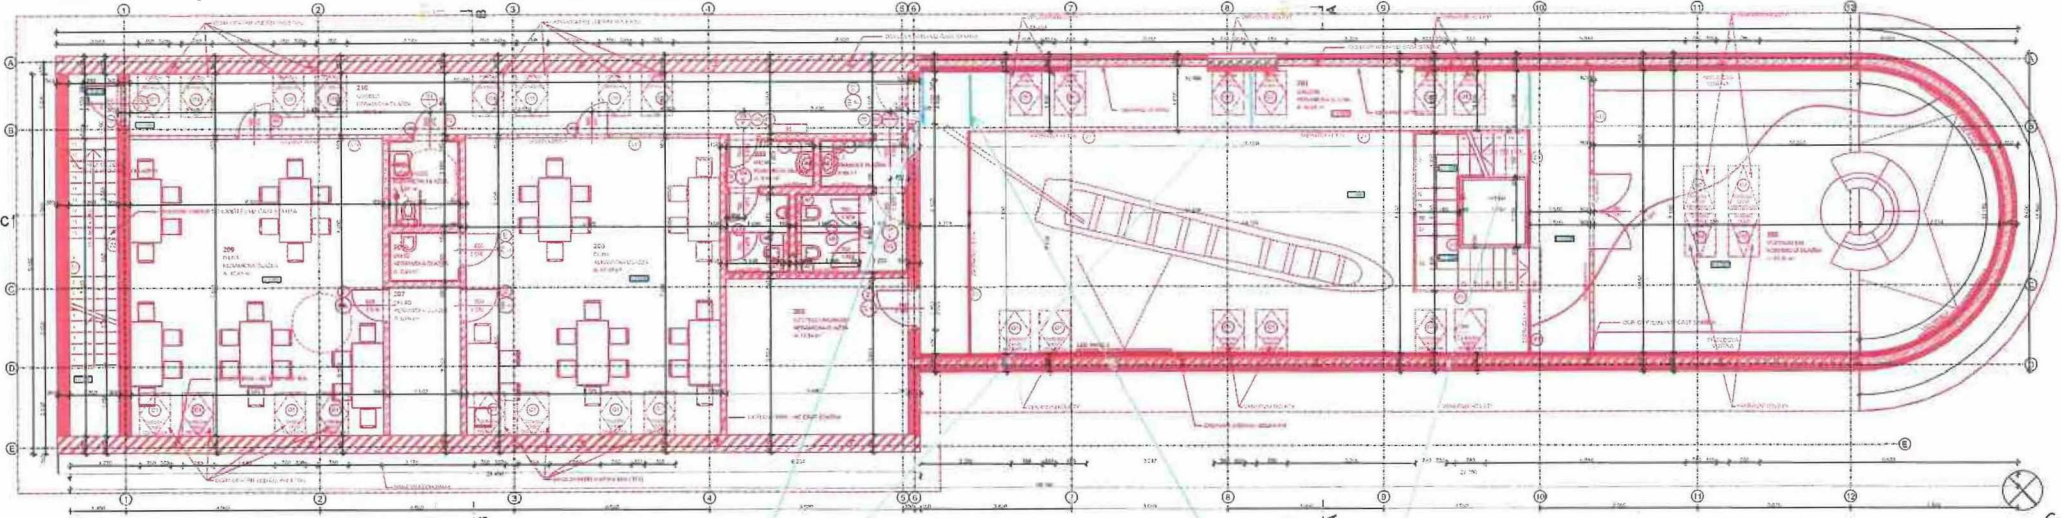

- LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ**
- 1. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 2. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 3. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 4. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 5. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 6. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 7. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 8. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 9. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 10. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 11. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 12. KANCELÁŘSKÝ STOL

- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ**
- 1. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 2. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 3. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 4. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 5. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 6. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 7. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 8. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 9. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 10. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 11. KANCELÁŘSKÝ STOL
 - 12. KANCELÁŘSKÝ STOL

TABULKA MATERIÁLŮ				
ČÍSLO	NÁZEV MATERIÁLU	ALOKACE	POSLUŽNOST	POZNÁMKA
1	KANCELÁŘSKÝ STOL	1. KANCELÁŘSKÝ STOL	1. KANCELÁŘSKÝ STOL	1. KANCELÁŘSKÝ STOL
2	KANCELÁŘSKÝ STOL	2. KANCELÁŘSKÝ STOL	2. KANCELÁŘSKÝ STOL	2. KANCELÁŘSKÝ STOL
3	KANCELÁŘSKÝ STOL	3. KANCELÁŘSKÝ STOL	3. KANCELÁŘSKÝ STOL	3. KANCELÁŘSKÝ STOL
4	KANCELÁŘSKÝ STOL	4. KANCELÁŘSKÝ STOL	4. KANCELÁŘSKÝ STOL	4. KANCELÁŘSKÝ STOL
5	KANCELÁŘSKÝ STOL	5. KANCELÁŘSKÝ STOL	5. KANCELÁŘSKÝ STOL	5. KANCELÁŘSKÝ STOL
6	KANCELÁŘSKÝ STOL	6. KANCELÁŘSKÝ STOL	6. KANCELÁŘSKÝ STOL	6. KANCELÁŘSKÝ STOL
7	KANCELÁŘSKÝ STOL	7. KANCELÁŘSKÝ STOL	7. KANCELÁŘSKÝ STOL	7. KANCELÁŘSKÝ STOL
8	KANCELÁŘSKÝ STOL	8. KANCELÁŘSKÝ STOL	8. KANCELÁŘSKÝ STOL	8. KANCELÁŘSKÝ STOL
9	KANCELÁŘSKÝ STOL	9. KANCELÁŘSKÝ STOL	9. KANCELÁŘSKÝ STOL	9. KANCELÁŘSKÝ STOL
10	KANCELÁŘSKÝ STOL	10. KANCELÁŘSKÝ STOL	10. KANCELÁŘSKÝ STOL	10. KANCELÁŘSKÝ STOL
11	KANCELÁŘSKÝ STOL	11. KANCELÁŘSKÝ STOL	11. KANCELÁŘSKÝ STOL	11. KANCELÁŘSKÝ STOL
12	KANCELÁŘSKÝ STOL	12. KANCELÁŘSKÝ STOL	12. KANCELÁŘSKÝ STOL	12. KANCELÁŘSKÝ STOL

POZNÁMKA

1. KANCELÁŘSKÝ STOL

2. KANCELÁŘSKÝ STOL

3. KANCELÁŘSKÝ STOL

4. KANCELÁŘSKÝ STOL

5. KANCELÁŘSKÝ STOL

6. KANCELÁŘSKÝ STOL

7. KANCELÁŘSKÝ STOL

8. KANCELÁŘSKÝ STOL

9. KANCELÁŘSKÝ STOL

10. KANCELÁŘSKÝ STOL

11. KANCELÁŘSKÝ STOL

12. KANCELÁŘSKÝ STOL

TABULKA MATERIÁLŮ			
ČÍSLO	NÁZEV MATERIÁLU	ALOKACE	POSLUŽNOST
1	KANCELÁŘSKÝ STOL	1. KANCELÁŘSKÝ STOL	1. KANCELÁŘSKÝ STOL
2	KANCELÁŘSKÝ STOL	2. KANCELÁŘSKÝ STOL	2. KANCELÁŘSKÝ STOL
3	KANCELÁŘSKÝ STOL	3. KANCELÁŘSKÝ STOL	3. KANCELÁŘSKÝ STOL
4	KANCELÁŘSKÝ STOL	4. KANCELÁŘSKÝ STOL	4. KANCELÁŘSKÝ STOL
5	KANCELÁŘSKÝ STOL	5. KANCELÁŘSKÝ STOL	5. KANCELÁŘSKÝ STOL
6	KANCELÁŘSKÝ STOL	6. KANCELÁŘSKÝ STOL	6. KANCELÁŘSKÝ STOL
7	KANCELÁŘSKÝ STOL	7. KANCELÁŘSKÝ STOL	7. KANCELÁŘSKÝ STOL
8	KANCELÁŘSKÝ STOL	8. KANCELÁŘSKÝ STOL	8. KANCELÁŘSKÝ STOL
9	KANCELÁŘSKÝ STOL	9. KANCELÁŘSKÝ STOL	9. KANCELÁŘSKÝ STOL
10	KANCELÁŘSKÝ STOL	10. KANCELÁŘSKÝ STOL	10. KANCELÁŘSKÝ STOL
11	KANCELÁŘSKÝ STOL	11. KANCELÁŘSKÝ STOL	11. KANCELÁŘSKÝ STOL
12	KANCELÁŘSKÝ STOL	12. KANCELÁŘSKÝ STOL	12. KANCELÁŘSKÝ STOL

POZNÁMKA

1. KANCELÁŘSKÝ STOL

2. KANCELÁŘSKÝ STOL

3. KANCELÁŘSKÝ STOL

4. KANCELÁŘSKÝ STOL

5. KANCELÁŘSKÝ STOL

6. KANCELÁŘSKÝ STOL

7. KANCELÁŘSKÝ STOL

8. KANCELÁŘSKÝ STOL

9. KANCELÁŘSKÝ STOL

10. KANCELÁŘSKÝ STOL

11. KANCELÁŘSKÝ STOL


12. KANCELÁŘSKÝ STOL

ZMĚNOVÝ LIST					č. 36	
věc: Zpevněné plochy						
Stavba:		Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary				
Objekt:		ASŘ - Stavební část				
Předkládá:		STAVER Luže s.r.o.				
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny			1 listů	
e-mailem	☒	2) Projektové podklady			0 listů, výkresů	
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			1 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
V projektové dokumentaci nebylo uvažováno s realizací okolních zpevněných ploch.						
1.2 Popis nového řešení:						
Budou zrealizovány nové zpevněné plochy + opravy stávajících zpevněných ploch.						
2 Zdůvodnění změny:						
Kvůli zvýšení uživatelského komfortu a zvýšení ochrany objektu před klimatickými vlivy bylo dohodnuto, že dojde k realizaci okapového chodníku a zpevněné plochy před dvoukřídlými dveřmi D1/L vedoucími z objektu na zahradu Archeoparku.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐ ANO			☒ NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			☒ NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		–	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):		+	11 023,20 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:			11 023,20 Kč bez DPH		
7 Schválil:						
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	07a	Dodatek č. 2 - úprava 11.02.2025
R:	36a	ZL č. 36 - zpevněné plochy - úprava 19.2.2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				974,70	
1	451571221	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. cc 100 mm pro chodník u dveří : 2*1,2 pro okapový chodník : 2*2,5	m2	13,40000	72,74	974,70	URS 25/l x 0,74
Díl: 5		Komunikace				1 743,50	
2	918231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lce z betonu prostého	m	4,40000	247,16	1 087,50	URS 25/l x 0,74
3	59217017	okapový chodník z betonových dlaždic tl. 40 mm do kameniva pro chodník u dveří : 1,2*1,2-2 pro okapový chodník : 2*2,5	m	4,50000	145,78	656,00	URS 25/l x 0,74
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 218,80	
4	637211131	Okapový chodník z betonových dlaždic tl. 40 mm do kameniva zpevněná plocha před dveřmi : 2*1,2 okapový chodník : 2*2,5	m2	11,20000	644,54	7 218,80	URS 25/l x 0,74
Díl: 998		Přesun hmot				1 086,20	
5	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým dopravní vzdáleností do 100 m přičítá se každý objekt.	t	5,94800	185,74	1 086,20	URS 25/l x 0,74
Celkem						11 023,20	

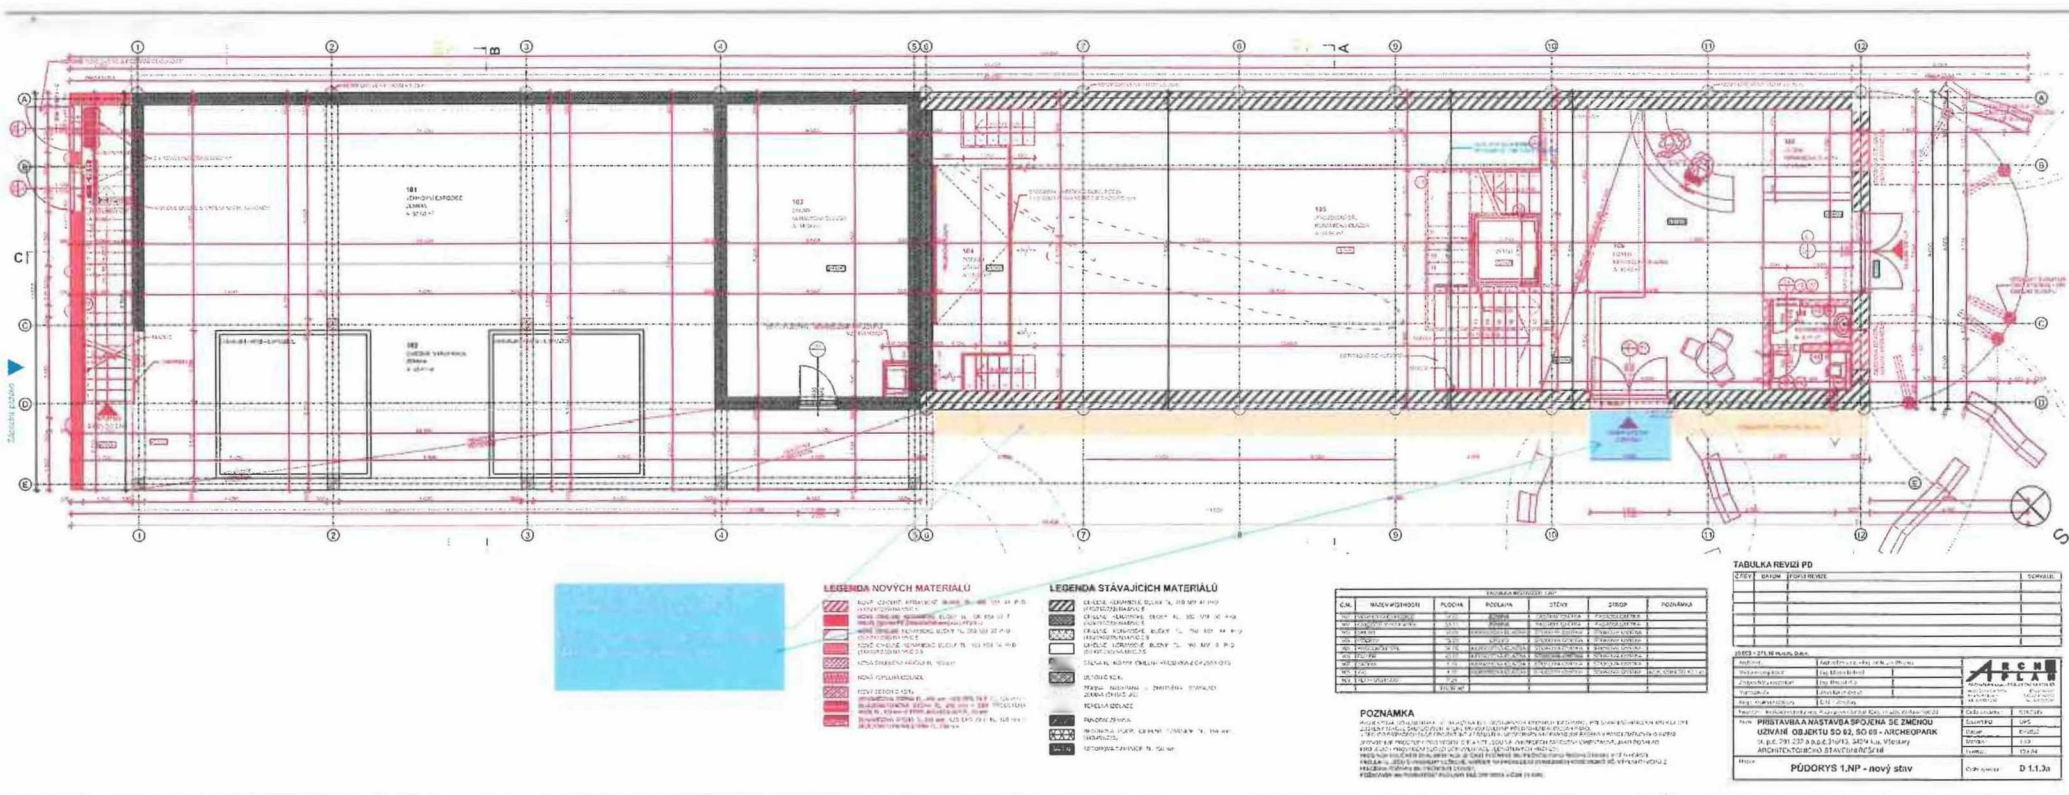


ZMĚNOVÝ LIST				č. 37	
věc: Ochoz - úprava zábradlí					
Stavba:		Rozšíření expozice v Archeoparku Věstary			
Objekt:		ASŘ - Stavební část			
Předkládá:		STAVER Luže s.r.o.			
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	1 listů		
e-mailem	☒	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů		
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 listů		
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Dle PD se má provést ocelové zábradlí u něhož je jako hlavní výplň použita nerezová síť X-Tend.					
1.2 Popis nového řešení: Bude zrealizováno ocelové zábradlí u něhož bude jako hlavní výplň použita nerezová síť X-Tend.					
2 Zdůvodnění změny:					
Kvůli zvýšení bezpečnosti návštěvníků objektu bylo rozhodnuto, že zábradlí na galerii ve 2.N.P. bude dodatečně zvýšeno o cca 10cm a dále bude konstrukce zábradlí doplněna o svislé výztuhy navíc, které zmenší nežádoucí průhyb nerezové sítě.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐ ANO		☒ NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒ NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 4	
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	13 500,00 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		13 500,00 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	07a	Dodatek č. 2 - úprava 11.02.2025
R	37	ZL č. 37 - ochoz - úprava zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenná úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				13 500,00	
1	767002	Úprava zábradlí - 1x ocelové lanko navíc, zvýšení zábradlí, mezi sloupky navíc	kpl	1,00000	13 500,00	13 500,00	Vlastní
Celkem						13 500,00	

Pohled běžné pole

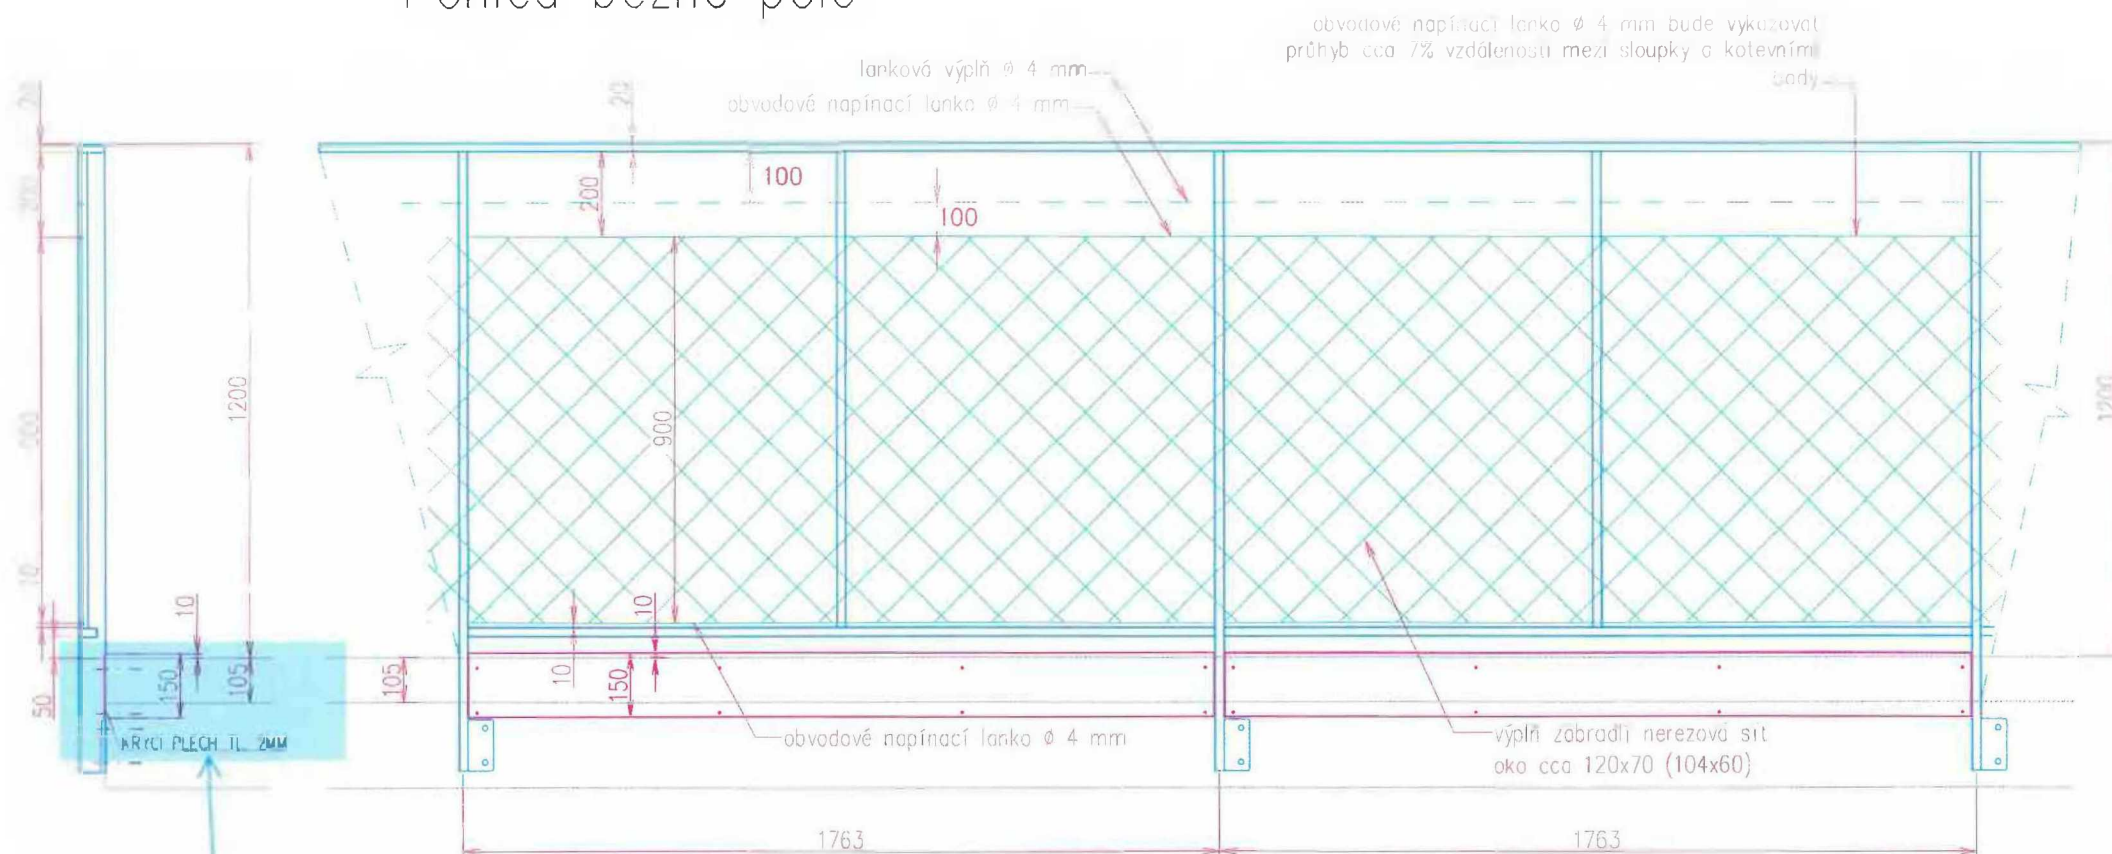

ZÁBRADLÍ NA GALERII

- MADLO JEKL 60x20 mm
- SLOUPKY JEKL 60x20 mm
- PODMADLO JEKL 40x20 mm
- KOTVENÍ BOČNÍ NA SCHODNICI
- VÝPLŇ NEREZOVÁ SÍŤ OKO 120x70 mm vpletená na obvodové nerezové lano $\varnothing$ 4mm a sloupky. Madlo zůstane volné bez opletačního drátu.

Znázornění
krycího
plechu pro
hranu
galerie

ZMĚNOVÝ LIST				č. 38	
věc: Konstrukce pro ukotvení lodi					
Stavba:	Rozšíření expozice v Archeoparku Věstary				
Objekt:	ASŘ - Stavební část				
Předkládá:	STAVÉR Luže s.r.o.				
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		7	listů
1. Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Projektová dokumentace neobsahovala technické řešení zavěšení lodi.					
1.2 Popis nového řešení: Dřevěná loď bude zavěšena pomocí 2ks ocelových lan, každé o průměru 12mm. Každé z lan bude uchyceno k ocelovému držáku, který bude přivařen k ocelovému rámu, jenž je součástí konstrukce krovu.					
2 Zdůvodnění změny:					
V projektové dokumentaci chybí technické řešení na základě kterého by se loď zavěšila pro prostoru projekčního sálu a jelikož tato loď je jeden z hlavních exponátů rekonstruovaného objektu, bylo nutné toto dořešit. Technické řešení chybí zároveň i v SOD rozpočtu. Jedná se o chybu v projektu.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐ ANO	☒ NE		
4 Dopad do smluvních termínů:		☐ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE		
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	37 283,90 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		37 283,90 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Marcel Kusý	Ing. Tomáš Pazdera		Ing. Martin Dohnal	doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.	Iva Javůrková

Položkový soupis prací a dodávek

S:	039	Všešary - rozšíření expozice v Archeoparku
O:	07a	Dodatek č. 2 - úprava 11.02.2025
R:	38	ZL č. 38 - konstrukce pro ukotvení lodi

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena / M.j.	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 900		HZS				32 820,50	
1	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnická odborná Zámečnická - vytažení lodě a tichý na závěsy - převšení na pomocný provizorní lana - 40 + 20 Zámečnická - převšení lodě na finální ocelová lana - vč. ostatních pracovníků stavby Zámečnická - montáž pomocných závěsů na pomocná lana - 14	hod	84,00000	390,72	32 820,50	JRS 24/4 x 0,74
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 463,40	
2	314520459R	Lano ocelové, pozinkované, šestipramenné, počet drátů 6 x 7 = 42 + vložka, průměr lana 12,00 mm pevnost drátů 1770 N/mm ² , hmotnost 0,470 kg/m lano se zaplacenými zámkami - 10,38 9,28	m	19,66000	227,03	4 463,40	Vlastní
Celkem						37 283,90	

MONTECO s.r.o.
Mladoboleslavská 676
190 17 Praha 9 Vinoř




Certifikát zápletu na ocelovém lanu

Příjemce: STAVER Luže s.r.o.

Průměr lana	Pr. 12 mm
Norma zápletu	ČSN 024468, ČSN EN 13411
Počet zápletů	4
Faktura číslo/dod.číslo	25200237

Datum: 31.01.2025

Razítko, podpis:



tel: 256 550 911

MONTECO s.r.o.
Mladoboleslavská 676
190 17 Praha 9 Vinoř

MONTECO
VAZACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Certifikát ocelového lana

Příjemce: STAVER Luže s.r.o.

Průměr lana	Pr. 12 mm
Norma lana	ČSN EN 12385-1,2,4
Označení lana	6x37 FC B sZ
Třída pevnosti lana	1960 Nmm ²
Minimální únosnost N/mm ²	83,30 kN
Délka	12,38m a 11,28m
Faktura číslo/dod.číslo	25200237

Při používání lana je nutno se řídit ČSN EN 12385-3+A1.

Okamžitě po dodání je lano nutno prohlédnout zda odpovídá požadavku objednávky a není poškozeno přepravou. Certifikát shody výrobce lana by měl být uložen na bezpečném místě např. s manuálem jeřábu. Pramenná lana s duši z vláken mohou být používána max. do 100°C. Pramenná lana s duši z oceli mohou být používána do 200°C. Pevnost lana se nesníží do teploty nižší jak -40°C, ale v závislosti na účinnosti mazadla může být snížena funkčnost lana. Lana s nalisovanou hliníkovou objímkou nesmí být vystavena větší teplotě než 150°C a s kovovou objímkou do 200°C.

V případě použití lana např. na moři, zdvihání osob a nebezpečných nákladů, jako jsou roztavený kov, korozivní nebo radioaktivní materiály je nutno vyhodnotit rizika a podle toho upravit nosnost.


Zpravidla jsou lana dodávána s pravým vinutím ale i s levým. Nabíhá-li lano shora a navíjí se zprava doleva, resp. nabíhá-li na buben odspodu a navíjí se zleva doprava, pak se používá lano pravé, v ostatních případech se používá lano levé.


Lana je nutno skladovat v suchých skladovacích prostorech, chráněných před povětrnostními a jinými škodlivými vlivy, jako jsou např. výpary kyselin a jiných chemických látek, které by mohly způsobit jeho znehodnocení. Nevhodné uložení lana má za následek znečištění lana a může vést ke korozi ještě před uvedením lana do provozu. Před instalací nového lana by měly být ověřeny podmínky a rozměry částí souvisejících s lanem (tuhlny, lanovnice, kladky, chrániče lan apod.). Drážky pro lana by měly být o 5% nad jmenovitý průměr lana, lanovnice by měly být volně otočné. Drážky s větším poloměrem zakřivení jsou nevhodné, protože se zmenšuje styčná plocha lana a drážky, tj. zvyšuje se měrný tlak mezi lanem a drážkou a tím se snižuje životnost lana.



Datum: 31.01.2025

Razítko, podpis:



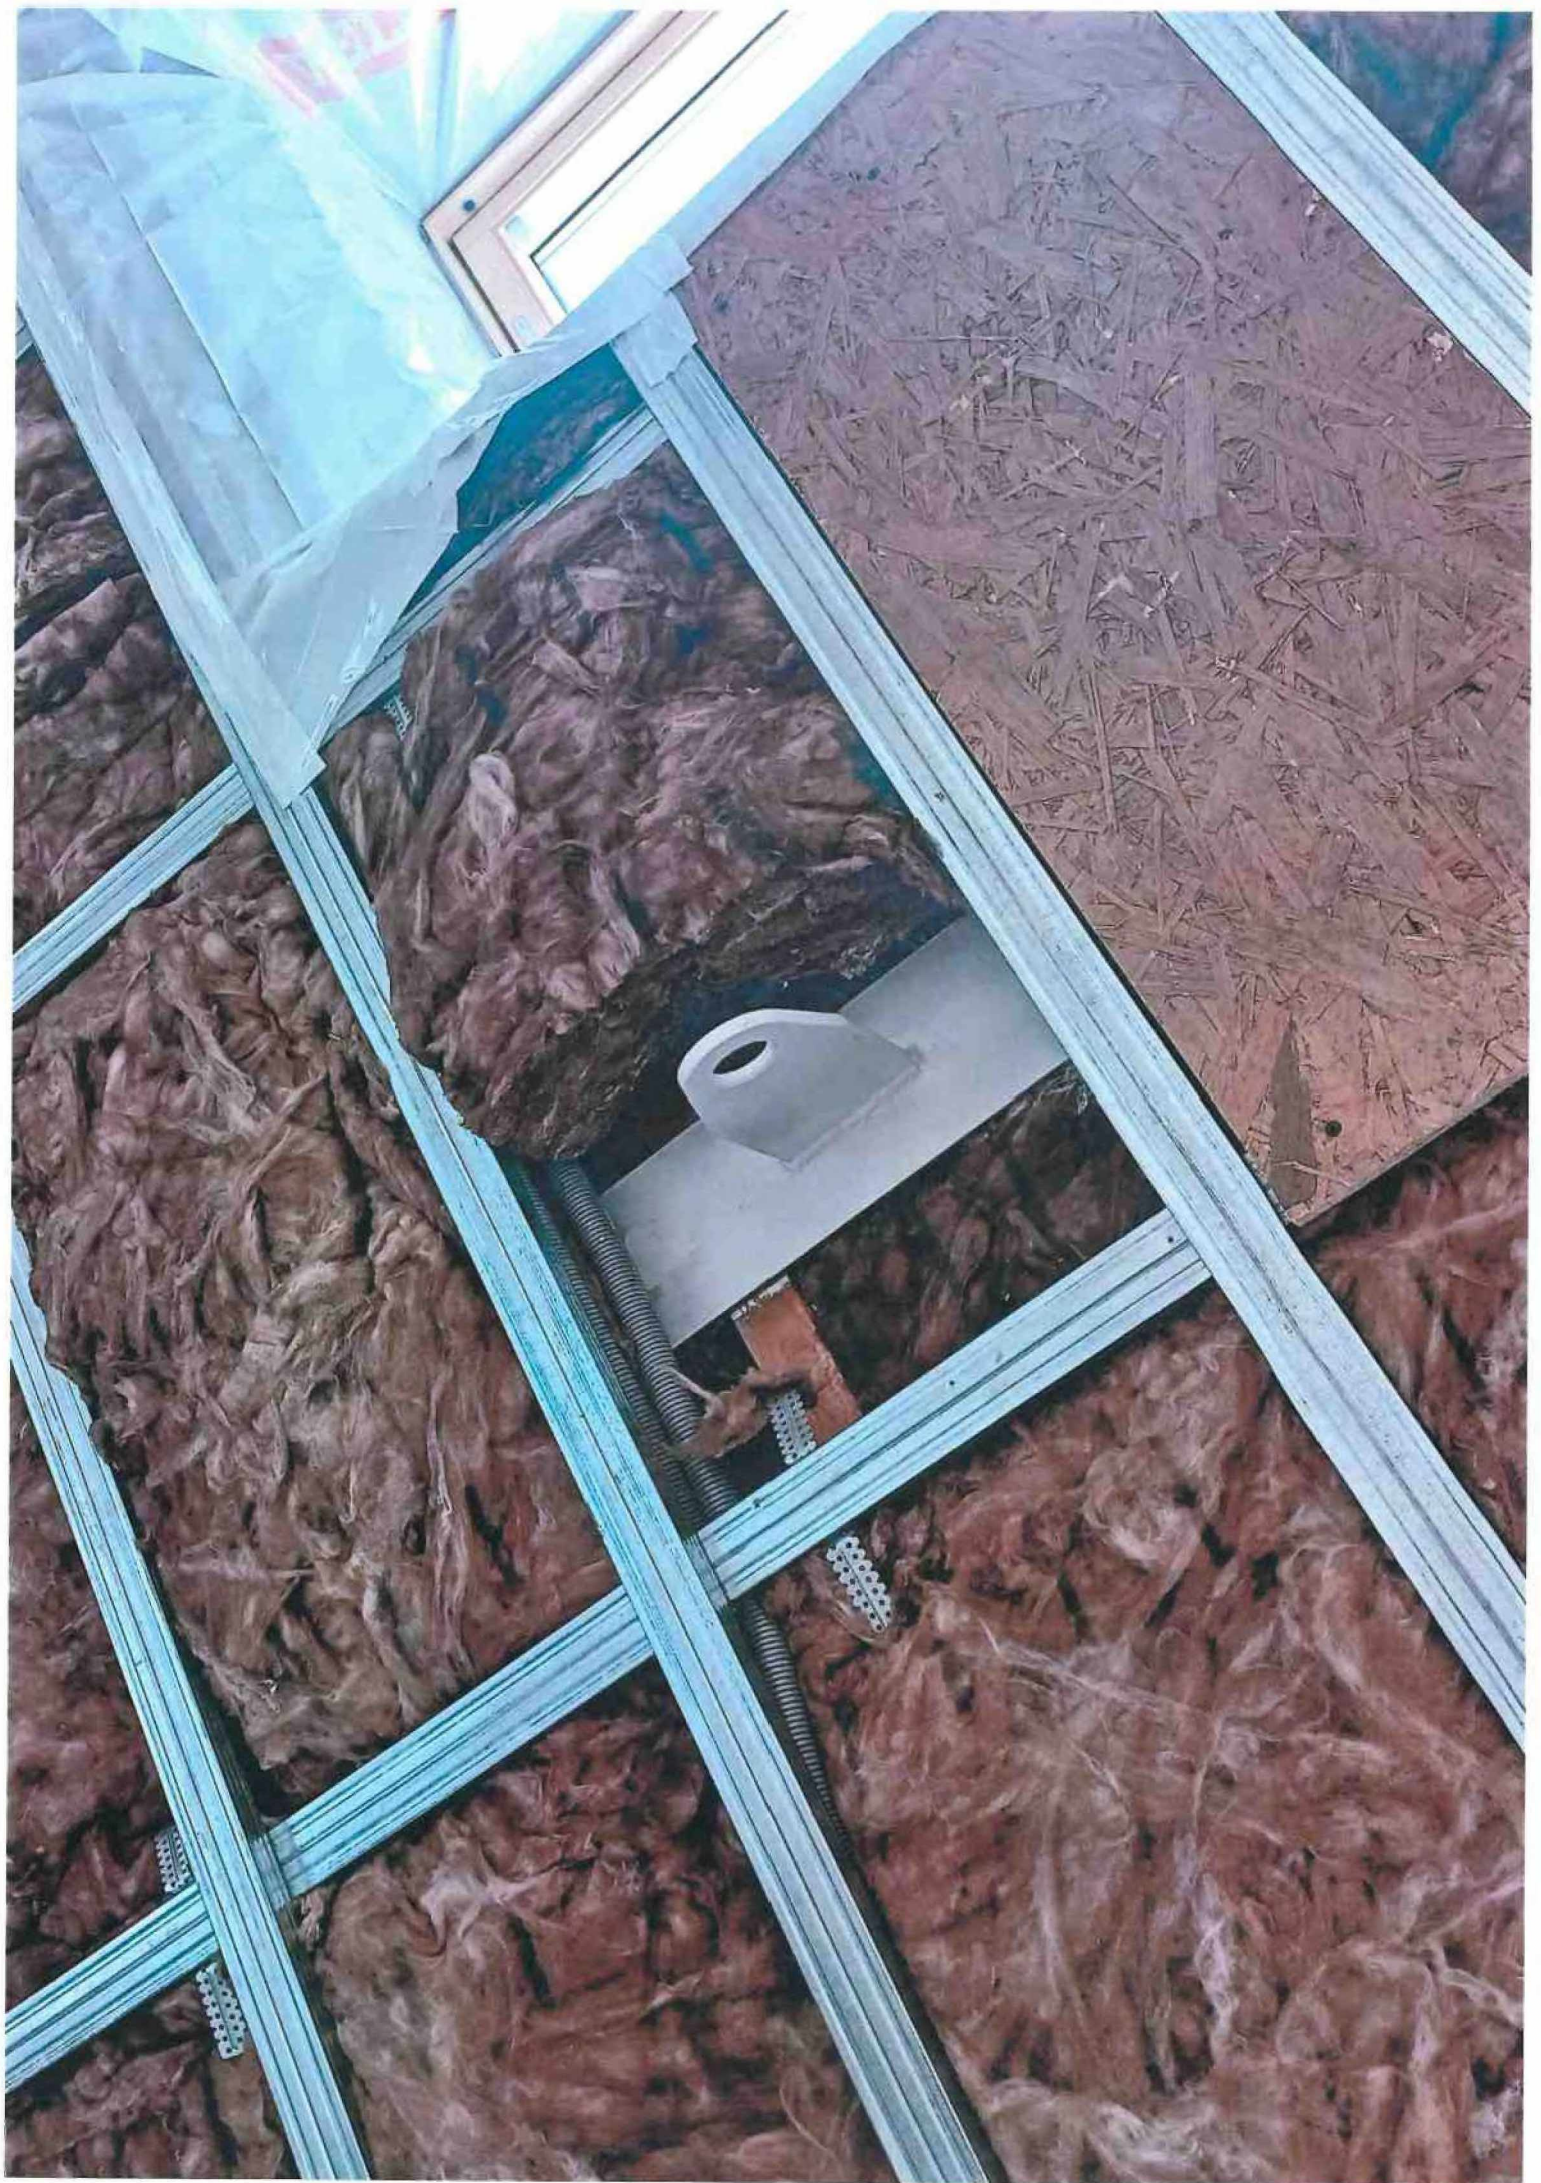


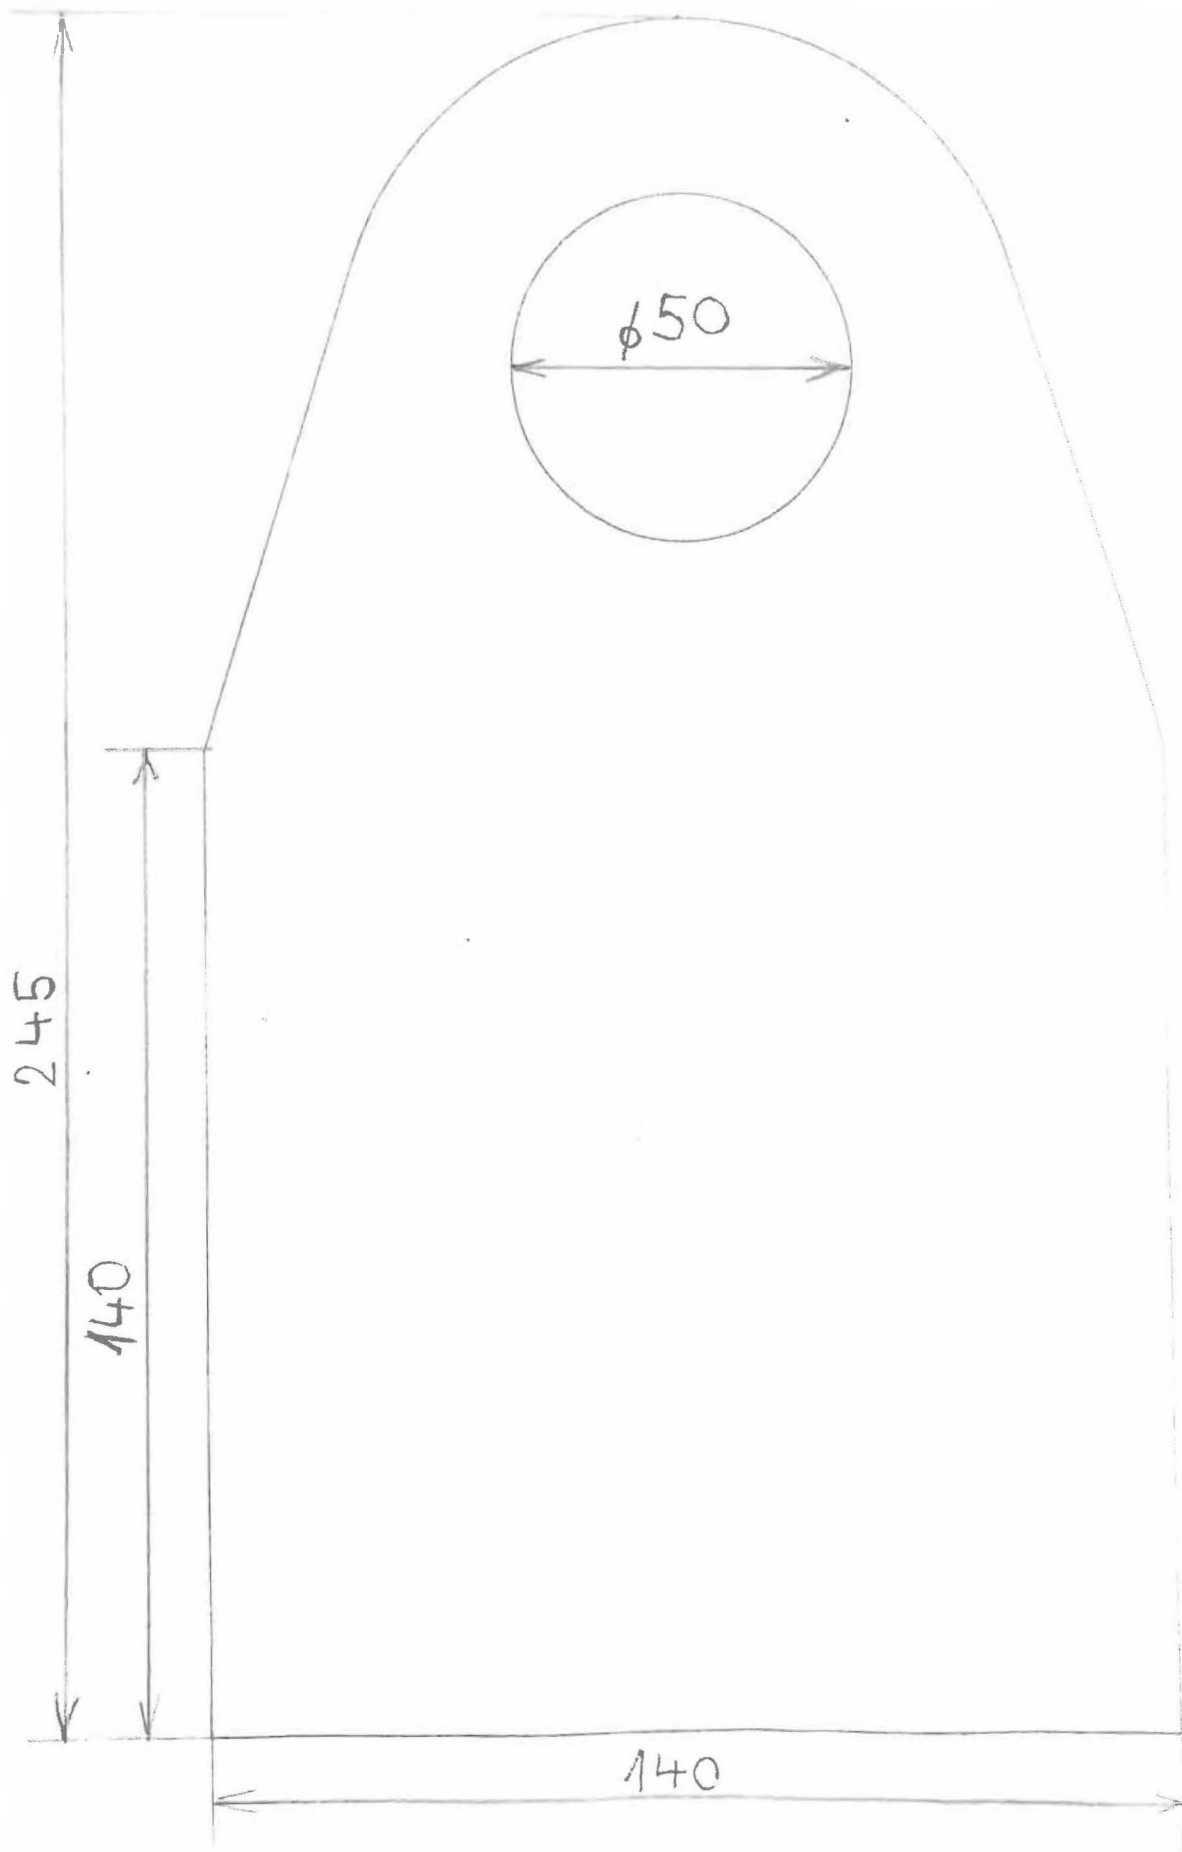





Svorka nova grip pro šroub M12
P12-220/150 + žiletka P12 s otvorem

Lano HMPE Ø10 mm



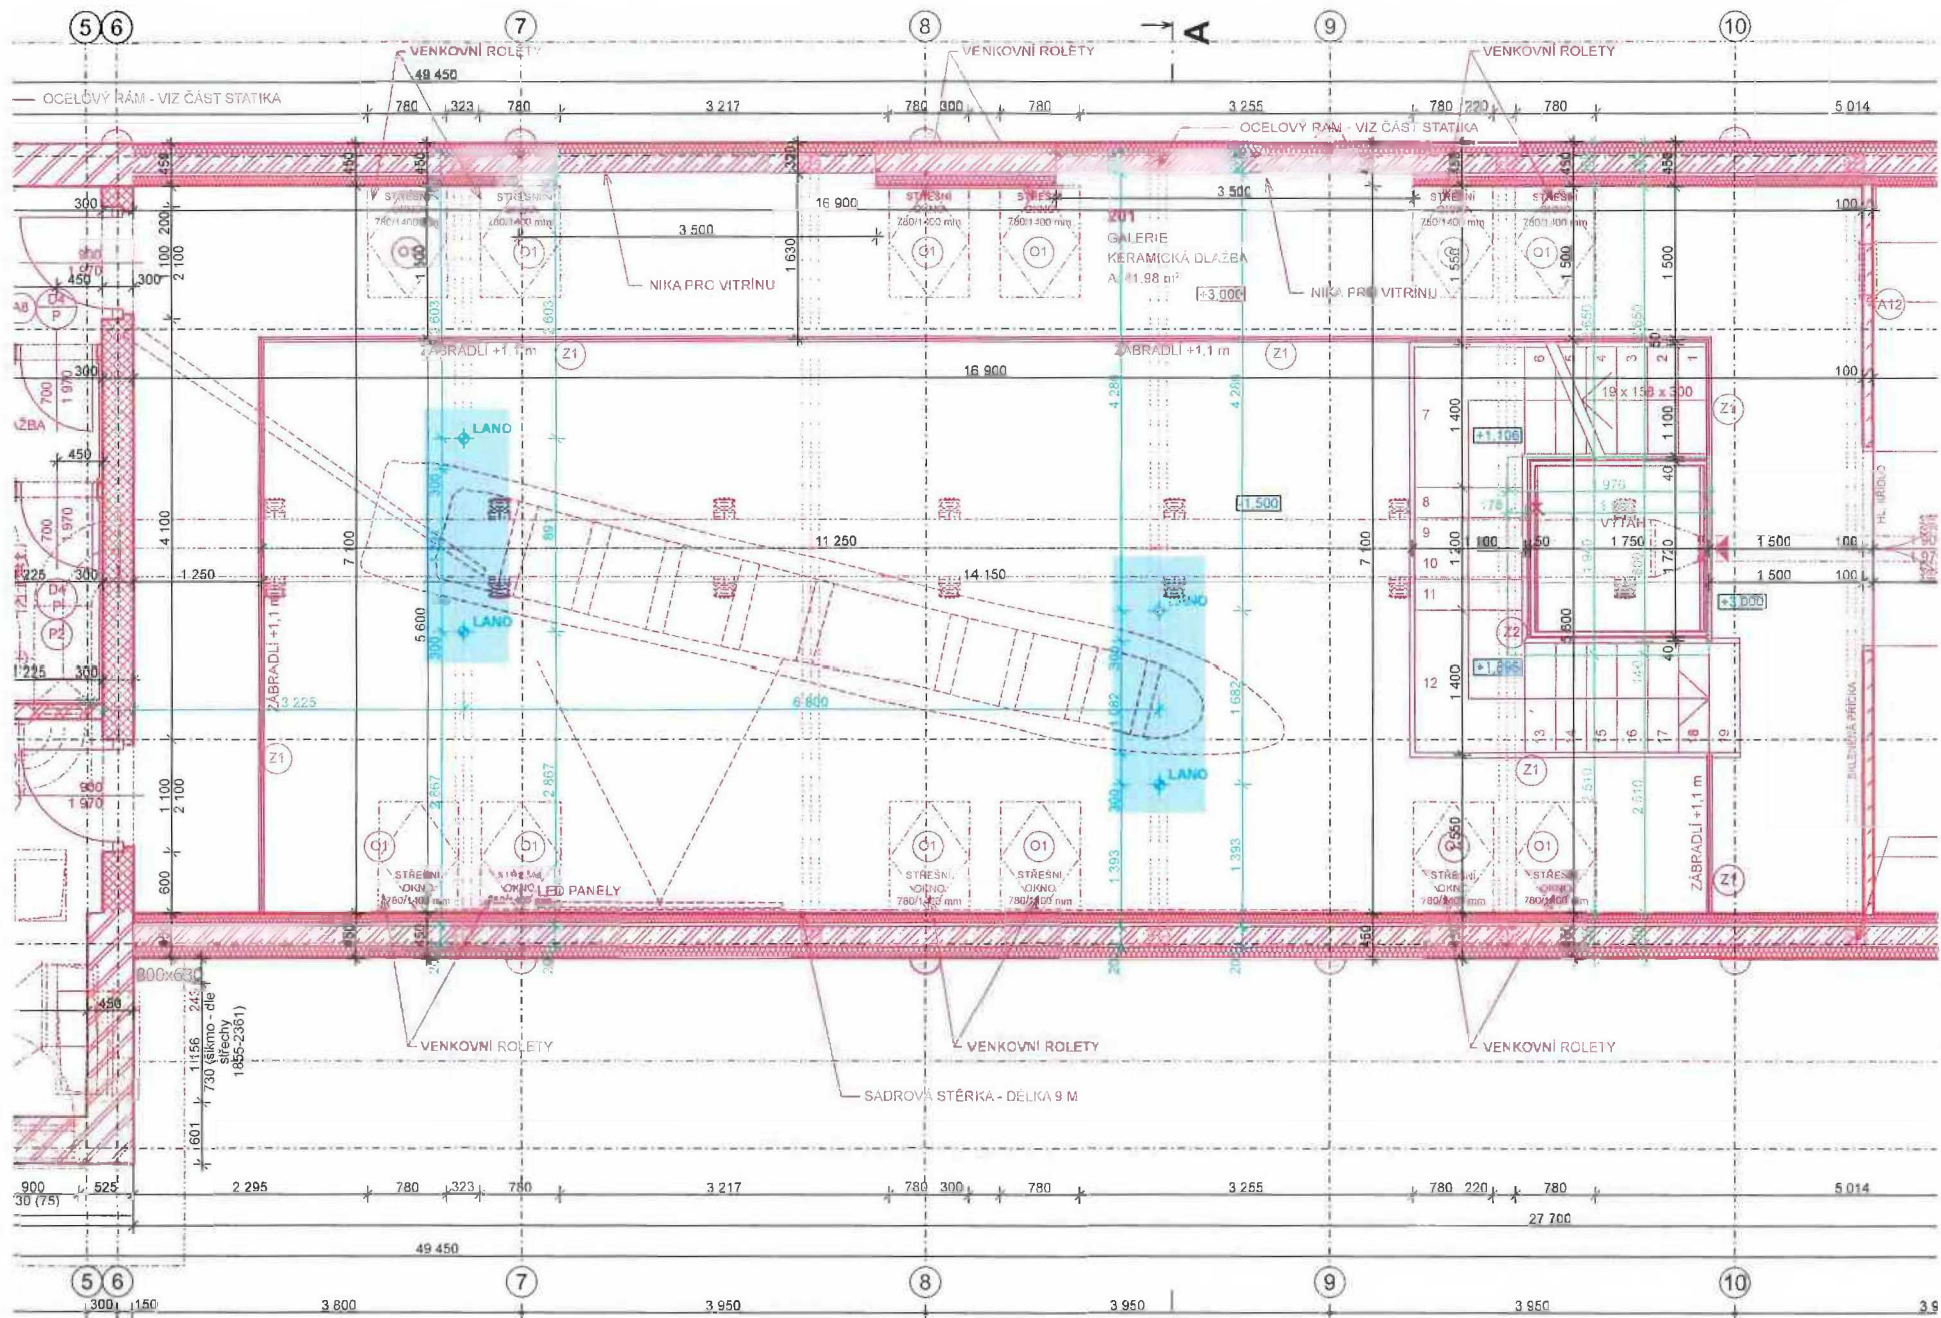

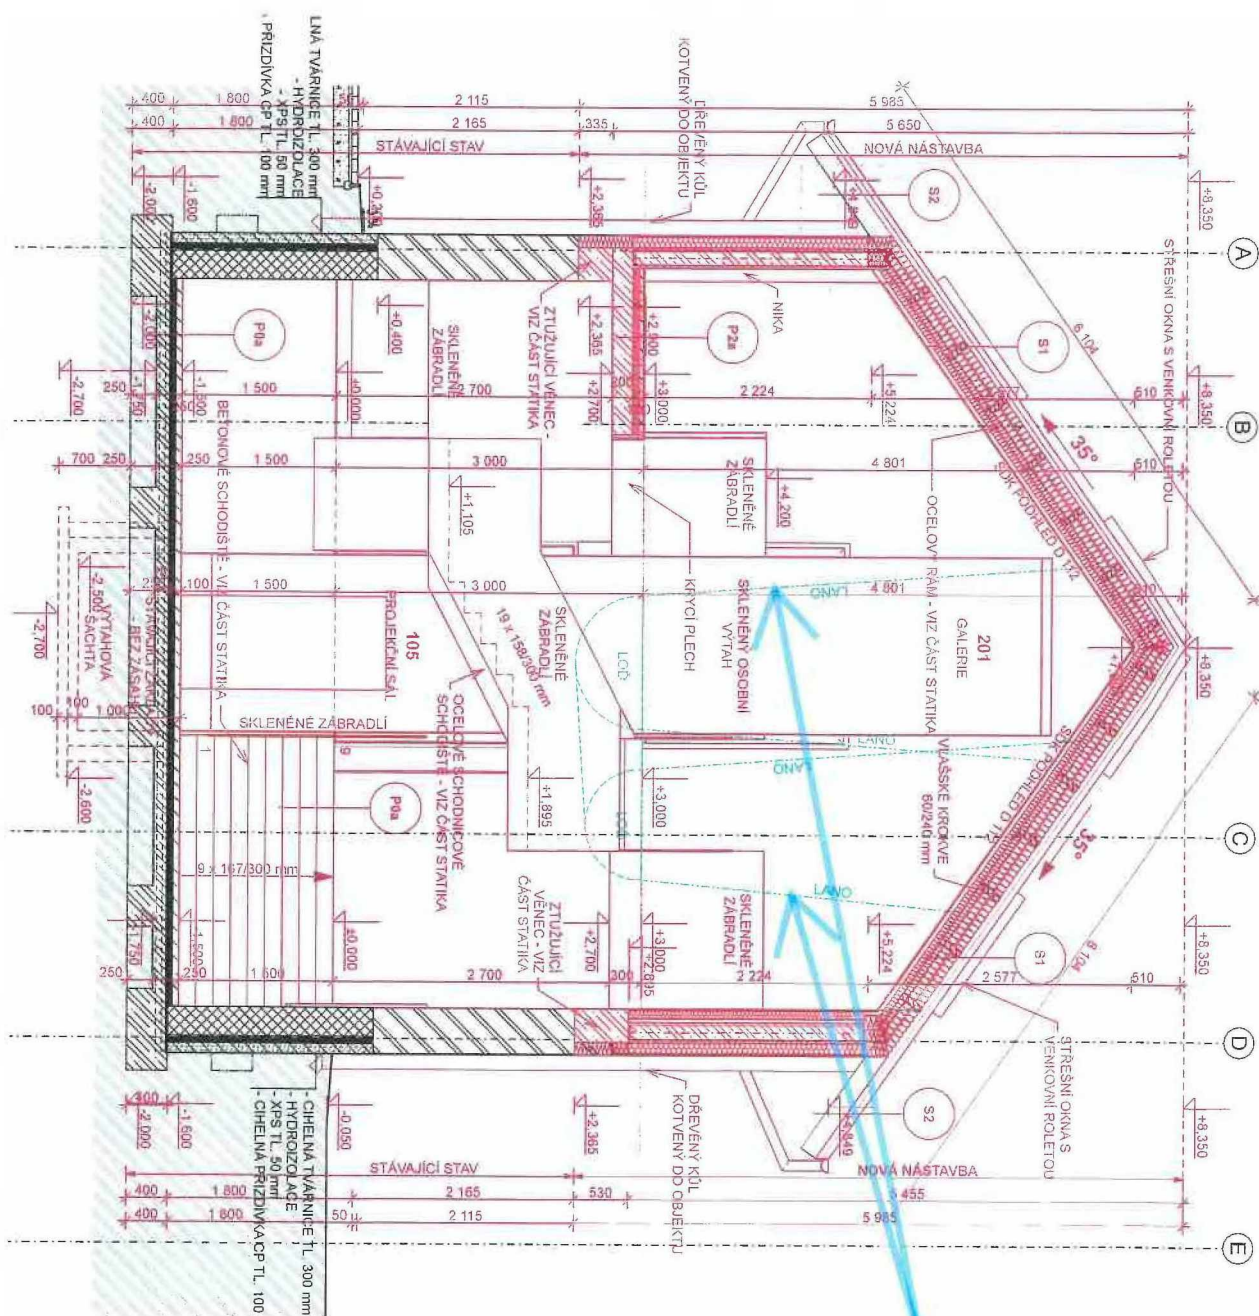

Zaključek: prišlo je do izboljšav pri ravnanju s tveganji.

Rekapitulace změn

Číslo	Název	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
1	ZL č. 18 - Silnoproud - venkovní svítidla	11 846,00	2 487,66	14 333,66
2	ZL č. 19 - Silnoproud - přívod pro střešní okna	30 342,50	6 371,93	36 714,43
3	ZL č. 20 - Interiérové dveře (skutečnost)	29 397,80	6 173,54	35 571,34
4	ZL č. 21 - Umyvadla do dílen - 2.NP	23 587,10	4 953,29	28 540,39
5	ZL č. 22 - Čistící zóna, 1.NP	21 918,90	4 602,97	26 521,87
6	ZL č. 23 - Požární ucpávky	-17 500,00	-3 675,00	-21 175,00
7	ZL č. 24 - Úprava terénu kvůli HI	59 544,70	12 504,39	72 049,09
8	ZL č. 25 - Vybourání vodicích drážek regálů + zapravení	11 277,30	2 368,23	13 645,53
9	ZL č. 26 - Venkovní schodiště, záměna dlažby na podestě	1 292,90	271,51	1 564,41
10	ZL č. 27 - Malby (schodiště)	10 456,50	2 195,87	12 652,37
11	ZL č. 28 - Venkovní dveře	-14 822,00	-3 112,62	-17 934,62
12	ZL č. 29 - Lišty k obkladům + tmelení spár silikonem	25 202,50	5 292,53	30 495,03
13	ZL č. 30 - Vybavení wc pro imobilní osoby	12 382,10	2 600,24	14 982,34
14	ZL č. 31 - Oprava komunikace po zhotovení přípojky elektro	3 352,40	704,00	4 056,40
15	ZL č. 32 - 1.N.P., úprava stávajících betonových mazanin	49 731,80	10 443,68	60 175,48
16	ZL č. 33 - Kobercové čtverce na podium a schody	9 871,20	2 072,95	11 944,15
17	ZL č. 34 - Svítidla KEEN	22 080,00	4 636,80	26 716,80
18	ZL č. 35 - Dilatace podlah 2.N.P.	4 850,00	1 018,50	5 868,50
19	ZL č. 36 - Zpevněné plochy	11 023,20	2 314,87	13 338,07
20	ZL č. 37 - Ochoz - úprava zábradlí	13 500,00	2 835,00	16 335,00
21	ZL č. 38 - Konstrukce pro ukotvení lodi	37 283,90	7 829,62	45 113,52
Celkem za stavbu		356 618,80	74 889,95	431 508,75

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4					
Původní smluvní cena (vstupní)		17 759 719,30 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 216 175,70 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 381 282,40 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 228 069,40 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 59 892,10 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 1 444 245,10 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 441 174,50 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		1 885 419,60 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	1 885 420 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	10,62 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	17 759 719,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 586 976,10 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 129 129,90 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 61 009,10 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 647 985,20 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 129 129,90 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	17 759 719,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 640 186,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 26 893,40 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 189 745,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 62 313,40 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 829 932,10 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 89 206,80 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		17 759 719,30 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 647 985,20 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 129 129,90 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 829 932,10 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 89 206,80 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		2 259 580,60 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	12,72 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7				
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH			
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč			
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH			
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč			
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH			
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH			

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 478 824,30 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 122 205,50 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	356 618,80 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	17 759 719,30 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	20 665 751,70 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	21 022 370,50 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	21 022 370,50 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Iva Javůrková

