# VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE č.p.777 VE SLANÉM

## Harmonogram prací

| číslo | technologcký postup prací | | dny | dı | zahájení | ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **doba výstavby - předání a převzetí staveniště** | | 266 | | 9.7.18 | 31.3.19 |
| 1 | **Předání staveniště** | | 1 | | *9.7.18* | *9.7.18* |
| 2 | Odstrojování, ochranné opatření, bourání kcí, likvidace suti | | 52 | | *10.7.18* | *30.8.18* |
| 3 | Zjišťování rozdílů kci proti RD, projednávání změn a upřesnění RD | | 67 | | *10.7.18* | *14.9.18* |
| 3 | Zajišťování doplnění podkladů zadavatelem - mykologický průzkum s návrhem sanace napadeného krovu | | 436 | | *13.9.18* | *22.11.19* |
| 4 | Obdržení konečné verze PD = vyjasnění sanace poškozených částí krovu | | 1 | | *22.11.18* | *22.11.18* |
| | SO.01 Stavební úpravy podkroví části školy | | | | | |
| 5 | Zahájení navážení materiálu pro krov | | 31 | | *26.9.18* | *26.10.18* |
| 6 | Ocelové konstrukce podlahy a CD lehké nosníky krovu | | 106 | | *8.10.18* | *21.1.19* |
| 8 | Tesařské kce - úpravy a doplnění krovunosné podlahové trámy, | | 87 | | *27.10.18* | *21.1.19* |
| 9 | Tesař - dřevěný rošt + tepelné izolace šikmých částí podkroví | | 96 | | *22.10.18* | *25.1.19* |
| 10 | Tesař - nosné podlahové trámy | | 84 | | *29.10.18* | *20.1.19* |
| 11 | Výroba oken, navážení na stavbu + osazení žaluzií | | 106 | | *20.11.18* | *5.3.19* |
| 12 | Montáž oken -světlovodů | | 36 | | *17.12.18* | *21.1.19* |
| 12 | Sanace poškozených částí krovu dle návrhu mykolog.průzkumu | | 49 | | *10.12.18* | *27.1.19* |
| 12 | Rozpěry podlahových trámů proti posunu | | 48 | | *12.12.18* | *28.1.19* |
| 7 | Montáž VSŽ plechů přistřelením | | 25 | | *11.1.19* | *4.2.19* |
| 13 | Betonáž podlah | | 24 | | *25.1.19* | *17.2.19* |
| 14 | Ocelové schodiště | | 15 | | *12.2.19* | *26.2.19* |
| 15 | Plošina pro imobilní | | 25 | | *1.3.19* | *25.3.19* |
| 16 | Vnitřní příčky | | 27 | | *10.2.19* | *8.3.19* |
| 17 | Hrubé podlahové konstrukce | | 16 | | *1.3.19* | *16.3.19* |
| 18 | Obklady stěn a stropů SDK, montáž zárubní | | 28 | | *1.3.19* | *28.3.19* |
| 19 | Obklady, omítky a ostatní drobné stavební práce | | 42 | | *15.2.19* | *28.3.19* |
| 20 | Akustické obklady | | 19 | | *10.3.19* | *28.3.19* |
| 21 | Specialisté - elektro, ZTI, UT, VZT | | 104 | | *12.12.18* | *25.3.19* |
| 22 | Malby a nátěry | | 42 | | *14.2.19* | *27.3.19* |
| 23 | Montáž dveřních křídel vestavby | | 10 | | *20.3.19* | *29.3.19* |
| 24 | Výroba požárních stěn včetně certifikace | | 72 | | *15.12.18* | *24.2.19* |
| 25 | Montáž požárních stěn v 1 a 2 NP | | 4 | | *25.2.19* | *28.2.19* |
| 26 | Dokončovací práce, osazení doplňků a úklid | | 12 | | *20.3.19* | *31.3.19* |
| 27 | Zkoušky, revize | | 17 | | *15.3.19* | *31.3.19* |
| | SO.02 Venkovní výtah a úprava dvora | | | | | |
| 28 | Výkop jámy, betonáž podkladu | | 27 | | *20.8.18* | *15.9.18* |
| 29 | Lešení pro izolace | | 10 | | *24.9.18* | *3.10.18* |
| 30 | 1.krok izolací - vodorovná a svislá na stávající objekt | | 8 | | *27.9.18* | *4.10.18* |
| 31 | Betonáž základové desky | | 15 | | *4.10.18* | *18.10.18* |
| 31 | Nosná kce výtahové šachty | | 62 | | *20.10.18* | *20.12.18* |
| 32 | 2.krok izolací - svislá na výtahovou šachtu, napojení | | 5 | | *12.11.18* | *16.11.18* |
| 33 | Střecha a povrchové úpravy vnitřních stěn | | 39 | | *16.12.18* | *23.1.19* |
| 34 | Elektroinstalace | | 41 | | *15.1.19* | *24.2.19* |
| 35 | Výtah + kompletace | | 60 | | *15.1.19* | *15.3.19* |

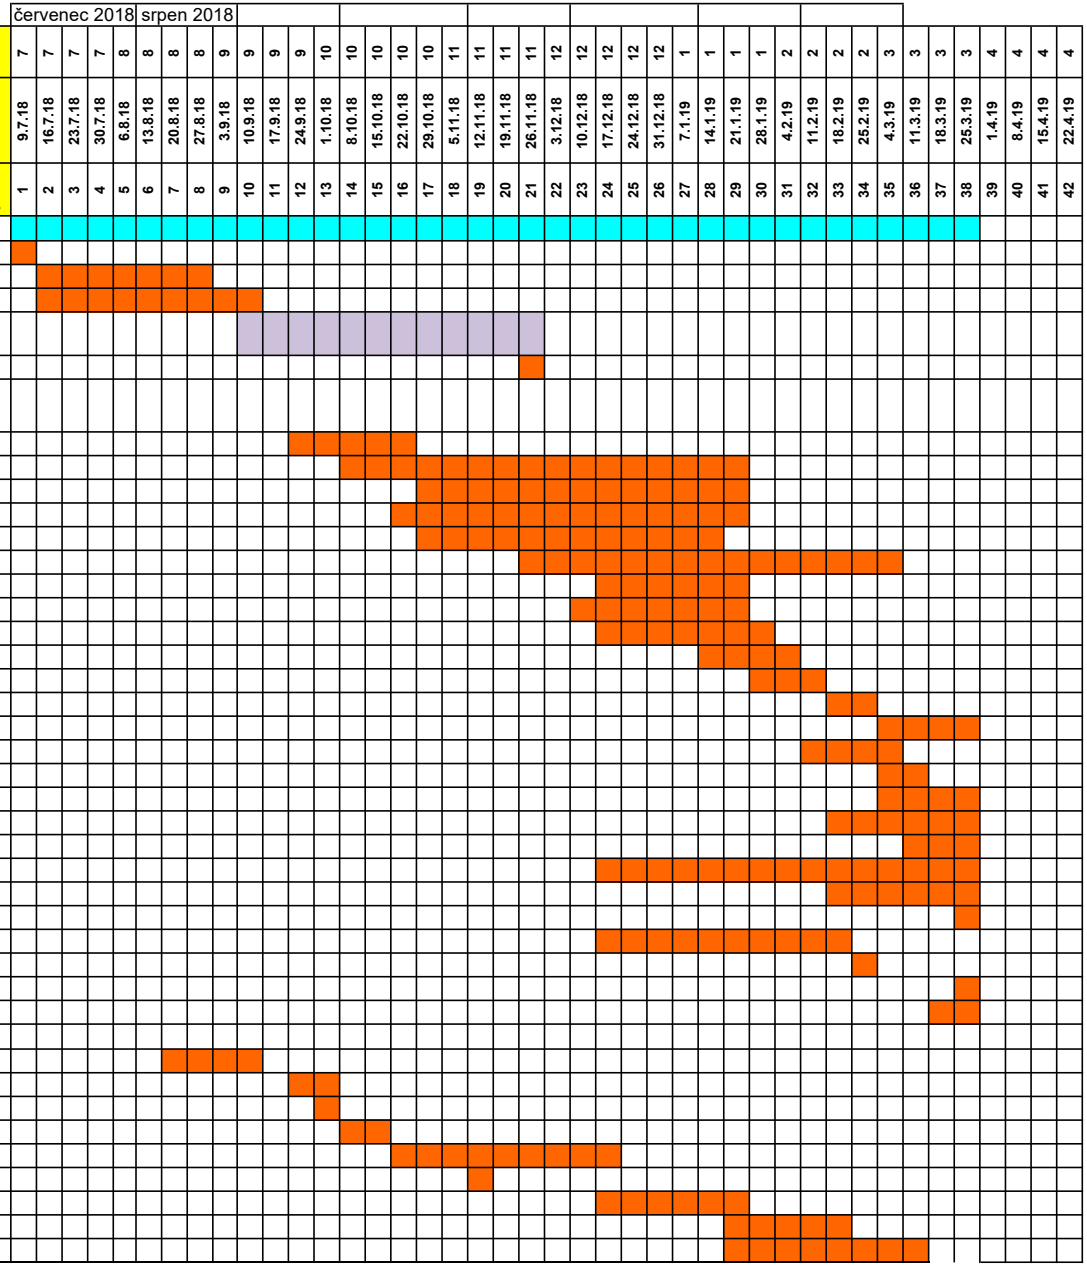


ALSTAP s.r.o.

# VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE č.p.777 VE SLANÉM

## Harmonogram prací

| číslo | technologcký postup prací | | dny | dn | zahájení | ukončení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Fasáda výtahové šachty | | 31 | | *25.2.19* | *27.3.19* |
| 36 | Dokončovací práce, osazení doplňků a úklid | | 21 | | *10.3.19* | *30.3.19* |
| 37 | Zkoušky, revize | | 17 | | *11.3.19* | *27.3.19* |
| | SO.03 Vybudování WC pro vozíčkáře v 1. a 2.np | | | | | |
| | 1.n.p. | | | | | |
| 38 | Bourání a demontáže, likvidace suti | | 15 | | *1.10.18* | *15.10.18* |
| 39 | Nové příčky a drobné stavební práce | | 11 | | *15.11.18* | *25.11.18* |
| 40 | Obklady, dlažby, omítky | | 7 | | *29.11.18* | *5.12.18* |
| 41 | Specialisti - ZTI, UT, elektroinstalace | | 5 | | *15.12.18* | *19.12.18* |
| 42 | Výběr dodavatele, objednání a výroba replik dveří a obložek | | 107 | | *1.10.18* | *15.1.19* |
| 43 | Osazení obložek a dveří | | 8 | | *19.2.19* | *26.2.19* |
| 44 | Malby, nátěry | | 9 | | *19.11.18* | *27.11.18* |
| 45 | Dokončovací práce, osazení doplňků a úklid | | 6 | | *25.1.19* | *30.1.19* |
| 46 | Zkoušky, revize | | 5 | | *3.12.18* | *7.12.18* |
| | 2.n.p. | | | | | |
| 38 | Bourání a demontáže, likvidace suti | | 16 | | *5.1.19* | *20.1.19* |
| 39 | Nové příčky a drobné stavební práce | | 27 | | *20.1.19* | *15.2.19* |
| 40 | Obklady, dlažby, omítky | | 22 | | *15.2.19* | *8.3.19* |
| 41 | Specialisti - ZTI, UT, elektroinstalace | | 60 | | *20.1.19* | *20.3.19* |
| 43 | Osazení obložek a dveří | | 8 | | *12.3.19* | *19.3.19* |
| 44 | Malby, nátěry | | 7 | | *19.3.19* | *25.3.19* |
| 45 | Dokončovací práce, osazení doplňků a úklid | | 6 | | *25.3.19* | *30.3.19* |
| 46 | Zkoušky, revize | | 11 | | *20.3.19* | *30.3.19* |
| 47 | **PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ ZADAVATELI** | | 1 | | ***31.3.19*** | ***31.3.19*** |

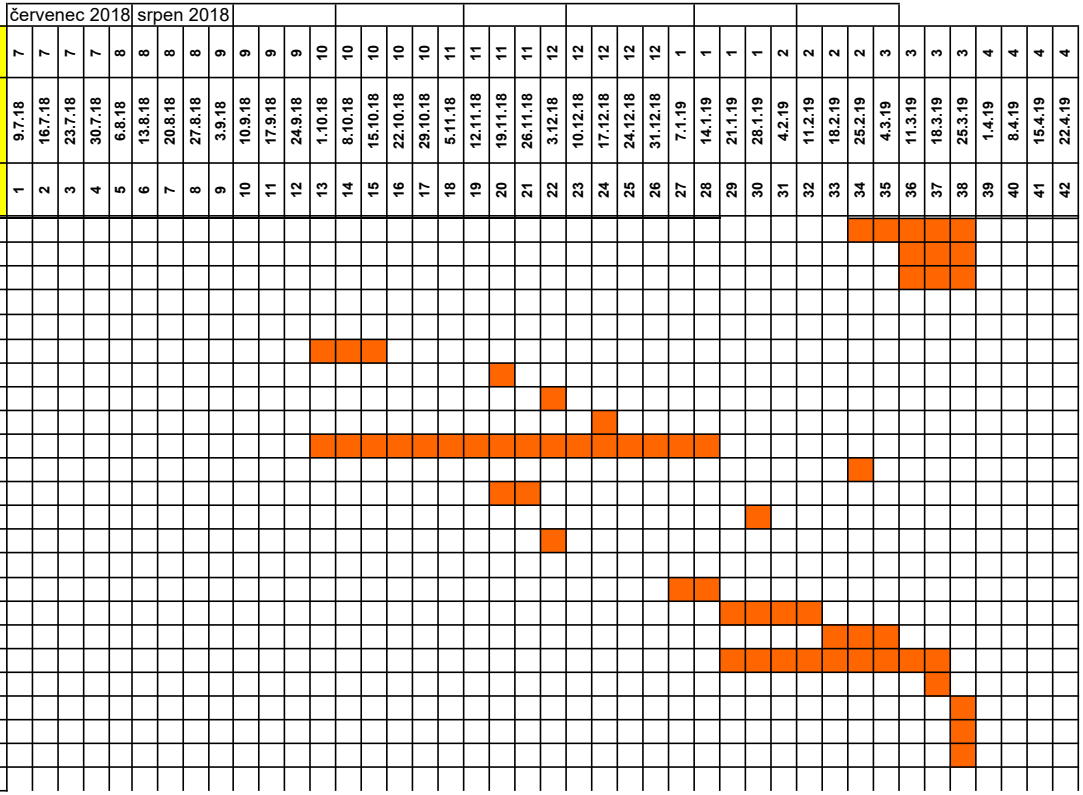


Komentář k HMG :
1) Práce na střeše musí být prováděny s ohledem na klimatické podmínky.
2) HMG je aktualizován na základě projektové dokumentace, jejího dopracování a změn předaných ke dni 7.12.2018 dodavateli ALSTAP s.r.o. Předpokládá se uzavření veškerých objednávek prací a materiálů s dlouhou dodací lhůtou či dopadem do sesmluvněných cen do 20.12.2018. Tyto objednávky materiálů budou sesmluvněny dle dokumentace a jejích změn dle předaných podkladů k datu 7.12.2018. Pozdější změna požadavků by mohla mít dopad do termínu realizace.

**ALSTAP s.r.o.**
