Revitalizace Staré Ponávky
- lokalita nad sídlištěm Komárov

Harmonogram

firesta

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1	**Doba plnění**	**354 dny**	**07.01. 19**	**26.12. 19**	
2	***Zahájení provádění díla***	***0 dny***	07.01. 19	07.01. 19	
3	projekční práce, průzkumy	12 dny	07.01. 19	18.01. 19	
4	přípravné práce	10 dny	07.01. 19	16.01. 19	2;3FS-15 dny
5	**SO-01 Terénní úpravy**	**220 dny**	**17.01. 19**	**24.08. 19**	
6	odstranění travin, porostů, sejmutí ornice	60 dny	17.01. 19	17.03. 19	4
7	zemní práce, úprava pláně	125 dny	08.03. 19	10.07. 19	6FS-10 dny
8	svahování, ohumusování	60 dny	26.06. 19	24.08. 19	7FS-15 dny
9	**SO-02 Úpravy toku**	**180 dny**	**08.03. 19**	**03.09. 19**	
10	odstranění dlažeb, záhozů, zemní práce	60 dny	08.03. 19	06.05. 19	6FS-10 dny
11	průtočné prahy, opevnění břehů	130 dny	27.04. 19	03.09. 19	10FS-10 dny
12	**SO-03 Zpevněné plochy**	**220 dny**	**18.03. 19**	**23.10. 19**	
13	zemní práce, úprava pláně	120 dny	18.03. 19	15.07. 19	7SS+10 dny
14	opěrná zeď, schody	120 dny	23.03. 19	20.07. 19	13SS+5 dny
15	podkladní vrstvy, obrubníky	120 dny	17.04. 19	14.08. 19	13SS+30 dny
16	dlažby, mlat, beton	130 dny	17.05. 19	23.09. 19	15SS+30 dny
17	ohumusování, osetí, dopravní značky	60 dny	25.08. 19	23.10. 19	16FS-30 dny
18	**SO-04 Lávky**	**280 dny**	**21.02. 19**	**27.11. 19**	
19	zemní práce, založení	60 dny	21.02. 19	21.04. 19	31FS-10 dny
20	spodní stavba	120 dny	07.04. 19	04.08. 19	19FS-15 dny
21	nosná konstrukce, mostovka	90 dny	16.07. 19	13.10. 19	20FS-20 dny
22	příslušenství	50 dny	09.10. 19	27.11. 19	21FS-5 dny
23	**SO-05 Pobytové prvky**	**210 dny**	**07.05. 19**	**02.12. 19**	
24	terasa, pobytové schody	180 dny	07.05. 19	02.11. 19	10
25	zábradlí	45 dny	19.10. 19	02.12. 19	24FS-15 dny;21
26	SO-06 Demolice	70 dny	17.01. 19	27.03. 19	4
27	**SO-07 Veřejné osvěltení - TSB, Osvětlení lávek**	**120 dny**	**15.08. 19**	**12.12. 19**	
28	kabeláže, stožáry	90 dny	15.08. 19	12.11. 19	15
29	osvětlení lávek	10 dny	03.12. 19	12.12. 19	28;25
30	**SO-08 Vegetace**	**325 dny**	**17.01. 19**	**07.12. 19**	
31	kácení, odstranění porostu	45 dny	17.01. 19	02.03. 19	4
32	výsadba	90 dny	09.09. 19	07.12. 19	17FS-45 dny
33	SO-09 Mobiliář	90 dny	09.09. 19	07.12. 19	16FS-15 dny
34	**SO-10 Chodník**	**135 dny**	**06.07. 19**	**17.11. 19**	
35	bourání, zemní práce	30 dny	06.07. 19	04.08. 19	13FS-10 dny
36	podkladní vrstvy, obrubníky	60 dny	31.07. 19	28.09. 19	35FS-5 dny
37	dlažby	60 dny	19.09. 19	17.11. 19	36FS-10 dny
38	**SO-10.1 Rozšíření stávajícího chodníku za mostem-Rekonstrukce veřejného osvětlení**	**115 dny**	**06.07. 19**	**28.10. 19**	
39	demontáž starých stožárů	15 dny	06.07. 19	20.07. 19	35SS
40	kabeláže, stožáry	90 dny	31.07. 19	28.10. 19	39;35FS-5 dny
41	dokončovací práce	14 dny	13.12. 19	26.12. 19	29
42	***Ukončení provádění díla, předání a převzetí***	***0 dny***	26.12. 19	26.12. 19	41

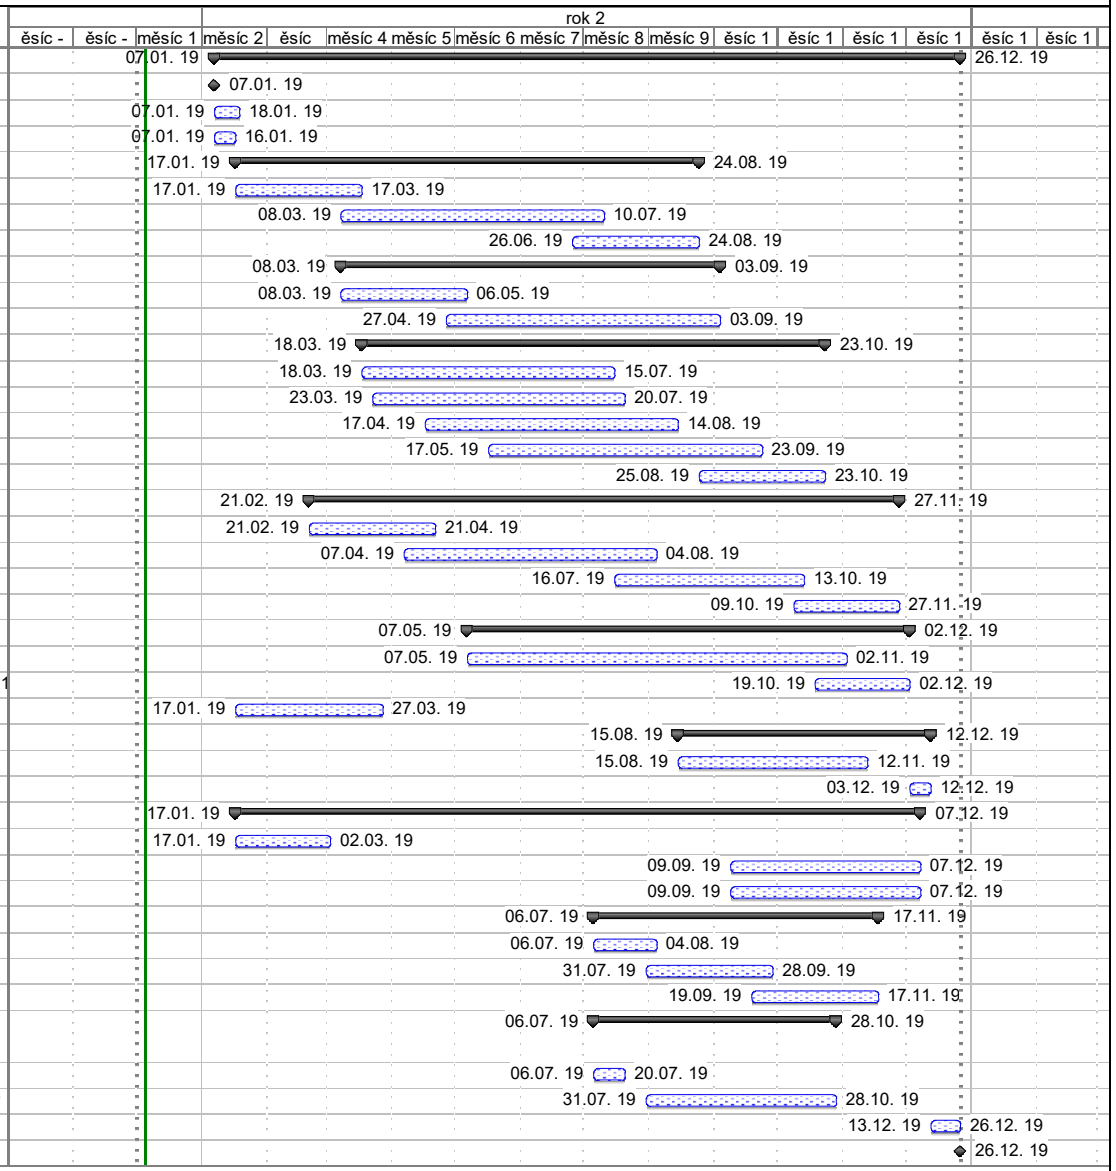

Úkol Přerušení Milník Souhrnný
