# Plán organizace výstavby, aktualizace ze dne 25.1.2019

Příl. č. 5

| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY** | **381 dny** | **01.07. 18** | **31.08. 19** |
| 2 | **SO 21.1 Hlavní tribuna** | **63 dny** | **09.07. 18** | **17.09. 18** |
| 20 | **SO 21.2 Demolice trafostanice a rozvodny VN** | **12 dny** | **10.02. 19** | **23.02. 19** |
| 25 | **SO 21.3 Demolice hospodářských budov** | **31 dny** | **01.08. 18** | **04.09. 18** |
| 30 | **SO 21.4 Demolice výsledkové tabule** | **6 dny** | **20.07. 18** | **26.07. 18** |
| 35 | **SO 21.5 Demolice objektů pokladen** | **6 dny** | **09.07. 18** | **15.07. 18** |
| 40 | **SO 21.6 Odstranění drobných objektů** | **10 dny** | **09.07. 18** | **19.07. 18** |
| 45 | **SO 21.7 Odstranění hlediště tréninik. hřiště** | **8 dny** | **30.07. 18** | **07.08. 18** |
| 50 | **SO 21.8 Odbourání části jižního hlediště** | **10 dny** | **01.08. 18** | **12.08. 18** |
| 55 | | | | |
| 56 | **SO 01 - Hlavní objekt** | **376 dny** | **01.07. 18** | **26.08. 19** |
| 57 | **Zemní práce** | **255 dny** | **01.07. 18** | **12.04. 19** |
| 58 | **Sanace základové spáry** | **63 dny** | **01.07. 18** | **09.09. 18** |
| 62 | Zásypy kolem objektu | 145 dny | 01.11. 18 | 12.04. 19 |
| 63 | **Zakládání** | **152 dny** | **20.09. 18** | **08.03. 19** |
| 64 | Základová deska | 60 dny | 20.09. 18 | 26.11. 18 |
| 65 | Drenáže | 110 dny | 06.11. 18 | 08.03. 19 |
| 66 | **Svislé a kompletní konstrukce** | **210 dny** | **01.10. 18** | **23.05. 19** |
| 67 | Monolitické Kce 2.PP | 20 dny | 01.10. 18 | 23.10. 18 |
| 68 | Monolitické Kce 1.PP | 60 dny | 01.10. 18 | 06.12. 18 |
| 69 | Monolitické Kce 1.NP | 60 dny | 01.10. 18 | 06.12. 18 |
| 70 | Monolitické Kce 2.NP | 40 dny | 10.01. 19 | 23.02. 19 |
| 71 | Prefa prvky 2.PP | 10 dny | 07.11. 18 | 18.11. 18 |
| 72 | Prefa prvky a spiroly 1.PP | 30 dny | 20.11. 18 | 23.12. 18 |
| 73 | Prefa prvky a spiroly 1.NP | 25 dny | 07.01. 19 | 03.02. 19 |
| 74 | Prefa prvky a spiroly 2.NP | 25 dny | 01.02. 19 | 28.02. 19 |
| 75 | Obvodové zdivo 1.PP | 50 dny | 01.02. 19 | 28.03. 19 |
| 76 | Obvodové zdivo 1.NP | 60 dny | 21.01. 19 | 28.03. 19 |
| 77 | Obvodové zdivo 2.NP | 50 dny | 01.03. 19 | 25.04. 19 |
| 78 | Zděné příčky 2.PP | 50 dny | 01.03. 19 | 25.04. 19 |
| 79 | Zděné příčky 1.PP | 40 dny | 01.04. 19 | 15.05. 19 |
| 80 | Zděné příčky 1.NP | 40 dny | 01.04. 19 | 15.05. 19 |
| 81 | Zděné příčky 2.NP | 30 dny | 20.04. 19 | 23.05. 19 |
| 82 | Vodorovné konstrukce | 110 dny | 01.12. 18 | 03.04. 19 |
| 83 | Úpravy povrchu, podlahy a výplně otvorů | 110 dny | 20.04. 19 | 21.08. 19 |
| 84 | Ostatní konstrukce a bourání | 230 dny | 01.07. 18 | 15.03. 19 |
| 85 | Zastřešení | 50 dny | 10.02. 19 | 06.04. 19 |
| 86 | Lešení a stavební výtahy | 200 dny | 01.12. 18 | 12.07. 19 |
| 87 | Přesun sutě | 310 dny | 18.07. 18 | 30.06. 19 |
| 88 | Přesun hmot | 320 dny | 01.09. 18 | 25.08. 19 |
| 89 | **PSV - Práce a dodávky PSV** | **246 dny** | **06.11. 18** | **08.08. 19** |
| 120 | **M - Práce a dodávky M** | **342 dny** | **01.08. 18** | **19.08. 19** |
| 121 | **VZT** | **125 dny** | **01.04. 19** | **18.08. 19** |
| 122 | Rozvody | 100 dny | 01.04. 19 | 21.07. 19 |
| 123 | VZT jednotky | 55 dny | 01.06. 19 | 01.08. 19 |
| 124 | Kompletace | 25 dny | 10.07. 19 | 06.08. 19 |
| 125 | Regulace systému | 15 dny | 01.08. 19 | 17.08. 19 |
| 126 | **Silnoproud** | **338 dny** | **01.08. 18** | **14.08. 19** |
| 127 | Hromosvod a uzemnění | 290 dny | 01.08. 18 | 21.06. 19 |
| 128 | Kabelové rozvody a elektroinstalační materiál | 95 dny | 15.03. 19 | 29.06. 19 |
| 129 | Rozvaděče | 40 dny | 01.06. 19 | 16.07. 19 |
| 130 | Kompletace | 40 dny | 01.07. 19 | 14.08. 19 |
| 131 | **SLP a MaR** | **136 dny** | **15.03. 19** | **14.08. 19** |
| 132 | Kabelové rozvody a elektroinstalační materiál | 105 dny | 15.03. 19 | 10.07. 19 |
| 133 | Rozvaděče | 35 dny | 20.06. 19 | 29.07. 19 |
| 134 | Kompletace | 40 dny | 01.07. 19 | 14.08. 19 |
| 135 | **Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh** | **45 dny** | **20.06. 19** | **09.08. 19** |
| 136 | Výtah - 3 stanice | 45 dny | 20.06. 19 | 09.08. 19 |
| 137 | **OST - Ostatní** | **35 dny** | **15.07. 19** | **22.08. 19** |
| 138 | GASTRO - TECHNOLOGIE | 35 dny | 15.07. 19 | 22.08. 19 |
| 139 | | | | |
| 140 | **SO 02 - Tréninkové hřiště 1 ( hlavní hrací plocha )** | **137 dny** | **20.03. 19** | **20.08. 19** |
| 141 | Zemní práce | 87 dny | 20.03. 19 | 25.06. 19 |
| 142 | Povrchové úpravy terénu | 50 dny | 20.06. 19 | 14.08. 19 |
| 143 | Základy a zvláštní zakládání | 21 dny | 01.04. 19 | 24.04. 19 |
| 144 | Základy | 33 dny | 15.05. 19 | 20.06. 19 |
| 145 | Automatická závlaha | 58 dny | 01.05. 19 | 04.07. 19 |
| 146 | Potrubí z drenážek | 27 dny | 20.04. 19 | 20.05. 19 |
| 147 | Vybavení sportovišť | 35 dny | 05.07. 19 | 13.08. 19 |
| 148 | Oplocení záchytné | 33 dny | 01.06. 19 | 08.07. 19 |
| 149 | Přesun hmot | 137 dny | 20.03. 19 | 20.08. 19 |
| 150 | **SO 03 - Tréninkové hřiště 2 ( travnaté hřiště )** | **140 dny** | **20.03. 19** | **23.08. 19** |
| 151 | Zemní práce | 35 dny | 20.03. 19 | 28.04. 19 |
| 152 | Povrchové úpravy terénu | 70 dny | 01.06. 19 | 18.08. 19 |
| 153 | Základy | 33 dny | 15.05. 19 | 20.06. 19 |
| 154 | Automatická závlaha | 59 dny | 25.04. 19 | 30.06. 19 |
| 155 | Potrubí z drenážek | 46 dny | 10.04. 19 | 31.05. 19 |
| 156 | Vybavení sportovišť | 43 dny | 05.07. 19 | 22.08. 19 |
| 157 | Oplocení záchytné | 36 dny | 01.06. 19 | 11.07. 19 |
| 158 | Přesun hmot | 137 dny | 20.03. 19 | 20.08. 19 |
| 159 | **SO 04 - Tréninkové hřiště 2 ( umělá tráva )** | **140 dny** | **20.03. 19** | **23.08. 19** |
| 160 | Zemní práce | 34 dny | 20.03. 19 | 26.04. 19 |
| 161 | Základy | 14 dny | 15.05. 19 | 30.05. 19 |
| 162 | Umělé povrchy | 30 dny | 20.07. 19 | 22.08. 19 |
| 163 | Podkladní vrstvy umělých povrchů | 77 dny | 15.04. 19 | 09.07. 19 |
| 164 | Automatická závlaha | 64 dny | 22.05. 19 | 01.08. 19 |
| 165 | Potrubí z drenážek | 58 dny | 05.04. 19 | 09.06. 19 |
| 166 | Vybavení sportovišť | 31 dny | 15.07. 19 | 18.08. 19 |
| 167 | Oplocení záchytné | 33 dny | 26.06. 19 | 01.08. 19 |
| 168 | Ohraničení plochy obrubníky | 39 dny | 01.06. 19 | 15.07. 19 |
| 169 | Přesun hmot | 137 dny | 20.03. 19 | 20.08. 19 |
| 170 | **SO 04.2 Umělé LED osvětlení** | **95 dny** | **01.04. 19** | **16.07. 19** |
| 174 | **SO 05 - Terénní úpravy** | **220 dny** | **01.08. 18** | **04.04. 19** |
| 175 | **HSV - Práce a dodávky HSV** | **220 dny** | **01.08. 18** | **04.04. 19** |
| 176 | Zemní práce | 220 dny | 01.08. 18 | 04.04. 19 |
| 177 | **SO 05.1 - Pilotové stěny** | **300 dny** | **01.09. 18** | **02.08. 19** |
| 178 | **HSV - Práce a dodávky HSV** | **300 dny** | **01.09. 18** | **02.08. 19** |
| 179 | Zemní práce | 100 dny | 01.10. 18 | 20.01. 19 |
| 180 | Zakládání - piloty | 90 dny | 10.10. 18 | 18.01. 19 |
| 181 | Základy | 120 dny | 01.10. 18 | 12.02. 19 |
| 182 | Zakládání - zpevňování hornin - injektáže a mikropil | 40 dny | 05.02. 19 | 21.03. 19 |
| 183 | Svislé a kompletní konstrukce | 35 dny | 05.02. 19 | 15.03. 19 |
| 184 | Ostatní konstrukce a práce a monitoring | 300 dny | 01.09. 18 | 02.08. 19 |
| 185 | **PSV - Práce a dodávky PSV** | **60 dny** | **01.03. 19** | **07.05. 19** |
| 186 | Konstrukce zámečnické | 60 dny | 01.03. 19 | 07.05. 19 |
| 187 | **SO 05.2 - Opěrné zdi** | **239,5 dny** | **01.10. 18** | **25.06. 19** |
| 188 | **HSV - Práce a dodávky HSV** | **228 dny** | **01.10. 18** | **12.06. 19** |
| 189 | Zemní práce | 155 dny | 01.10. 18 | 22.03. 19 |
| 190 | Zakládání | 110 dny | 01.11. 18 | 04.03. 19 |
| 191 | Vodorovné konstrukce | 140 dny | 01.10. 18 | 06.03. 19 |
| 192 | Svislé a kompletní konstrukce | 125 dny | 01.11. 18 | 20.03. 19 |
| 193 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 200 dny | 01.11. 18 | 12.06. 19 |
| 194 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 135 dny | 01.11. 18 | 01.04. 19 |
| 195 | Přesun hmot | 200 dny | 01.11. 18 | 12.06. 19 |
| 196 | **PSV - Práce a dodávky PSV** | **211,5 dny** | **01.11. 18** | **25.06. 19** |
| 197 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 125 dny | 01.11. 18 | 20.03. 19 |
| 198 | Konstrukce zámečnické | 30 dny | 01.04. 19 | 03.05. 19 |
| 199 | Dokončovací práce - nátěry | 50 dny | 01.05. 19 | 25.06. 19 |
| 200 | **SO 06 - Areálový vodovod (areálový rozvod vody)** | **70 dny** | **01.03. 19** | **18.05. 19** |
| 207 | **SO 07 - Splašková areálová kanalizace** | **100 dny** | **01.03. 19** | **20.06. 19** |
| 217 | **SO 07.1 - Lapák tuku** | **30 dny** | **10.03. 19** | **12.04. 19** |
| 226 | **SO 08 - Dešťová kanalizace areálová** | **105 dny** | **01.03. 19** | **26.06. 19** |
| 234 | **SO 08.1 - Odlučovač lehkých kapalin** | **35 dny** | **01.03. 19** | **09.04. 19** |
| 242 | **SO 08.2 - Retenční nádrže** | **35 dny** | **25.02. 19** | **04.04. 19** |
| 255 | **SO 10 - Úprava přípojky tepla** | **20 dny** | **01.04. 19** | **23.04. 19** |
| 262 | **SO 11 - Přeložka distribuční VN rozvodny a areálové TRF** | **110 dny** | **01.11. 18** | **04.03. 19** |
| 268 | **SO 13 - Kabelové trasy NN** | **60 dny** | **01.03. 19** | **07.05. 19** |
| 273 | **SO 14 - Kabelové trasy SLP** | **60 dny** | **01.03. 19** | **07.05. 19** |
| 282 | **SO 15 - Místní rozhlas** | **60 dny** | **01.03. 19** | **07.05. 19** |
| 287 | **SO 16 - Venkovní osvětlení** | **60 dny** | **15.03. 19** | **21.05. 19** |
| 293 | **SO 17 - Komunikace a zpevněné plochy** | **95 dny** | **15.04. 19** | **30.07. 19** |
| 330 | **SO 18 - Vedlejší tréninkové plochy** | **35 dny** | **01.04. 19** | **09.05. 19** |
| 338 | **SO 19 - Úprava oplocení** | **91 dny** | **01.04. 19** | **11.07. 19** |
| 351 | **SO 20 - Sadové úpravy** | **91 dny** | **15.04. 19** | **25.07. 19** |
| 356 | Dokončovací práce, zkoušky a měření | 34 dny | 20.07. 19 | 27.08. 19 |
| 357 | Předání díla objednateli | 0 dny | 31.08. 19 | 31.08. 19 |

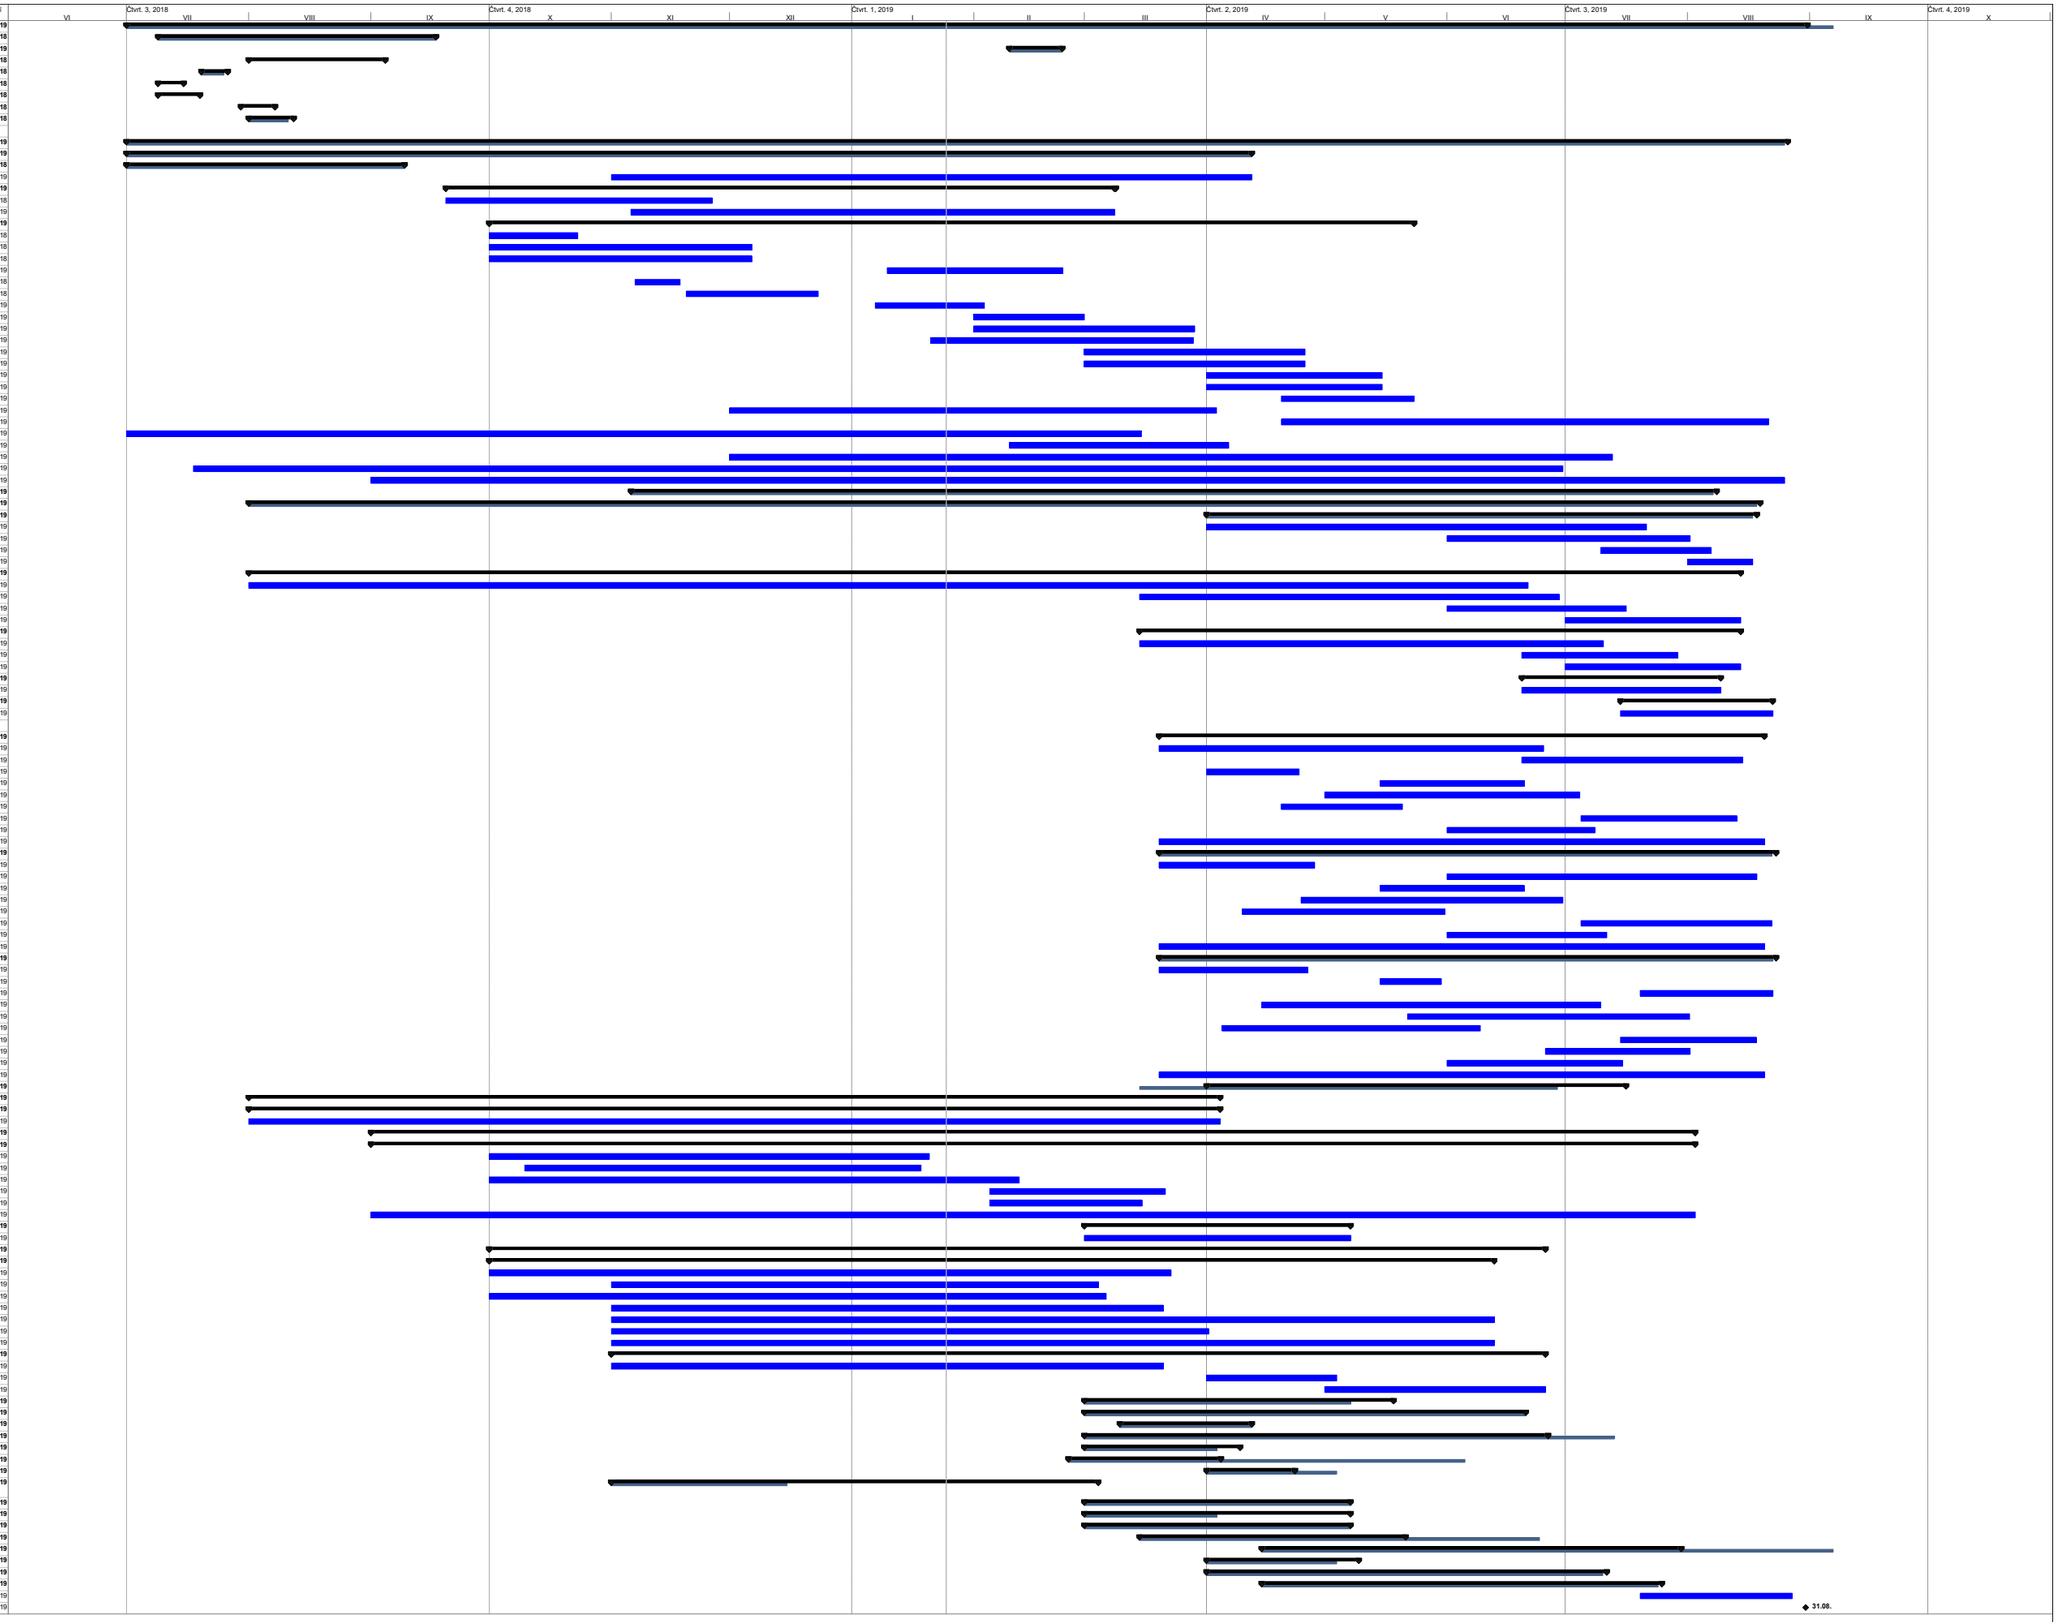


Projekt: MSProj11
Datum: 25.01. 19

Úkol | Rozdělení | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu | Vnější úkoly | Vnější milník | Neaktivní milník | Neaktivní souhrn | Ruční úkol | Pouze s dobou trvání | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Ruční souhrn | Pouze zahájení | Pouze s datem dokončení | Vnější úkoly | Vnější milník | Průběh | Konečný termín
