HARMONOGRAM STAVBY

17.05.2018

Akce: II/2017 Modernizace silnice Smilov - Lažany

práce	subdodavatel	datum		doba	07/2018			08/2018					09/2018				10/2018				11/2018					12/2018				01/2019				
		zahájení	dokončení	dní	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
DIO - dopravně inženýrská opatření																																	
částečná uzavírka - 3. úsek		09.07.2018	10.08.2018																														
úplná uzavírka - 3. a 5. úsek		11.08.2018	28.10.2018																														
úplná uzavírka - 1 úsek		29.10.2018	17.01.2019																														
Úsek 1 - km 5,026 - 5,830 (804 m)		**29.10.2018**	**17.01.2019**																														
přípravné práce																																	
opěrá zeď																																	
odvodnění																																	
zemní práce																																	
konstrukce komunikace																																	
pokládka asfaltových směsí																																	
dokončovací práce																																	
Úsek 3 - km 6,350 - 7,060 (710 m)		**09.07.2018**	**28.10.2018**																														
přípravné práce																																	
opěrá zeď																																	
zemní práce																																	
odvodnění																																	
konstrukce komunikace																																	
pokládka asfaltových směsí																																	
dokončovací práce																																	
Úsek 5 - km 7,894 - 8,676 (782 m)		**30.07.2018**	**28.10.2018**																														
přípravné práce																																	
zemní práce																																	
odvodnění																																	
konstrukce komunikace																																	
pokládka asfaltových směsí																																	
dokončovací práce																																	

HARMONOGRAM STAVBY

19.11.2018

Akce: II/2017 Modernizace silnice Smilov - Lažany
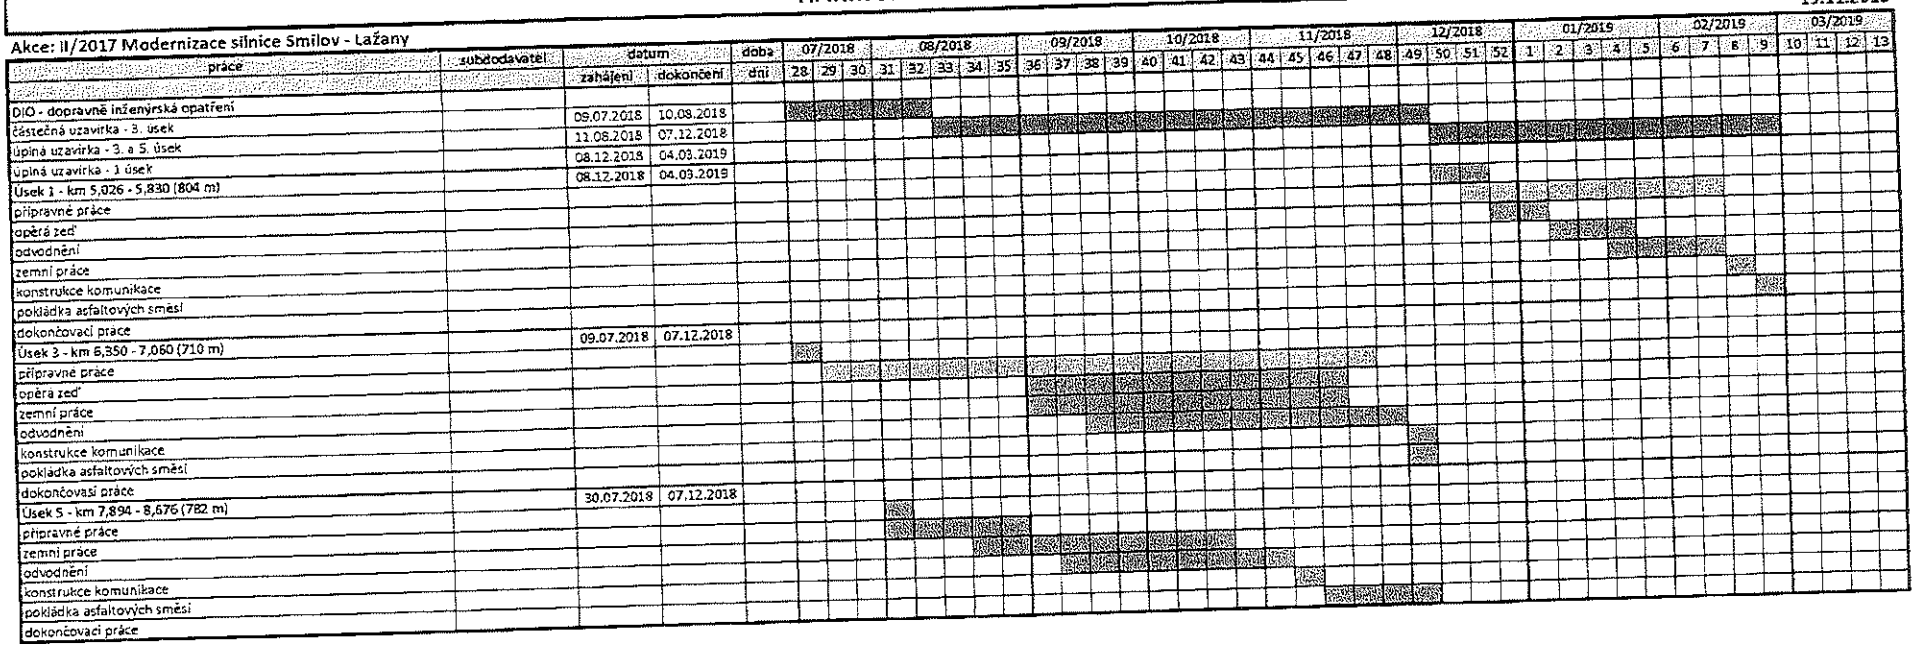
práce	subdodavatel	datum zahájení	datum dokončení	doba dní
DIO - dopravně inženýrská opatření		09.07.2018	10.08.2018	
částečná uzavírka - 3. úsek		11.08.2018	07.12.2018	
úplná uzavírka - 3. a 5. úsek		08.12.2018	04.03.2019	
úplná uzavírka - 1 úsek		08.12.2018	04.03.2019	
Úsek 1 - km 5,026 - 5,830 (804 m)				
přípravné práce				
opěrá zeď				
odvodnění				
zemní práce				
konstrukce komunikace				
pokládka asfaltových směsí				
dokončovací práce				
Úsek 2 - km 6,350 - 7,060 (710 m)		09.07.2018	07.12.2018	
přípravné práce				
opěrá zeď				
zemní práce				
odvodnění				
konstrukce komunikace				
pokládka asfaltových směsí				
dokončovací práce				
Úsek 5 - km 7,894 - 8,676 (782 m)		30.07.2018	07.12.2018	
přípravné práce				
zemní práce				
odvodnění				
konstrukce komunikace				
pokládka asfaltových směsí				
dokončovací práce
