HARMONOGRAM PRACÍ

ID	Číslo SO/PS	č.klenby	Zhotov	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1				**milníky**	**1448 dny**	**25.04. 17**	**31.05. 21**	
2				PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ	0 dny	25.04. 17	25.04. 17	
3				doba pro dokončení stavebních prací	1316 dny	25.04. 17	30.11. 20	
4				doba pro dokončení díla	1498 dny	25.04. 17	31.05. 21	
5				výluka	1043 dny	04.07. 17	30.06. 20	
6				ukončení výluky	0 dny	30.06. 20	30.06. 20	7FF
7				zatěžovací zkoušky	16 dny	15.06. 20	30.06. 20	
8				**PRÁCE NA CELÉM ÚSEKU STAVBY**	**1407 dny**	**05.06. 17**	**31.05. 21**	
9			**STR**	**E.1.1 Železniční svršek a spodek**	**1027 dny**	**04.07. 17**	**14.06. 20**	
10	11-01.1		STR	železniční svršek - demontáž	31 dny	04.07. 17	03.08. 17	
11	11-01.2		STR	železniční svršek - demontáž	31 dny	04.07. 17	03.08. 17	
12	11-02.1		STR	železniční spodek - demontáž	25 dny	10.07. 17	03.08. 17	10FF
13	11-02.2		STR	železniční spodek - demontáž	23 dny	12.07. 17	03.08. 17	11FF
14	11-01.1		STR	žel. svršek - montáž II. Úseku (Bubny - IBC)	234 dny	30.09. 19	14.06. 20	
15	11-01.1		STR	žel. svršek - montáž III. Úseku (IBC - Křižíkova)	226 dny	08.10. 19	14.06. 20	
16	11-01.2		STR	žel. svršek - montáž I. Úseku (Hrabovka)	240 dny	24.09. 19	14.06. 20	
17	11-01.2		STR	žel. svršek - montáž IV. Úseku (Křižíkova - Masar.n.)	70 dny	06.04. 20	14.06. 20	
18	11-02.1		STR	železniční spodek - montáž	234 dny	30.09. 19	14.06. 20	
19	11-02.2		STR	železniční spodek - montáž	240 dny	24.09. 19	14.06. 20	
20	11-03.1		STR	vystrojení trati	234 dny	30.09. 19	14.06. 20	
21	11-03.2		STR	vystrojení trati	240 dny	24.09. 19	14.06. 20	
22			**STR**	**E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (ochrana inženýrských sítí)**	**1205 dny**	**25.06. 17**	**30.11. 20**	
23	15-01.1		STR	Ochrana sdělovací kabelizace PRE - část 1	9 dny	25.06. 17	03.07. 17	
24	15-01.2		STR	Ochrana sdělovací kabelizace PRE - část 2	9 dny	25.06. 17	03.07. 17	
25	15-03		STR	Ochrana sdělovací kabelizace Dial Telecom, Telekom Austria	900 dny	26.04. 18	30.11. 20	
26	15-04		STR	Ochrana sdělovací kabelizace UPC	1190 dny	10.07. 17	30.11. 20	
27	15-05		STR	Úprava sdělovací kabelizace ČSAD Praha Holding	53 dny	16.11. 17	07.01. 18	
28	15-06		STR	Ochrana sdělovací kabelizace GTS Novera	524 dny	01.06. 19	30.11. 20	
29	15-07.1		STR	Ochrana sdělovací kabelizace T-Systems Pragonet - část 1	1190 dny	10.07. 17	30.11. 20	
30	15-07.2		STR	Ochrana sdělovací kabelizace T-Systems Pragonet - část 2	1190 dny	10.07. 17	30.11. 20	
31	15-09		STR	Ochrana kamerového systému Hl.města Prahy	849 dny	16.06. 18	30.11. 20	
32	15-10.1		STR	Odstranění vestaveb oblouků a přilehlých objektů - část 1	1190 dny	10.07. 17	30.11. 20	
33	15-10.2		STR	Odstranění vestaveb oblouků a přilehlých objektů - část 2	868 dny	28.05. 18	30.11. 20	
34			**STR**	**E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)**	**1108 dny**	**30.09. 17**	**30.11. 20**	
35	16-01.1		STR	Odvodnění Negrelliho viaduktu	800 dny	04.08. 18	30.11. 20	
36	16-01.2		STR	Odvodnění Negrelliho viaduktu	1108 dny	30.09. 17	30.11. 20	
37	16-02.1		STR	obnova vodovodní přípojky pro stavědlo	400 dny	03.10. 19	30.11. 20	
38	16-03		STR	splašková přípojka pro stavědlo	200 dny	15.05. 20	30.11. 20	
39			**HT**	**E.1.8 Pozemní komunikace**	**1199 dny**	**01.07. 17**	**30.11. 20**	
40	18-01.1		HT	Úpravy povrchů - část 1	843 dny	22.06. 18	30.11. 20	
41	18-01.2		HT	Úpravy povrchů - část 2	1110 dny	28.09. 17	30.11. 20	
42	18-02.1		HT	Dopravní opatření - část 1	1199 dny	01.07. 17	30.11. 20	
43	18-02.2		HT	Dopravní opatření - část 2	1199 dny	01.07. 17	30.11. 20	
44			**HT**	**E.1.9 Kabelovody, kolektory**	**241 dny**	**23.09. 19**	**14.06. 20**	
45	19-01.1		HT	Kabelovod - úsek Bubny - IBC	241 dny	23.09. 19	14.06. 20	
46	19-01.2		HT	Kabelovod - úsek Křižíkova - Masarykovo nádr.	77 dny	30.03. 20	14.06. 20	
47			**STR**	**E.2.1 Pozemní stavební objekty**	**1159 dny**	**10.06. 17**	**30.09. 20**	
48	21-01		STR	Dostavba přístřešku ANF	63 dny	30.07. 20	30.09. 20	
49	21-02		STR	Stavební úpravy vodárny	40 dny	01.09. 18	10.10. 18	
50	21-03		STR	Stavební úpravy hradla č. 4	94 dny	14.07. 19	15.10. 19	
51	25-01		STR	Demolice hostince	21 dny	10.06. 17	30.06. 17	
52	25-02		STR	Demolice přístřešku ANF	102 dny	14.11. 17	23.02. 18	
53			**STR**	**E.3.1 Trakční vedení**	**1027 dny**	**04.07. 17**	**14.06. 20**	
54	31-01.1		STR	Demontáž TV	31 dny	04.07. 17	03.08. 17	
55	31-01.2		STR	Demontáž TV	31 dny	04.07. 17	03.08. 17	
56	31-01.1		STR	Montáž TV	234 dny	30.09. 19	14.06. 20	
57	31-01.2		STR	Montáž TV	240 dny	24.09. 19	14.06. 20	
58			**STR**	**E.3.4 Ohřev výměn**	**240 dny**	**24.09. 19**	**14.06. 20**	
59	34-01.1		STR	Masarykovo n., úprava EOV - část 1	234 dny	30.09. 19	14.06. 20	
60	34-01.2		STR	Masarykovo n., úprava EOV - část 2	240 dny	24.09. 19	14.06. 20	
61			**STR**	**E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů**	**1194 dny**	**05.06. 17**	**30.10. 20**	
62	36-01.1		STR	Masarykovo n., úprava DOÚO - část 1 (demontáž)	38 dny	04.07. 17	10.08. 17	
63	36-01.2		STR	Masarykovo n., úprava DOÚO - část 2 (demontáž)	38 dny	04.07. 17	10.08. 17	
64	36-01.1		STR	Masarykovo n., úprava DOÚO - část 1 (montáž)	234 dny	30.09. 19	14.06. 20	
65	36-01.2		STR	Masarykovo n., úprava DOÚO - část 2 (montáž)	240 dny	24.09. 19	14.06. 20	
66	36-02.1		STR	Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 1 (demontáž)	38 dny	04.07. 17	10.08. 17	
67	36-02.2		STR	Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 2 (demontáž)	38 dny	04.07. 17	10.08. 17	
68	36-02.1		STR	Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 1 (montáž)	234 dny	30.09. 19	14.06. 20	
69	36-02.2		STR	Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 2 (montáž)	240 dny	24.09. 19	14.06. 20	
70	36-03		STR	Bubny, úprava rozvodu nn a osvětlení	26 dny	05.06. 17	30.06. 17	
71	36-04.1		STR	Úprava kabelového vedení 22 kV PREdistribuce - část 1	234 dny	30.09. 19	14.06. 20	
72	36-04.2		STR	Úprava kabelového vedení 22 kV PREdistribuce - část 2	240 dny	24.09. 19	14.06. 20	

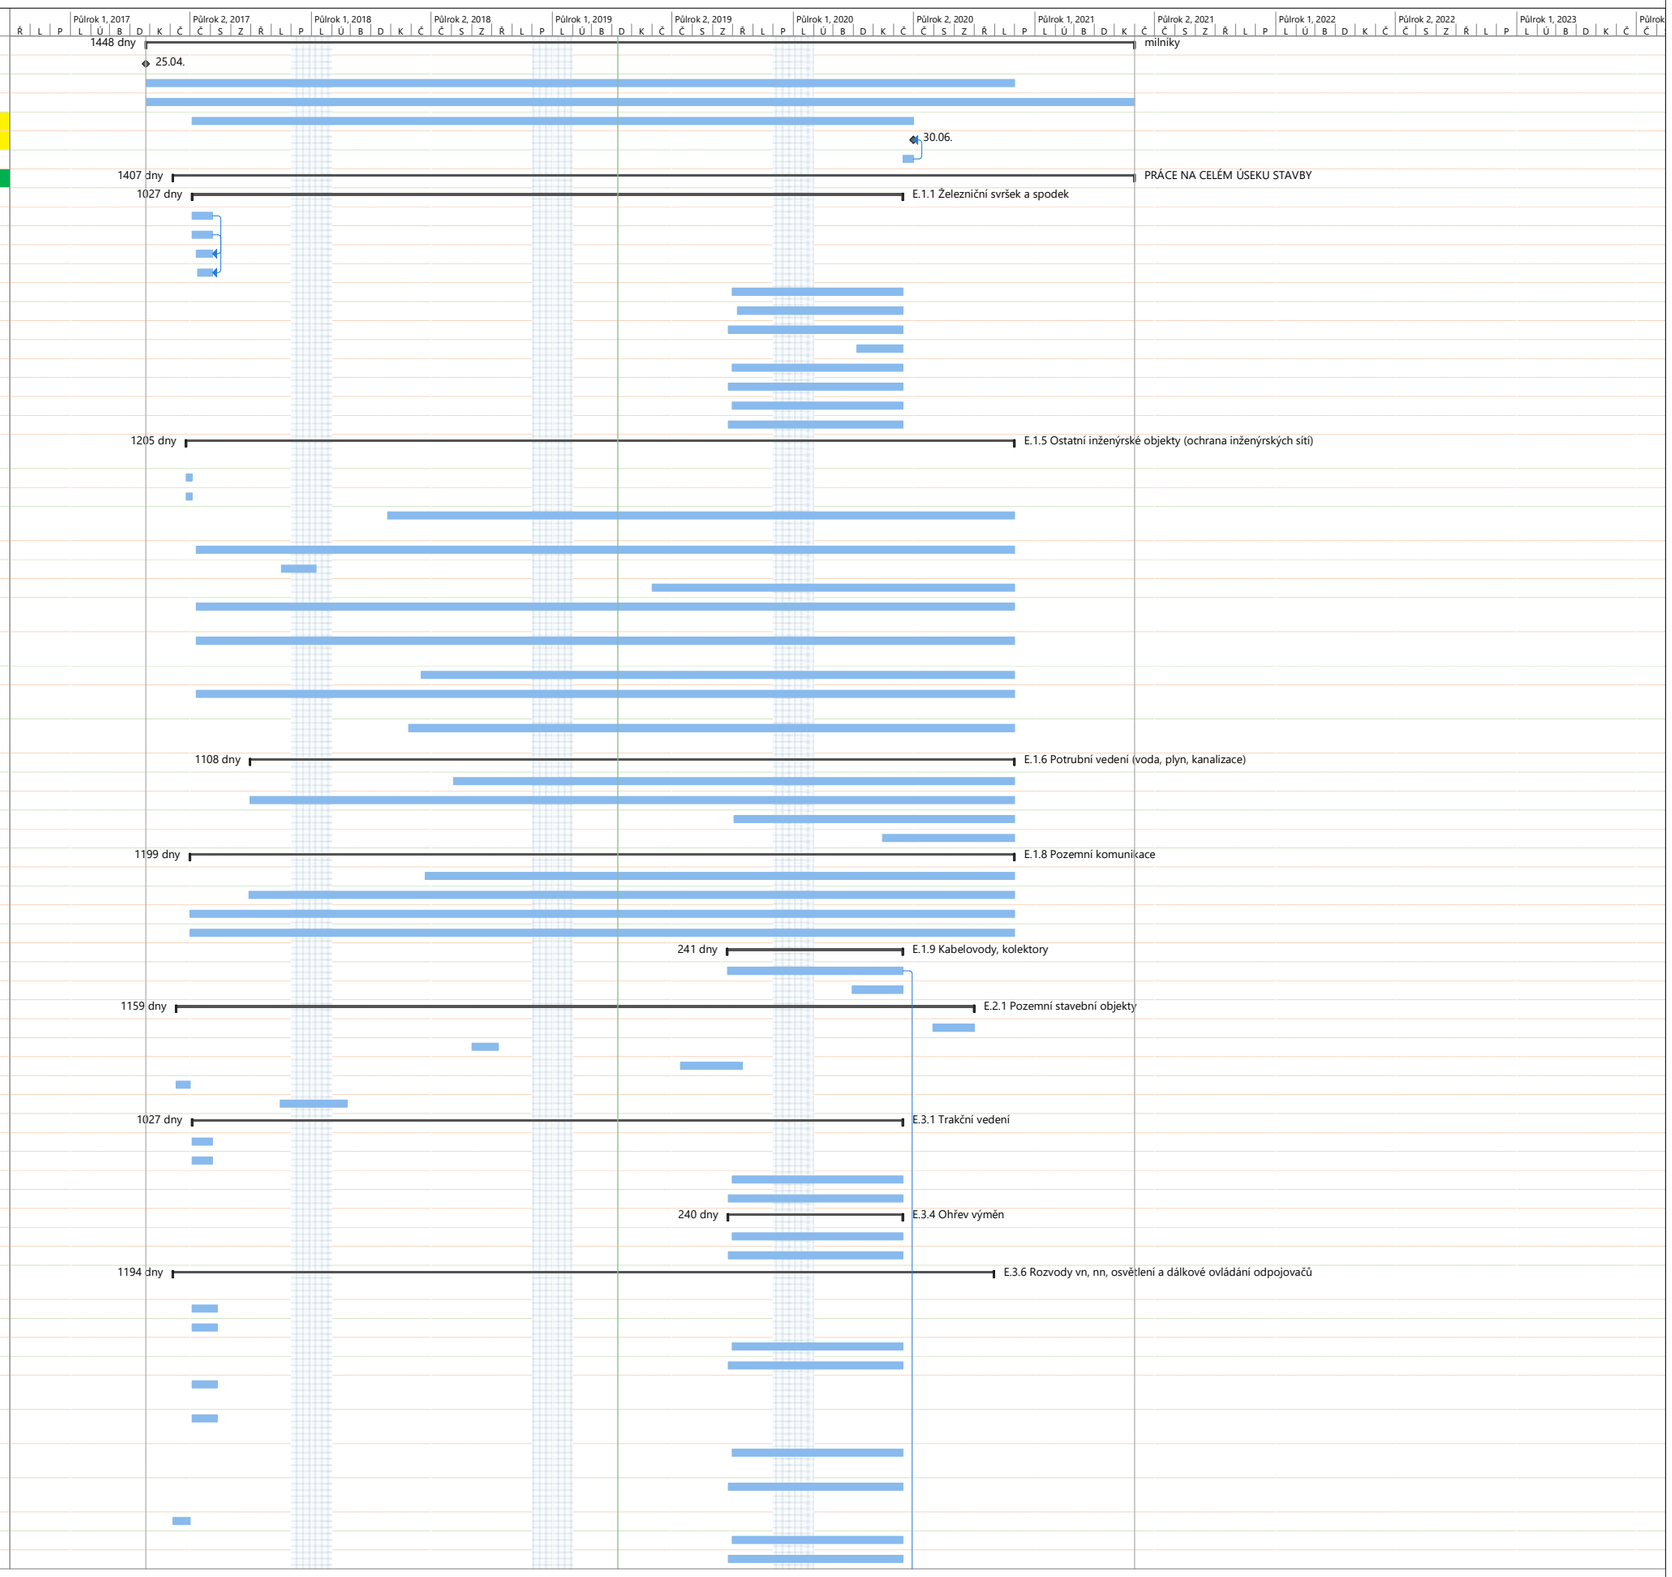

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	Číslo SO/PS	č.klenby	Zhotov	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
73	36-05.1		STR	Úprava kabelového vedení nn, vn PREdistribuce - Karlín - část 1	1165 dny	04.07. 17	30.10. 20	
74	36-05.2		STR	Úprava kabelového vedení nn, vn PREdistribuce - Karlín - část 2	1165 dny	04.07. 17	30.10. 20	
75	36-06		STR	Úprava kabelového vedení nn ČSAD holding	105 dny	25.09. 17	07.01. 18	
76	36-07		STR	Úprava kabelového vedení ELTODO	400 dny	03.08. 18	01.10. 19	
77			**STR**	**E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí**	**240 dny**	**24.09. 19**	**14.06. 20**	
78	37-01.1		STR	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, ukolejnění vodivých konstrukcí	234 dny	30.09. 19	14.06. 20	
79	37-01.2		STR	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, ukolejnění vodivých konstrukcí - část 2	240 dny	24.09. 19	14.06. 20	
80				**Všeobecný objekt stavby**	**1402 dny**	**10.06. 17**	**31.05. 21**	
81	9898			Všeobecný objekt	1452 dny	10.06. 17	31.05. 21	
82			**STR**	**D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení**	**1027 dny**	**04.07. 17**	**14.06. 20**	
83	PS 11-01.1		STR	ŽST Masarykovo n., úpravy SZZ část 1 (demontáž)	38 dny	04.07. 17	10.08. 17	
84	PS 11-01.2		STR	ŽST Masarykovo n., úpravy SZZ část 2 (demontáž)	38 dny	04.07. 17	10.08. 17	
85	PS 11-01.1		STR	ŽST Masarykovo n., úpravy SZZ část 1 (montáž)	234 dny	30.09. 19	14.06. 20	
86	PS 11-01.2		STR	ŽST Masarykovo n., úpravy SZZ část 2 (montáž)	240 dny	24.09. 19	14.06. 20	
87			**STR**	**D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů**	**1027 dny**	**04.07. 17**	**14.06. 20**	
88	PS 21-01.1		STR	Úprava sdělovací kabelizace SŽDC - část 1 (demontáž)	38 dny	04.07. 17	10.08. 17	
89	PS 21-01.2		STR	Úprava sdělovací kabelizace SŽDC - část 2 (demontáž)	38 dny	04.07. 17	10.08. 17	
90	PS 21-01.1		STR	Úprava sdělovací kabelizace SŽDC - část 1 (montáž)	234 dny	30.09. 19	14.06. 20	
91	PS 21-01.2		STR	Úprava sdělovací kabelizace SŽDC - část 2 (montáž)	240 dny	24.09. 19	14.06. 20	
92			**STR**	**D.2.2 Rozhlasové zařízení**	**1194 dny**	**05.06. 17**	**30.10. 20**	
93	PS 22-01		STR	Provizorní rozhlasové zařízení ŽST Praha - Bubny - zřízení	26 dny	05.06. 17	30.06. 17	
94	PS 22-01		STR	Provizorní rozhlasové zařízení ŽST Praha - Bubny - odstranění	372 dny	30.09. 19	30.10. 20	
95			**STR**	**D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)**	**1027 dny**	**04.07. 17**	**14.06. 20**	
96	PS 23-01.1		STR	Úprava sdělovacího zařízení - část 1 (demontáž)	38 dny	04.07. 17	10.08. 17	
97	PS 23-01.2		STR	Úprava sdělovacího zařízení - část 2 (demontáž)	38 dny	04.07. 17	10.08. 17	
98	PS 23-01.1		STR	Úprava sdělovacího zařízení - část 1 (montáž)	234 dny	30.09. 19	14.06. 20	
99	PS 23-01.2		STR	Úprava sdělovacího zařízení - část 2 (montáž)	240 dny	24.09. 19	14.06. 20	
100	**14-01**			**SO 14-01 Železniční most v ev. km 0,311(N 101)**	**1059 dny**	**07.07. 17**	**19.07. 20**	
101	15-01.2		STR	přeložka kabelu PRE distibuce za OP1	2 dny	07.07. 17	08.07. 17	
102	14-01		STR	pažení za OP1 (HEB)	2 dny	15.07. 17	16.07. 17	
103	14-01		STR	TI typ 2	7 dny	17.07. 17	23.07. 17	
104	14-01		STR	výkopové práce vč.výdřevy	2 dny	25.07. 17	26.07. 17	
105	14-01		STR	kotevní převázka	3 dny	01.08. 17	03.08. 17	
106	14-01		STR	dokončení výkopových prací vč.výdřevy	2 dny	06.08. 17	07.08. 17	
107	14-01		STR	montáž podpěrné konstrukce NK / zdvih NK včetně demolice říms	7 dny	21.08. 17	27.08. 17	
108	**14-01**		**STR**	**OP1: bourání a betonáž**	**49 dny**	**04.08. 17**	**21.09. 17**	
109	14-01		STR	OP1: Stavba lešení	2 dny	04.08. 17	05.08. 17	
110	14-01		STR	OP1: výkopové práce za záv.zdí a ÚP	2 dny	06.08. 17	07.08. 17	109
111	14-01		STR	OP1: Bourání stávajícího úložného prahu a závěrné zdi	7 dny	08.08. 17	14.08. 17	110
112	14-01		STR	OP1: Provedení mikropilot a TI	14 dny	15.08. 17	28.08. 17	111
113	14-01		STR	OP1: Bednění, výztuž a betonáž nového úložného prahu	14 dny	29.08. 17	11.09. 17	112
114	14-01		STR	OP1: Bednění, výztuž a betonáž závěrné zdi	7 dny	12.09. 17	18.09. 17	113
115	14-01		STR	OP1: Betonáž ložiskových bločků	2 dny	19.09. 17	20.09. 17	114
116	14-01		STR	OP1: Zabezpečení průchodu pro pěší	1 den	21.09. 17	21.09. 17	115
117	**14-01**		**STR**	**OP2: bourání a betonáž**	**48 dny**	**22.09. 17**	**08.11. 17**	
118	14-01		STR	OP2: Stavba lešení	2 dny	22.09. 17	23.09. 17	116
119	14-01		STR	OP2: výkopové práce za záv.zdí a ÚP	2 dny	24.09. 17	25.09. 17	118
120	14-01		STR	OP2: Bourání stávajícího úložného prahu a závěrné zdi	7 dny	26.09. 17	02.10. 17	119
121	14-01		STR	OP2: Provedení mikropilot a TI	14 dny	03.10. 17	16.10. 17	120
122	14-01		STR	OP2: Bednění, výztuž a betonáž nového úložného prahu	14 dny	17.10. 17	30.10. 17	121
123	14-01		STR	OP2: Bednění, výztuž a betonáž závěrné zdi	7 dny	31.10. 17	06.11. 17	122
124	14-01		STR	OP2: Betonáž ložiskových bločků	2 dny	07.11. 17	08.11. 17	123
125	14-01		STR	sanace OK včetně dodatečného vyztužení	21 dny	09.11. 17	29.11. 17	124
126	14-01		STR	PKO OK	21 dny	01.03. 18	21.03. 18	125
127	14-01		STR	spuštění NK, osazení na ložiska	3 dny	22.03. 18	24.03. 18	126
128	14-01		STR	příprava povrchů pro aplikaci stříkané izolace	83 dny	01.04. 18	22.06. 18	
129	14-01		STR	osazení drenáží a odvodnění za rubem OP1, OP2	13 dny	23.06. 18	05.07. 18	128
130	14-01		STR	částečné zásypy mezerovitým betonem	21 dny	08.07. 18	28.07. 18	
131	14-01		STR	částečná výstavba kamenné rovnaniny	21 dny	08.07. 18	28.07. 18	
132	14-01		STR	dobetonování konce závěrných zdí a opěr	11 dny	20.07. 18	30.07. 18	
133	14-01		STR	sanační práce nosné konstrukce	15 dny	23.07. 18	06.08. 18	
134	14-01		STR	osazení dilatačních závěrů	6 dny	15.08. 18	20.08. 18	
135	14-01		STR	sanační práce nosné konstrukce + napojení pojistné izolace	28 dny	23.07. 18	19.08. 18	
136	14-01		STR	dokončení kamenné rovnaniny	15 dny	16.08. 18	30.08. 18	
137	14-01		STR	dokončení zásypů za OP1, OP2	15 dny	23.08. 18	06.09. 18	
138	14-01		STR	osazení římsových prefabrikátů (částečné uzavření komunikace)	14 dny	03.03. 19	16.03. 19	
139	14-01		STR	dokončení sanace NK, příprava povrchů pro SVI	32 dny	30.10. 18	30.11. 18	
140	14-01		STR	betonáž roznášecí desky	32 dny	15.04. 19	16.05. 19	
141	14-01		STR	izolace tavené, vč. ochrany	4 dny	24.05. 19	27.05. 19	140FS+7 dny
142	14-01		STR	dokončení sanace NK z líce	33 dny	05.09. 18	07.10. 18	
143	14-01		AV	přezdívání pohledových ploch	450 dny	01.08. 18	18.11. 19	

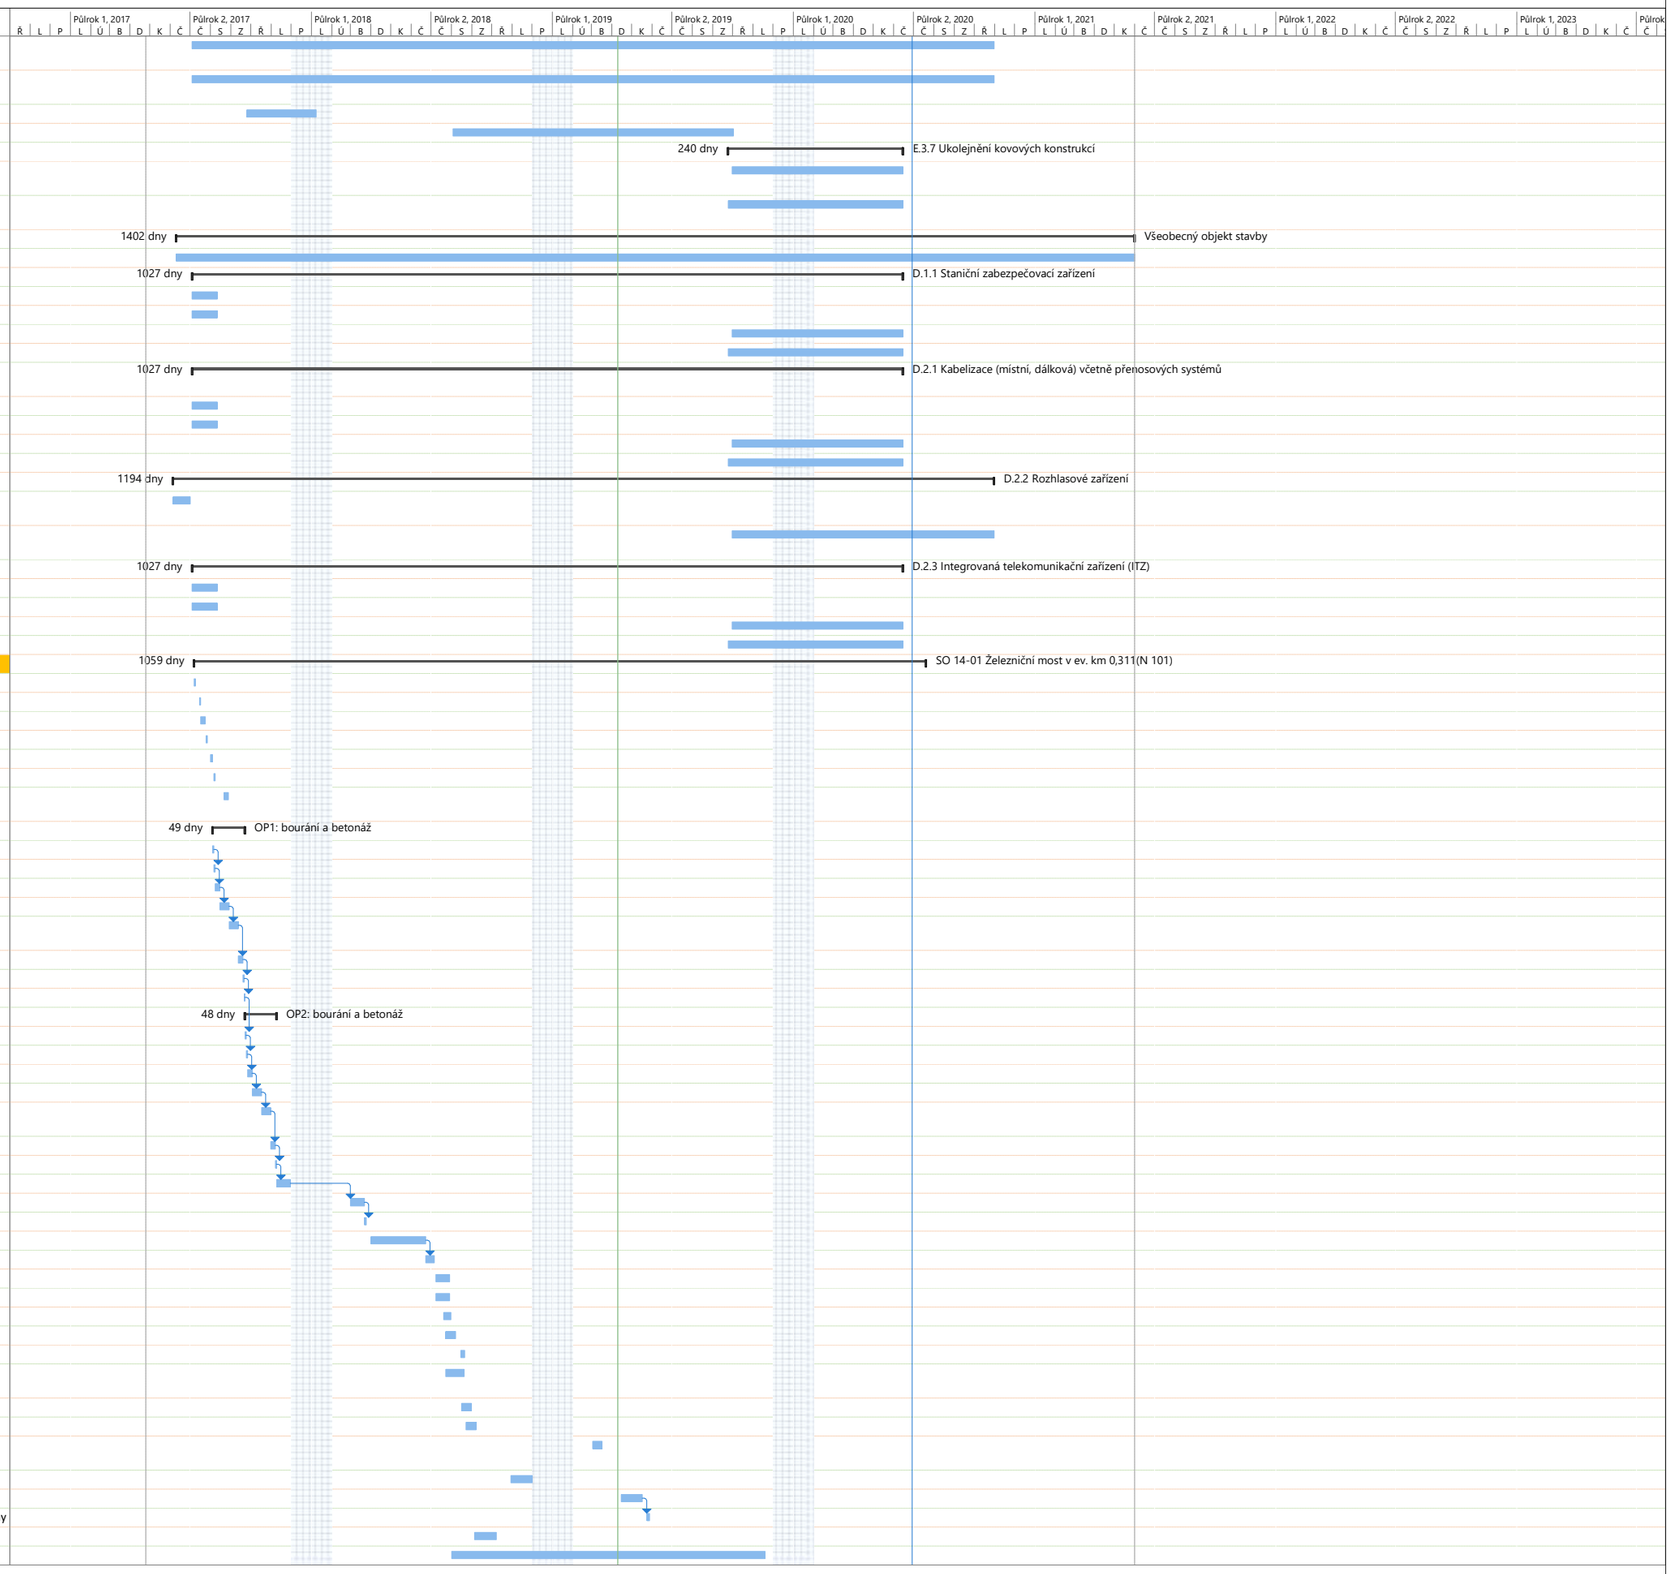

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	Číslo SO/PS	č.klenby	Zhotov	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
144	14-01		AV	sanace základového zdiva	50 dny	26.06. 18	14.08. 18	
145	14-01			dokončovací práce	360 dny	01.07. 19	19.07. 20	
146	**14-02**	**83-90**		**SO 14-02 Železniční most v ev. km 0,370 (N 102)**	**747 dny**	**20.09. 17**	**31.10. 19**	
147	14-02	83-90	STR	sanace opěr a pilířů - injektáž	40 dny	20.09. 17	29.10. 17	
148	14-02	83-90	STR	podskružení kleneb	10 dny	01.11. 17	10.11. 17	
149	14-02	83-90	STR	demolice římsy	30 dny	01.11. 17	30.11. 17	148SS
150	14-02	83-90	STR	demolice stávající RD včetně odtěžení	15 dny	11.11. 17	25.11. 17	148
151	14-02	83-90	AV	diagnostika z rubu kleneb 86-87	5 dny	26.11. 17	30.11. 17	150
152	14-02	83-90	AV	vyhodnocení diagnostiky kleneb 86-87	45 dny	01.12. 17	14.01. 18	151
153	14-02	83-90	AV	diagnostika z rubu kleneb 88-90	5 dny	26.11. 17	30.11. 17	150
154	14-02	83-90	AV	vyhodnocení diagnostiky kleneb 88-90	45 dny	01.12. 17	14.01. 18	151
155	14-02	83-90	STR	betonáž úložných prahů	91 dny	01.04. 18	30.06. 18	
156	14-02	83-90	STR	demolice pro uložení odvodnění	67 dny	25.04. 18	30.06. 18	
157	14-02	83-90	STR	vrty pro odvodnění	40 dny	22.05. 18	30.06. 18	
158	14-02	83-90	STR	sanace spádových betonů v odvodnění	25 dny	01.07. 18	25.07. 18	
159	14-02	83-90	STR	sanace spádových betonů při rubu opěr	25 dny	01.07. 18	25.07. 18	158SS
160	14-02	83-90	STR	pojistná izolace, vč. ochrany	16 dny	26.07. 18	10.08. 18	159
161	14-02	83-90	STR	osazení drenáží a odvodnění	8 dny	08.08. 18	15.08. 18	
162	14-02	83-90	STR	mezerovitý beton	10 dny	16.08. 18	25.08. 18	161
163	14-02	83-90	STR	podkladní beton pod RD	10 dny	20.08. 18	29.08. 18	
164	14-02	83-90	STR	roznášecí deska	27 dny	04.11. 18	30.11. 18	
165	14-02	83-90	STR	římsy	29 dny	17.11. 18	15.12. 18	
166	14-02	83-90	STR	izolace vč. ochrany	25 dny	15.03. 19	08.04. 19	
167	14-02	83-90	AV	doplnění cihelných obezdívek	20 dny	10.04. 19	29.04. 19	
168	14-02	83-90	STR	odstranění podskružení	17 dny	14.01. 19	30.01. 19	
169	14-02	83-90	STR	odkopání pilířů	23 dny	16.01. 19	07.02. 19	168FS-15 dny
170	14-02	83-90	AV	sanační práce základového zdiva	45 dny	08.02. 19	24.03. 19	169
171	14-02	83-90	STR	terénní úpravy podlah klenebních oblouků	22 dny	25.03. 19	15.04. 19	170
172	14-02	83-90	AV	sanace zdiva kleneb	90 dny	01.05. 19	29.07. 19	
173	14-02	83-90		dokončovací práce	214 dny	01.04. 19	31.10. 19	
174	**14-03**			**SO 14-03 Železniční most v ev. km 0,426 (N 103)**	**599 dny**	**15.02. 18**	**31.10. 19**	
175	14-03		STR	demontáž ocelových konstrukcí	4 dny	15.02. 18	18.02. 18	
176	**14-03**	**OP2**	**STR**	**opěra 2**	**259 dny**	**01.04. 18**	**15.12. 18**	
177	14-03	OP2	STR	demolice spodní stavby	60 dny	01.04. 18	30.05. 18	
178	14-03	OP2	STR	výstavby spodní desky, úložné prahy	36 dny	31.05. 18	05.07. 18	177
179	14-03	OP2	STR	závěrná zídka	26 dny	06.07. 18	31.07. 18	178
180	14-03	OP2	STR	roznášecí deska	18 dny	01.08. 18	18.08. 18	179
181	14-03	OP2	STR	římsy opěr	13 dny	03.12. 18	15.12. 18	
182	**14-03**	**OP1**		**opěra 1**	**168 dny**	**01.07. 18**	**15.12. 18**	
183	14-03	OP1	STR	demolice stpodní stavby pro založení zaražedla	14 dny	01.07. 18	14.07. 18	
184	14-03	OP1	STR	výstavby spodní desky, úložné prahy	32 dny	15.07. 18	15.08. 18	183
185	14-03	OP1	STR	závěrná zídka	21 dny	16.08. 18	05.09. 18	184
186	14-03	OP1	STR	roznášecí deska	21 dny	06.09. 18	26.09. 18	185
187	14-03	OP1	STR	římsy opěr	15 dny	01.12. 18	15.12. 18	
188	14-03	OP1,OP2	STR	příprava povrchů pod pojistnou izolaci	41 dny	01.08. 18	10.09. 18	
189	14-03	OP1,OP2	STR	pojistná izolace, vč. ochrany	6 dny	15.09. 18	20.09. 18	188FS+4 dny
190	14-03	OP1,OP2	STR	osazení drenáží a odvodnění	3 dny	21.09. 18	23.09. 18	189
191	14-03	OP1,OP2	STR	kamenná rovnanina	7 dny	24.09. 18	30.09. 18	190
192	14-03	OP1,OP2	STR	mezerovitý beton	11 dny	08.10. 18	18.10. 18	
193	14-03	OP1,OP2	STR	osazení mostních ložisek	30 dny	01.10. 18	30.10. 18	
194	14-03	NK	STR	osazení NK	2 dny	08.05. 19	09.05. 19	
195	14-03		STR	osazení DZ	5 dny	10.05. 19	14.05. 19	194
196	14-03		STR	dobetonování DZ	1 den	15.05. 19	15.05. 19	195
197	14-03		STR	izolace vč. ochrany	30 dny	01.05. 19	30.05. 19	
198	14-03	OP1,OP2	STR	odkopy podél opěr	82 dny	14.11. 18	26.04. 19	
199	14-03	OP1,OP2	AV	sanace základového zdiva opěr	82 dny	15.11. 18	27.04. 19	198SS+1 den
200	14-03	OP1,OP2	AV	přezdívání lícového zdiva opěr	82 dny	15.11. 18	27.04. 19	199SS
201	14-03			dokončovací práce	214 dny	01.04. 19	31.10. 19	
202	**14-04**	**91-99**		**SO 14-04 Železniční most v ev. km 0,495 (N 104)**	**736 dny**	**20.09. 17**	**20.10. 19**	
203	14-04	91-99	STR	demontáž římsy	30 dny	20.09. 17	19.10. 17	
204	14-04	91-99	STR	podskružení kleneb	10 dny	01.10. 17	10.10. 17	
205	14-04	91-99	STR	odtěžení zásypů	15 dny	11.10. 17	25.10. 17	204
206	14-04	91-99	AV	diagnostika z rubu kleneb 91-99	5 dny	10.01. 18	15.01. 18	207SF
207	14-04	91-99	AV	vyhodnocení diagnostiky kleneb 91-99	45 dny	15.01. 18	01.03. 18	208SF
208	14-04	91-99	AV	výměna cihel poprsních zdí kleneb 91-99	75 dny	01.03. 18	14.05. 18	
209	14-04	91-99	STR	úložné prahy	91 dny	01.04. 18	30.06. 18	
210	14-04	91-99	STR	demolice pro uložení odvodnění	37 dny	25.05. 18	30.06. 18	
211	14-04	91-99	STR	vrty pro odvodnění	30 dny	01.06. 18	30.06. 18	210FF
212	14-04	91-99	STR	sanace spádových betonů v odvodnění	25 dny	01.07. 18	25.07. 18	210
213	14-04	91-99	STR	sanace spádových betonů při rubu opěr	25 dny	01.07. 18	25.07. 18	212SS
214	14-04	91-99	STR	odbourání pro sanaci klenby č. 98	15 dny	01.07. 18	15.07. 18	212SS
215	14-04	91-99	STR	sanace klenby č. 98 statical	15 dny	16.07. 18	30.07. 18	214
216	14-04	91-99	STR	sanace rubu klenby č. 98 pod pojistnou izolaci	2 dny	31.07. 18	01.08. 18	215
217	14-04	91-99	STR	pojistná izolace vč. ochrany	13 dny	08.08. 18	20.08. 18	
218	14-04	91-99	STR	osazení drenáží a odvodnění	3 dny	21.08. 18	23.08. 18	217
219	14-04	91-99	STR	mezerovitý beton	14 dny	24.08. 18	06.09. 18	218
220	14-04	91-99	STR	podkladní beton pod RD	7 dny	07.09. 18	13.09. 18	219
221	14-04	92-98	STR	roznášecí deska	21 dny	14.09. 18	04.10. 18	220
222	14-04	92-98	AV	římsy	70 dny	05.10. 18	05.03. 19	221
223	14-04	92-98	AV	doplnění cihelných obezdívek	70 dny	10.10. 18	10.03. 19	222FF
224	14-04	91-99	STR	demontáž podskružení	16 dny	01.12. 18	16.12. 18	

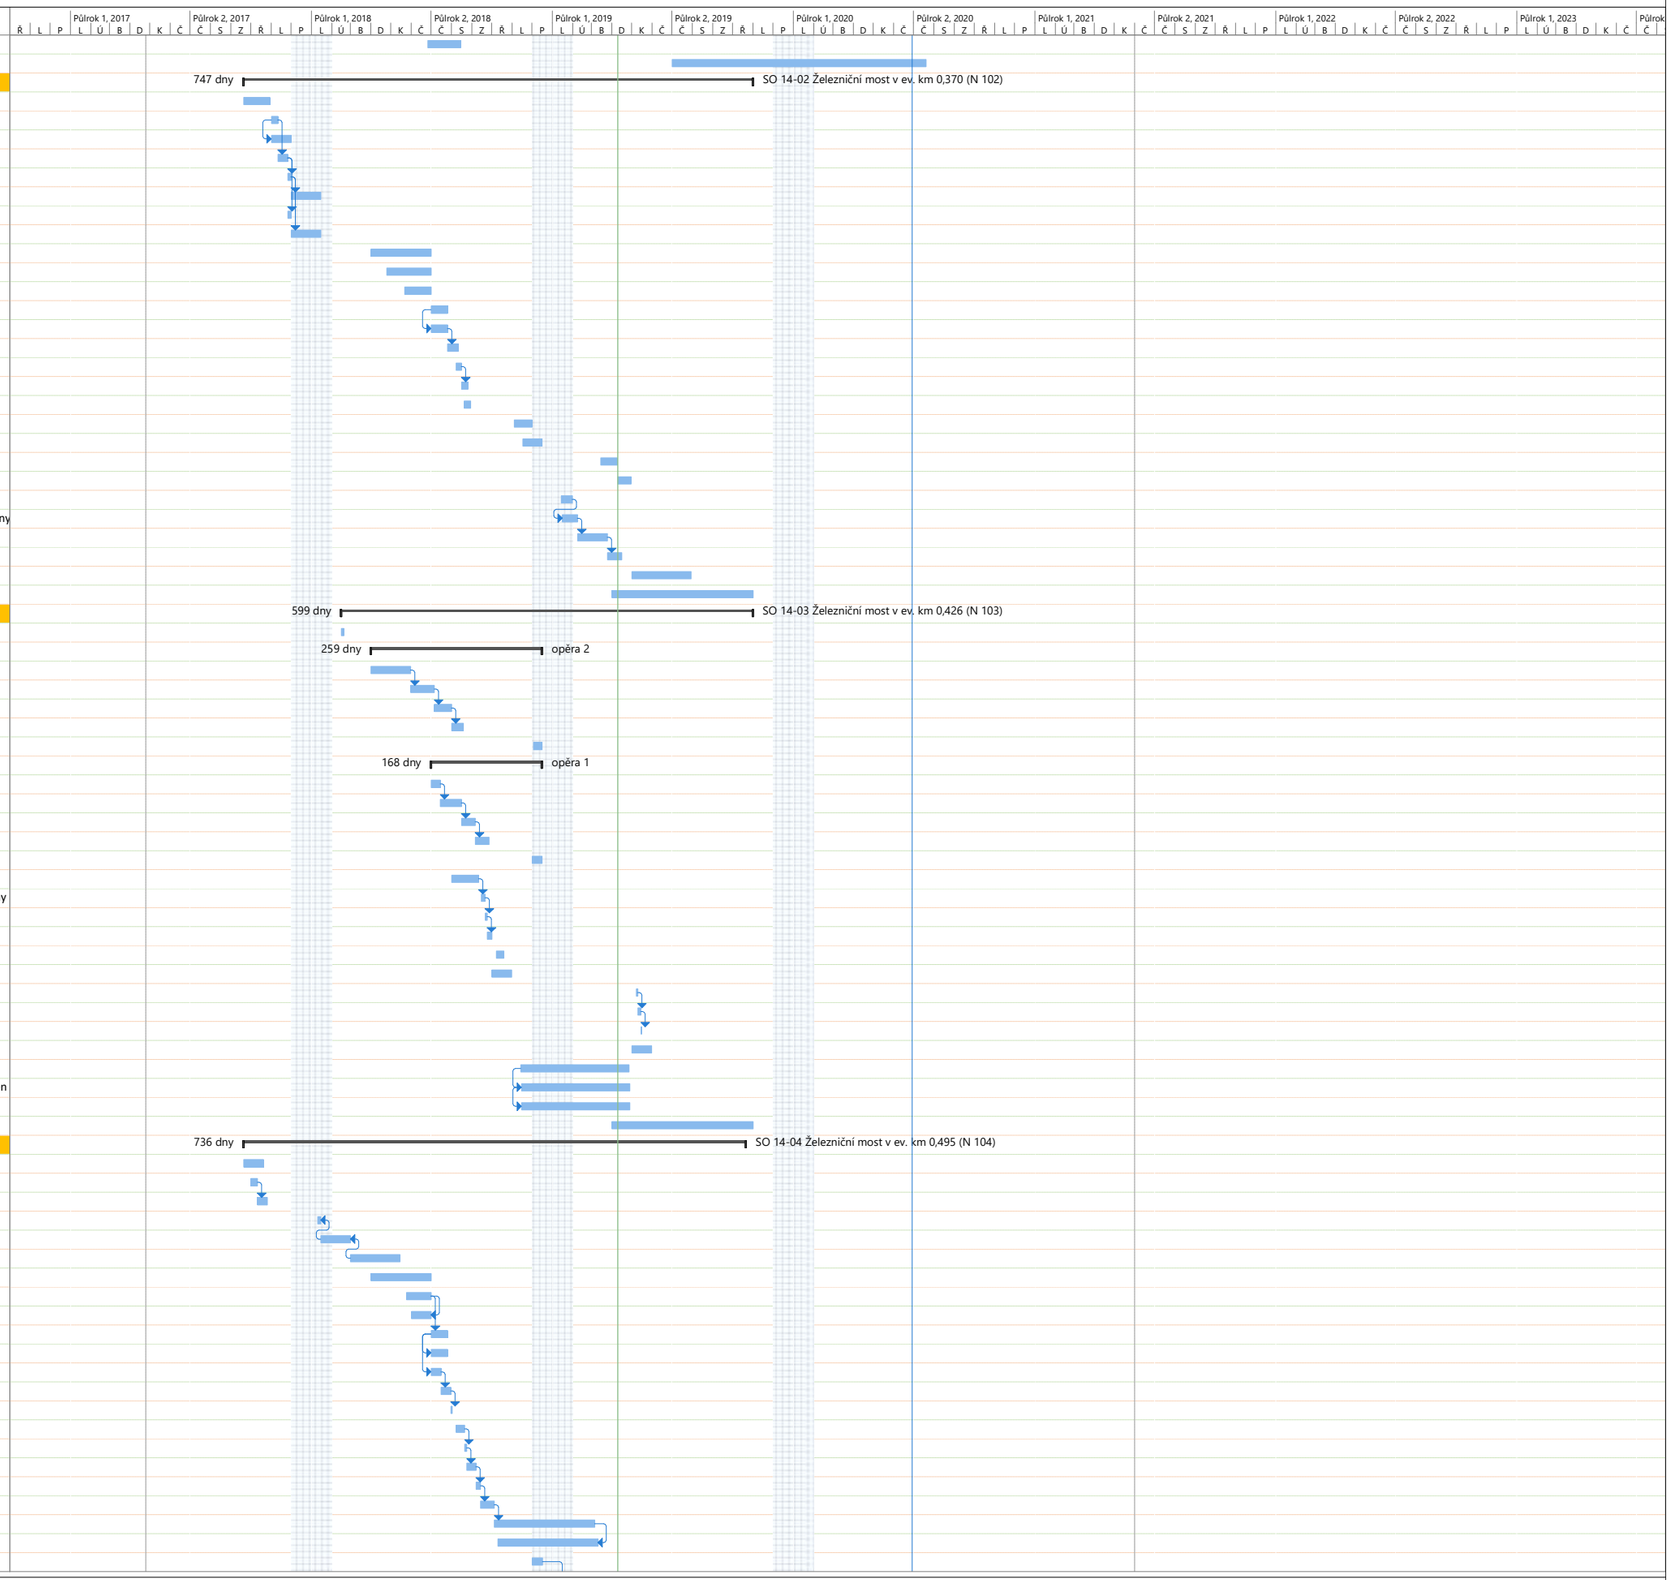

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	Číslo SO/PS	č.klenby	Zhoto	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
225	14-04	91-99	STR	výkopy kolem pilířů	21 dny	16.01. 19	05.02. 19	224
226	14-04	91-99	AV	sanace pod terénem	45 dny	06.02. 19	22.03. 19	225
227	14-04	91-99	AV	konsolidace, spárování, odsolování	120 dny	01.05. 19	28.08. 19	
228	14-04	91-99		terénní úpravy podlah klenebních oblouků	21 dny	02.03. 19	22.03. 19	226FF
229	14-04	91-99		dokončovací práce	224 dny	11.03. 19	20.10. 19	228SS
230	**14-05**			**SO 14-05**	**435 dny**	**18.05. 18**	**20.08. 19**	
231	**14-05**		**HT**	**Práce HT - demontáže**	**75 dny**	**18.05. 18**	**31.07. 18**	
232	14-05		HT	bourání NK	25 dny	18.05. 18	11.06. 18	
233	14-05		HT	demontáž obkladu úložných prahů	10 dny	12.06. 18	21.06. 18	232
234	14-05		HT	bourání úložných prahů	7 dny	22.06. 18	28.06. 18	233
235	14-05		HT	odkopání základů	7 dny	25.07. 18	31.07. 18	
236	**14-05**		**HT**	**Práce HT - montáže**	**279 dny**	**11.08. 18**	**10.06. 19**	
237	14-05		HT	zásyp základů	4 dny	11.08. 18	14.08. 18	243
238	14-05		HT	úložný práh: bednění, armování, betonáž	30 dny	01.10. 18	30.10. 18	237
239	14-05		HT	ŽB deska: bednění, armování, betonáž	20 dny	31.10. 18	19.11. 18	238
240	14-05		HT	římsa: bednění, armování, betonáž	14 dny	10.05. 19	23.05. 19	
241	14-05		HT	izolace, vč. ochrany, odvodnění	7 dny	24.05. 19	30.05. 19	240
242	14-05		HT	zábradlí	10 dny	01.06. 19	10.06. 19	
243	14-05		AV	čištění, diagnostika, spárování pod terénem	10 dny	01.08. 18	10.08. 18	235
244	**14-05**		**AV**	**Práce AV**	**142 dny**	**01.04. 19**	**20.08. 19**	
245	14-05		AV	výměna kamenů	14 dny	24.05. 19	06.06. 19	240
246	14-05		AV	zaměření obkladu úložných prahů a objednání kamene (úprava stávajícího kamene)	30 dny	07.06. 19	06.07. 19	245
247	14-05		AV	sanace líců	30 dny	01.04. 19	30.04. 19	
248	14-05		AV	montáž obkladu úložných prahů	21 dny	01.04. 19	21.04. 19	
249	14-05		AV	odsolování	60 dny	01.06. 19	30.07. 19	248
250	14-05		AV	spárování	21 dny	31.07. 19	20.08. 19	249
251	**14-06**	**21-00**		**SO 14-06**	**831 dny**	**31.03. 18**	**27.08. 20**	
252	14-06	21-00	HT	montáž podskružení	73 dny	31.03. 18	11.06. 18	
253	14-06	19-00	HT	odhalení rubu (vč. dmtž říms)	75 dny	21.05. 18	03.08. 18	
254	14-06	21-00	HT	zábradlí	7 dny	09.03. 20	16.03. 20	255SF
255	14-06	21-00	HT	izolace vč. ochrany, antivibrační rohože	21 dny	16.03. 20	05.04. 20	
256	**14-06**	**21**		**PŘEZDÍVANÁ KLENBA 21**	**422 dny**	**21.05. 18**	**10.08. 19**	
257	**14-06**	**21**	**AV**	**přezdívání (AV)**	**348 dny**	**21.05. 18**	**28.05. 19**	
258	14-06	21	AV	diagnostika z rubu vč. vyhodnocení	25 dny	21.05. 18	14.06. 18	
259	14-06	21	HT	vybourání a odvoz zásypu klenby 21	14 dny	03.09. 18	16.09. 18	
260	14-06	21	AV	demontáž poprsních zdí	30 dny	17.09. 18	16.10. 18	259
261	14-06	21	AV	demontáž klenby	45 dny	17.10. 18	30.11. 18	260
262	14-06	21	AV	vyzdění klenby	70 dny	21.02. 19	01.05. 19	261
263	14-06	21	AV	vyzdění poprsních zdí	27 dny	02.05. 19	28.05. 19	262
264	**14-06**	**21**	**HT**	**betonáže (HT)**	**72 dny**	**31.05. 19**	**10.08. 19**	
265	14-06	21-20	HT	torkrety, úložné prahy	14 dny	31.05. 19	13.06. 19	263FS+2 dny
266	14-06	21-20	HT	dobetonávky, vrtání pro odvodnění	10 dny	14.06. 19	23.06. 19	265
267	14-06	21-20	HT	spádové betony, příprava pro izolaci	8 dny	24.06. 19	01.07. 19	266
268	14-06	21-20	HT	mezerovitý beton, RD	40 dny	02.07. 19	10.08. 19	267
269	**14-06**	**20-15**		**SANOVANÉ KLENBY 20-15**	**375 dny**	**25.07. 18**	**28.08. 19**	
270	14-06	20-15	AV	diagnostika z rubu	14 dny	25.07. 18	07.08. 18	253FF+4 dny
271	**14-06**	**20-15**	**HT**	**betonáže (HT)**	**203 dny**	**11.10. 18**	**26.05. 19**	
272	14-06	20-15	HT	sešívání kleneb	21 dny	11.10. 18	31.10. 18	270
273	14-06	20-15	HT	torkrety	15 dny	01.11. 18	15.11. 18	272
274	14-06	19-16	HT	spádové betony	7 dny	16.11. 18	22.11. 18	273
275	14-06	19-16	HT	úložné prahy, vč. dobetonávek	30 dny	07.11. 18	26.02. 19	273SS+6 dny
276	14-06	19-16	HT	vrtání pro odvodnění	15 dny	08.11. 18	22.11. 18	273SS+7 dny
277	14-06	19-16	HT	průchody odvodnění, stěrka	14 dny	30.11. 18	13.12. 18	276FS+7 dny
278	14-06	19-16	HT	pojistná izolace	10 dny	14.12. 18	10.04. 19	277
279	14-06	18-17	HT	mezerovitý beton, vč. podkl.	14 dny	11.04. 19	24.04. 19	278
280	14-06	18-17	HT	roznášecí deska, vč. říms	32 dny	25.04. 19	26.05. 19	279
281	14-06	18-17	HT	demontáž podskružení	20 dny	29.04. 19	18.05. 19	279FS+4 dny
282	14-06	18-17	HT	odkopání pilířů	10 dny	19.05. 19	28.05. 19	281
283	14-06	18-17	AV	diagnostika, sanace pod terénem	14 dny	26.05. 19	08.06. 19	282SS+7 dny
284	14-06	18-17	HT	zásyp pilířů	7 dny	09.06. 19	15.06. 19	283
285	14-06	18-17	AV	sanace líců, spárování, konsolidace	120 dny	01.05. 19	28.08. 19	
286	**14-06**	**14-08**		**PŘEZDÍVANÉ KLENBY 14-08**	**668 dny**	**19.07. 18**	**05.07. 20**	
287	**14-06**	**14-08**		**přezdívání**	**378 dny**	**19.07. 18**	**25.08. 19**	
288	**14-06**	**14**	**HT**	**K14,P14**	**265 dny**	**26.10. 18**	**11.08. 19**	
289	14-06	14	HT	úprava skruže K14 pro bourání	10 dny	26.10. 18	04.11. 18	
290	14-06	14	HT	vybourání kalhot K14	14 dny	05.11. 18	18.11. 18	289
291	14-06	14	AV	demontáž klenby K14	4 týdny	13.12. 18	03.02. 19	
292	14-06	14	HT	demontáž podskružení K14	7 dny	18.02. 19	24.02. 19	
293	14-06	14	HT	odkopání P14	7 dny	11.03. 19	17.03. 19	309
294	14-06	14	AV	diagnostika P14	7 dny	18.03. 19	24.03. 19	293
295	14-06	14	AV	demontáž P14	1 týden	25.03. 19	31.03. 19	294
296	14-06	14	HT	TI podzákladí	2 týdny	01.04. 19	14.04. 19	295
297	14-06	14	AV	vyzdění P14	3 týdny	15.04. 19	05.05. 19	294FS+2 týdn
298	14-06	14	HT	terénní úpravy kolem P14	7 dny	06.05. 19	12.05. 19	297
299	14-06	14	HT	montáž skruže K14	14 dny	13.05. 19	26.05. 19	298
300	14-06	14	HT	vyzdění klenby K14	8 týdny	27.05. 19	21.07. 19	299
301	14-06	14	AV	vyzdění poprsní zdi P15	3 týdny	22.07. 19	11.08. 19	300
302	14-06	14	AV	vyzdění poprsní zdi P14	3 týdny	22.07. 19	11.08. 19	314
303	**14-06**	**13**		**K13,P13**	**210 dny**	**03.01. 19**	**11.08. 19**	
304	14-06	13	AV	demontáž jeřábu před klenbou 13	3 dny	03.01. 19	05.01. 19	

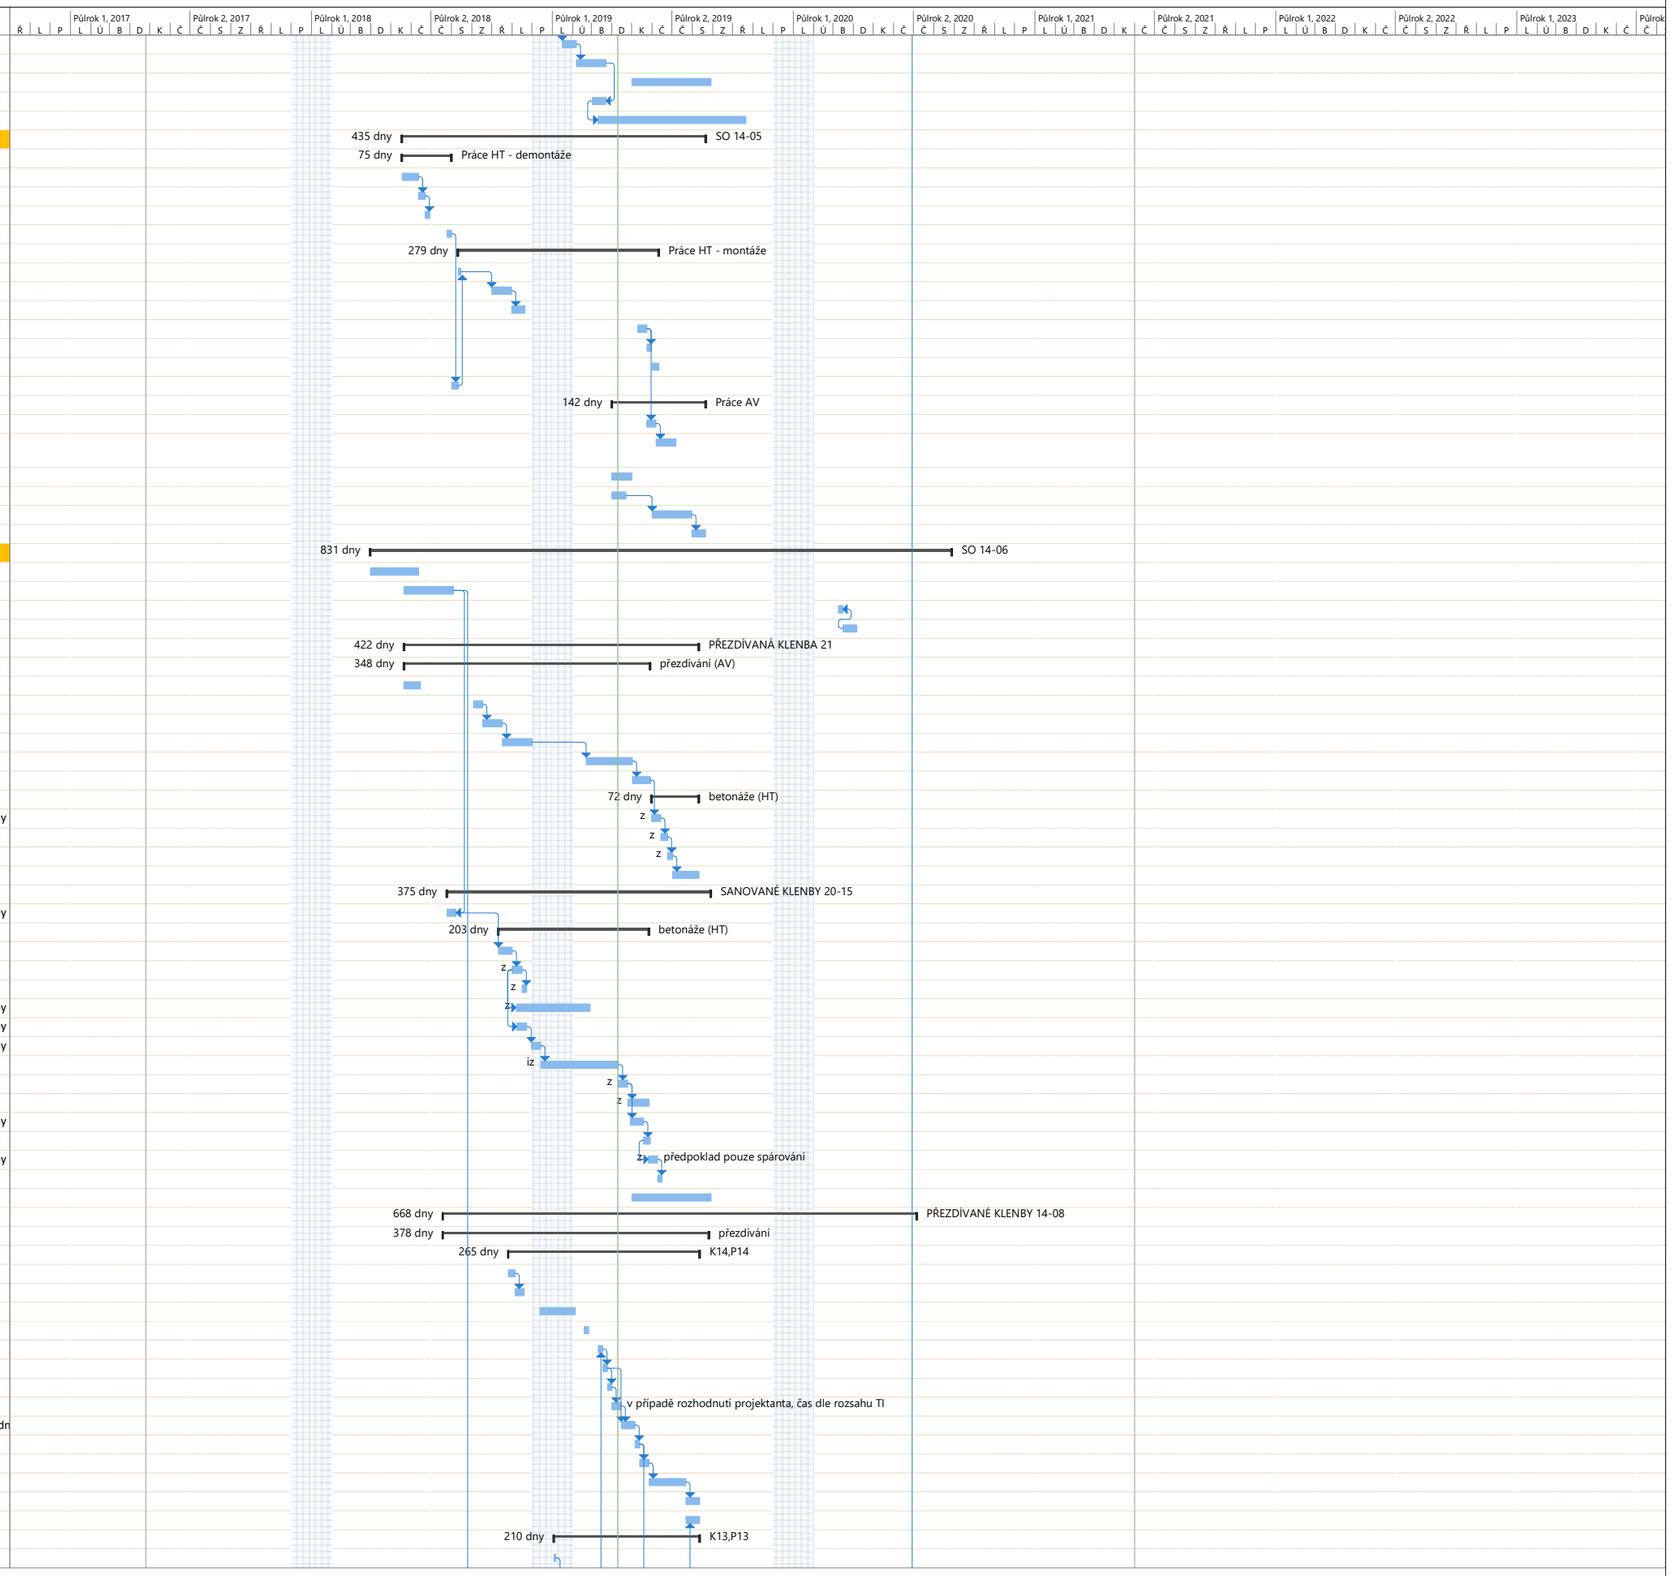

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	Číslo SO/PS	č.klenby	Zhoto	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
305	14-06	13	HT	úprava skruže K13 pro bourání	10 dny	06.01. 19	15.01. 19	304
306	14-06	13	AV	montáž jeřábu	3 dny	16.01. 19	18.01. 19	305
307	14-06	13	HT	vybourání kalhot K13	14 dny	19.01. 19	01.02. 19	306
308	14-06	13	AV	demontáž klenby K13	4 týdny	02.02. 19	01.03. 19	307
309	14-06	13	HT	demontáž podskružení K13	7 dny	02.03. 19	08.03. 19	308
310	14-06	13	HT	odkopání P13	7 dny	09.03. 19	15.03. 19	309
311	14-06	13	AV	diagnostika P13	7 dny	16.03. 19	22.03. 19	310
312	14-06	13	HT	terénní úpravy P13	7 dny	23.03. 19	29.03. 19	311
313	14-06	13	HT	montáž skruže K13	14 dny	13.05. 19	26.05. 19	298
314	14-06	13	AV	zdění klenby K13	8 týdny	27.05. 19	21.07. 19	313
315	14-06	13	AV	zdění poprsní zdi P13	3 týdny	22.07. 19	11.08. 19	314
316	**14-06**	**12**		**K12**	**91 dny**	**17.09. 18**	**16.12. 18**	
317	14-06	12	AV	demontáž klenby 12	28 dny	17.09. 18	14.10. 18	323
318	14-06	12	HT	úprava skruže K12 pro zdění	7 dny	15.10. 18	21.10. 18	317
319	DIO	12	HT	převedení autobusů z klenby 11 do klenby 12	0 dny	29.10. 18	29.10. 18	318
320	14-06	12	AV	zdění klenby 12	8 týdny	22.10. 18	16.12. 18	318
321	DIO	12	HT	převedení autobusů z klenby 11 do klenby 12	0 dny	11.11. 18	11.11. 18	327
322	**14-06**	**11**		**K11,P12**	**264 dny**	**18.08. 18**	**02.06. 19**	
323	14-06	11	AV	demontáž klenby 11	30 dny	18.08. 18	16.09. 18	333
324	14-06	11	HT	demontáž skruže K11	7 dny	29.10. 18	04.11. 18	319
325	14-06	11	HT	zápory u P11 v klenbě 11	3 dny	05.11. 18	07.11. 18	324
326	14-06	11	HT	odkop P11 v klenbě 11	4 dny	08.11. 18	11.11. 18	325
327	DIO	11	HT	převedení autobusů z K10 do K11	0 dny	11.11. 18	11.11. 18	326
328	14-06	11	HT	montáž skruže K11	14 dny	04.03. 19	17.03. 19	345
329	DIO	10	HT	převedení autobusů z K10 do K11	0 dny	17.03. 19	17.03. 19	328
330	14-06	11	AV	zdění klenby K11	8 týdny	18.03. 19	12.05. 19	328
331	14-06	11	AV	zdění poprsí zdi P12	3 týdny	13.05. 19	02.06. 19	330
332	**14-06**	**10**		**K10,P11**	**371 dny**	**19.07. 18**	**18.08. 19**	
333	14-06	10	AV	demontáž K10	30 dny	19.07. 18	17.08. 18	
334	14-06	10	HT	demontáž skruže K10	7 dny	12.11. 18	18.11. 18	327
335	DIO	10	HT	příprava pěšího koridoru v K10	7 dny	19.11. 18	25.11. 18	334
336	DIO	10	HT	převedení pěších z K09 do K10	0 dny	25.11. 18	25.11. 18	334FS+7 dny
337	14-06	10	HT	odkop P11 v klenbě 10	7 dny	19.11. 18	25.11. 18	334
338	14-06	10	AV	diagnostika P11	7 dny	19.11. 18	25.11. 18	334
339	14-06	10	AV	demontáž P11	1 týden	26.11. 18	02.12. 18	338
340	14-06	10	HT	TI podzákladí P11	2 týdny	03.12. 18	16.12. 18	339
341	14-06	10	HT	injektáž P11	1 týden	17.12. 18	17.01. 19	340
342	14-06	10	HT	betonáž P11	14 dny	18.01. 19	31.01. 19	341
343	14-06	10	AV	osazení patního kamene, montáž obkladu pilíře	14 dny	01.02. 19	14.02. 19	342
344	14-06	10	HT	terénní úpravy kolem P11	7 dny	15.02. 19	21.02. 19	343
345	DIO	10	HT	převedení autobusů z K11 do K10	0 dny	21.02. 19	21.02. 19	344
346	DIO	10	HT	převedení pěšího koridoru z K09 do K10, s vytvořením pracovního prostoru u P10	0 dny	17.03. 19	17.03. 19	329
347	14-06	10	HT	montáž skruže K10	7 dny	27.05. 19	02.06. 19	
348	14-06	10	AV	zdění klenby 10	8 týdny	03.06. 19	28.07. 19	347
349	14-06	10	AV	zdění poprsní zdi P11	3 týdny	29.07. 19	18.08. 19	348
350	**14-06**	**09**		**K09,P9,P10**	**248 dny**	**26.11. 18**	**25.08. 19**	
351	14-06	09	HT	úprava skruže K09 pro bourání	7 dny	26.11. 18	02.12. 18	336
352	14-06	09	HT	vybourání kalhot klenby K09	14 dny	03.12. 18	16.12. 18	351
353	14-06	09	AV	demontáž klenby K09 včetně poprsních zdí	4 týdny	17.12. 18	07.02. 19	352
354	14-06	09	HT	demontáž skruže K09, příprava pro chodce	10 dny	08.02. 19	17.02. 19	353
355	DIO	09	HT	převedení pěších z K10 do K09	0 dny	21.02. 19	21.02. 19	345
356	14-06	09	HT	odkopání P9	7 dny	18.02. 19	24.02. 19	354
357	14-06	09	AV	diagnostika P9	7 dny	25.02. 19	03.03. 19	356
358	14-06	09	AV	rozebrání P9	1 týden	04.03. 19	10.03. 19	357
359	14-06	09	HT	TI podzákladí P9	2 týdny	11.03. 19	24.03. 19	358
360	14-06	09	AV	vyzdění pilíře P9	3 týdny	25.03. 19	14.04. 19	359
361	14-06	09	HT	terénní úpravy P9	7 dny	15.04. 19	21.04. 19	360
362	14-06	09	HT	odkopání P10	7 dny	18.03. 19	24.03. 19	346
363	14-06	09	AV	diagnostika P10	7 dny	25.03. 19	31.03. 19	362
364	14-06	09	AV	demontáž P10	1 týden	01.04. 19	07.04. 19	363
365	14-06	09	HT	TI podzákladí P10	7 dny	08.04. 19	14.04. 19	364
366	14-06	09	HT	nízkotlaká injektáž P10	7 dny	15.04. 19	21.04. 19	365
367	14-06	09	AV	vyzdění P10	3 týdny	22.04. 19	12.05. 19	366
368	14-06	09	HT	terénní úpravy	7 dny	13.05. 19	19.05. 19	367
369	14-06	09	HT	montáž skruže K09	7 dny	03.06. 19	09.06. 19	347
370	DIO	09	HT	převedení koridoru pro pěší do klenby 09	0 dny	09.06. 19	09.06. 19	369
371	14-06	09	AV	zdění klenby 09	8 týdny	10.06. 19	04.08. 19	370
372	14-06	09	AV	zdění poprsní zdi P9	3 týdny	05.08. 19	25.08. 19	371
373	14-06	09	AV	zdění poprsní zdi P10	3 týdny	05.08. 19	25.08. 19	371
374	**14-06**	**08**	**HT**	**K08,P8**	**227 dny**	**12.11. 18**	**21.07. 19**	
375	14-06	08	HT	úprava skruže K08 pro bourání	7 dny	12.11. 18	18.11. 18	327
376	14-06	08	HT	vybourání kalhot klenby 8	14 dny	19.11. 18	02.12. 18	375
377	14-06	08	AV	demontáž klenby K8 včetně poprsních zdí	4 týdny	03.12. 18	24.01. 19	376
378	14-06	08	HT	demontáž skruže K8	7 dny	25.01. 19	31.01. 19	377
379	14-06	08	HT	montáž podskružení klenby 8	10 dny	26.04. 19	05.05. 19	361
380	14-06	08	AV	zdění klenby 08	8 týdny	06.05. 19	30.06. 19	379
381	14-06	08	AV	zdění poprsní zdi P8	3 týdny	01.07. 19	21.07. 19	380
382	**14-06**	**15-07**	**HT**	**betonáže (HT)**	**189 dny**	**03.06. 19**	**08.12. 19**	
383	14-06	15-07	HT	torkrety	91 dny	03.06. 19	01.09. 19	
384	14-06	15-07	HT	úložné prahy	91 dny	10.06. 19	08.09. 19	

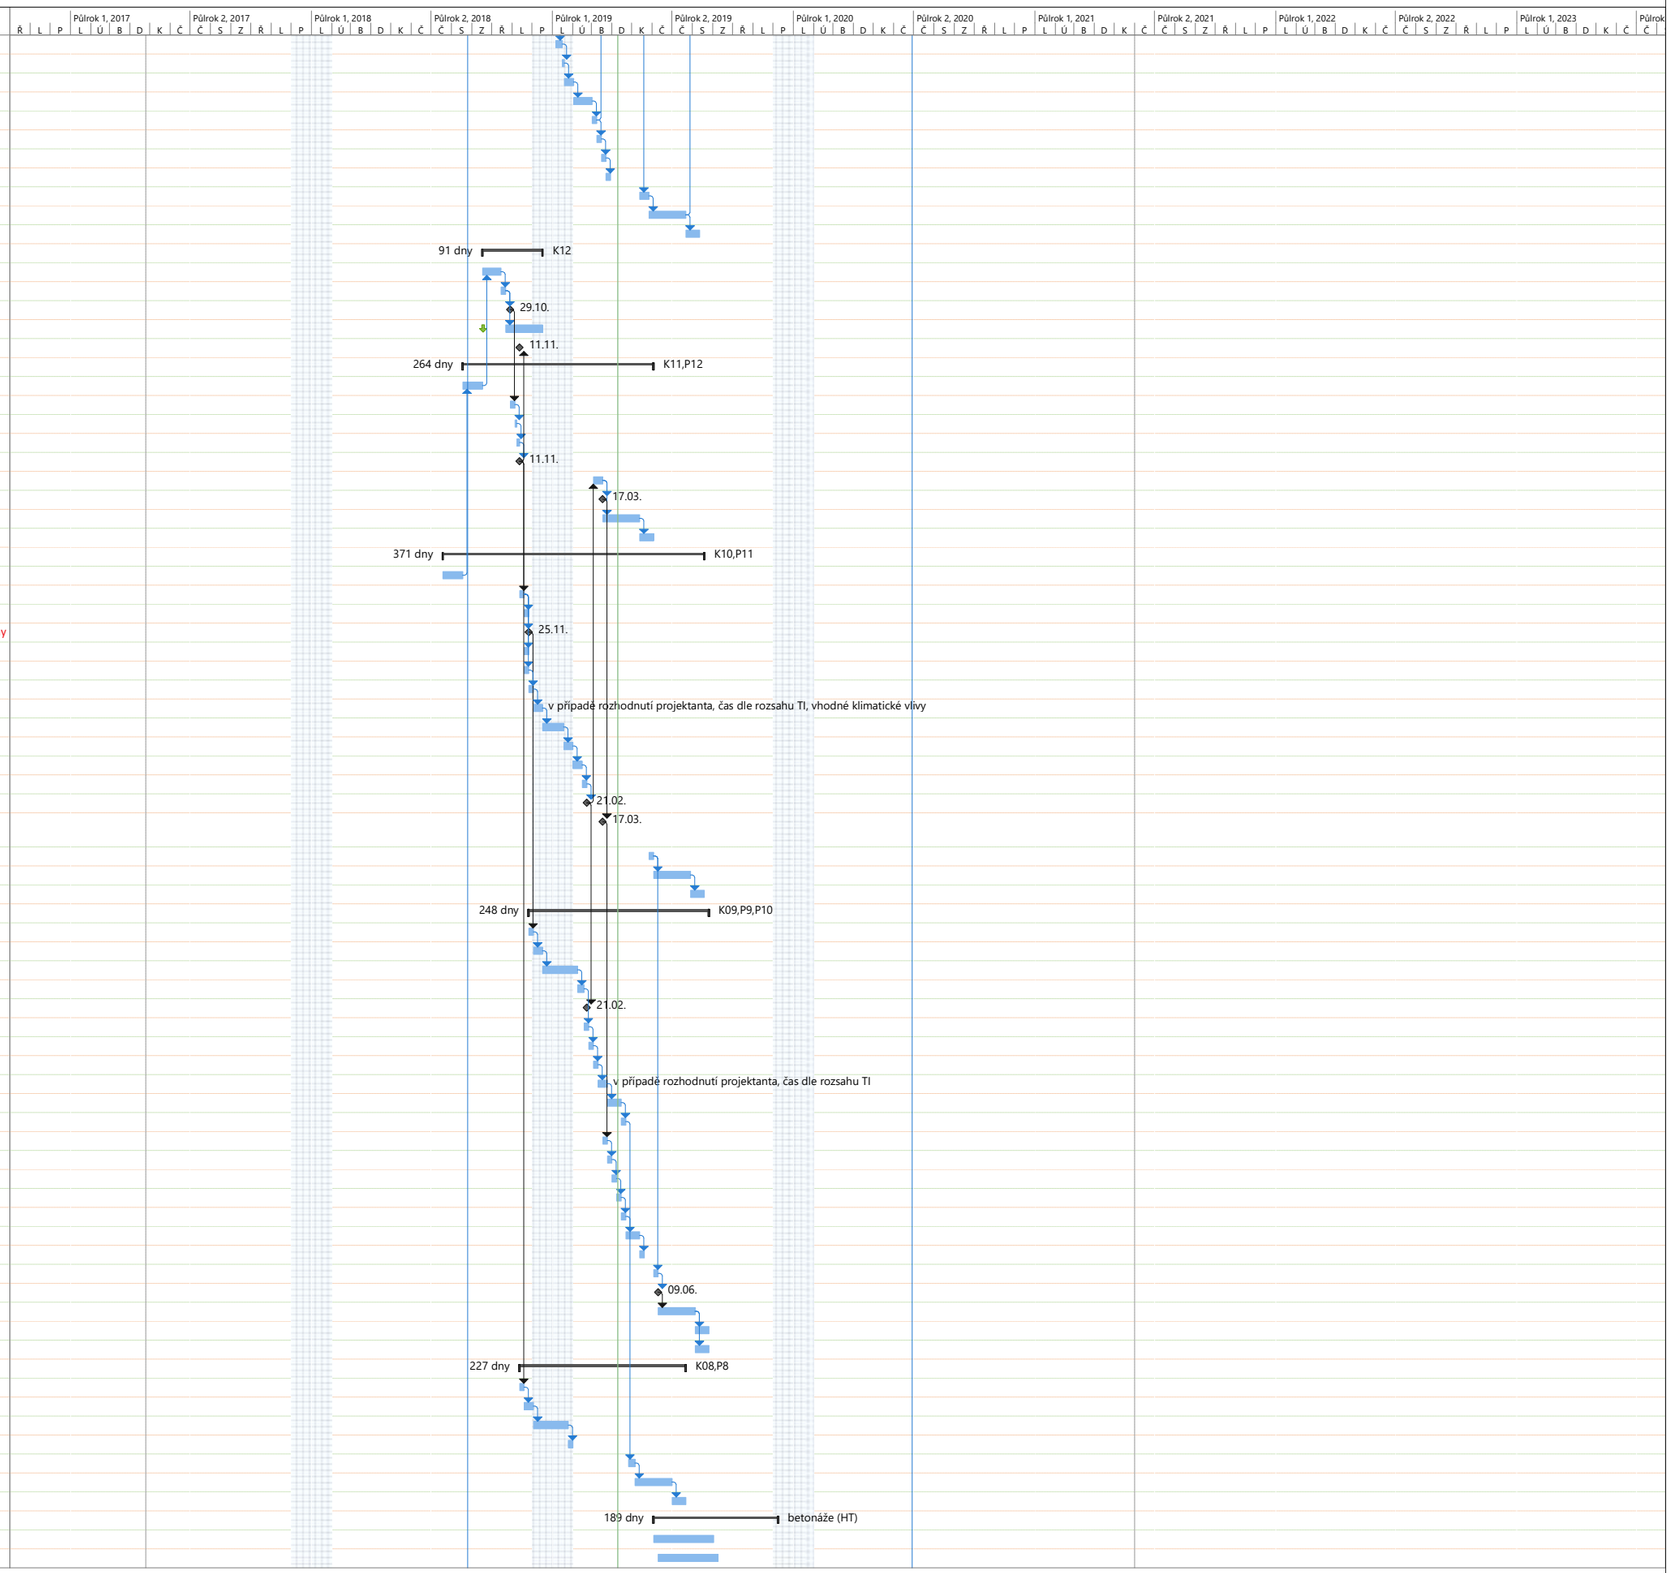

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	Číslo SO/PS	č.klenby	Zhoto	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
385	14-06	15-07	HT	dobetonávky	91 dny	17.06. 19	15.09. 19	
386	14-06	15-07	HT	vrtání pro odvodnění, spádové bet.	91 dny	24.06. 19	22.09. 19	
387	14-06	15-07	HT	stěrka, příprava povrchu pro izolaci	91 dny	01.07. 19	29.09. 19	
388	14-06	15-07	HT	pojistná izolace	7 dny	30.09. 19	06.10. 19	
389	14-06	16-06	HT	mezerovitý beton, vč. podkl.	35 dny	07.10. 19	10.11. 19	
390	14-06	16-06	HT	roznášecí deska, vč. říms	49 dny	21.10. 19	08.12. 19	
391	**14-06**	**16-06**		**sanace líců**	**91 dny**	**06.04. 20**	**05.07. 20**	
392	14-06	16-06	HT	demontáž poskružení, odkopání (zbylých pilířů)	45 dny	06.04. 20	20.05. 20	
393	14-06	16-06	AV	sanace pod terénem (zbylých pilířů)	60 dny	20.04. 20	18.06. 20	392SS+14 dny
394	14-06	16-06	HT	zásyp pilířů	60 dny	30.04. 20	28.06. 20	393SS+10 dny
395	14-06	16-06	AV	sanace líců, spárování, konsolidace	60 dny	07.05. 20	05.07. 20	394SS+7 dny
396	**14-06**	**07-00**		**SANOVANÉ KLENBY 07-00**	**330 dny**	**30.07. 18**	**19.07. 19**	
397	14-06	07-05	AV	diagnostika z rubu (07-05)	14 dny	30.07. 18	12.08. 18	253FF+5 dny
398	14-06	04-00	AV	diagnostika z rubu (04-00)	14 dny	13.08. 18	26.08. 18	397
399	14-06	07-00	AV	odříznutí 2 řad kamenů, vč přezdění	14 dny	27.08. 18	09.09. 18	398
400	14-06	07-00	AV	sešívání kleneb	21 dny	11.10. 18	31.10. 18	
401	**14-06**	**07-00**	**HT**	**betonáže (HT)**	**196 dny**	**01.11. 18**	**09.06. 19**	
402	14-06	07-00	HT	torkrety, úložné prahy	21 dny	01.11. 18	21.11. 18	400
403	14-06	07-00	HT	dobetonávky	10 dny	22.11. 18	01.12. 18	402
404	14-06	07-00	HT	stěrka,příprava povrchu pod izolaci	12 dny	02.12. 18	13.12. 18	403
405	14-06	06-00	HT	spádové betony, vrtání pro odvodnění	40 dny	14.12. 18	16.02. 19	404
406	14-06	06-00	HT	osazení drenáží, průchody odvodnění	14 dny	17.02. 19	02.03. 19	405
407	14-06	06-00	HT	pojistná izolace	7 dny	02.04. 19	08.04. 19	406
408	14-06	05-00	HT	mezerovitý beton	17 dny	09.04. 19	25.04. 19	407
409	14-06	05-00	HT	roznášecí deska vč. říms	45 dny	26.04. 19	09.06. 19	408
410	14-06	05-00	HT	demontáž podskružení	20 dny	10.05. 19	29.05. 19	408FS+14 dny
411	14-06	05-00	HT	odkopání pilířů	20 dny	24.05. 19	12.06. 19	410SS+14 dny
412	14-06	05-00	AV	diagnostika, sanace pod terénem	45 dny	31.05. 19	14.07. 19	411SS+7 dny
413	14-06	05-00	HT	zásyp pilířů	14 dny	06.07. 19	19.07. 19	412FF+5 dny
414	14-06	05-00	AV	sanace líců, spárování, konsolidace	214 dny	01.05. 19	30.11. 19	
415	15-10.2	00-21	STR	opětovné vyzdění vestaveb	28 dny	21.05. 20	17.06. 20	395SS+14 dny
416	25-02	00-09	STR	montáž původních odjezdových stání, vč. souvisejících objektů	60 dny	11.06. 20	09.08. 20	415SS+21 dny
417	18-01.2	00-21	HT	úpravy povrchů	60 dny	29.06. 20	27.08. 20	394
418	**14-07**			**SO 14-07**	**796 dny**	**19.03. 18**	**11.07. 20**	
419	**14-07**		**HT**	**Příprava, demolice NK**	**51 dny**	**19.03. 18**	**08.05. 18**	
420	14-07		HT	výztužné žebra v přilehlých klenbách	35 dny	19.03. 18	22.04. 18	
421	14-07	NK	HT	demolice NK	5 dny	04.05. 18	08.05. 18	
422	**14-07**	**OP1**		**OP1**	**185 dny**	**18.06. 18**	**19.12. 18**	
423	**14-07**	**OP1**	**HT**	**bourání OP1, vč. zajištění**	**99 dny**	**18.06. 18**	**24.09. 18**	
424	14-07	OP1	HT	montáž pižma pro 1. úroveň	4 dny	18.06. 18	21.06. 18	
425	14-07	OP1	HT	řezání krajů OP1 stěnovou pilou	7 dny	22.06. 18	28.06. 18	424
426	14-07	OP1	HT	injektáž OP1 (celá šířka)	10 dny	25.06. 18	04.07. 18	
427	14-07	OP1	HT	bourání střední části opěry (pod hradlem)	5 dny	25.06. 18	29.06. 18	426SS
428	14-07	OP1	HT	bourání ÚP (LM+PM) - 1. úroveň	14 dny	30.06. 18	13.07. 18	427
429	14-07	OP1	HT	frézování	2 dny	16.07. 18	17.07. 18	
430	14-07	OP1	HT	kotvy	3 dny	17.07. 18	19.07. 18	429SS+1 den
431	14-07	OP1	HT	montáž pižma pro 2. úroveň	2 dny	20.07. 18	21.07. 18	430
432	14-07	OP1	HT	torkret	1 den	22.07. 18	22.07. 18	431
433	14-07	OP1	HT	bourání - 2. úroveň	5 dny	23.07. 18	27.07. 18	432
434	14-07	OP1	HT	frézování	2 dny	28.07. 18	29.07. 18	433
435	14-07	OP1	HT	kotvy	3 dny	29.07. 18	31.07. 18	434SS+1 den
436	14-07	OP1	HT	demontáž pižma	1 den	01.08. 18	01.08. 18	435
437	14-07	OP1	HT	torkret	1 den	02.08. 18	02.08. 18	436
438	14-07	OP1	HT	bourání po úroveň chodníku	3 dny	03.08. 18	05.08. 18	437
439	14-07	OP1	HT	frézování	1 den	06.08. 18	06.08. 18	438
440	14-07	OP1	HT	kotvy (2 kotevní úrovně)	5 dny	07.08. 18	11.08. 18	439
441	18-01.2	OP1	HT	odstr. povrchu chodníku	1 den	11.08. 18	11.08. 18	440SS+4 dny
442	14-07	OP1	HT	torkret	1 den	12.08. 18	12.08. 18	440
443	14-07	OP1	HT	výkop	20 dny	13.08. 18	01.09. 18	442
444	14-07	OP1	HT	výkop do def. polohy	15 dny	04.09. 18	18.09. 18	448
445	14-07	OP1	HT	bourání do definitivní úrovně	5 dny	19.09. 18	23.09. 18	444
446	14-07	OP1	HT	frézování	1 den	24.09. 18	24.09. 18	445
447		**OP1**	**STR**	**přeložky (provizorní)**	**2 dny**	**02.09. 18**	**03.09. 18**	
452	14-07	OP1	HT	mikropiloty	21 dny	25.09. 18	15.10. 18	446
453	14-07	OP1	HT	torkret, izolace rubu opěry, vč ochrany	6 dny	13.10. 18	18.10. 18	452FS-3 dny
454	14-07	OP1	HT	odkop cem. stab.	7 dny	16.10. 18	22.10. 18	453SS+3 dny
455	14-07	OP1	HT	navaření hlav MP	7 dny	23.10. 18	29.10. 18	454
456	14-07	OP1	HT	základ (bednění, armování, betonáž)	8 dny	30.10. 18	06.11. 18	455
457	14-07	OP1	HT	dřík (bednění, armování, betonáž)	20 dny	07.11. 18	26.11. 18	456
458	14-07	OP1	HT	odbednění dříku, příprava pro uložení kabelů	7 dny	27.11. 18	03.12. 18	457
459	36-05.1	OP1	STR	přeložka PRE (definitvní)	2 dny	11.12. 18	12.12. 18	458
460	36-07	OP1	STR	přeložka kabelů SSZ - definitivní poloha	2 dny	10.12. 18	11.12. 18	458
461	14-07	OP1	HT	zásyp výkopu, ochrana kabelů (panely)	1 den	13.12. 18	13.12. 18	459
462	14-07	OP1	HT	ložiskové bločky (bednění, armování, betonáž)	2 dny	04.12. 18	05.12. 18	458
463	18-01.2	OP1	HT	obnovení povrchů (definitivní)	6 dny	14.12. 18	19.12. 18	461
464	18-02.07	OP1	HT	úprava DIO (OP1)	0 dny	19.12. 18	19.12. 18	463
465	18-02.07	OP1	HT	úprava DIO (OP2)	0 dny	07.01. 19	07.01. 19	
466	**14-07**	**OP2**		**OP2**	**180 dny**	**14.01. 19**	**12.07. 19**	
467	14-07	OP2	HT	bourání po úroveň terénu	38 dny	14.01. 19	20.02. 19	
468	14-07	OP2	HT	odstranění povrchů, odkopání inž. Sítí	30 dny	21.02. 19	22.03. 19	

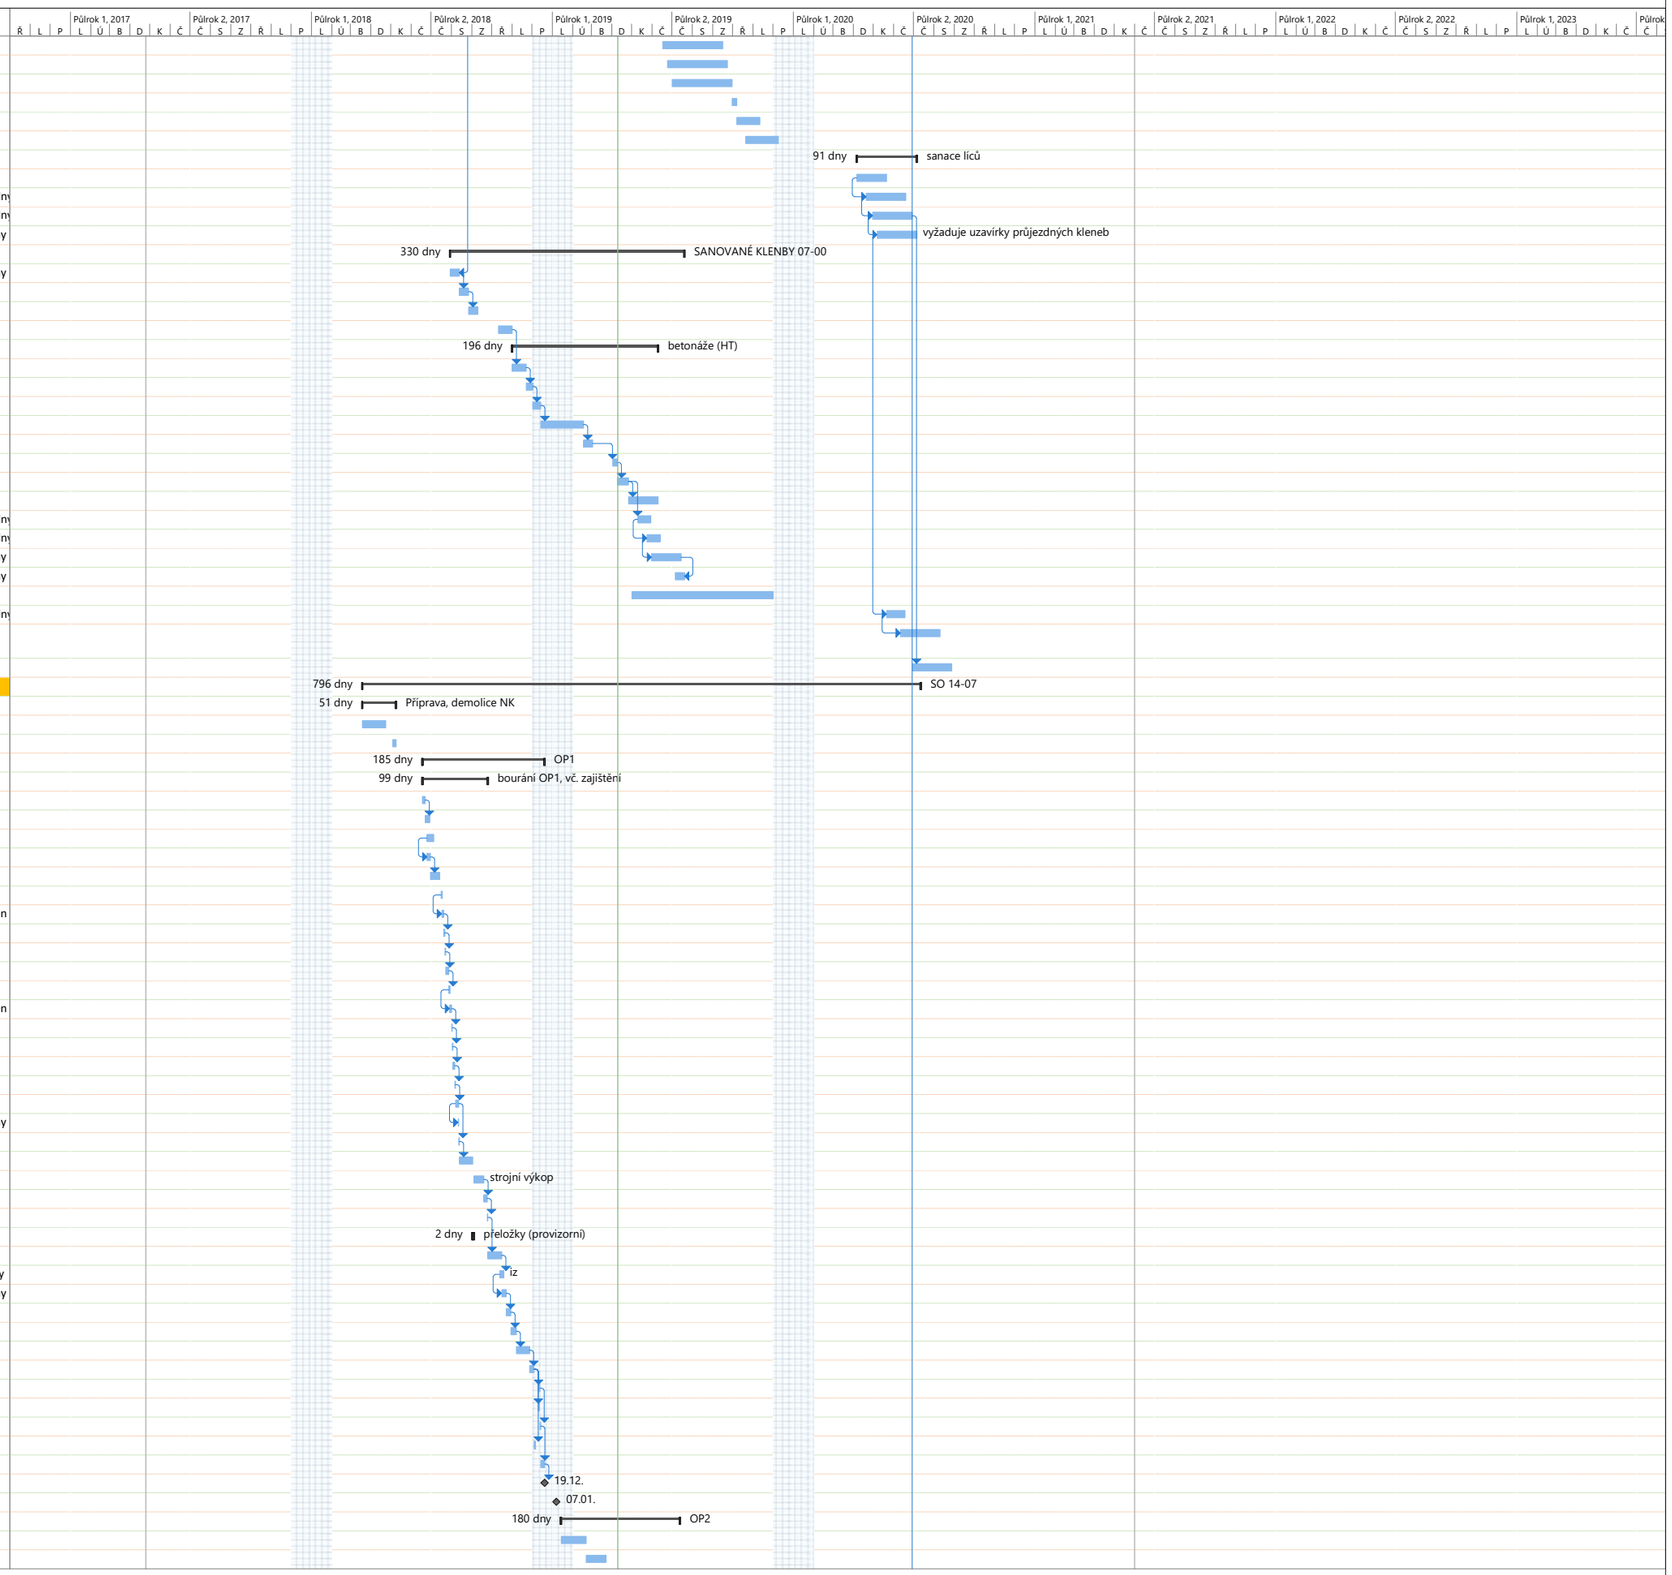

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	Číslo SO/PS	č.klenby	Zhoto	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
469	36-05.1	OP2	STR	přeložka PRE (provizorní)	1 den	12.04. 19	12.04. 19	
470	36-07	OP2	STR	přeložka Eltodo (provizorní)	1 den	01.04. 19	01.04. 19	
471	14-07	OP2	HT	překrytí sítí panely	2 dny	13.04. 19	14.04. 19	469
472	14-07	OP2	HT	bourání do def. Polohy	7 dny	15.04. 19	21.04. 19	471
473	14-07	OP2	HT	zásyp CS. v zákl. spáře (příprava pro TI)	3 dny	22.04. 19	24.04. 19	472
474	14-07	OP2	HT	mikropiloty	30 dny	25.04. 19	24.05. 19	473
475	14-07	OP2	HT	odtěžení zásypů CS	10 dny	25.05. 19	03.06. 19	474
476	14-07	OP2	HT	úprava MP, podklad.beton	7 dny	04.06. 19	10.06. 19	475
477	14-07	OP2	HT	základ (bednění, armování, betonáž)	10 dny	11.06. 19	20.06. 19	476
478	14-07	OP2	HT	dřík (bednění, armování, betonáž)	20 dny	21.06. 19	10.07. 19	477
479	14-07	OP2	HT	ložiskové bločky (bednění, armování, betonáž)	2 dny	11.07. 19	12.07. 19	478
480	14-07	OP2	HT	zásyp výkopu, příprava definitivní trasy PRE, VO	1 den	11.07. 19	11.07. 19	478
481	36-05.1	OP2	STR	přeložka PRE (definitvní)	1 den	12.07. 19	12.07. 19	480
482	36-07	OP2	STR	přeložka Eltodo (defin.)	1 den	12.07. 19	12.07. 19	480
483	**14-07**	**NK**		**NK**	**127 dny**	**13.07. 19**	**16.11. 19**	
484	**18-02.07**		**HT**	**DIO - úplná uzavírka**	**9 dny**	**13.07. 19**	**21.07. 19**	
485	14-07	NK	HT	osazení nosníků	3 dny	13.07. 19	15.07. 19	482
486	14-07	NK	HT	montáž bednění (ochranná konstruce)	6 dny	16.07. 19	21.07. 19	485
487	14-07	OP2	HT	obnovení povrchů	6 dny	16.07. 19	21.07. 19	485
488	**14-07**	**NK**	**HT**	**DIO - uzavírka OP1**	**30 dny**	**22.07. 19**	**20.08. 19**	**487**
489	14-07	NK	HT	spřažená deska (dobednění, armování, betonáž)	12 dny	22.07. 19	02.08. 19	486
490	14-07	NK	HT	odvodnění za OP1	20 dny	22.07. 19	10.08. 19	489SS
491	14-07	NK	HT	rámový roh OP1 bednění, armov.,bet.,odbednění	18 dny	03.08. 19	20.08. 19	489
492	**14-07**	**NK**	**HT**	**DIO - uzavírka OP2**	**34 dny**	**21.08. 19**	**23.09. 19**	
493	14-07	NK	HT	rámový roh OP2 bednění, armov.,bet.,odbednění	17 dny	21.08. 19	06.09. 19	491
494	14-07	NK	HT	římsy	28 dny	21.08. 19	17.09. 19	491
495	14-07	NK	HT	montáž mostních závěrů	6 dny	18.09. 19	23.09. 19	494
496	**14-07**	**NK**	**HT**	**DIO úplná uzavírka**	**4 dny**	**24.09. 19**	**27.09. 19**	
497	14-07	NK	HT	demontáž bednění (ochranná konstruce)	4 dny	24.09. 19	27.09. 19	495
498	14-07	NK	HT	izolace, LA	7 dny	24.09. 19	30.09. 19	495
499	14-07	NK	HT	zábradlí	8 dny	01.10. 19	08.10. 19	498
500	14-07	NK	HT	antivibrační rohože	3 dny	13.10. 19	15.10. 19	499
501	14-17	OP2	STR	montáž návěstní lávky	30 dny	18.10. 19	16.11. 19	494FS+30 dny
502	14-07	OP1	AV	obklad OP1	60 dny	13.05. 20	11.07. 20	503
503	14-07	OP2	AV	obklad OP2	60 dny	14.03. 20	12.05. 20	
504	**14-08**	**36-22**		**SO 14-08**	**927 dny**	**15.11. 17**	**18.07. 20**	
505	14-08	36-22	HT	injektáž pilířů	36 dny	15.11. 17	20.12. 17	
506	14-08	36-22	HT	montáž poskružení	40 dny	23.02. 18	03.04. 18	
507	14-08	36-22	HT	odhalení rubu (vč. dmtž říms)	39 dny	27.03. 18	04.05. 18	
508	14-08	36-22	HT	izolace vč. ochrany, antivibrační rohože	25 dny	21.09. 19	15.10. 19	
509	14-08	36-22	HT	zábradlí	40 dny	06.09. 19	15.10. 19	
510	**14-08**	**36-27**		**SANOVANÉ KLENBY 36-27**	**345 dny**	**05.05. 18**	**09.05. 19**	
511	**14-08**	**36-27**	**AV**	**diagnostika vč. vyhodnocení, výměny kamenů v klenbě**	**74 dny**	**05.05. 18**	**17.07. 18**	
512	14-08	36-27	AV	diagnostika vč. vyhodnocení	30 dny	05.05. 18	03.06. 18	507
513	14-08	36-27	AV	výměna kamenů	44 dny	04.06. 18	17.07. 18	512
514	**14-08**	**36-27**	**HT**	**betonáže (HT)**	**301 dny**	**18.06. 18**	**09.05. 19**	
515	14-08	36-27	HT	torkrety, úložné prahy	45 dny	18.06. 18	01.08. 18	513FF+15 dny
516	14-08	36-27	HT	dobetonávky	30 dny	02.08. 18	31.08. 18	515
517	14-08	36-27	HT	stěrka,příprava povrchu pod izolaci	14 dny	19.10. 18	01.11. 18	515SS
518	14-08	36-27	HT	spádové betony, vrtání pro odvodnění	30 dny	01.09. 18	30.09. 18	516
519	14-08	36-27	HT	osazení drenáží, průchody odvodnění	21 dny	16.10. 18	05.11. 18	518FS+7 dny
520	14-08	36-27	HT	pojistná izolace	7 dny	02.11. 18	08.11. 18	517
521	14-08	36-27	HT	mezerovitý beton	25 dny	09.11. 18	23.02. 19	520
522	14-08	36-27	HT	roznášecí deska vč. říms	75 dny	24.02. 19	09.05. 19	521
523	**14-08**	**26-24**		**PŘEZDÍVANÉ KLENBY 26-24**	**381 dny**	**14.05. 18**	**23.06. 19**	
524	**14-08**	**26-24**	**AV**	**přezdívání (AV)**	**296 dny**	**14.05. 18**	**30.03. 19**	
525	14-08	26-24	AV	demontáž poprsních zdí	30 dny	14.05. 18	12.06. 18	
526	14-08	26-24	AV	demontáž klenby	45 dny	13.06. 18	27.07. 18	525
527	14-08	26-24	AV	vyzdění kleneb	120 dny	11.08. 18	08.12. 18	529
528	14-08	26-24	AV	vyzdění poprsních zdí	38 dny	21.02. 19	30.03. 19	527
529	14-08	26-24	HT	demolice bet. částí kleneb	14 dny	28.07. 18	10.08. 18	526
530	**14-08**	**26-24**	**HT**	**betonáže (HT)**	**85 dny**	**31.03. 19**	**23.06. 19**	
531	14-08	26-24	HT	torkrety	6 dny	31.03. 19	05.04. 19	528
532	14-08	26-24	HT	úložné prahy	12 dny	06.04. 19	17.04. 19	531
533	14-08	26-24	HT	dobetonávky, vrtání pro odvodnění	10 dny	18.04. 19	27.04. 19	532
534	14-08	26-24	HT	pojistná izolace, vč. úpravy povrchů	10 dny	28.04. 19	07.05. 19	533
535	14-08	26-24	HT	mezerovitý beton	7 dny	08.05. 19	14.05. 19	534
536	14-08	26-24	HT	roznášecí deska vč. říms	40 dny	15.05. 19	23.06. 19	535
537	**14-08**	**23-22**		**PŘEZDÍVANÉ KLENBY 23-22**	**288 dny**	**30.11. 18**	**08.10. 19**	
538	14-08	23-22	HT	úprava skruží 22 a 23 pro bourání	20 dny	30.11. 18	20.12. 18	
539	14-08	23-22	AV	rozebrání poprsních zdí	30 dny	01.12. 18	24.01. 19	
540	14-08	23-22	HT	bourání kleneb 22 a 23	6 týdny	14.01. 19	24.02. 19	
541	14-08	23	HT	úprava skruže 23 pro zdění	10 dny	20.02. 19	01.03. 19	
542	14-08	22	HT	úprava skruže 22 pro zdění	10 dny	02.03. 19	11.03. 19	541
543	14-08	23-22	AV	vyzdění kleneb 22 a 23, vč. poprsních zdí	5 měsíce	03.03. 19	30.07. 19	
544	**14-08**	**23-22**	**HT**	**betonáže (HT)**	**70 dny**	**31.07. 19**	**08.10. 19**	
545	14-08	23-22	HT	torkrety	6 dny	31.07. 19	05.08. 19	543
546	14-08	23-22	HT	úložné prahy	10 dny	06.08. 19	15.08. 19	545
547	14-08	23-22	HT	dobetonávky, vrtání pro odvodnění	10 dny	16.08. 19	25.08. 19	546
548	14-08	23-22	HT	pojistná izolace, vč. úpravy povrchů	6 dny	26.08. 19	31.08. 19	547
549	14-08	23-22	HT	mezerovitý beton	6 dny	01.09. 19	06.09. 19	548

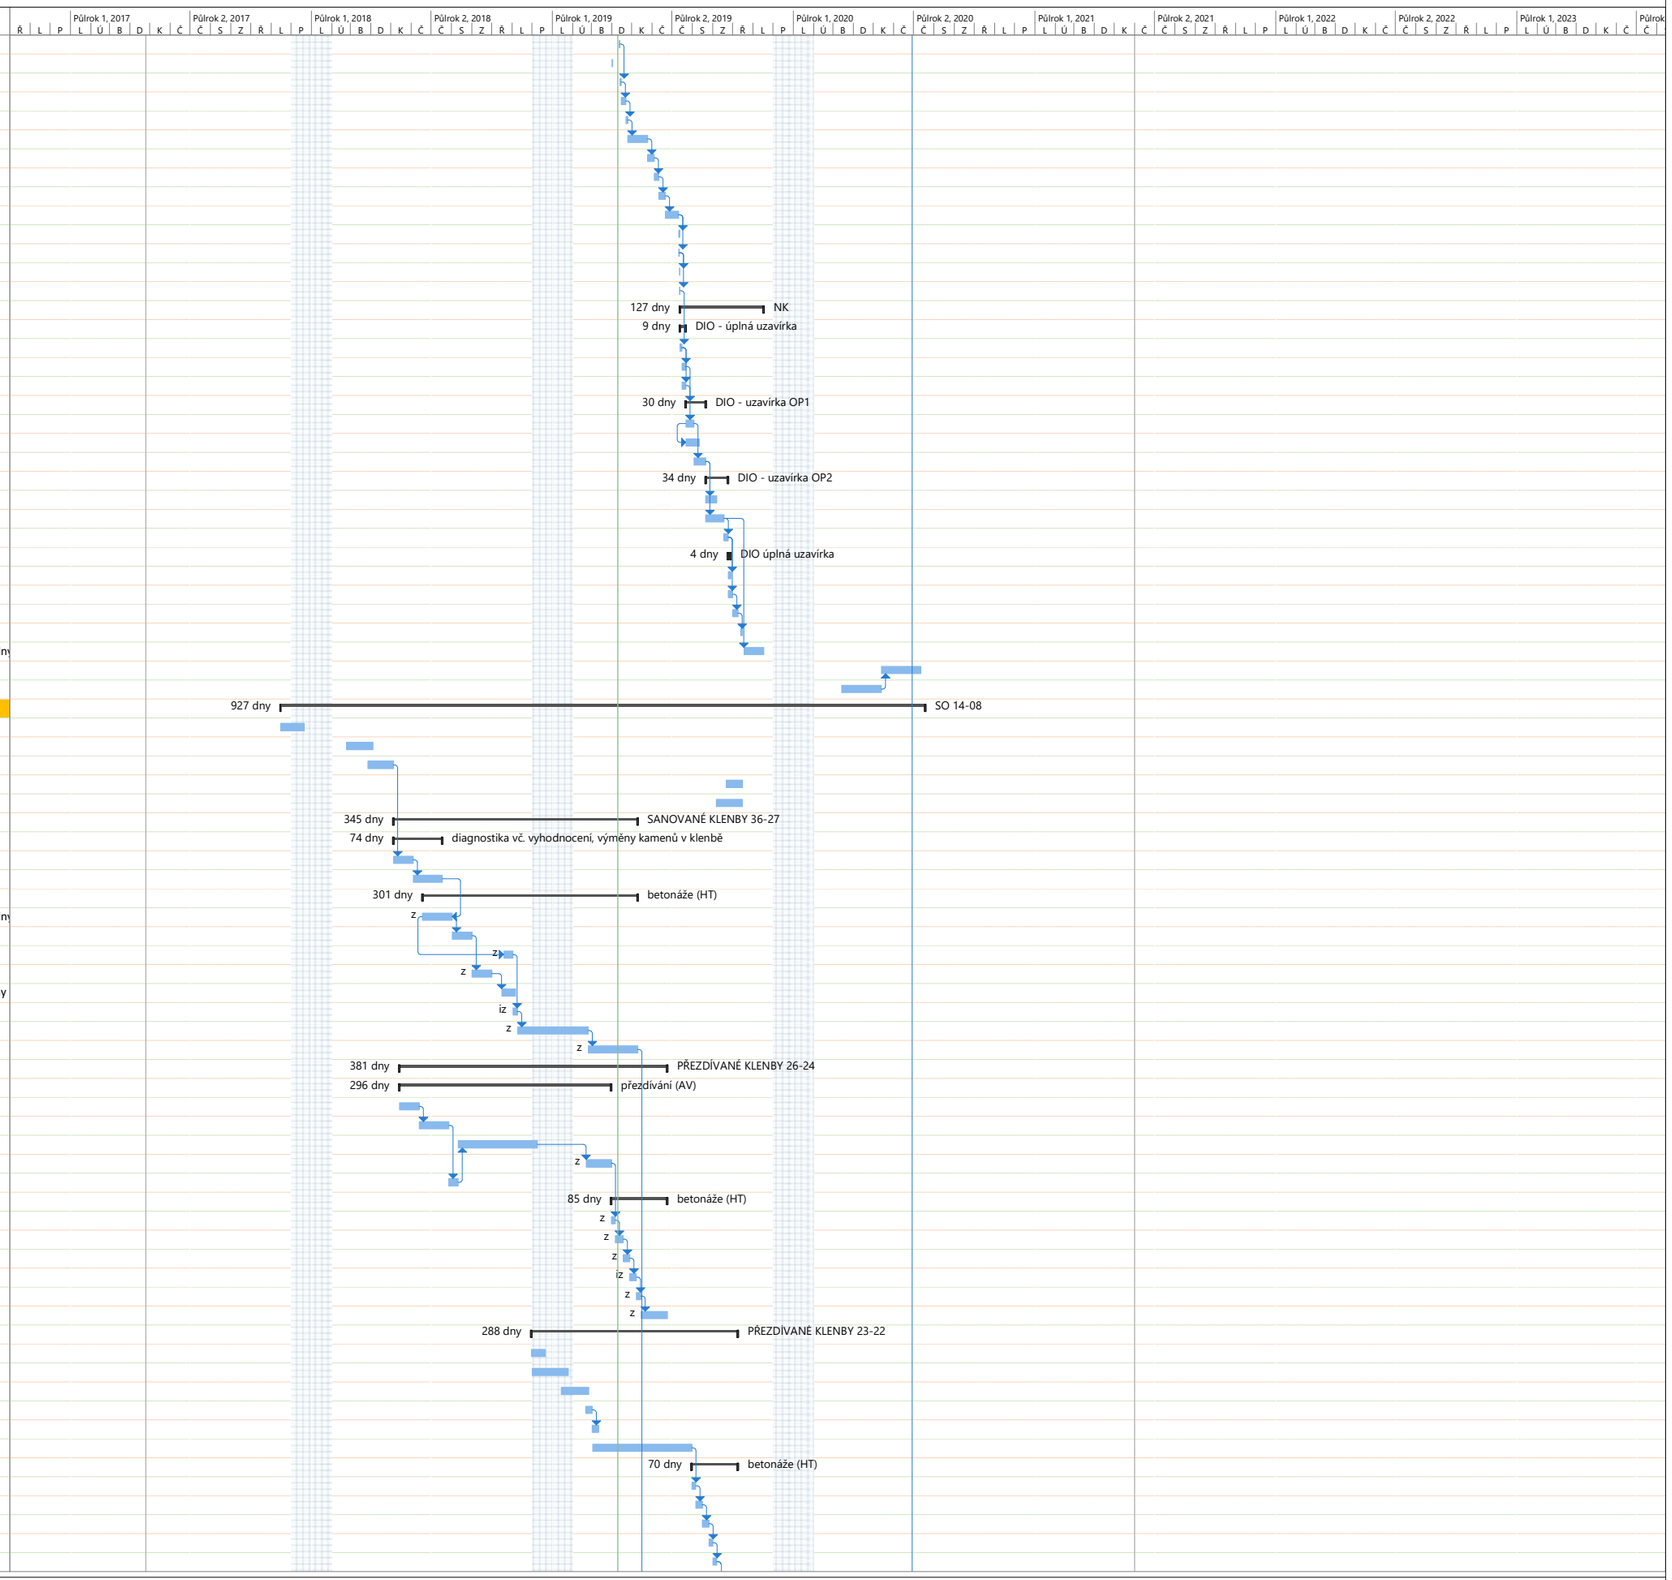

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	Číslo SO/PS	č.klenby	Zhotov	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
550	14-08	23-22	HT	roznášecí deska vč. říms	32 dny	07.09. 19	08.10. 19	549
551	**14-08**	**22-36**		**sanační práce (pod mostem)**	**192 dny**	**10.05. 19**	**17.11. 19**	
552	14-08	22-36	HT	demontáž podskružení, odkopání pilířů	25 dny	07.09. 19	01.10. 19	549
553	14-08	22-36	AV	diagnostika, sanace pod terénem	60 dny	12.09. 19	10.11. 19	552SS+5 dny
554	14-08	22-36	HT	zásyp pilířů	25 dny	24.10. 19	17.11. 19	553FF+7 dny
555	14-08	22-36	AV	sanace líců, spárování, konsolidace	180 dny	10.05. 19	05.11. 19	522
556	16-01.1		STR	kanalizace	20 dny	29.06. 20	18.07. 20	45FS+14 dny
557	**14-09**	**39-37**		**SO 14-09**	**612 dny**	**01.11. 17**	**30.07. 19**	
558	14-09	37-39	HT	injektáž pilířů	21 dny	01.11. 17	21.11. 17	
559	14-09	37-39	HT	TI podzákladí - změna projektu	5 dny	15.12. 17	19.12. 17	
560	14-09	37-39	HT	odhalení rubu (vč. dmtž říms)	20 dny	22.03. 18	10.04. 18	
561	14-09	37-39	AV	diagnostika vč. vyhodnocení, výměny kamenů v klenbě	60 dny	11.04. 18	09.06. 18	560
562	14-09	37-39	HT	izolace vč. ochrany, antivibrační rohože	14 dny	05.06. 19	18.06. 19	
563	14-09	37-39	HT	zábradlí	10 dny	19.06. 19	28.06. 19	562
564	**14-09**	**37-39**	**HT**	**betonáže (HT)**	**196 dny**	**06.08. 18**	**14.03. 19**	
565	14-09	37-39	HT	torkrety, průchody odvodnění, stěrka	14 dny	06.08. 18	19.08. 18	
566	14-09	37-39	HT	úložné prahy, vč. dobetonávek	20 dny	20.08. 18	08.09. 18	565
567	14-09	37-39	HT	spádové betony	6 dny	11.10. 18	16.10. 18	566
568	14-09	37-39	HT	pojistná izolace	7 dny	17.10. 18	23.10. 18	567
569	14-09	37-39	HT	mezerovitý beton, podkladní beton	20 dny	24.10. 18	12.11. 18	568
570	14-09	37-39	HT	roznášecí deska vč. říms	40 dny	13.11. 18	14.03. 19	569
571	14-09	37	HT	odkopání O1,P1	10 dny	15.03. 19	24.03. 19	570
572	14-09	37	AV	diagnostika a sanace pod terénem	30 dny	25.03. 19	23.04. 19	571
573	14-09	37	HT	zásyp O1,P1	10 dny	24.04. 19	03.05. 19	572
574	14-09	39	HT	odkopání O2,P2	10 dny	04.05. 19	13.05. 19	573
575	14-09	39	AV	diagnostika a sanace pod terénem	30 dny	14.05. 19	12.06. 19	574
576	14-09	39	HT	zásyp O2,P2	10 dny	13.06. 19	22.06. 19	575
577	14-09	37-39	AV	sanace líců, spárování, konsolidace	60 dny	01.06. 19	30.07. 19	
578	**14-10**	**48-40**		**SO 14-10**	**699 dny**	**04.09. 17**	**28.08. 19**	
579	14-10	48-40	HT	injektáž pilířů	37 dny	21.09. 17	27.10. 17	
580	14-10	48-40	HT	TI podzákladí	108 dny	04.09. 17	20.12. 17	
581	14-10	48-40	HT	montáž poskružení	14 dny	07.02. 18	20.02. 18	
582	14-10	48-40	HT	odhalení rubu (vč. dmtž říms)	24 dny	08.03. 18	31.03. 18	
583	14-10	48-40	HT	izolace vč. ochrany, antivibrační rohože	20 dny	20.07. 19	08.08. 19	626
584	14-10	48-40	HT	zábradlí	14 dny	09.08. 19	22.08. 19	583
585	**14-10**	**47-40**		**SANOVANÉ KLENBY 47-40**	**490 dny**	**01.04. 18**	**28.08. 19**	
586	14-10	47-40	AV	výměny kamenů v klenbě	90 dny	01.04. 18	29.06. 18	582
587	**14-10**	**47-40**	**HT**	**betonáže (HT)**	**261 dny**	**18.06. 18**	**30.03. 19**	
588	14-10	47-40	HT	úložné prahy	30 dny	30.06. 18	29.07. 18	590SS
589	14-10	47-40	HT	vrtání pro odvodnění	12 dny	18.06. 18	29.06. 18	586FF
590	14-10	47-40	HT	torkrety, průchody odvodnění, spádový beton	42 dny	30.06. 18	10.08. 18	589
591	14-10	47-40	HT	dobetonávky	21 dny	19.09. 18	09.10. 18	
592	14-10	47-40	HT	pojistná izolace	7 dny	10.10. 18	16.10. 18	591
593	14-10	47-40	HT	mezerovitý beton, podkladní beton	25 dny	17.10. 18	10.11. 18	592
594	14-10	47-40	HT	roznášecí deska vč. říms	50 dny	19.11. 18	30.03. 19	593
595	**14-10**	**47-40**	**AV**	**sanační práce (pod mostem)**	**151 dny**	**31.03. 19**	**28.08. 19**	
596	14-10	47-40	AV	odkopání pilířů	25 dny	31.03. 19	24.04. 19	594
597	14-10	47-40	AV	diagnostika, sanace pod terénem	60 dny	07.04. 19	05.06. 19	596SS+7 dny
598	14-10	47-40	AV	zásyp pilířů	25 dny	19.05. 19	12.06. 19	597FF+7 dny
599	14-10	48-40	AV	sanace líců, spárování, konsolidace	120 dny	01.05. 19	28.08. 19	
600	**14-10**	**48**		**PŘEZDÍVANÁ KLENBA 48**	**469 dny**	**13.03. 18**	**19.07. 19**	
601	**14-10**	**48**	**AV**	**přezdívání klenby, sanace pod terénem (AV)**	**392 dny**	**13.03. 18**	**03.05. 19**	
602	14-10	48	AV	demontáž poprsních zdí	32 dny	13.03. 18	13.04. 18	
603	14-10	48	AV	demontáž klenby 48	38 dny	14.04. 18	21.05. 18	602
604	14-10	48	AV	demontáž pilíře O2	24 dny	30.05. 18	22.06. 18	614
605	**14-10**	**48**	**AV**	**sanace prvků pod terénem (AV)**	**56 dny**	**28.06. 18**	**22.08. 18**	
606	14-10	48	AV	čištění pilířů pod terénem	2 dny	28.06. 18	29.06. 18	615
607	14-10	48	AV	diagnostika prvků pod terénem	2 dny	12.07. 18	13.07. 18	
608	14-10	48	AV	vyhodnocení prvků pod terénem	5 dny	14.07. 18	18.07. 18	607
609	14-10	48	AV	výměna kamenů pod terénem, spárování	5 dny	18.08. 18	22.08. 18	608FS+30 dny
610	14-10	48	AV	sanace líců, spárování, konsolidace pod terénem	14 dny	19.07. 18	01.08. 18	608
611	14-10	48	AV	stavba pilíře O2 včetně římsového kamene	21 dny	26.08. 18	15.09. 18	616
612	14-10	48	AV	stavba klenby 48	80 dny	21.09. 18	01.03. 19	617
613	14-10	48	AV	stavba poprsních zdí včetně pilíře O2	63 dny	02.03. 19	03.05. 19	612
614	14-10	48	HT	demontáž podskružení	8 dny	22.05. 18	29.05. 18	603
615	14-10	48	HT	odkopání pilířů O2 a P8	5 dny	23.06. 18	27.06. 18	604
616	14-10	48	HT	zásyp pilířů	3 dny	23.08. 18	25.08. 18	609;610
617	14-10	48	HT	stavba podskružení	5 dny	16.09. 18	20.09. 18	611
618	14-10	48	HT	montáž lešení (poprsní zdi)	4 dny	26.02. 19	02.03. 19	613SF
619	14-10	48	HT	demontáž lešení (poprsní zdi)	4 dny	04.05. 19	07.05. 19	613
620	**14-10**	**48**	**HT**	**betonáže (HT)**	**77 dny**	**04.05. 19**	**19.07. 19**	
621	14-10	48	HT	torkrety	6 dny	04.05. 19	09.05. 19	613
622	14-10	48	HT	úložné prahy	10 dny	10.05. 19	19.05. 19	621
623	14-10	48	HT	dobetonávky, vrtání pro odvodnění	10 dny	20.05. 19	29.05. 19	622
624	14-10	48	HT	pojistná izolace, vč. úpravy povrchů	7 dny	30.05. 19	05.06. 19	623
625	14-10	48	HT	mezerovitý beton	4 dny	06.06. 19	09.06. 19	624
626	14-10	48	HT	roznášecí deska vč. říms	40 dny	10.06. 19	19.07. 19	625
627	**14-11**	**61-49**		**SO 14-11**	**712 dny**	**09.10. 17**	**15.10. 19**	
628	14-11	61-49	HT	injektáž pilířů	20 dny	09.10. 17	28.10. 17	
629	14-11	53-55	HT	montáž podskružení	7 dny	11.12. 17	17.12. 17	
630	14-11	61-49	HT	odhalení rubu (vč. dmtž říms)	86 dny	08.12. 17	03.03. 18	

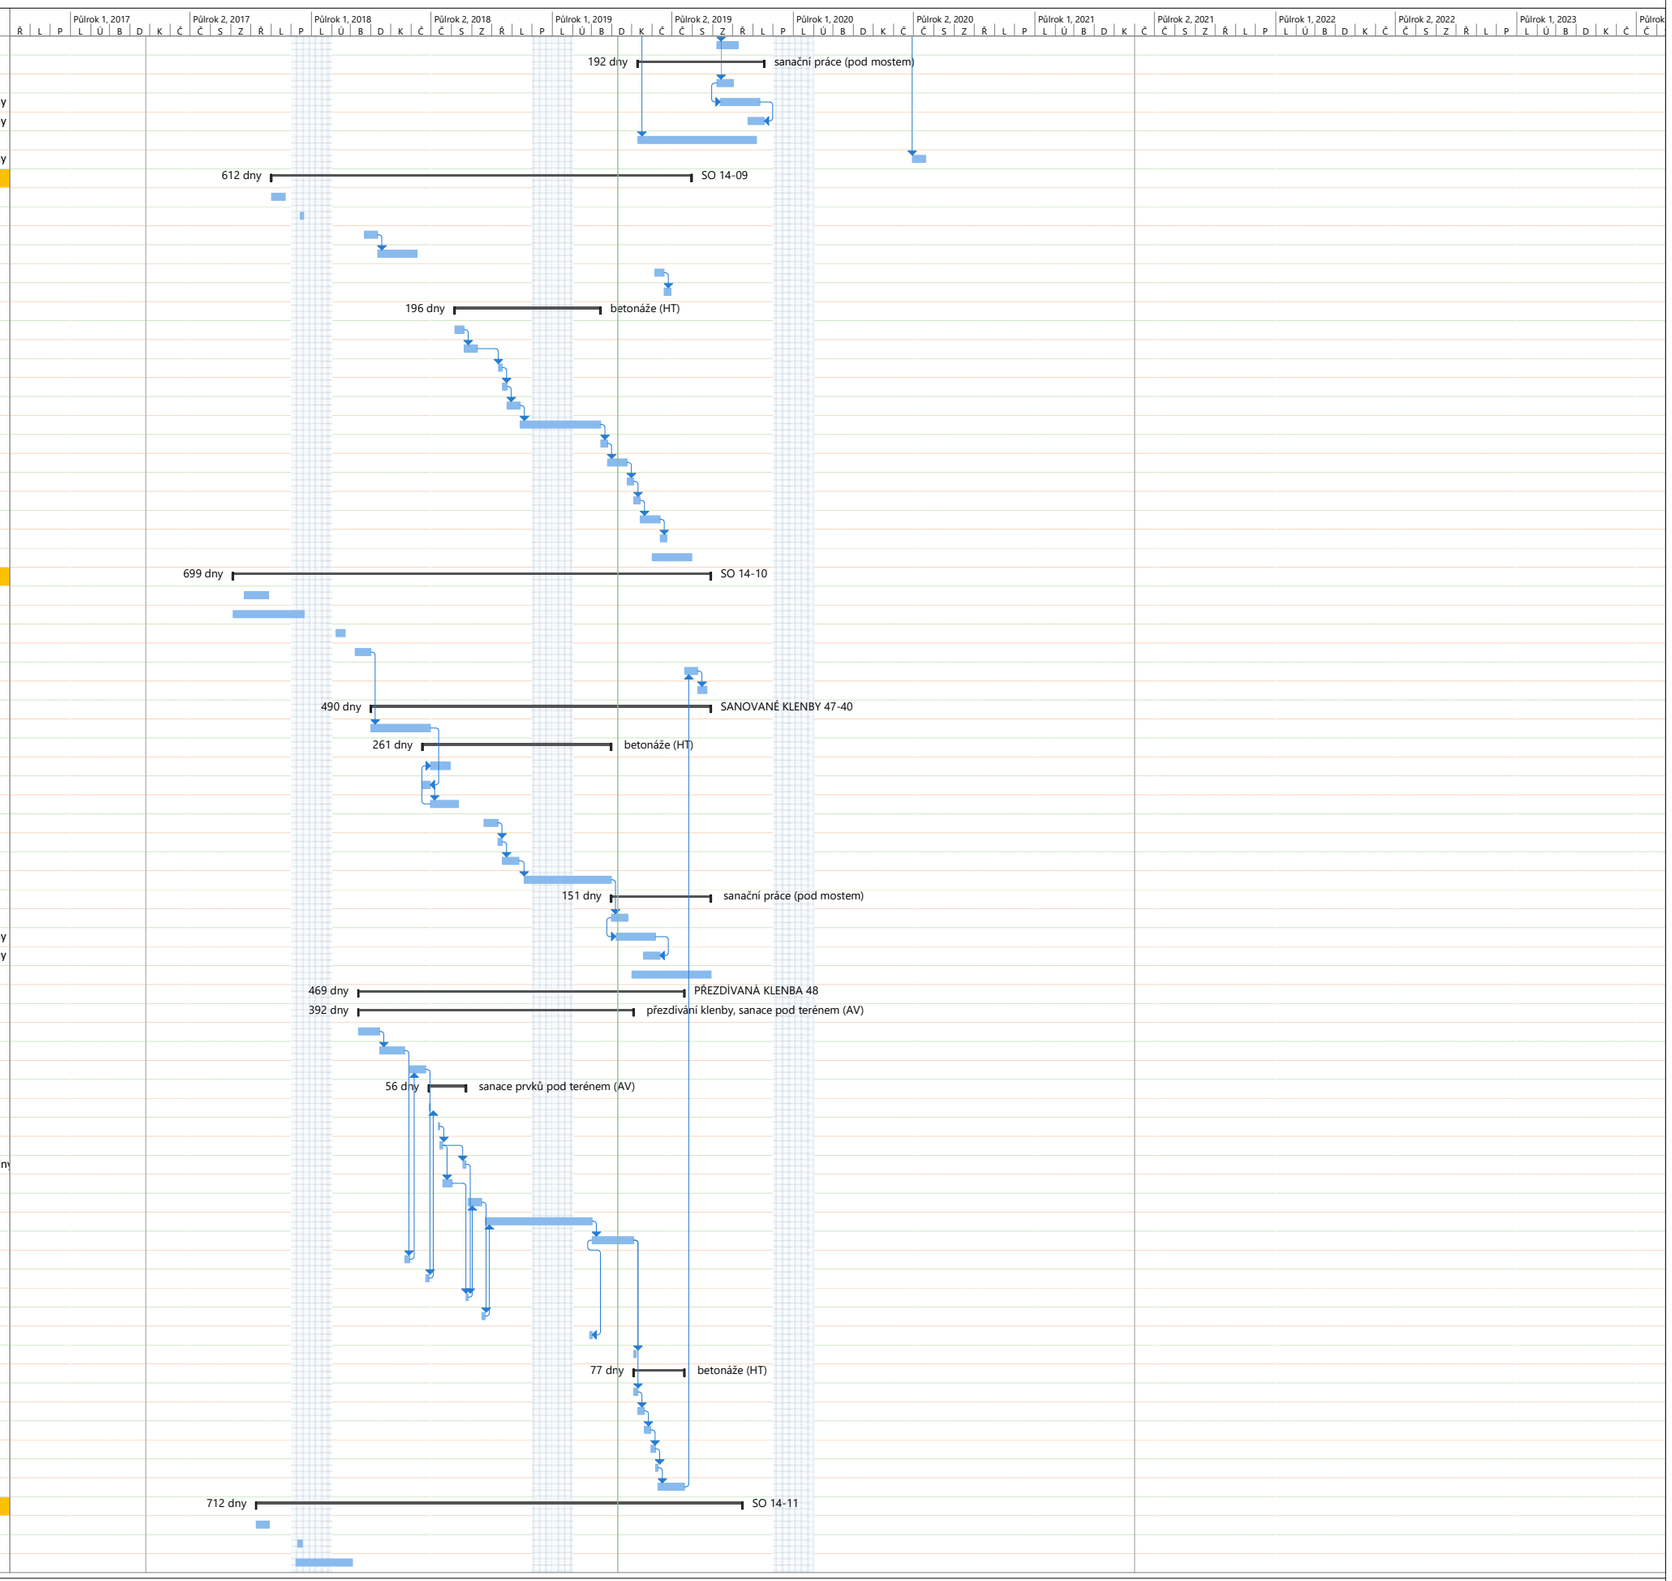

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	Číslo SO/PS	č.klenby	Zhotov	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
631	14-11	61-49	AV	diagnostika z rubu vč. vyhodnocení	14 dny	16.07. 18	29.07. 18	
632	14-11	53-55	AV	výměna kamenů v klenbě	21 dny	01.06. 18	21.06. 18	
633	14-11	61-52	HT	izolace vč. Ochrany, antivibrační rohože (nebouraná část)	30 dny	11.08. 19	09.09. 19	
634	14-11	49-51	HT	izolace vč. Ochrany, antivibrační rohože (bouraná část)	10 dny	29.09. 19	08.10. 19	654
635	14-11	49-51	HT	zábradlí	80 dny	21.07. 19	08.10. 19	634FF
636	**14-11**	**50**		**bouraná klenba 50**	**197 dny**	**16.03. 19**	**28.09. 19**	
637	ZL	50	HT	příprava pro přeložení kabelů (VN, sděl.)	18 dny	25.03. 19	11.04. 19	
638	ZL	50	HT	přeložení kabelů (VN, sděl.)	14 dny	01.04. 19	14.04. 19	
639	ZL	50	HT	vybourání kalhot (P1, P2)	30 dny	16.03. 19	14.04. 19	
640	**ZL**	**50**	**HT**	**práce v uzavírce ul. Prvního pluku**	**15 dny**	**20.04. 19**	**04.05. 19**	
641	ZL	50	HT	ochranná vrstva (ŠD)	4 dny	20.04. 19	23.04. 19	
642	ZL	50	HT	bourání klenby 50 (vč. Poprsních zdí), odvoz suti	11 dny	24.04. 19	04.05. 19	641
643	ZL	50	HT	dobourání kalhot	10 dny	05.05. 19	14.05. 19	642
644	ZL	50	HT	podskružení klenby 50	14 dny	15.05. 19	28.05. 19	643
645	ZL	50	HT	armování klenby 50	10 dny	29.05. 19	07.06. 19	644
646	ZL	50	HT	bednění a betonáž klenby 50	14 dny	08.06. 19	21.06. 19	645
647	ZL	50	HT	poprsní zdi (bednění, armování, betonáž)	14 dny	22.06. 19	05.07. 19	646
648	14-11	50	HT	spádové betony, vrtání pro odvodnění	7 dny	06.07. 19	12.07. 19	647
649	14-11	50	HT	úložné prahy	12 dny	13.07. 19	24.07. 19	648
650	14-11	49-51	HT	torkrety, průchody odvodnění, stěrka	10 dny	25.07. 19	03.08. 19	649
651	14-11	49-51	HT	pojistná izolace	4 dny	11.08. 19	14.08. 19	650FS+7 dny
652	14-11	49-52	HT	mezerovitý beton	9 dny	15.08. 19	23.08. 19	651
653	14-11	49-52	HT	roznášecí deska	14 dny	24.08. 19	06.09. 19	652
654	14-11	49-52	HT	římsy	22 dny	07.09. 19	28.09. 19	653
655	14-11	50	HT	demontáž podskružení	7 dny	29.09. 19	05.10. 19	654
656	**14-11**	**61-49**	**HT**	**betonáže (HT)**	**387 dny**	**25.06. 18**	**10.08. 19**	
657	14-11	61-49	HT	úložné prahy	105 dny	16.07. 18	28.10. 18	
658	14-11	49-51,56-61	HT	dobourání stávající mazaniny	21 dny	25.06. 18	15.07. 18	
659	14-11	61-49	HT	spádové betony, vrtání pro odvodnění	21 dny	01.10. 18	21.10. 18	
660	14-11	61-49	HT	torkrety, průchody odvodnění, stěrka	21 dny	08.10. 18	28.10. 18	
661	14-11	61-49	HT	pojistná izolace	14 dny	22.10. 18	04.11. 18	
662	14-11	61-49	HT	mezerovitý beton	28 dny	26.01. 19	22.02. 19	
663	14-11	61-49	HT	roznášecí deska	60 dny	23.02. 19	23.04. 19	
664	14-11	61-49	HT	římsy	102 dny	01.05. 19	10.08. 19	
665	14-11	61-49	HT	demontáž podskružení, odkopání pilířů	20 dny	11.08. 19	30.08. 19	
666	14-11	61-49	AV	sanace pod terénem	45 dny	25.08. 19	08.10. 19	
667	14-11	61-49	HT	zásyp pilířů	14 dny	02.10. 19	15.10. 19	
668	14-11	49-51,56-61	HT	sanace bet. líců	260 dny	19.10. 18	30.07. 19	
669	14-11	53-55	AV	sanace kamenných líců	120 dny	01.05. 19	28.08. 19	
670	**14-12**	**62-64**		**SO 14-12**	**714 dny**	**18.09. 17**	**26.09. 19**	
671	14-12	62-64	AV	demontáž zábradlí, vč. říms	59 dny	18.09. 17	15.11. 17	
672	14-12	62-64	HT	odhalení rubu	20 dny	27.11. 17	16.12. 17	
673	14-12	62-64	AV	diagnostika z rubu vč. vyhodnocení	30 dny	20.02. 18	21.03. 18	
674	14-12	62-64	AV	dozdění vodárny	36 dny	01.08. 18	05.09. 18	
675	14-12	62-64	HT	izolace vč. ochrany, antivibrační rohože	25 dny	08.08. 19	01.09. 19	690;694
676	14-12	62-64	HT	zábradlí	21 dny	02.09. 19	22.09. 19	675
677	**14-12**	**62-64**	**HT**	**betonáže (HT)**	**122 dny**	**08.03. 18**	**07.07. 18**	
678	14-12	62-64	HT	přibetonávka poprsních zdí	25 dny	08.03. 18	01.04. 18	
679	14-12	62-64	HT	spádové betony, vrtání pro odvodnění	15 dny	06.04. 18	20.04. 18	
680	14-12	62-64	HT	podkladní ŽB vrstva, osazení odvodňovačů	25 dny	21.04. 18	15.05. 18	679
681	14-12	62-64	HT	pojistná hydroizolace	10 dny	24.05. 18	02.06. 18	
682	14-12	62-64	HT	mezerovitý beton	20 dny	18.06. 18	07.07. 18	
683	14-12	64	HT	montáž fasádní lávky pro 1. kámen	3 dny	13.07. 18	16.07. 18	688SF
684	14-12	64	HT	montáž závěsné lávky pro čištění a spárování líců	7 dny	30.07. 18	06.08. 18	687SF
685	14-12	64	HT	montáž podpěrné lávky pro 2. a 3. kámen	52 dny	20.08. 18	10.10. 18	
686	**14-12**	**62-64**	**AV**	**vysouvání kamenů - práce AV**	**299 dny**	**16.07. 18**	**04.06. 19**	
687	14-12	62-64	AV	čištění líců, spárování	120 dny	06.08. 18	03.12. 18	
688	14-12	62-64	AV	výměna 1. římsového kamene	42 dny	16.07. 18	26.08. 18	
689	14-12	62-64	AV	montáž římsových kamenů č.2 a č.3	22 týdny	12.10. 18	04.06. 19	
690	14-12	62-64	AV	montáž římsového kamene č. 4	65 dny	01.04. 19	04.06. 19	
691	**14-12**	**62-64**	**HT**	**zmonolitnění kamenů - práce HT**	**314 dny**	**03.09. 18**	**07.08. 19**	
692	14-12	62-64	HT	napojení izolace, dosypání MCB, podkladní bet.	99 dny	03.09. 18	10.12. 18	
693	14-12	62-64	HT	zmonolitnění římsových kamenů č.2 a č.3	22 týdny	20.10. 18	12.06. 19	689SS+8 dny
694	14-12	62-64	HT	dobetonování roznášecí desky	24 týdny	21.02. 19	07.08. 19	693SS+28 dny
695	**14-12**	**62-64**	**AV**	**PRÁCE Z VLTAVY**	**402 dny**	**27.07. 18**	**26.09. 19**	
696	14-12	O1	HT	montáž lešení O1	3 dny	04.04. 19	06.04. 19	
697	14-12	O1	AV	sanace líce O1	30 dny	07.04. 19	06.05. 19	
698	14-12	O1	HT	demontáž lešení O1	3 dny	07.05. 19	09.05. 19	
699	14-12	O1	HT	odkopání O1	10 dny	10.05. 19	19.05. 19	
700	14-12	O1	AV	sanace pod terénem O1	20 dny	20.05. 19	08.06. 19	
701	14-12	O1	HT	zásyp O1, kamenná rovnanina	20 dny	09.06. 19	28.06. 19	
702	14-12	P1	HT	montáž lešení P1	7 dny	14.08. 19	20.08. 19	
703	14-12	P1	AV	sanace nad hladinou P1	30 dny	21.08. 19	19.09. 19	
704	14-12	P1	HT	demontáž lešení P1	7 dny	20.09. 19	26.09. 19	
705	14-12	P2	HT	montáž lešení P2	7 dny	01.07. 19	07.07. 19	
706	14-12	P2	AV	sanace nad hladinou P2	30 dny	08.07. 19	06.08. 19	
707	14-12	P2	HT	demontáž lešení P2	7 dny	07.08. 19	13.08. 19	
708	14-12	O2	HT	montáž lešení O2	3 dny	27.07. 18	29.07. 18	
709	14-12	O2	AV	sanace nad hladinou O2	30 dny	30.07. 18	28.08. 18	
710	14-12	O2	HT	demontáž lešení O2	3 dny	01.04. 19	03.04. 19	
711	**14-13**	**65-77**		**SO 14-13**	**814 dny**	**01.08. 17**	**17.11. 19**	

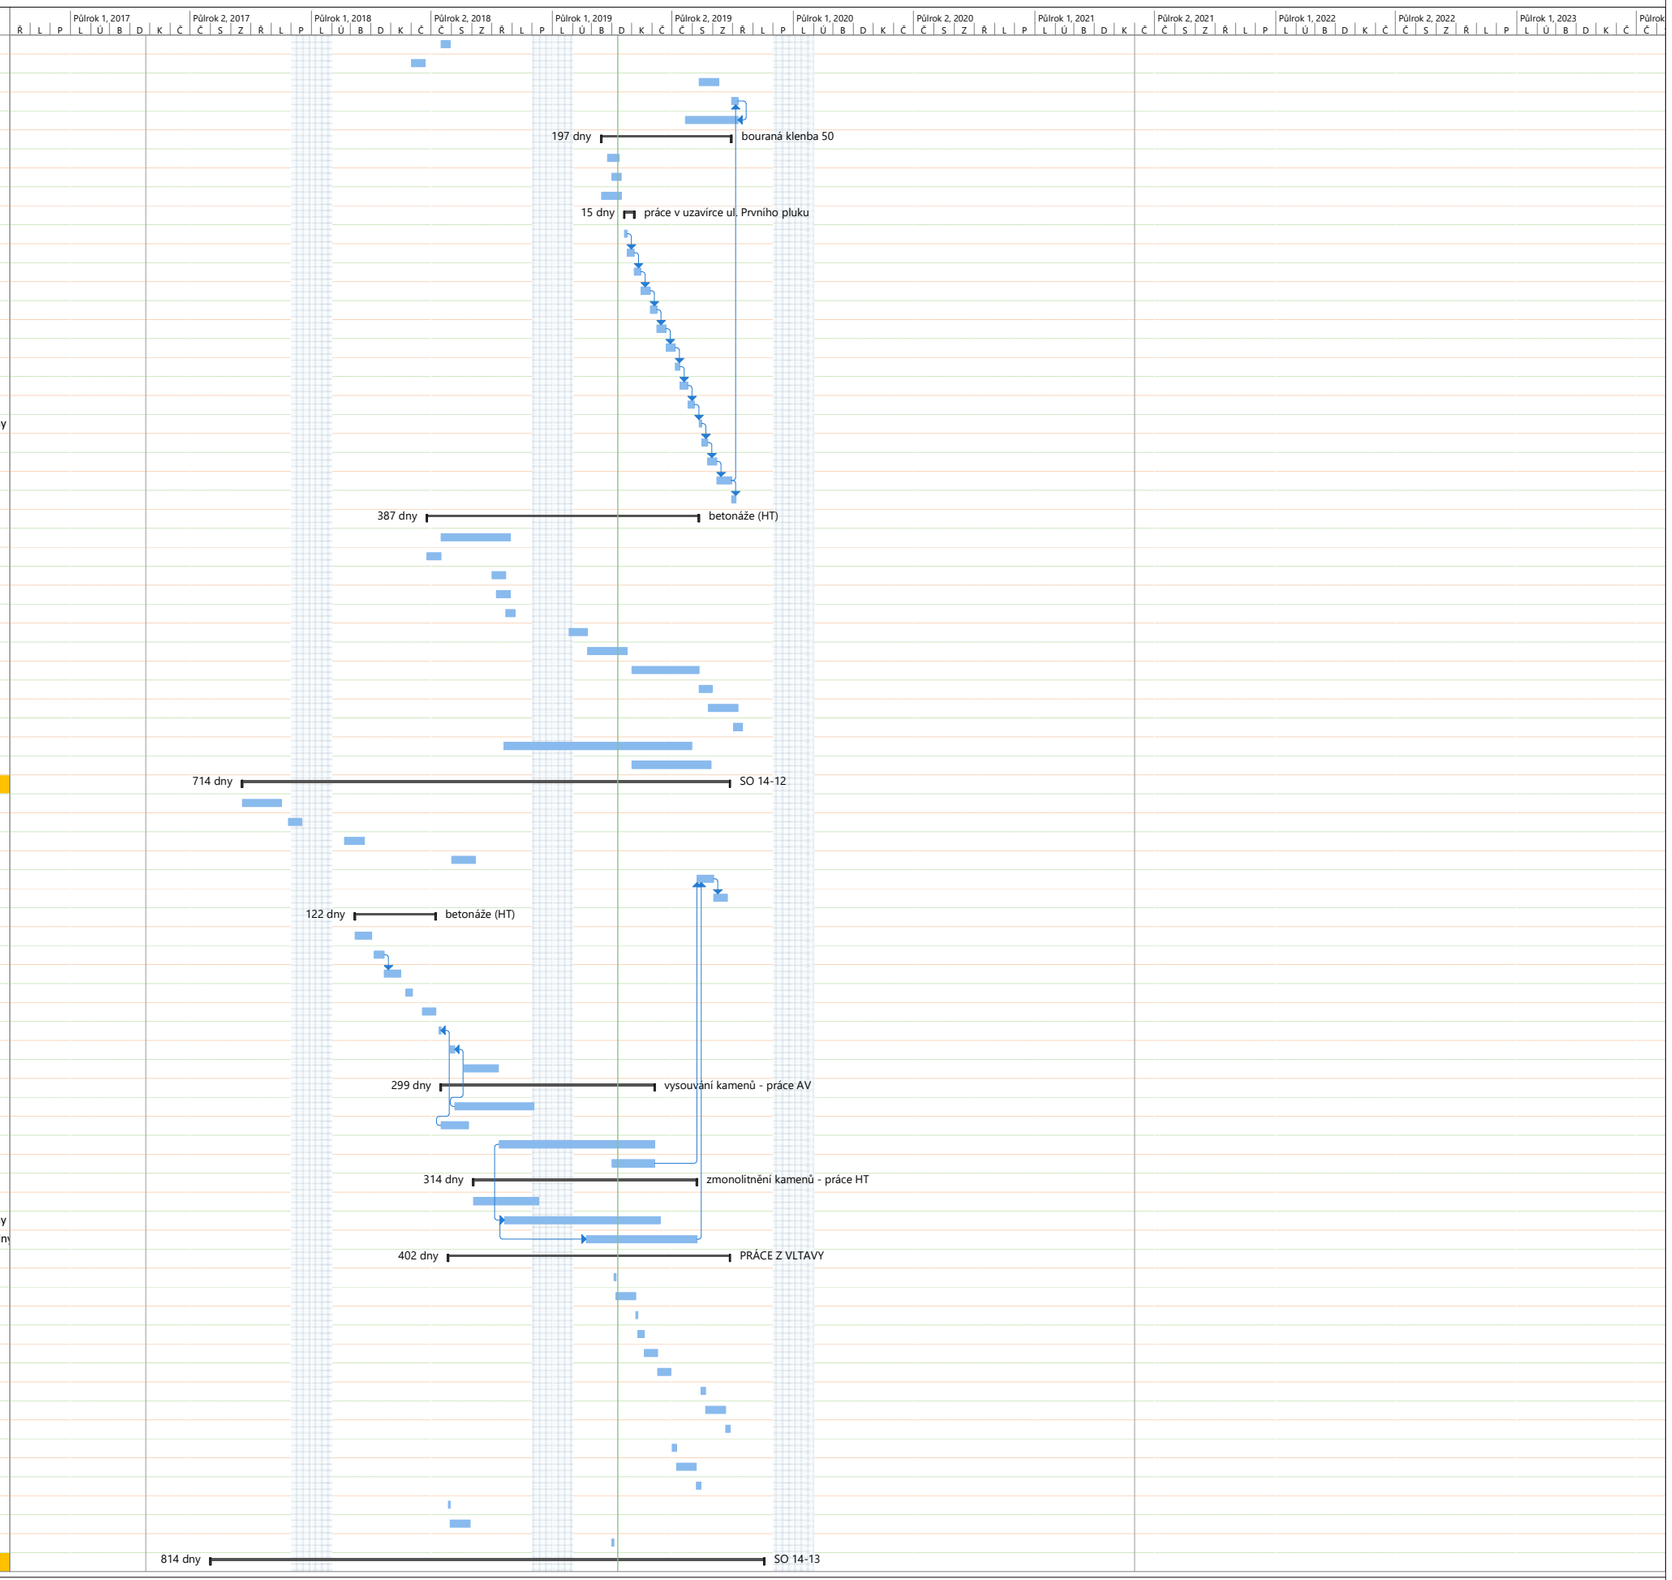

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	Číslo SO/PS	č.klenby	Zhoto	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
712	14-13	65-71,76-77	HT	trysková injektáž podzákladí	41 dny	01.08. 17	10.09. 17	
713	14-13	65-71,76-77	HT	nízkotlaká injektáž pilířů	29 dny	31.08. 17	28.09. 17	
714	14-13	65-77	HT	montáž podskružení	20 dny	31.10. 17	19.11. 17	
715	14-13	65-71,76-77	HT	odhalení rubu (vč. dmtž říms)	33 dny	02.12. 17	03.01. 18	
716	14-13	65-77	HT	izolace vč. ochrany, antivibrační rohože	20 dny	25.08. 19	13.09. 19	751
717	14-13	65-77	HT	zábradlí	17 dny	14.09. 19	30.09. 19	716
718	**14-13**	**65-71,76-77**		**SANOVANÉ KLENBY 65-71,76-77**	**658 dny**	**04.01. 18**	**17.11. 19**	
719	14-13	65-71,76-77	AV	diagnostika vč. vyhodnocení, výměny kamenů v klenbě	150 dny	04.01. 18	02.06. 18	715
720	**14-13**	**65-71,76-77**	**HT**	**betonáže (HT)**	**294 dny**	**24.04. 18**	**08.03. 19**	
721	14-13	65-71,76-77	HT	torkrety	12 dny	24.04. 18	05.05. 18	
722	14-13	65-71,76-77	HT	spádové betony, vrtání pro odvodnění	14 dny	21.05. 18	03.06. 18	
723	14-13	65-71,76-77	HT	stěrka	12 dny	03.06. 18	14.06. 18	719
724	14-13	65-71,76-77	HT	úložné prahy	75 dny	03.06. 18	16.08. 18	723SS
725	14-13	65-71,76-77	HT	pojistná izolace	12 dny	17.08. 18	28.08. 18	724
726	14-13	65-71,76-77	HT	mezerovitý beton	25 dny	29.08. 18	22.09. 18	725
727	14-13	65-71,76-77	HT	roznášecí deska vč. říms	60 dny	18.10. 18	08.03. 19	
728	14-13	65-71,76-77	HT	demontáž podskružení, odkopání pilířů	20 dny	09.03. 19	28.03. 19	727
729	14-13	65-71,76-77	AV	sanace pod terénem	60 dny	16.03. 19	14.05. 19	728SS+7 dny
730	14-13	65-71,76-77	HT	zásyp pilířů	14 dny	08.05. 19	21.05. 19	729FF+7 dny
731	14-13	65-71,76-77	AV	sanace líců	180 dny	22.05. 19	17.11. 19	730
732	**14-13**	**72-75**		**PŘEZDÍVANÉ KLENBY 72-75 (vč. P8, P9, P10)**	**554 dny**	**23.01. 18**	**24.08. 19**	
733	**14-13**	**72-75**	**AV**	**přezdívání (AV)**	**452 dny**	**23.01. 18**	**14.05. 19**	
734	14-13	72-75	AV	demontáž kleneb včetně poprsních zdí	110 dny	23.01. 18	12.05. 18	
735	14-13	72-75	AV	demontáž pilířů P8-P10 (vč. diagnostiky)	30 dny	01.06. 18	30.06. 18	741
736	14-13	72-75	AV	vyzdění pilířů P8-P10	45 dny	23.07. 18	05.09. 18	
737	**14-13**	**72-75**	**AV**	**vyzdění kleneb včetně poprsních zdí**	**155 dny**	**20.09. 18**	**14.05. 19**	
738	14-13	72-75	AV	vyzdění kleneb 73 a 75	60 dny	20.09. 18	18.11. 18	743
739	14-13	72-75	AV	vyzdění kleneb 72 a 74	60 dny	19.11. 18	09.04. 19	738
740	14-13	72-75	AV	vyzdění poprsních zdí	35 dny	10.04. 19	14.05. 19	739
741	14-13	72-75	HT	demontáž podskružení, odkopání pilířů	15 dny	17.05. 18	31.05. 18	
742	14-13	72-75	HT	trysková injektáž pilířů	28 dny	07.07. 18	03.08. 18	735
743	14-13	72-75	HT	zásyp pilířů, montáž podskružení	14 dny	06.09. 18	19.09. 18	736
744	14-13	72-75	HT	demontáž lešení (poprsní zdi)	5 dny	15.05. 19	19.05. 19	740
745	**14-13**	**72-75**	**HT**	**betonáže (HT)**	**102 dny**	**15.05. 19**	**24.08. 19**	
746	14-13	71-76	HT	spádové betony, vrtání pro odvodnění	15 dny	15.05. 19	29.05. 19	740
747	14-13	71-76	HT	úložné prahy	25 dny	30.05. 19	23.06. 19	746
748	14-13	71-76	HT	torkrety, průchody odvodnění, stěrka	10 dny	24.06. 19	03.07. 19	747
749	14-13	71-76	HT	pojistná izolace	6 dny	06.07. 19	11.07. 19	748FS+2 dny
750	14-13	71-76	HT	mezerovitý beton	12 dny	12.07. 19	23.07. 19	749
751	14-13	71-76	HT	roznášecí deska, vč. říms	32 dny	24.07. 19	24.08. 19	750
752	16-01.1		STR	kanalizace	20 dny	15.05. 19	03.06. 19	740
753	**14-14**	**78-82**		**SO 14-14**	**705 dny**	**01.10. 17**	**30.09. 19**	
754	**14-14**	**78-82**		**PRÁCE Z MOSTOVKY (CELÝ MOST)**	**705 dny**	**01.10. 17**	**30.09. 19**	
755	14-14	78-82	HT	zemnící MP	7 dny	01.10. 17	07.10. 17	
756	14-14	78-82	HT	odtěžení zásypů	16 dny	22.01. 18	06.02. 18	
757	14-14	78-82	AV	demontáž říms	45 dny	26.01. 18	11.03. 18	756SS+4 dny
758	14-14	78-82	AV	diagnostika z rubu vč. vyhodnocení	28 dny	14.03. 18	10.04. 18	
759	14-14	78-82	HT	izolace vč. ochrany, antivibrační rohože	25 dny	22.08. 19	15.09. 19	773;777
760	14-14	78-82	HT	zábradlí	25 dny	06.09. 19	30.09. 19	759FS-10 dny
761	**14-14**	**78-82**	**HT**	**betonáže (HT)**	**97 dny**	**17.04. 18**	**22.07. 18**	
762	14-14	78-82	HT	přibetonávka poprsních zdí, vrtání pro odvodnění	17 dny	17.04. 18	03.05. 18	
763	14-14	78-82	HT	spádový beton, osazení odvodňovačů	39 dny	26.04. 18	03.06. 18	
764	14-14	78-82	HT	pojistná hydroizolace	7 dny	04.06. 18	10.06. 18	763
765	14-14	78-82	HT	mezerovitý beton, vč. podkladního betonu	42 dny	11.06. 18	22.07. 18	764
766	14-14	78	HT	montáž fasádní lávky pro 1. kámen	3 dny	20.07. 18	23.07. 18	771SF
767	14-14	78	HT	montáž závěsné lávky pro čištění a spárování líců	7 dny	06.08. 18	13.08. 18	770SF
768	14-14	78	HT	montáž podpěrné lávky pro 2. a 3. kámen	14 dny	03.09. 18	16.09. 18	
769	**14-14**	**78-82**	**AV**	**vysouvání kamenů - práce AV**	**318 dny**	**23.07. 18**	**30.06. 19**	
770	14-14	78-82	AV	čištění líců, spárování	105 dny	13.08. 18	25.11. 18	
771	14-14	78-82	AV	montáž 1. římsového kamene	77 dny	23.07. 18	07.10. 18	765
772	14-14	78-82	AV	montáž římsových kamenů č.2 a č.3	24 týdny	10.10. 18	16.06. 19	
773	14-14	78-82	AV	montáž římsového kamene č. 4	61 dny	01.05. 19	30.06. 19	
774	**14-14**	**78-82**	**HT**	**zmonolitnění kamenů - práce HT**	**314 dny**	**17.09. 18**	**21.08. 19**	
775	14-14	78-82	HT	napojení izolace na římsový kámen, dosypání MCB	77 dny	17.09. 18	22.02. 19	
776	14-14	78-82	HT	zmonolitnění římsových kamenů č.2 a č.3	24 týdny	18.10. 18	24.06. 19	772SS+8 dny
777	14-14	78-82	HT	dobetonování roznášecí desky	26 týdny	21.02. 19	21.08. 19	
778	**14-14**	**O1**		**OPĚRA 1**	**593 dny**	**13.10. 17**	**22.06. 19**	
779	14-14	O1	HT	montáž hráze	14 dny	06.12. 18	07.01. 19	
780	14-14	O1	HT	injektáž opěry O1	21 dny	14.01. 19	03.02. 19	
781	14-14	O1	HT	montáž lešení	7 dny	18.03. 19	24.03. 19	
782	**14-14**	**O1**	**AV**	**sanace líce (AV)**	**35 dny**	**25.03. 19**	**28.04. 19**	
783	14-14	O1	AV	čištění a diagnostika líce	5 dny	25.03. 19	29.03. 19	
784	14-14	O1	AV	spárování, konsolidace	30 dny	30.03. 19	28.04. 19	
785	14-14	O1	HT	demontáž hráze, vč. lešení	14 dny	29.04. 19	12.05. 19	
786	**14-14**	**P1**		**PILÍŘ 1**	**273 dny**	**29.08. 18**	**22.06. 19**	
787	14-14	P1	HT	montáž jímky	70 dny	29.08. 18	06.11. 18	
788	**14-14**	**P1**	**AV**	**sanace pod hladinou (AV)**	**72 dny**	**19.11. 18**	**23.02. 19**	
789	14-14	P1	AV	čištění a diagnostika líce	5 dny	19.11. 18	23.11. 18	
790	14-14	P1	AV	spárování, konsolidace	10 dny	14.02. 19	23.02. 19	
791	14-14	P1	HT	injektáž pilíře P2	21 dny	24.02. 19	16.03. 19	
792	14-14	P1	HT	bet. prstenec v jímce	10 dny	17.03. 19	26.03. 19	

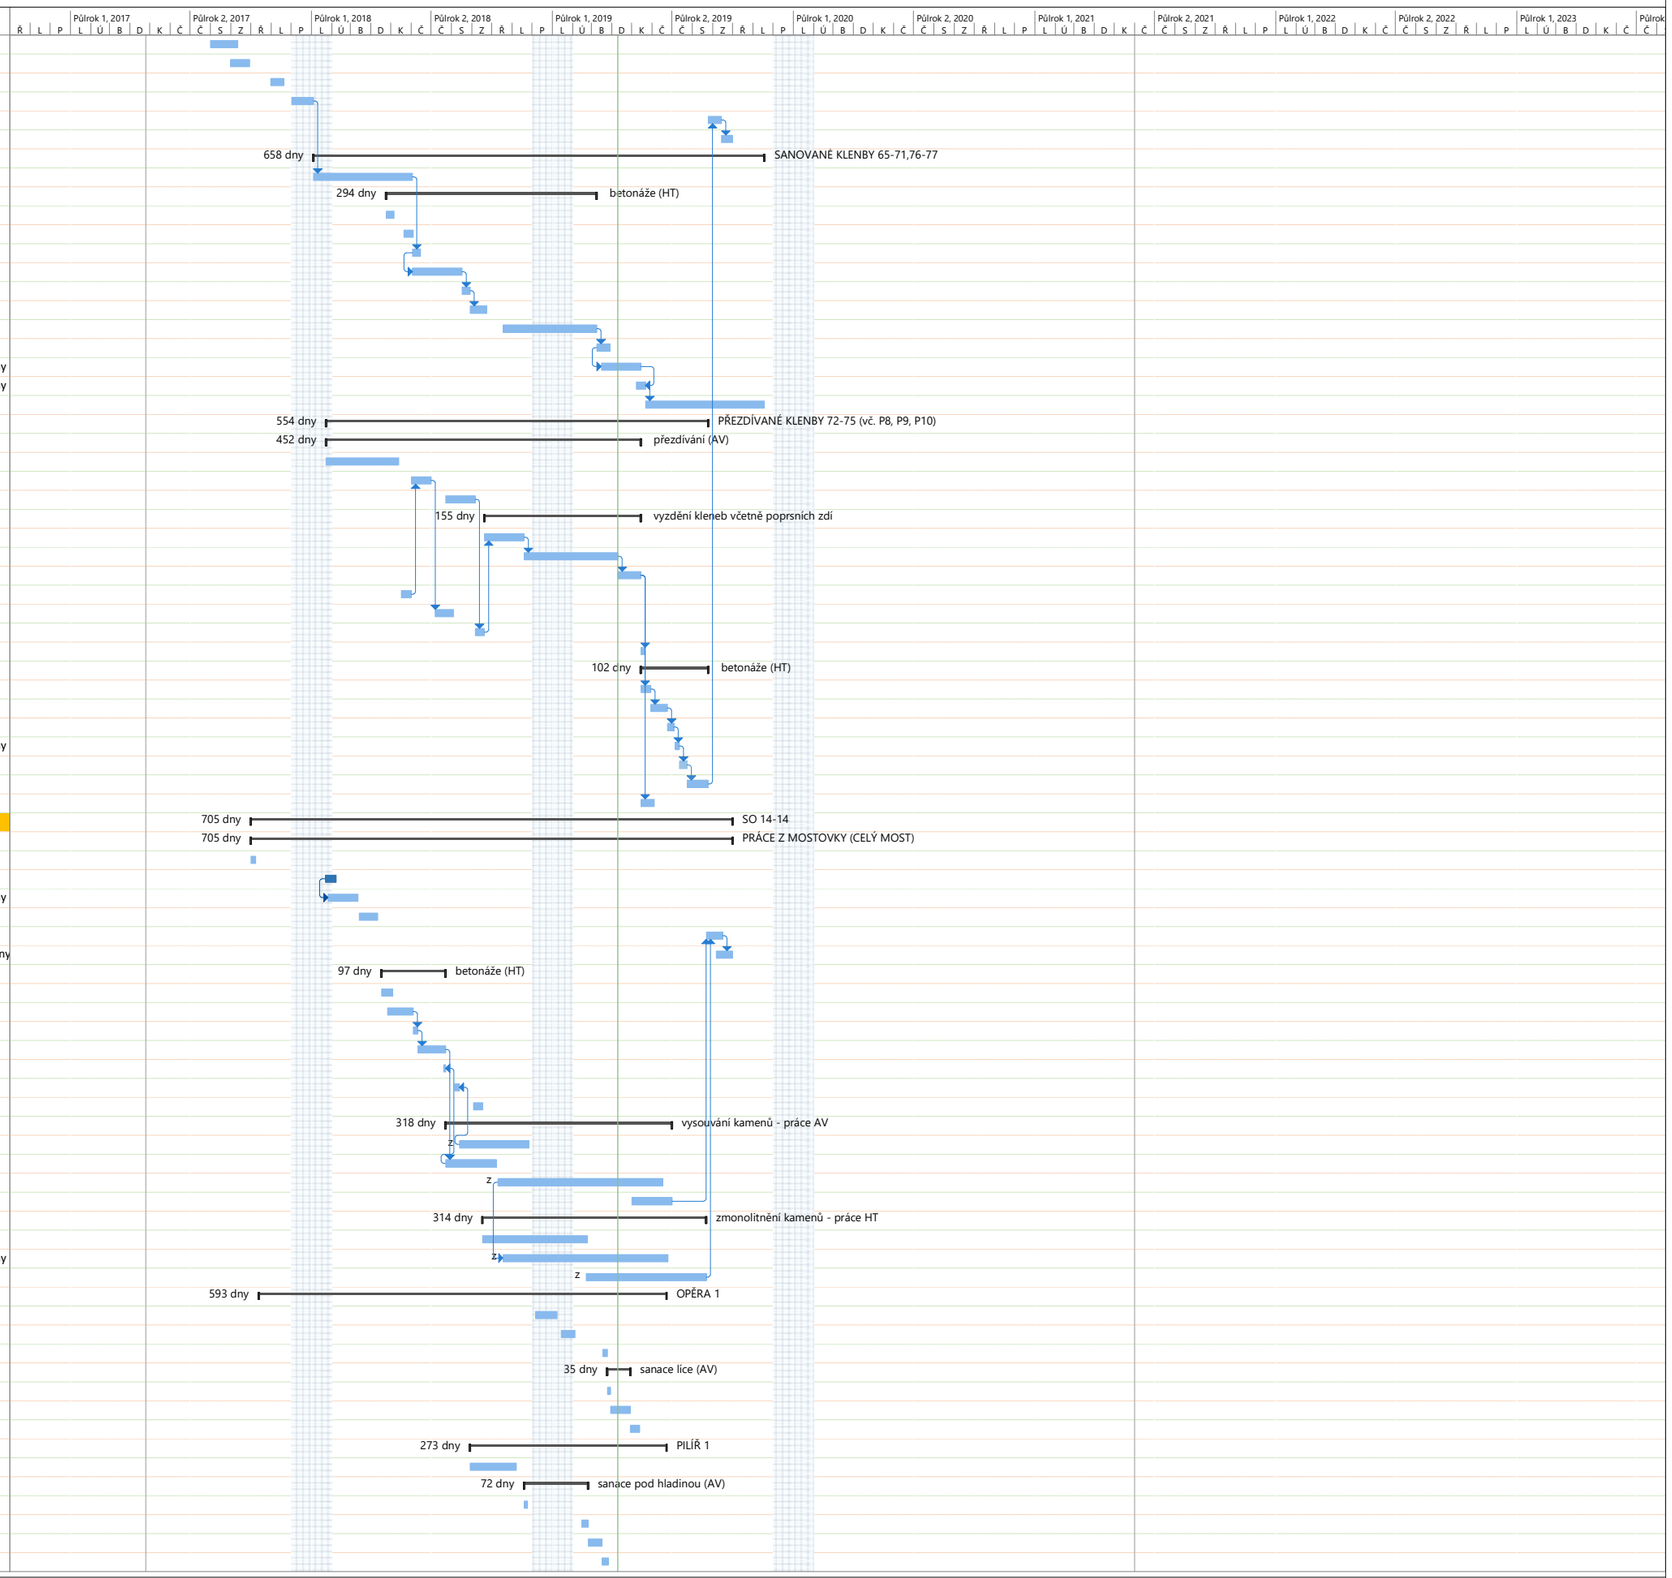

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	Číslo SO/PS	č.klenby	Zhotov	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
793	14-14	P1	HT	montáž lešení	7 dny	10.04. 19	16.04. 19	
794	**14-14**	**P1**	**AV**	**sanace nad hladinou (AV)**	**30 dny**	**17.04. 19**	**16.05. 19**	
795	14-14	P1	AV	čištění a diagnostika líce	5 dny	17.04. 19	21.04. 19	
796	14-14	P1	AV	spárování, konsolidace	25 dny	22.04. 19	16.05. 19	
797	14-14	P1	HT	demontáž lešení	7 dny	17.05. 19	23.05. 19	
798	14-14	P1	HT	demontáž jímek	30 dny	24.05. 19	22.06. 19	
799	**14-14**	**P2**		**PILÍŘ 2**	**280 dny**	**22.12. 17**	**27.09. 18**	
800	14-14	P2	HT	montáž jímky	50 dny	22.12. 17	09.02. 18	
801	14-14	P2	AV	sanace pod hladinou	100 dny	09.02. 18	19.05. 18	
802	14-14	P2	HT	injektáž pilíře P2	21 dny	28.05. 18	17.06. 18	
803	14-14	P2	HT	bet. prstenec v jímce	10 dny	18.06. 18	27.06. 18	
804	14-14	P2	HT	montáž lešení	7 dny	16.07. 18	22.07. 18	
805	14-14	P2	AV	sanace nad hladinou	30 dny	23.07. 18	21.08. 18	
806	14-14	P2	HT	demontáž lešení	7 dny	22.08. 18	28.08. 18	
807	14-14	P2	HT	demontáž jímky	30 dny	29.08. 18	27.09. 18	
808	**14-14**	**P3**		**PILÍŘ 3**	**273 dny**	**16.07. 18**	**09.05. 19**	
809	14-14	P3	HT	montáž jímky	70 dny	16.07. 18	23.09. 18	
810	**14-14**	**P3**	**AV**	**sanace pod hladinou (AV)**	**15 dny**	**24.09. 18**	**08.10. 18**	
811	14-14	P3	AV	čištění a diagnostika líce	5 dny	24.09. 18	28.09. 18	
812	14-14	P3	AV	spárování	10 dny	29.09. 18	08.10. 18	
813	14-14	P3	HT	injektáž pilíře P3	21 dny	09.10. 18	29.10. 18	
814	14-14	P3	HT	bet. prstenec v jímce	10 dny	30.10. 18	08.11. 18	
815	14-14	P3	HT	montáž lešení	7 dny	26.02. 19	04.03. 19	
816	**14-14**	**P3**	**AV**	**sanace nad hladinou (AV)**	**30 dny**	**04.03. 19**	**02.04. 19**	
817	14-14	P3	AV	čištění a diagnostika líce	5 dny	04.03. 19	08.03. 19	
818	14-14	P3	AV	spárování, konsolidace	25 dny	09.03. 19	02.04. 19	
819	14-14	P3	HT	demontáž lešení	7 dny	03.04. 19	09.04. 19	
820	14-14	P3	HT	demontáž jímky	30 dny	10.04. 19	09.05. 19	
821	**14-14**	**P4**		**PILÍŘ 4**	**306 dny**	**13.10. 17**	**14.08. 18**	
822	14-14	P4	HT	montáž jímky	90 dny	13.10. 17	10.01. 18	
823	14-14	P4	AV	sanace pod hladinou	100 dny	11.01. 18	20.04. 18	
824	14-14	P4	HT	injektáž pilíře P2	21 dny	21.04. 18	11.05. 18	
825	14-14	P4	HT	montáž lešení	7 dny	02.06. 18	08.06. 18	
826	**14-14**	**P4**	**AV**	**sanace nad hladinou (AV)**	**30 dny**	**09.06. 18**	**08.07. 18**	
827	14-14	P4	AV	čištění a diagnostika líce	5 dny	09.06. 18	13.06. 18	
828	14-14	P4	AV	spárování, konsolidace	25 dny	14.06. 18	08.07. 18	
829	14-14	P4	HT	demontáž lešení	7 dny	09.07. 18	15.07. 18	
830	14-14	P4	HT	demontáž jímek	30 dny	16.07. 18	14.08. 18	
831	**14-14**	**O2**	**AV**	**OPĚRA 2 (AV)**	**185 dny**	**20.08. 18**	**17.03. 19**	
832	14-14	O2	HT	montáž lešení	3 dny	20.08. 18	22.08. 18	
833	14-14	O2	AV	sanace líce	60 dny	22.08. 18	20.10. 18	
834	14-14	O2	HT	demontáž lešení	7 dny	11.03. 19	17.03. 19	
835	**14-15**			**SO 14-15**	**288 dny**	**01.02. 19**	**15.11. 19**	
836	**14-15**			**Práce bez uzavírky**	**288 dny**	**01.02. 19**	**15.11. 19**	
837	14-15	NK	HT	odstranění ochrany izolace	30 dny	01.02. 19	02.03. 19	
838	14-15	NK	HT	krycí desky, izolace vč. Ochrany	21 dny	16.06. 19	06.07. 19	875
839	14-15	O1, O2	HT	práce v přechodových oblastech (vč. Zásypů)	6 týdny	07.07. 19	17.08. 19	838
840	14-15			dokončovací práce	90 dny	18.08. 19	15.11. 19	839
841	**18-02.15**	**O1,NK**	**HT**	**DIO et.1 - provoz 2+2**	**16 dny**	**01.05. 19**	**16.05. 19**	
842	18-02.15		HT	zahájení DIO	0 dny	01.05. 19	01.05. 19	
843	14-15	O1,NK	HT	nadbetonování říms	2 dny	02.05. 19	03.05. 19	842SS
844	14-15	O1,NK	HT	odstrojení příslušenství	1 den	01.05. 19	01.05. 19	
845	14-15	O1,NK	HT	sanace betonových ploch	14 dny	02.05. 19	15.05. 19	844
846	14-15	O1,NK	HT	montáž příslušenství	1 den	16.05. 19	16.05. 19	854FF
847	**14-15**		**HT**	**DIO et.1a - provoz 1+2**	**8 dny**	**05.05. 19**	**12.05. 19**	
854	18-02.15		HT	konec DIO	0 dny	16.05. 19	16.05. 19	
855	**14-15**		**HT**	**DIO et.2 - provoz 2+2**	**15 dny**	**17.05. 19**	**31.05. 19**	
856	18-02.15		HT	zahájení DIO	0 dny	17.05. 19	17.05. 19	
857	14-15	P1, NK	HT	nadbetonování říms	2 dny	18.05. 19	19.05. 19	856SS
858	14-15	P1, NK	HT	odstrojení příslušenství	1 den	18.05. 19	18.05. 19	856SS
859	14-15	P1, NK	HT	sanace betonových ploch	12 dny	19.05. 19	30.05. 19	858
860	14-15	P1, NK	HT	montáž příslušenství	1 den	31.05. 19	31.05. 19	859
861	**18-02.15**		**HT**	**DIO et.2b - provoz 2+1**	**4 dny**	**17.05. 19**	**21.05. 19**	
864	**18-02.15**		**HT**	**DIO - výluka tram**	**7 dny**	**17.05. 19**	**23.05. 19**	
865	18-02.15		HT	ukončení DIO	0 dny	31.05. 19	31.05. 19	
866	**18-02.15**		**HT**	**DIO et.3 - provoz 2+2**	**16 dny**	**01.06. 19**	**17.06. 19**	
867	18-02.15		HT	zahájení DIO	0 dny	01.06. 19	01.06. 19	
868	14-15	O2, NK	HT	nadbetonování říms	2 dny	02.06. 19	03.06. 19	867SS
869	14-15	O2, NK	HT	odstrojení příslušenství	1 den	02.06. 19	02.06. 19	867SS
870	14-15	O2, NK	HT	sanace betonových ploch	14 dny	03.06. 19	16.06. 19	869
871	14-15	O2, NK	HT	montáž příslušenství	1 den	17.06. 19	17.06. 19	870
872	**18-02.15**	**O2,NK**	**HT**	**DIO et.3a - provoz 2+1**	**1 den**	**15.06. 19**	**16.06. 19**	
875	18-02.15		HT	ukončení DIO	0 dny	16.06. 19	16.06. 19	

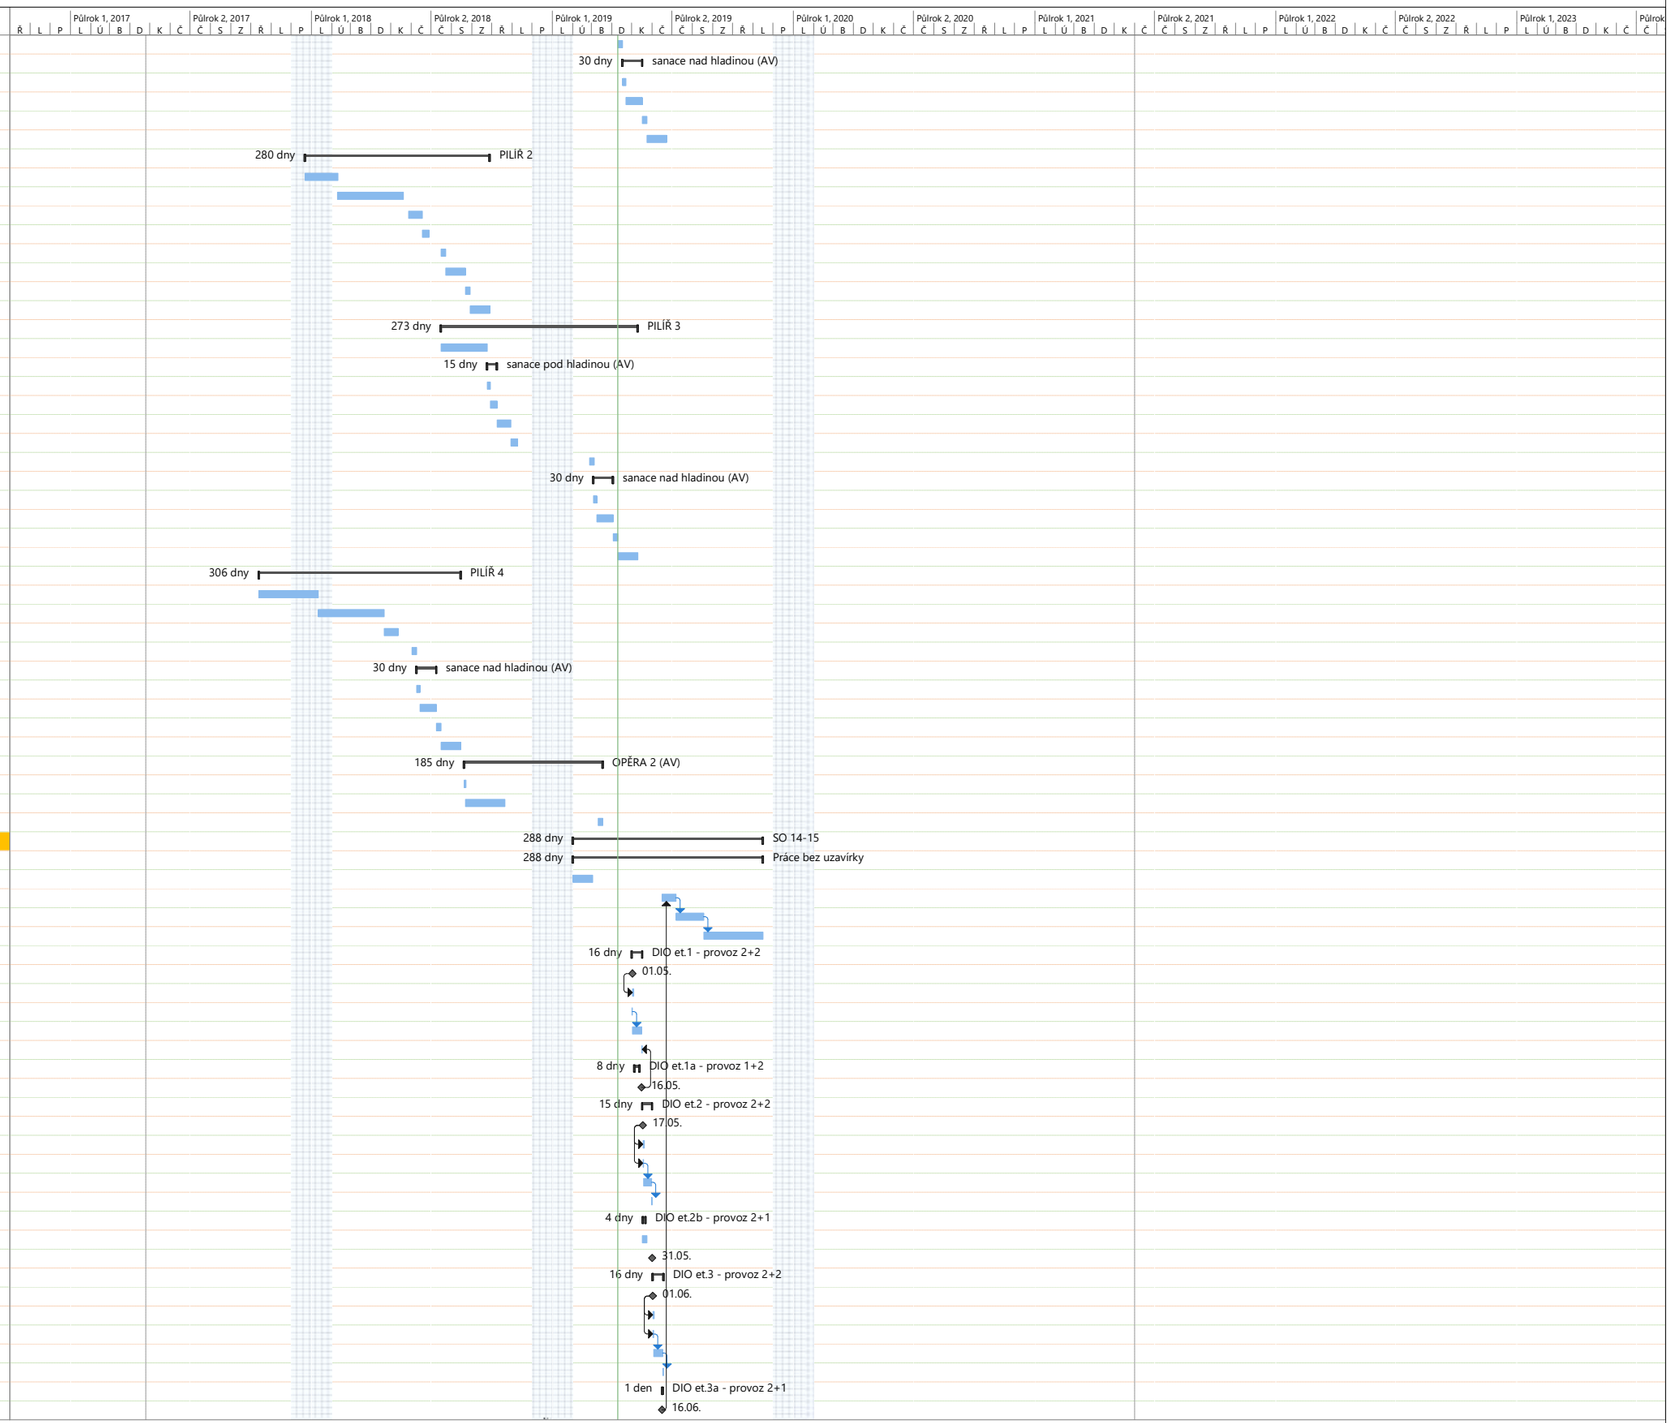

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 293777

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cf3540f3-fabb-413c-9891-6965e2956697

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.05.2019 15:17:01

feeed63e-1c0e-46be-a709-13805f314189
