ID	Režim úkolu	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1			**Metro D - geologický průzkum - PAD 1b**	**390 dny**	**01.04. 19**	**04.05. 20**
2			Zařízení staveniště, příprava území	31 dny	01.04. 19	02.05. 19
3			**Související stavební objekty**	**360 dny**	**01.04. 19**	**04.04. 20**
4		SO 11-01	Příprava území	10 dny	01.04. 19	11.04. 19
5		SO 11-02	Vjezdy a výjezdy na staveniště	10 dny	06.04. 19	16.04. 19
6		SO 11-03/10	Vodovodní přípojka staveniště PAD1b	30 dny	11.04. 19	11.05. 19
7		SO 11-04/10	Kanalizační přípojka staveniště PAD1b	30 dny	11.04. 19	11.05. 19
8		SO 11-06/10	El. přípojka|VN staveniště PAD1b	80 dny	11.04. 19	30.06. 19
9		SO 11-09	Ochrana inženýrských sítí - není předmětem dodávky stavby	350 dny	11.04. 19	04.04. 20
10		SO 11-10	Demolice - není předmětem dodávky stavby	10 dny	11.04. 19	21.04. 19
11		SO 11-40	Provizorní dopravní značení	350 dny	11.04. 19	04.04. 20
12			**C. Stavební část**	**327 dny**	**02.05. 19**	**02.04. 20**
13			Výstavba stavební jámy - pilotová část	60 dny	02.05. 19	01.07. 19
14			Výstavba stavební jámy - ražená část	188 dny	01.07. 19	14.01. 20
15			Betonové dno	28 dny	05.03. 20	02.04. 20
16			Zařízení staveniště - likvidace	30 dny	04.04. 20	04.05. 20
17			**E. Geologický průzkum**	**92 dny**	**14.01. 20**	**15.04. 20**
18			Presiometrický vějíř	6 dny	14.01. 20	20.01. 20
19			Jádrový vrt ŠJ 1006	45 dny	20.01. 20	05.03. 20
20			Zkoušky, měření ve vrtech, laborka	30 dny	05.03. 20	04.04. 20
21			Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	15.04. 20	15.04. 20

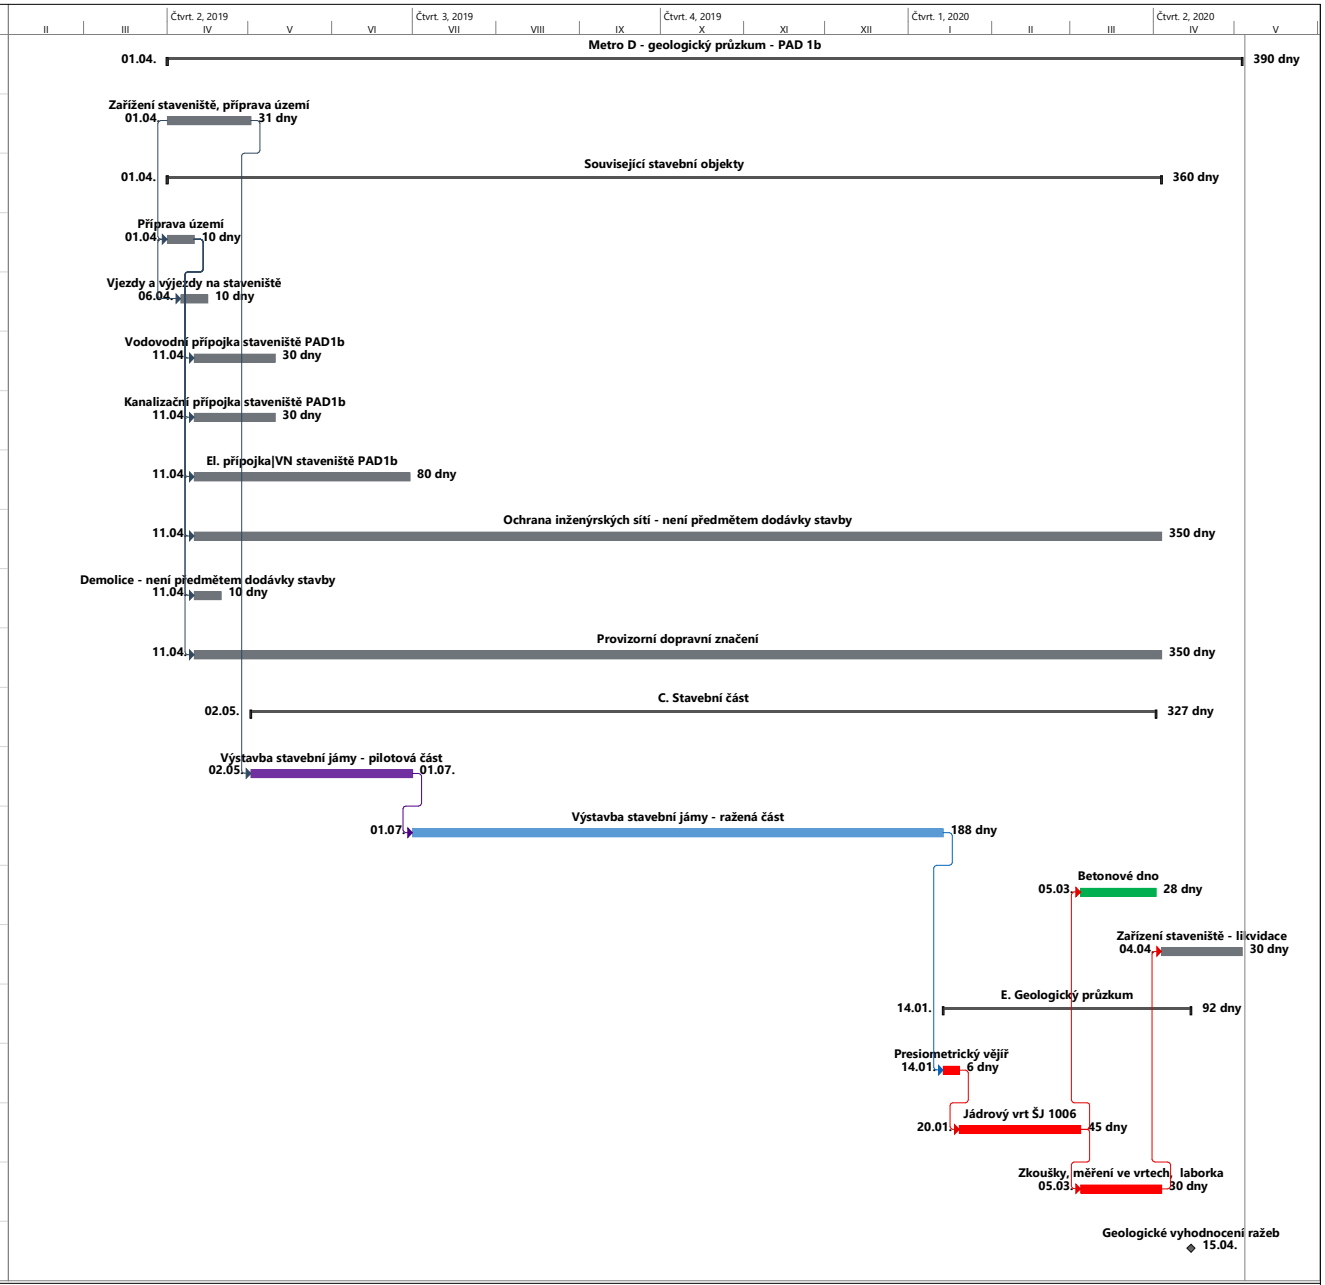

Projekt: Metro D - IGP Pad1b
Datum: 30.11.2018

Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník			
