STRABAG a.s.
Pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice
direkce TR, oblast PA (Čechy Jih)
Vrbenská 1821/31, CZ - 370 06 České Budějovice
www.strabag.com

Harmonogram výstavby :
Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice
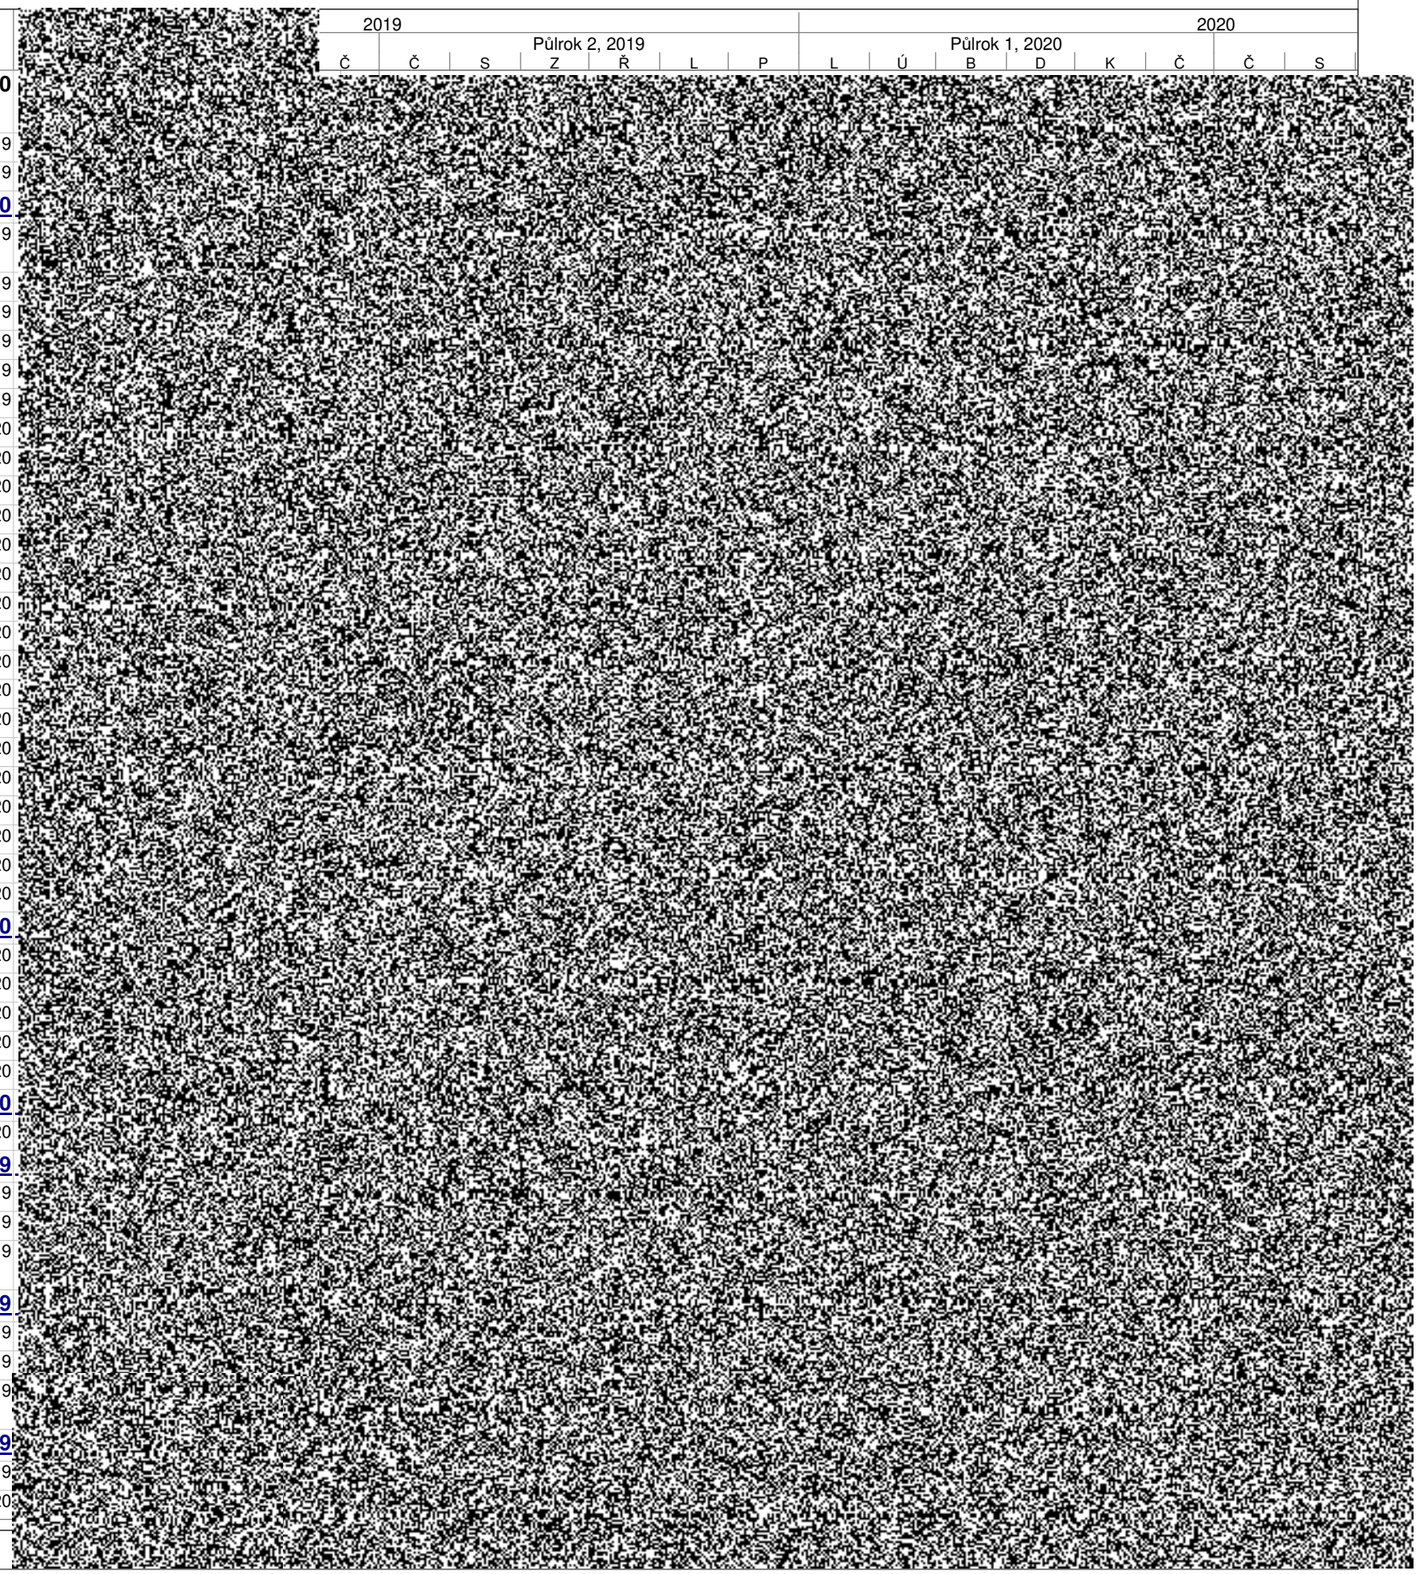
ID	Číslo osnovy	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
0	0	**Výstavba garáží pro speciální technicku HZS Jihočeského kraje České Budějovice**	**397 dny**	**20.06. 19**	**20.07. 20**
1	1	**PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ-včetně stav.povolení**	0 dny	20.06. 19	20.06. 19
2	2	Přípravné práce	10 dny	20.06. 19	29.06. 19
3	3	**SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku**	**334 dny**	**30.06. 19**	**28.05. 20**
4	3.1	Zemní práce, odstranění stávajících zpevněných ploch	30 dny	30.06. 19	29.07. 19
5	3.2	Základové konstrukce	30 dny	30.07. 19	28.08. 19
6	3.3	Prefabrikované konstrukce	60 dny	29.08. 19	27.10. 19
7	3.4	Hydroizolační souvrství vč. teplené izolace	14 dny	23.10. 19	05.11. 19
8	3.5	Zdivo	30 dny	06.11. 19	05.12. 19
9	3.6	**DOKONČENÍ HRUBÉ STAVBY**	0 dny	05.12. 19	05.12. 19
10	3.7	Střešní plášť	50 dny	26.11. 19	14.01. 20
11	3.8	Úpravy povrchů vnitřních	30 dny	11.12. 19	09.01. 20
12	3.9	Podlahové konstrukce	45 dny	10.01. 20	23.02. 20
13	3.10	Lehké příčky, podhledy, obkladové materiály	21 dny	24.02. 20	15.03. 20
14	3.11	Fasády	40 dny	15.01. 20	23.02. 20
15	3.12	Vnější výplně otvorů	30 dny	11.12. 19	09.01. 20
16	3.13	**HRUBÉ UZAVŘENÍ OBJEKTU PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM**	0 dny	09.01. 20	09.01. 20
17	3.14	Obklady a dlažby	14 dny	09.02. 20	22.02. 20
18	3.15	Malby a nátěry	10 dny	23.02. 20	03.03. 20
19	3.16	Nášlapné vrstvy PVC, koberce, podlahy ze syntetických hmot	15 dny	24.02. 20	09.03. 20
20	3.17	Zámečnické a ocelové konstrukce	30 dny	15.01. 20	13.02. 20
21	3.18	Vnitřní dveře	10 dny	10.03. 20	19.03. 20
22	3.19	ZTI	100 dny	06.12. 19	14.03. 20
23	3.20	UT	100 dny	06.12. 19	14.03. 20
24	3.21	VZT	100 dny	15.01. 20	23.04. 20
25	3.22	Elektroinstalace	217 dny	30.07. 19	02.03. 20
26	3.23	Drobné konstrukce, dokončovací práce, úklid	80 dny	10.03. 20	28.05. 20
27	4	**SO-02 Zpevněné plochy**	**188 dny**	**15.01. 20**	**20.07. 20**
28	4.1	Zemní práce	30 dny	15.01. 20	13.02. 20
29	4.2	Podkladní vrstvy	45 dny	14.02. 20	29.03. 20
30	4.3	Asfaltový kryt	45 dny	06.06. 20	20.07. 20
31	4.4	Zámková dlažba	2 dny	06.06. 20	07.06. 20
32	4.5	Okapový chodník	2 dny	24.02. 20	25.02. 20
33	5	**SO-03 Sadové a parkové úpravy**	**30 dny**	**16.06. 20**	**15.07. 20**
34	5.1	Sadové úpravy	30 dny	16.06. 20	15.07. 20
35	6	**SO-04 Venkovní splašková a dešťová kanalizace**	**89 dny**	**30.06. 19**	**26.09. 19**
36	6.1	Zemní práce vč. odstranění stávajících zpevněných ploch	30 dny	30.06. 19	29.07. 19
37	6.2	Doplňkové konstrukce, vsakovací bloky	14 dny	30.07. 19	12.08. 19
38	6.3	Trubní vedení vč. obsypů, zásypů a zapravení ploch	45 dny	13.08. 19	26.09. 19
39	7	**SO-05 Venkovní NTL plynovod**	**63 dny**	**30.06. 19**	**31.08. 19**
40	7.1	Zemní práce vč. odstranění stávajících zpevněných ploch	21 dny	30.06. 19	20.07. 19
41	7.2	Doplňkové konstrukce	21 dny	21.07. 19	10.08. 19
42	7.3	Trubní vedení vč. obsypů, zásypů a zapravení ploch	21 dny	11.08. 19	31.08. 19
43	8	**Demolice objektu zděné garáže**	**30 dny**	**30.06. 19**	**29.07. 19**
44	8.1	Kompletní demolice garáže	30 dny	30.06. 19	29.07. 19
45	9	**DOKONČENÍ DÍLA (PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA)**	0 dny	20.07. 20	20.07. 20
