HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n.
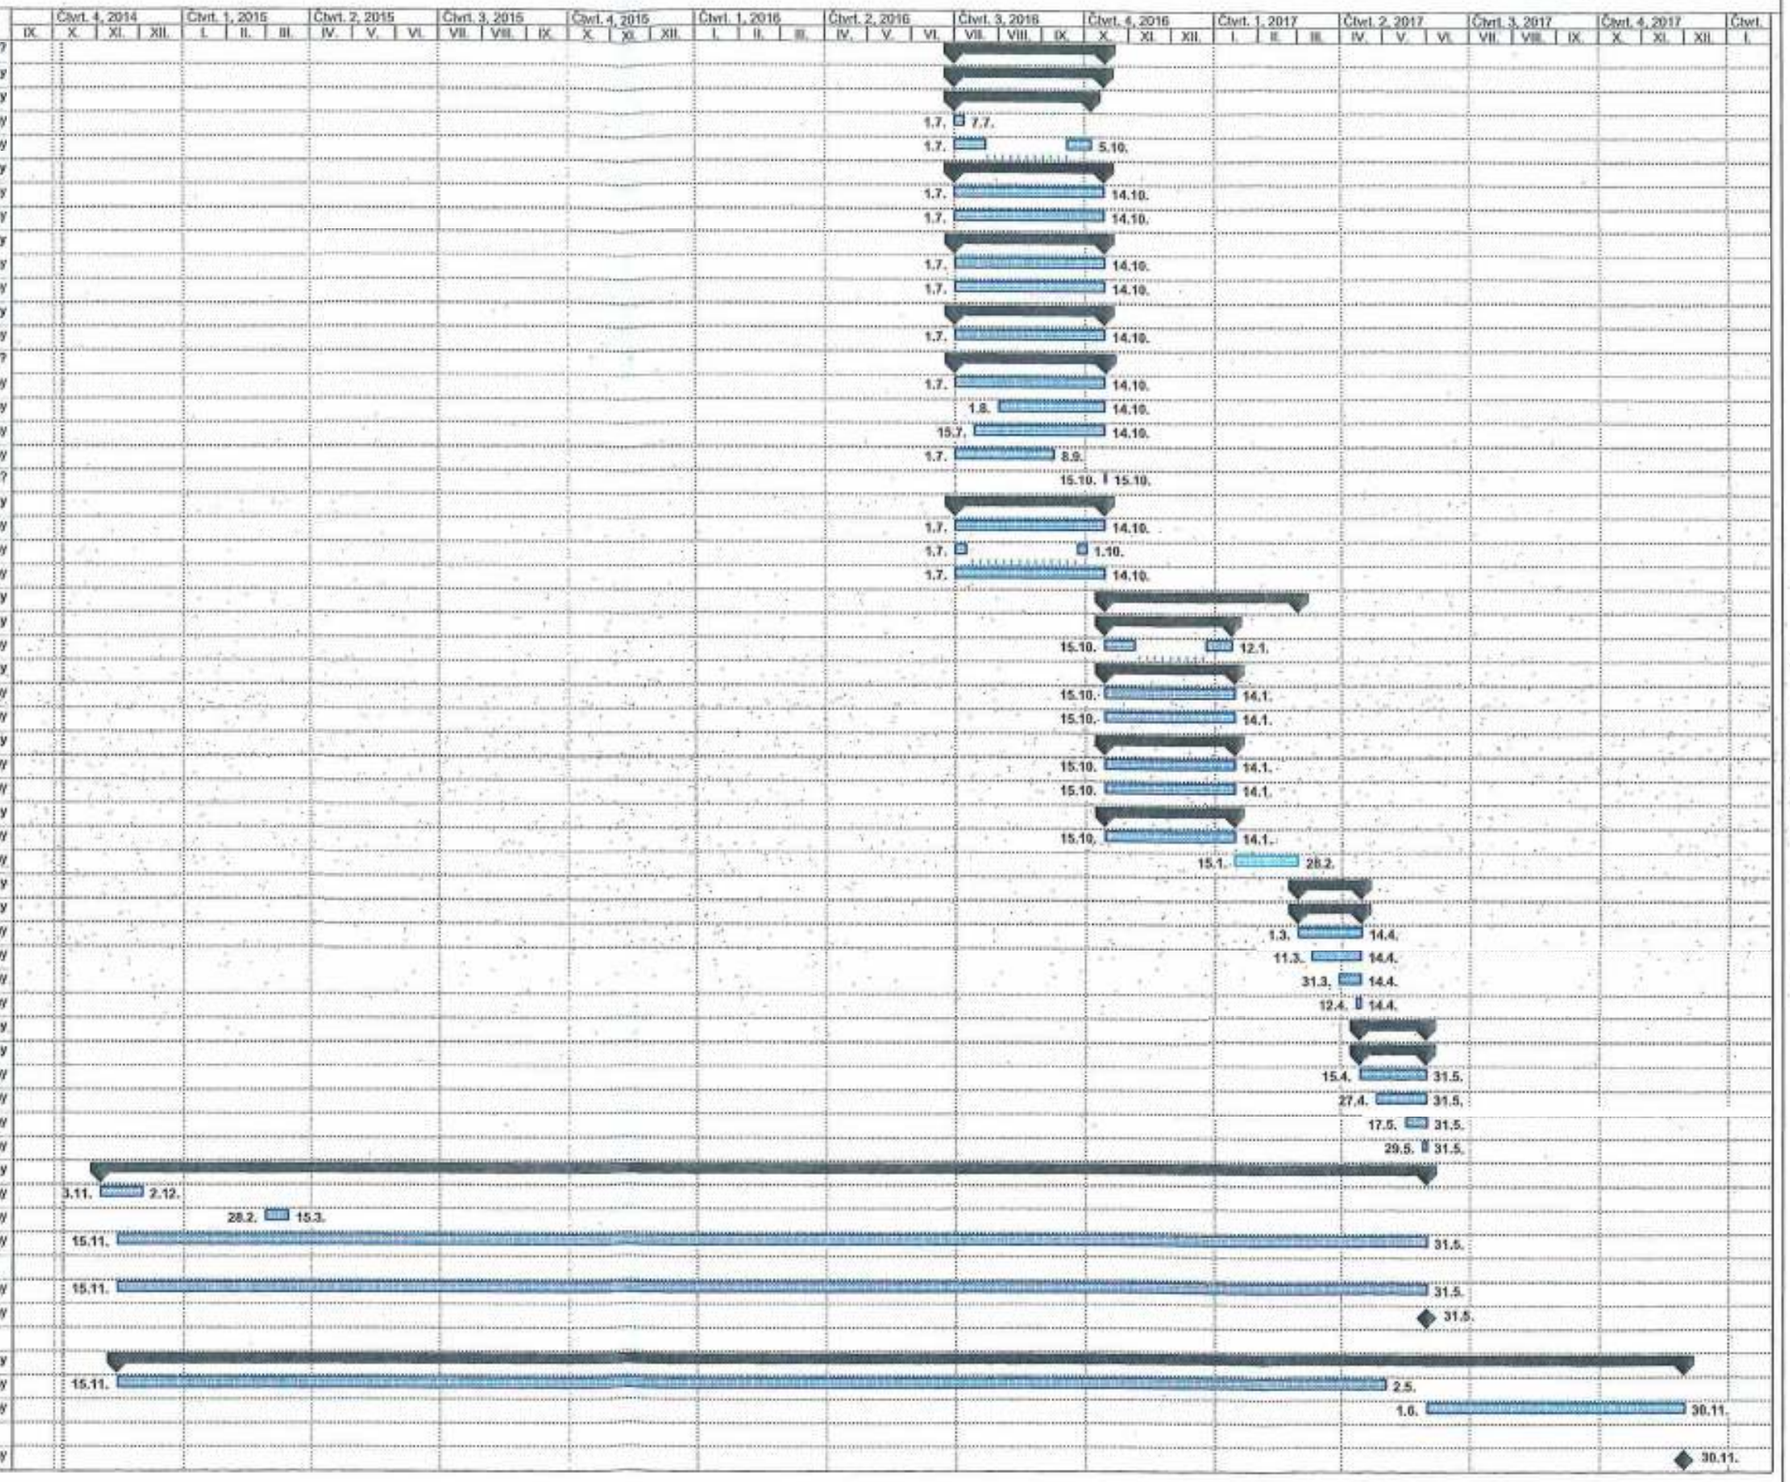
ID	Název úkolu	Doba trvání
60	**9. etapa - oblouk západní části haly 1, 1. nást., záp**	**107 dny?**
61	**oblouk západní části haly 1**	**106 dny**
62	**Přípravné práce**	**97 dny**
63	Odstranění stávajících lávek	7 dny
64	Kanalizační svody	39 dny
65	**Světlíky**	**106 dny**
66	zasklívání + nátěry	106 dny
67	klempíř - světlíky - Pz + nátěr	106 dny
68	**střecha s plechovou krytinou**	**106 dny**
69	Konstrukce klempířské	106 dny
70	Konstrukce zámečnické	106 dny
71	**Ocelové konstrukce**	**106 dny**
72	Oprava, výměna, PKO	106 dny
73	**1. nástupiště**	**107 dny?**
74	Zastřešení 1. nástupiště - dl 233,2-2*2,9 = 2	106 dny
75	Klempířské prvky - světlíky - TiZn	75 dny
76	Zastřešení 1. nástupiště - krytina	92 dny
77	Ocelová konstrukce zastřešení 1. nástupiště	70 dny
78	Ostatní konstrukce a práce na 1. nástupišti	1 den?
79	**Boční prosklené plochy - západní**	**106 dny**
80	Západní - dl. (233,2-2*2,90); v. 4,94 m	106 dny
81	Přístupové žebříky ze střechy 1. nástupiště	14 dny
82	Konstrukce zámečnické	106 dny
83	**10. etapa - oblouk východní části haly 1**	**137 dny**
84	**Přípravné práce**	**90 dny**
85	Kanalizační svody	39 dny
86	**Světlíky**	**92 dny**
87	zasklívání + nátěry	92 dny
88	klempíř - světlíky - Pz + nátěr	92 dny
89	**střecha s plechovou krytinou**	**92 dny**
90	Konstrukce klempířské	92 dny
91	Konstrukce zámečnické	92 dny
92	**Ocelové konstrukce**	**92 dny**
93	Oprava, výměna, PKO	92 dny
94	Technologická přestávka	45 dny
95	**11. etapa - jižní čelo haly 1**	**45 dny**
96	**Čelní prosklené plochy**	**45 dny**
97	Prosklené plochy (jižní)	45 dny
98	Výplnily - plech	35 dny
99	Lávky čelních fasád	15 dny
100	Vnější označení na halách	3 dny
101	**12. etapa - severní čelo haly 1**	**47 dny**
102	**Čelní prosklené plochy**	**47 dny**
103	Prosklené plochy (severní)	47 dny
104	Výplnily - plech	35 dny
105	Lávky čelních fasád	15 dny
106	Vnější označení na halách	3 dny
107	**Provádění stavby, ochranné konstrukce, lešení, ZS,...**	**941 dny**
108	Přípravné práce	30 dny
109	Pořízení prostorového lešení (dodávka)	16 dny
110	v průběhu stavby	929 dny
111		
112	**SO 05 Ukolejnění kovových konstrukcí**	**929 dny**
113	Dokončení stavebních prací	0 dny
114		
115	**SO 98 Všeobecný objekt**	**1112 dny**
116	Korozní měření a realizační projekt	900 dny
117	Dokumentace skutečného provedení	183 dny
118		
119	Dokončení díla / zakázky	0 dny
