HARMONOGRAM POSTUPU PLNĚNÍ

ID	Kód	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1					
2		„Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k.ú. Trnitá III. “	360 dny	01.07. 19	24.06. 20
3					
4		Předání staveniště	0 dny	01.07. 19	01.07. 19
5		Dokončení díla - předání a převzetí bez vad a nedodělků	0 dny	24.06. 20	24.06. 20
6					
7	190:	Stavební, montážní a ostatní práce	360 dny	01.07. 19	24.06. 20
8	180:	Vedlejší a ostatní náklady	360 dny	01.07. 19	24.06. 20
9	SO 0	Arch.stavební řešení	355 dny	06.07. 19	24.06. 20
10	1	Zemní práce	22 dny	02.09. 19	23.09. 19
11	2	Základy a zvláštní zakládání	20 dny	24.09. 19	13.10. 19
12	3	Svislé a kompletní konstrukce	86 dny	14.10. 19	12.05. 20
13	311	Konstrukce sádrokartonové	80 dny	27.01. 20	15.04. 20
14	4	Vodorovné konstrukce	56 dny	14.09. 19	08.11. 19
15	5	Komunikace	57 dny	06.04. 20	01.06. 20
16	60	Sanace	53 dny	02.12. 19	23.01. 20
17	61	Úpravy povrchů vnitřní	58 dny	23.03. 20	19.05. 20
18	62	Úpravy povrchů vnější	72 dny	09.03. 20	19.05. 20
19	63	Podlahy a podlahové konstrukce	57 dny	30.12. 19	24.02. 20
20	64	Výplně otvorů	52 dny	23.11. 19	13.01. 20
21	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	15 dny	09.09. 19	23.09. 19
22	94	Lešení a stavební výtahy	255 dny	16.07. 19	26.03. 20
23	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	32 dny	24.05. 20	24.06. 20
24	96	Bourání konstrukcí	185 dny	16.07. 19	16.01. 20
25	98	Demolice	48 dny	16.07. 19	01.09. 19
26	99	Staveništní přesun hmot	355 dny	06.07. 19	24.06. 20
27	711	Izolace proti vodě	77 dny	14.10. 19	18.03. 20
28	713	Izolace tepelné	65 dny	06.01. 20	10.03. 20
29	762	Konstrukce tesařské	68 dny	07.09. 19	13.11. 19
30	764	Konstrukce klempířské	33 dny	02.09. 19	04.10. 19
31	765	Krytiny tvrdé	46 dny	02.09. 19	03.12. 19
32	766	Konstrukce truhlářské	76 dny	06.04. 20	20.06. 20
33	767	Konstrukce zámečnické	98 dny	15.03. 20	20.06. 20
34	769	Otvorové prvky z plastu	36 dny	02.12. 19	06.01. 20
35	771	Podlahy z dlaždic a obklady	48 dny	30.03. 20	16.05. 20
36	776	Podlahy povlakové	65 dny	20.04. 20	23.06. 20
37	777	Podlahy ze syntetických hmot	15 dny	04.05. 20	18.05. 20
38	781	Obklady keramické	48 dny	16.03. 20	02.05. 20
39	783	Nátěry	40 dny	17.02. 20	27.03. 20
40	784	Malby	46 dny	13.04. 20	28.05. 20
41	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	11 dny	02.03. 20	12.03. 20
42	M43	Montáže ocelových konstrukcí	45 dny	02.09. 19	16.10. 19
43	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	51 dny	16.07. 19	04.09. 19
44	SO 0	Zdravotechnika	313 dny	06.07. 19	13.05. 20
45	721	Vnitřní kanalizace	58 dny	06.07. 19	29.03. 20
46	722	Vnitřní vodovod	71 dny	06.07. 19	28.04. 20
47	723	Vnitřní plynovod	4 dny	06.07. 19	09.07. 19
48	724	Strojní vybavení	11 dny	07.02. 20	17.02. 20
49	725	Zařizovací předměty	30 dny	06.07. 19	13.05. 20
50	SO 0	Vzduchotechnika	72 dny	23.03. 20	02.06. 20
51	SO 0	Ústřední vytápění	70 dny	22.02. 20	01.05. 20
52	2_18	Elektroinstalace	82 dny	23.01. 20	20.06. 20
53	10	DT	29 dny	22.04. 20	20.05. 20
54	2	Dat	30 dny	22.04. 20	21.05. 20
55	4	EPS	27 dny	23.03. 20	18.04. 20
56	5	STA	30 dny	23.01. 20	21.02. 20
57	6	PTV	33 dny	22.02. 20	11.06. 20
58	7	PZTS	14 dny	22.04. 20	05.05. 20
59	IS	Inženýrské sítě	87 dny	08.03. 20	02.06. 20
60	1804	PŘÍPOJKA VODY	14 dny	23.03. 20	05.04. 20
61	1804	ZRUŠENÍ PŘÍPOJKY PLYNU - VÝKOP	8 dny	08.03. 20	15.03. 20
62	1-18	PARKOVÁ ÚPRAVA DVORA - 01 - Vegetační úpravy	12 dny	22.05. 20	02.06. 20
63	2-18	PARKOVÁ ÚPRAVA DVORA - 02 - Zpevněná plocha a mo...	45 dny	07.04. 20	21.05. 20

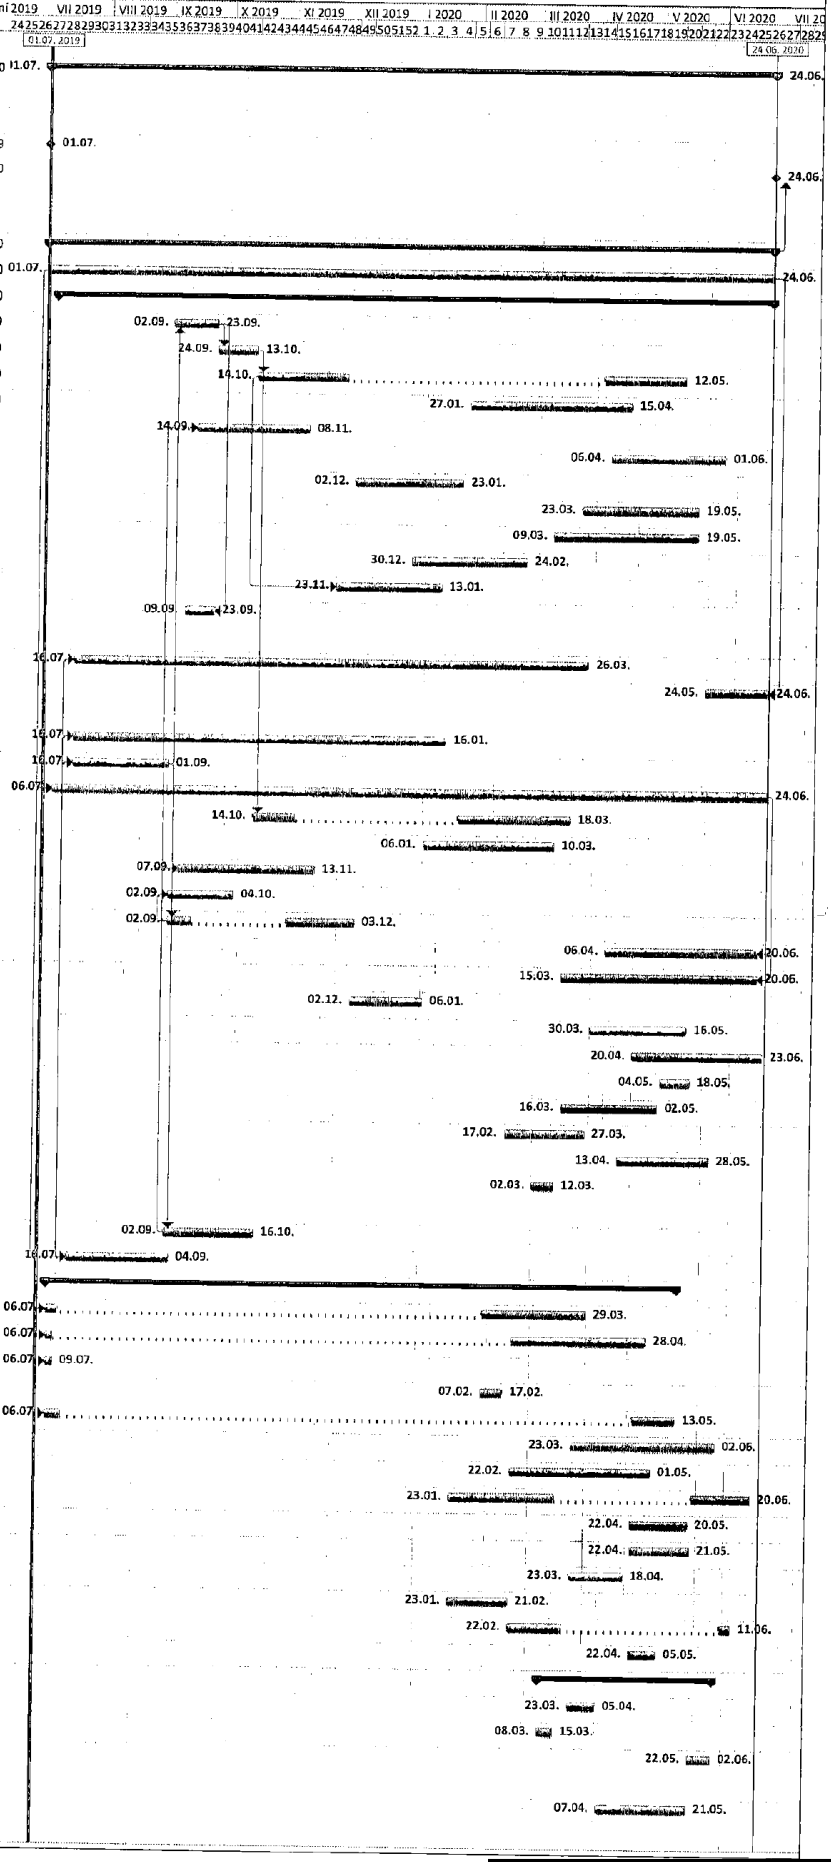

V Brně 03.06.2019

Digitálně podepsal JUDr. Iva Marešová
12.09.2019 14:26

[redacted]
